

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

2007 YILI FAALİYET RAPORU



ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ





ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

2007 YILI FAALİYET RAPORU





“Hususi idareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyetle hayat ucuzluğunu temin ederek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır.”

H. Ortakent

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER

A)- Elazığ İl Özel İdaresinin Misyonu Vizyonu ve İlkeleri	1
B)- Yetki Görev ve Sorumluluklar	2
C)- Elazığ İl Özel İdaresine İlişkin Bilgiler	
1. Fiziki Kaynaklar	
1.1. Taşınmazlar	4
1.2. Makina Parkı	7
1.3. Ortak veya Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar	9
2. Örgüt Yapısı	
2.1. Elazığ İl Özel İdaresi Organizasyon Şeması	10
2.2. Organizasyon Yapısı Özet Tablosu	11
2.3. İl Genel Meclisi	12
a)- İl Encümeni	16
b)- İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı	17
2.4. İl Genel Meclis Üyeleri	18
3. İnsan Kaynakları	28
2. AMAÇ VE HEDEFLER	
2.1.)- İdaremizin Stratejik Planı	32
2.2.)- İdaremizin Stratejik Konuları	33
2.3.)- Temel Politika ve Önceliklerimiz	34
3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	
3.1.)- Mali Bilgiler	
a)- Gelir ve Gider Bütçesi Tahmini ve Gerçekleşen	36
3.2.)- Sektörler Bazında Yapılan Yatırımlar ve Ödemeler	62
3.3.)- İlçe Bazında Yapılan Yatırımlar ve Ödemeler	82



Önsöz

Elazığ İl Özel İdaresi stratejik planıyla misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir vizyon oluşturmuş bu vizyona uygun amaçlar ile bunlara ulaşmayı mümkün kılacak hedef ve stratejileri belirlemiş ayrıca ölçülebilir kriterler geliştirerek performanslarını izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı esnek bir yönetim

yaklaşımı sergilemiştir.

Elazığ İl Özel İdaresi 2007 yılında hizmet alanını sürekli genişletmiş yatırım ve hizmetlerini çeşitlendirerek Elazığ'ın kalkınmasında ve genişlemesinde büyük katkılar yapacak önemli işlerin ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde öncü kuruluş olmuştur.

2007 yılında gerçekleştirilen hizmetler ve yatırımlar gelecekte yapılacak yatırım hizmetler için teminat olarak kabul edilebilir.

En büyük hedefimiz olan Elazığ'ımızı yaşanabilir modern yerleşim alanına dönüştürmektir, bunun için gerekli yatırım ve hizmetleri kısa sürede gerçekleştirmektir.

Elazığ İl Özel İdaresi kendisini sürekli geliştiren ilerlemeyi ve çağdaşlığı temel ilke olarak kabul etmiş bir yerel yönetim birimi olarak her geçen gün güçlenmekte ve her personelini her üyesini de ilerlemeye ve gelişmeye teşvik ederek kendi kurumsal gelişmesini sürdürerek çağdaş bir yerel yönetim birimi olarak Elazığ'ımızın gelişmesinde ve kalkınmasında öncülüğünü sürdürecektir.

Bu doğrultuda 2007 yılında Elazığ İl Özel İdaresi hedeflerine ulaşmak için gerekli yatırım ve hizmetlerini her zamankinden daha kısa sürede en etkin en verimli bir şekilde yerine getirmiştir.

Muammer MUŞMAL
Vali



Sunuş

Bütün İl Genel Meclisi Üye arkadaşlarımızla başlatmış olduğumuz, yerel kalkınma hamlesiyle kararları atılımcı bir ruhla, azimle, sabırla, özveriyle çalışarak ilimizin sahip olduğu ve coğrafi tarihi kültürel zenginliklerini bilimin aklın ve tecrübenin ışığı altında değerlendirerek Elazığ'ımızın uygar bir kent olması için çalışıyoruz.

Kamu hizmetlerinin bireye en yakın yönetimler tarafından verilmesinden daha güzel bir şey yoktur.

Demokrasiyi özümsemiş, sevgi saygı hoşgörü ve uzlaşma kültürüne sahip kendi geleneklerine bağlı bir o kadar da yeni fikirlere açık çağdaş uygar seçkin arkadaşlarımızın bulunduğu meclisimiz geride bıraktığı 2007 yılında seviyeli ve saygın bir şekilde çalışmış bir çok hayırlı hizmetin gerçekleşmesi ile ilgili olarak iktidarıyla muhalefetiyle birlikte karar almıştır.

Son bir yıllık çalışmanın bilançosu olan "Elazığ İl Özel İdaresi 2007 Faaliyet Raporu"nu takdirle karşılayacağınızı umar, saygılar sunarım.

Abbas ALTUNIŞIK
İl Genel Meclis Başkanı



Sunuş

Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yöneticilik anlayışı içerisinde, İlimizin önceliklerini göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi belli bir plan dahilinde gerçekleştirip, sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin kullanmaya çalışarak 2007 yılı çalışma sezonunu geride bırakmış bulunuyoruz.

Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir.

Bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanan 2007 Yılı Elazığ İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu; İl Özel İdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, temel politikalar ve öncelikler, 2007 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle mali bilgileri kapsamaktadır.

Mahalli ve müşterek nitelikli hizmetlerin hepsinin önemli olduğu bir dönemde İl Özel İdaresinin kısıtlı bütçe imkanlarının rasyonel ve rantbal kullanıldığı, mevcut ödenekleri hizmetlerin alternatifleri düşünülerek ve öncelikler dikkate alınarak kullanılmaya özen gösterilmiştir.

Bilindiği üzere hızla kalkınan ülkemizde yapılan kanuni düzenlemeler sonucu Mahalli İdarelerin görev alanları genişlemekte ve gün geçtikçe de etkinliği artmaktadır.

Kamu mali yönetim sisteminin temel bileşenleri olan stratejik plan, performans programından sonra faaliyet raporunun da hayata geçirilmesinin mutluluğunu tüm ekibimle birlikte yaşıyorum.

Enver ERDEM
Vali Yardımcısı
Genel Sekreter



1.GENEL BİLGİLER

A)- Elazığ İl Özel İdaresinin Misyonu Vizyonu ve İlkeleri

İl Özel İdaresi, il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı İl'deki seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliğidir. İl'in kurulmasıyla kurulup İl'in kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona eren görev alanı belediye sınırları içerisinde ve belediye sınırları dışında olmak üzere iki kısmı kapsar. Karar organları İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve İl Valisidir.

a)- Misyonomuz



Elazığ İl Özel İdaresi olarak misyonumuz kanunların verdiği yetki ve görevler çerçevesinde ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere tüm kamu hizmetlerini adil, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde ve akılcı biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlamak ve sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefleyerek halkın gelir seviyesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.

b)- Vizyonumuz

İdaremizin vizyonu ise, değişimi ve gelişmeyi benimseyen, toplumun her kesimiyle bütünleşen, bireyleri yaşadığı şehre katkı sağlamak için harekete geçiren, çağdaş, güvenilir, dinamik, insan odaklı yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kırsal ve kentsel alanlardaki farklılıkları en aza indirmiş, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan ve Elazığ'ı 21.yüzyılda önemine layık olduğu noktaya getirmiş bir kurum olmaktır.



İlkelerimiz

c)- İlkelerimiz

Elazığ İl Özel İdaresi olarak;

- Güvenilir,
- Şeffaf,
- Hesap verme yükümlülüğü olan,
- Hizmetlerin sunumunda verimliliği, etkinliği ve tutumluluğu esas alan, ölçülebilir ilerlemeler sağlayan ve sürdüren bir kurum olmak temel ilkelerimizdir.

Görev ve Sorumluluklar

B)- Görev ve Sorumluluklar

İl Özel İdaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla İl sınırları içerisinde gençlik ve spor sağlık, tarım, sanayi ve ticaret İl'in çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri; Belediye sınırları dışında; imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ile verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir ve vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün, dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yürürlükten kaldırılan eski yasa, İl Özel İdaresinin sadece kendi görev alanına giren hizmetlerin yerine getirilmesini öngörmekte iken; yeni yasada mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk sınırları belirlenmiştir. Kanunun 6. Maddesinde 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı yasayla eklenen fıkra ile Merkez İdare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili Bakanlıkça uygun görülenlerin ödeneği ilgili İl Özel İdaresi bütçesine aktarılacak suretiyle gerçekleştirilebilecektir. İl Özel İdaresi bu yatırımların % 25 kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilecektir. Merkezi İdarenin desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili İl Özel İdaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içerisinde yürütülmesine de olanak sağlamıştır.

İl Özel İdaresinin İl Genel Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebileceği veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği ve bu amaçla kaynak aktarımında bulunabileceği, Merkez İdareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve aynı

ihtiyaçları karşılayabileceği, geçici olarak araç ve personel görevlendirebileceği, taşınmaz mallarını 25 yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebileceği hükme bağlanarak diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla İl'in özelliklerini dikkate alarak afet ve acil durum planlarını yapıp, ekip ve donanımını hazırlaması, İl dışında yangın ve doğal afetler gelmesi durumunda da bu bölgelere gerekli yardım ve desteği sağlayabileceği yeni yasada belirtilmiştir.

C)- Kanuni Yetkiler ve İmtiyazlar

Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek, denetlemek, kanunların verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasa koymak, uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, borç almak, bağış kabul etmek, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek, vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak ile Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseselere umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek İl Özel İdaresinin yetki ve imtiyazlarındandır.

Kanuni Yetki ve İmtiyazlar



Taşınmazlar

Sıra	İlçesi	Türü	Yeri	Kullanımı	M2
1.	Merkez	Akaryakıt İstasyonu	Müliga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü		200
2.	Merkez	Akaryakıt İstasyonu	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Akaryakıt İstasyonu	143
3.	Merkez	Ambar	Müliga Makine İkmal Grup Müdürlüğü	Yedekparça Ambarı	3250
4.	Merkez	Arazi	Müliga Makine İkmal Grup Müdürlüğü		115000
5.	Sivrice	Arazi	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Eğitim Tesisleri	11740
6.	Merkez	Arazi	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Asfalt Tesisi	136785
7.	Merkez	Arsa	Müliga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü	Arsa	20500
8.	Merkez	Arsa	Müliga Toprak İskan Tesisleri		2547
9.	Merkez	Arsa	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü		42800
10.	Ağın	Arsa	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Ağın Bakımevi (Arsa)	5000
11.	Alacakaya	Arsa	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Alacakaya Bakımevi (Arsa)	7730
12.	Ancak	Arsa	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Ancak Bakımevi (Arsa)	10796
13.	Baskil	Arsa	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Baskil Bakımevi (Arsa)	8400
14.	Keban	Arsa	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Keban Bakımevi (Arsa)	14507
15.	Maden	Arsa	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Maden Bakımevi (Arsa)	16800
16.	Palu	Arsa	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Palu Bakımevi (Arsa)	88850
17.	Palu - Beyhan	Arsa	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Palu - Beyhan Bakımevi (Arsa)	15200
18.	Sivrice	Arsa	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Sivrice Bakımevi (Arsa)	7650
19.	Sivrice	Arsa	İl Özel İdaresi	Hazar Gölü Kamp Yeri	5836
20.	Merkez	Arsa	İl Özel İdaresi	Halı Sanayii Okulu	1275
21.	Merkez	Arsa	İl Özel İdaresi	Elazığ Spor Kompleksi	75000
22.	Sivrice	Arsa	İl Özel İdaresi	Hazar Baba Kayak Merkezi	139
23.	Merkez	Arsa	İl Özel İdaresi	Feribot İskelesi	1000
24.	Merkez	Arsa	İl Özel İdaresi	Harpüt Evi Restaurant	2151
25.	Merkez	Arsa	İl Özel İdaresi	Huzurevi	7218
26.	Karakoçan	Arsa	İl Özel İdaresi	Golan Kaplıcaları	1500
27.	Merkez	Arsa	İl Özel İdaresi	Hizmet Binası	
28.	Merkez	Arsa	İl Özel İdaresi		1000
29.	Merkez	Arşiv - Ambar	Müliga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü		500
30.	Merkez	Asfalt Plenti	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Asfalt Plenti	1 Adet
31.	Merkez	Asfalt Plenti	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Konkasör	1 Adet
32.	Merkez	Asfalt Tankı	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Asfalt Tankları	3 Adet
33.	Merkez	Atölye	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Marangozhane	188
34.	Merkez	Atölye	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Kaynakhane-Kaportahane-Oto Elektrik	447
35.	Merkez	Atölye	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Boyahane - Lastikhane	177
36.	Merkez	Atölye	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Atölye	2112
37.	Merkez	Atölye	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Atölye	1131
38.	Merkez	Bağlantı Yolları - Saha	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Saha	32000
39.	Sivrice	Bağlantı Yolları - Saha	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Bağlantı Yolları - Saha	1000

S.No	İlçesi	Türü	Yeri	Kullanımı	M2
40.	Merkez	Bağlantı Yolları - Saha	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Asfalt Plenti	2000
41.	Baskil	Bağlantı Yolları - Saha	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Bağlantı Yolları - Saha	1000
42.	Palu	Bağlantı Yolları - Saha	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Bağlantı Yolları - Saha	500
43.	Merkez	Bahçe Duvarı	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Bahçe Duvarı	2000
44.	Palu	Bakimevi	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Palu Bakimevi	500
45.	Palu - Beyhan	Bakimevi	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Palu - Beyhan Bakimevi	500
46.	Sivrice	Bakimevi	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Sivrice Bakimevi	600
47.	Merkez	Bina	İl Özel İdaresi	Huzurevi	2000
48.	Baskil	Büz İmalathanesi	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Büz İmalathanesi	80
49.	Baskil	Büz İmalathanesi	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Büz Yapma Makinesi	1 Adet
50.	Merkez	Çevre Duvarı	İl Özel İdaresi		420
51.	Merkez	Çevre Duvarı-Yollar	Müliga Toprak İskan Tesisleri		500
52.	Maden	Çevre Duvarı-Yollar	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Maden Bakimevi	1000
53.	Sivrice	Eğitim Tesisi	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Eğitim Tesisleri	1000
54.	Sivrice	Eğitim Tesisi	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Oba	600
55.	Merkez	Feribot İskelesi	İl Özel İdaresi	Feribot İskelesi	1
56.	Merkez	Feribot İskelesi	İl Özel İdaresi	Yolcu Bekleme Salonu	75
57.	Merkez	Garaj - Sundurma	Müliga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü		300
58.	Merkez	Hizmet Binası	Müliga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü	Çubukbey Anadolu Lisesi	1300
59.	Merkez	Hizmet Binası	Müliga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü	İl İdare Mahkemesi	1850
60.	Merkez	Hizmet Binası	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Asfalt Tesisi	75
61.	Alacakaya	Hizmet Binası	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Alacakaya Bakimevi	220
62.	Ancak	Hizmet Binası	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Ancak Bakimevi	600
63.	Baskil	Hizmet Binası	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Baskil Bakimevi	700
64.	Maden	Hizmet Binası	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Maden Bakimevi	700
65.	Merkez	Hizmet Binası	İl Özel İdaresi	Hizmet Binası	
66.	Merkez	Hizmet Binası	Müliga Makine İkmal Grup Müdürlüğü	Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi	1400
67.	Merkez	Hizmet Binası	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Hizmet Binası	4950
68.	Merkez	Hizmet Binası	Müliga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Hizmet Binası	1200
69.	Merkez	İş Merkezi	İl Özel İdaresi	V.Muharrem GÖKTAYOĞLU İş Merk.	
70.	Karakoçan	Kaplıca	İl Özel İdaresi	Golan Kaplıcaları	65
71.	Sivrice	Kayak Merkezi	İl Özel İdaresi	Teleferik Sistemi	
72.	Merkez	Lojman	İl Özel İdaresi	Kültür Mahallesi 4 Dairelik Lojman	480
73.	Merkez	Lojman	İl Özel İdaresi	Yeni Mahallesi 3 Dairelik Lojman	360
74.	Merkez	Lojman	İl Özel İdaresi	Naibbey Mahallesi 12 Dairelik Lojman	1440
75.	Merkez	Lojman	İl Özel İdaresi	10 Dairelik Lojman	1200
76.	Merkez	Lojman	Müliga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü	Lojman	1000
77.	Merkez	Lojman	Müliga Toprak İskan Tesisleri	Kültür Mahallesi 9 Dairelik Lojman	1400
78.	Merkez	Lojman	Müliga Makine İkmal Grup Müdürlüğü	Grup Müd. 10 Dairelik Lojman	1200

Taşınmazlar

Taşınmazlar

S.No	İlçesi	Türü	Yeri	Kullanımı	M2
79.	Merkez	Lojman	Mülgâ Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Lojman	1200
80.	Merkez	Lojman	Mülgâ Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Lojman	1800
81.	Merkez	Lojman	Mülgâ Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Lojman	1700
82.	Merkez	Okul	İl Özel İdaresi	Halı Sanayii Okulu Tek Katlı Bina	350
83.	Merkez	Okul	İl Özel İdaresi	Zihinsel Engelliler Okulu	2240
84.	Merkez	Restaurant	İl Özel İdaresi	Harput Evi Restaurant	4000
85.	Merkez	Restaurant	İl Özel İdaresi	Harput Evi Kapalı Garaj Dinlenme Yeri	2500
86.	Sivrice	Restaurant-Dinlenme Tesisi	İl Özel İdaresi	Hazar Baba Kayak Merkezi	350
87.	Merkez	Saha Amirliği	Mülgâ Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü	Rehabilitasyon Ünitesi	280
88.	Merkez	Saha Amirliği Isı Santrali	Mülgâ Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Saha Amirliği Isı Santrali	492
89.	Merkez	Sosyal Tesis	Mülgâ Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Yemekhane - Misafirhane	1548
90.	Merkez	Spor Kompleksi	İl Özel İdaresi	Çim Saha - Peyzaj	80000
91.	Merkez	Spor Kompleksi	İl Özel İdaresi	Altyapı Tesisleri	931
92.	Merkez	Spor Kompleksi	İl Özel İdaresi	Eğitim ve Dinlenme Tesisi	10040
93.	Sivrice	Tek Katlı Bina	İl Özel İdaresi	Hazar Gölü Kamp Yeri	300
94.	Merkez	Yıkama Yağlama	Mülgâ Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü		230
95.	Merkez	Yıkama Yağlama	Mülgâ Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü	Yıkama Yağlama	120
96.	Merkez	Yollar	İl Özel İdaresi		1000

Makine Parkı

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE PARKI					
Sıra	Cinsi	Toplam	Sıra	Cinsi	Toplam
1.	OTOMOBİL	12	20.	BAKIM DİSTRÜBÜTÖRÜ	2
2.	PİKAP	21	21.	YAPIM DİSTRÜBÜTÖRÜ	6
3.	MİNİBÜS	11	22.	YAKIT TANKERİ	1
4.	MİDİBÜS	1	23.	SU TANKERİ (ARAZÖZ)	3
5.	AMBULANS	1	24.	ASFALT SÜPÜRGESİ	1
6.	KAMYONLAR	51	25.	ÇEK.TİP.YAKIT TANKI	15
7.	LAS.TEK.TRAKTÖR	1	26.	ÇEK.TİP.YAKIT TREYLERİ	1
8.	DOZER	15	27.	SEYYAR YAĞLAMA MAK.	1
9.	YAPIM GRAYDERİ	19	28.	SEYYAR KAYNAK MAK.	3
10.	YÜKLEYİCİ	11	29.	KAR MAKİNASI	4
11.	KAZICI-YÜKLEYİCİ	7	30.	KAMPTREYLER	18
12.	EXKAVATÖR	5	31.	SEYYAR TAMİR ARACI	1
13.	SONDAJ MAKİNASI	4	32.	KASALI TREYLER	1
14.	ÇEKİCİ	3	33.	SEMİ TREYLER	5
15.	VİNÇ	2	34.	TRAKTÖR ROMORKU	1
16.	FORKLİFT	2	35.	JENERATÖR	2
17.	SEYYAR KOMPRESÖR	2	36.	HİD.KAYA DELİCİ	1
18.	VİBRASYONLU SİLİNDİR	8	37.	AĞAÇ DİKME MAKİNASI	1
19.	KONKASÖR	1	T O P L A M		244

Elazığ İl Özel İdaresi 2007 yılında kendi öz kaynakları ile makine parkını yenileme projesi kapsamında


- 1/- Paletli Ekskavatör
- 2/- Kırıcı Tesisatı
- 3/- Hidrolik Kırıcı

Araçları makine parkına kazandırmış olup. İdaremize toplam maliyeti


186.449.00 YTL dir.

İş Makineleri Çalışma Saatleri

Yıllar	Dozer	Greyder	Yükleyici	Silindir	Ekskavatör
2006	14.168	26.837	11.730	4.166	9.861
2007	13.581	24.416	9.764	4.891	10.908


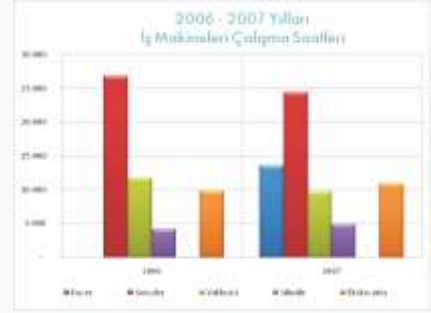


İş Makineleri Verimlilikleri

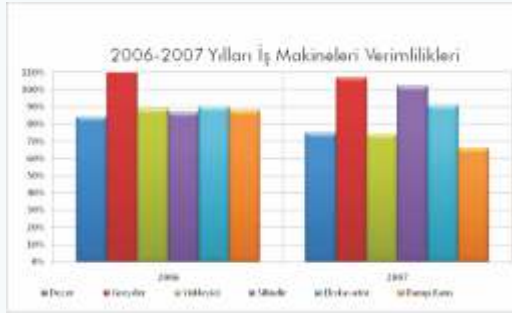

2006-2007 Yılları İş Makineleri Verimlilik Yüzdeleri						
Yıllar	Dozer	Greyder	Yükleyici	Silindir	Ekskavatör	Damp.Kam.
2006	84%	118%	89%	87%	90%	88%
2007	75%	107%	74%	102%	91%	66%

İş Makineleri Akaryakıt Sarf Durumu

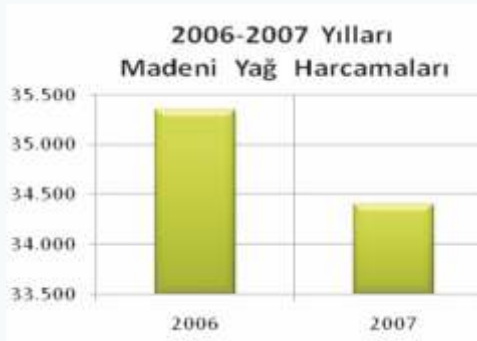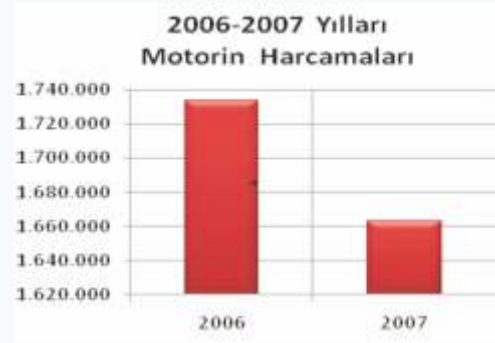

Yıllar	Benzin (lt.)	Motorin (lt.)	Mad. Yağ (kg.)
2006	16.887	1.733.880	35.353
2007	16.321	1.663.202	34.404

Teknolojik Kaynaklar


Cinsi	Sayısı
Araç Telsizi	3
Telsiz	20
Laptop (Kişisel Bilgisayar)	15
Bilgisayar	133
Yazıcı	91
Tarayıcı	1
Telefon Makinesi	56
Faks	6
Sabit Merkez Telsizi	1
Toplam	326

Organizasyon	Kuruluş Yılı	Pay Oranı (%)	Ortak Sayısı	Sermayesi	Açıklama
İŞGEM	2006	% 10	10	100.000 YTL	Aktif
Fırat Teknokent	2007	% 5	5	1.000.000 YTL	Aktif

Üye Bulunan Kuruluşlar



Organizasyon
Şeması

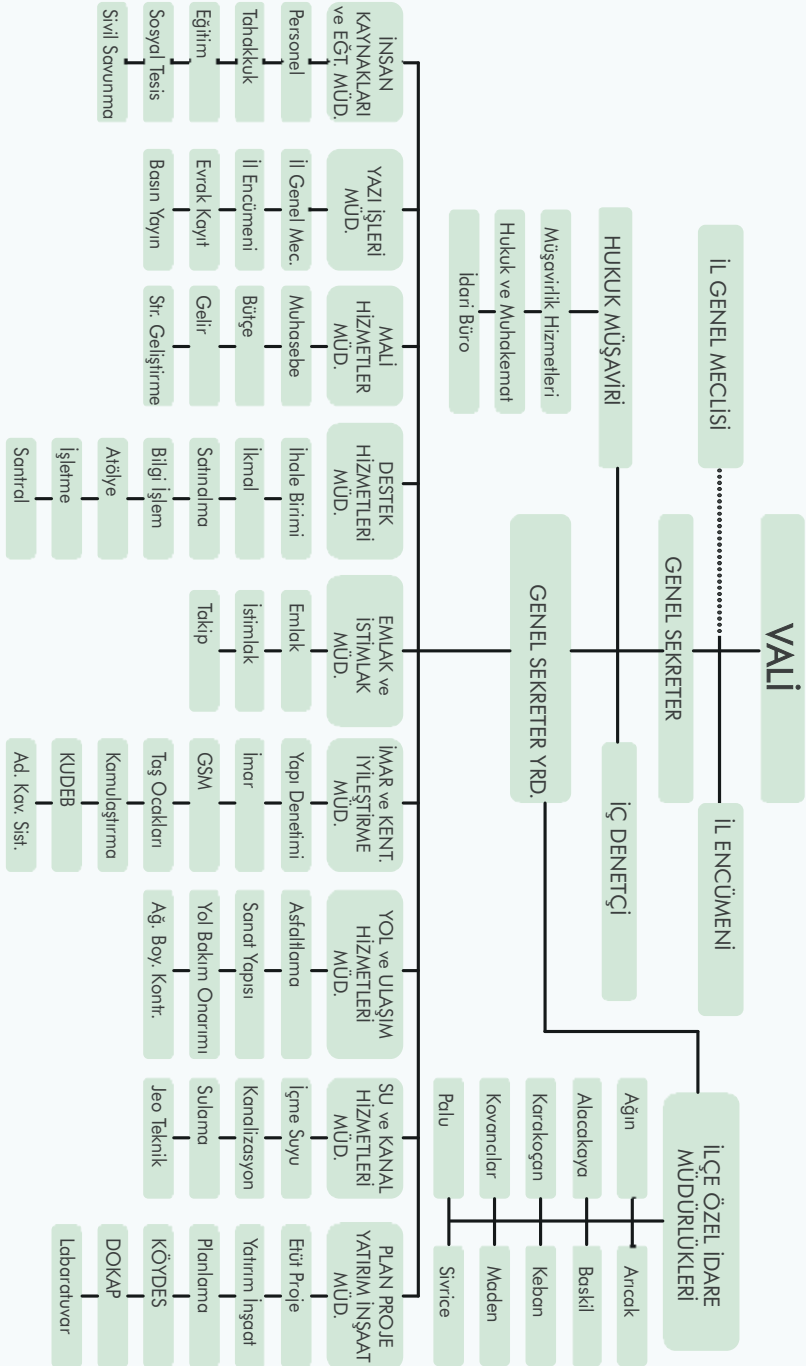

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

Organizasyon
Yapısı
Özet Tablosu

S.No	Unvan	Sayı	Birimi	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
1.	Genel Sekreter	1	Genel Sekreter	1			1
2.	Genel Sekreter Yardımcısı	1	Genel Sekreter Yardımcısı	1			1
3.	Müdür	15	İç Denetim	1			1
4.	İç Denetçi	1	Hukuk Müşavirliği	0	2	2	4
5.	Hukuk Müşaviri	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	16		136	152
6.	İlçe Özel İdare Müdürü	6	Yazı İşleri Müdürlüğü	7		4	11
7.	Avukat	1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	12		4	16
8.	Memur	1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	19	1	361	381
9.	V.H.K.İ.	18	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	8	1	6	15
10.	Teknisyen	10	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	19		93	112
11.	Tekniker	26	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	34		58	92
12.	Mühendis	54	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	17	2	24	43
13.	Ambar Memuru	2	İlçe Özel İdare Müdürlükleri	10		11	21
14.	Ayniyat Saymanı	1	Diğer Kurumlarda Görevli Özel İdare Personeli	1		33	34
15.	Hemşire	1					
16.	Hizmetli	5					
17.	Programcı	1					
18.	Sağlık Memuru	1					
19.	Sivil Savunma Uzmanı	1					
20.	Şef	5					
	Toplam	152	TOPLAM	146	6	732	884

HİZMET SINIFI	Bakanlıkça Tahsis	Yönetmeliğe Göre	Aktarılan Kadro	Kullanılabilir Kadro	İhdas Edilmeyen	MEVCUT İhdas	NORM Boş	KADRO Dolu	NORM DIŞI	Toplam Personel
Genel İdare Hizmetleri	102	13	-1	114	4	110	66	44	11	55
Teknik Hizmetler	42	13	6	61	0	61	11	50	39	89
Sağlık Hizmetleri	16			16	12	4	2	2	0	2
Yardımcı Hizmetler	24		-5	19	6	13	8	5	0	5
Avukatlık Hizmetleri	3			3	1	2	1	1	0	1
MEMUR TOPLAMI	187	26	0	213	23	190	88	102	50	152
Kadrolu İşçi	94			94	0	94	20	74	658	732
İŞÇİ TOPLAMI	94	0	0	94	0	94	20	74	658	732
GENEL TOPLAM	281	26	0	307	23	284	108	176	708	884

S.No	Eğitimin Konusu	Eğitim Yeri	Süresi	Katılımcı Sayısı
1.	Proje Hazırlama Eğitimi	Antalya	5 Gün	2
2.	Araçların Ağırlık ve Boyut Kontrolleri	Ankara	1 Gün	1
3.	Afet Zarar Azaltma	Ankara	1 Gün	1
4.	Taşınır Mal Yönetmenliği	Ankara	1 Gün	2
5.	Yerel Yönetim Uzmanlığı	Ankara	2 Gün	1
6.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi	Trabzon	5 Gün	3
7.	Kümeleme Temel Bileşenleri Politikası	İstanbul	2 Gün	1
8.	Performans Programı Hazırlama Eğitimi	Antalya	5 Gün	3
9.	İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılandırılması	Elazığ	2 Gün	18
10.	4734 Sayılı KİK ve Uygulaması Eğitimi	Elazığ	3 Gün	17
11.	4734 Sayılı KİK ve Uygulaması Eğitimi	Elazığ	3 Gün	17
12.	Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi	Elazığ	16 Gün	3
13.	Kalite Yönetim Sistemi	Elazığ	2 Gün	12
14.	Bilgisayar Kullanımı Eğitimi	Elazığ	3 Gün	11

İl Genel Meclisi

2.3. İl Genel Meclisi

Elazığ İl Genel Meclisi 31 üyeden oluşmaktadır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca her ayın ilk haftası en çok 5 gün, bütçe görüşmelerine rastlayan ay ise en çok 20 gün toplanmaktadır.

Elazığ İl Genel Meclisi 2007 yılında 11 toplantı 70 birleşim yapmak suretiyle 231 adet karar almıştır.

İhtisas Komisyonları

5302 sayılı yasanın 16. İl Genel Meclisi çalışma yönetmenliğinin 20. Maddesi uyarınca İl Genel Meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından seçilecek en az 3, en çok 5 kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonları en çok 7 kişiden meydana gelir.

İhtisas Komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin İl Genel Meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Eğitim, Kültür Sosyal Hizmetler Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması zorunludur.

İhtisas Komisyonları üye seçimi 05/07/2007 tarihinde yapılmış olup kurulması zorunlu olan komisyonlara ek olarak üç yeni komisyon kurulmasına karar verilmiş olup, bu komisyonlara üye seçimi yapılmıştır.

a)- Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri

- 1/-Ekrem USLU
- 2/-Yaşar ÇAKMAK
- 3/-Halim BEYAZELMA
- 4/-Metin Baki ÖLÇÜCÜ
- 5/-Celal SOYLU
- 6/-Süleyman USLU
- 7/-Mehmet Emin TURAN

Plan ve Bütçe Komisyonu 2007 yılında 9 kez toplanmış olup 9 adet konuyu görüşerek rapora bağlamıştır.

İhtisas Komisyonları

b)- İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeleri

- 1/-Cemal YILDIRIM
- 2/-Ahmet SARIKAYA
- 3/-Yusuf TANGÜNER
- 4/-Nurettin ÇETİNTAŞ
- 5/-Ahmet CANPOLAT
- 6/-Mehmet KAYA
- 7/-Reşit DEMİR

İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeleri 2007 yılında 29 kez toplanmış olup, 29 adet konuyu görüşerek rapora bağlamıştır.

c)- Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyon Üyeleri

- 1/-Süleyman BEKTAŞ
- 2/-Mehmet Hanifi COŞKUN
- 3/-Fevzi UZUNOĞLU
- 4/-Abdülhamit BAYDAŞ
- 5/-Aytunç SUNGUROĞLU

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyon Üyeleri 2007 yılında 3 kez toplanmış olup, 3 adet konuyu görüşerek rapora bağlamıştır.

d)-Çevre ve Sağlık Komisyon Üyeleri

- 1/-Halil GÖRGÖZ
- 2/-Necati EKMEKYAPAR
- 3/-Süleyman BEKTAŞ
- 4/-Ali KARABULUT
- 5/-Mehmet Nuri ÖZ

Çevre ve Sağlık Komisyon Üyeleri 2007 yılında 11 kez toplanmış olup, 11 adet konuyu görüşerek rapora bağlamıştır.

İhtisas Komisyonları

e)-Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyon Üyeleri

- 1/-Fazlı KIZILASLAN
- 2/-Mehmet Hanifi COŞKUN
- 3/-Abbas ALTUNIŞIK
- 4/-Fevzi UZUNOĞLU
- 5/-Eser AYDIN

Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyon Üyeleri 2007 yılında 4 kez toplanmış olup, 4 adet konuyu görüşerek rapora bağlamıştır.

f)-Turizm Gençlik ve Spor Komisyon Üyeleri

- 1/-Abdülhamit BAYDAŞ
- 2/-Necati EKMEKYAPAR
- 3/-Mehmet Ali ÖZDEMİR
- 4/-Mustafa AKDENİZ
- 5/-Haşim KARACİMŞİT

Turizm Gençlik ve Spor Komisyon Üyeleri 2007 yılında 2 kez toplanmış olup, 2 adet konuyu görüşerek rapora bağlamıştır.

g)-Sanayi ve Ticaret Komisyon Üyeleri

- 1/-Halil GÖRGÖZ
- 2/-Ali KARABULUT
- 3/-Fazlı KIZILASLAN
- 4/-Mehmet ARSLAN
- 5/-İsmet ELİTOK

Sanayi ve Ticaret Komisyon Üyeleri 2007 yılında 2 kez toplanmış olup, 2 adet konuyu görüşerek rapora bağlamıştır.

İl Encümeni

İl Valisinin başkanlığında İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyelerin arasından bir yıl için gizli oy ile seçeceği 5 Üye ile biri Mali Hizmetler Müdürü olmak üzere Valinin her yıl Birim Amirleri arasından seçeceği 5 üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşmaktadır.

06/11/2007 tarihinde seçilen Encümen üyeleri Kasım 2008 tarihinde yapılacak İl Encümeni seçimine kadar görev yapacaklardır. 2007 yılında İl Encümeni 50 oturumda 290 karar almıştır.

3. Teknolojik Kaynaklar

İl Özel İdaresi içerisinde Bilgi İşlem Merkezine bağlı bir iç ağ oluşturulmuş olup, ADSL üzerinde 4096 MB hızında internetin bütün bilgisayarlarba bağlandığı, Muhasebe iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığının hazırlamış olduğu olduğu program kullanılarak internet ortamında bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri yürütülmektedir.

Kurum hizmet birimlerinin etkin ve verimli faaliyette bulunabilmesi için yönetim ve bilişim sistemlerinin kurulması konusunda gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Kurum görev alanına giren konularda ortak veri tabanları oluşturmaya ilişkin iş işlemler hızla devam etmektedir.

Kurumun, Kurum dışı birimlerle bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve standartlar hazırlamak ve uygulanmasının sağlanması için alt yapı hazırlıkları devam etmektedir. İl özel idaresin web sitesi de hizmete sunulmuştur. (<http://www.elazigozelidaresi.gov.tr>)

Kurumun internet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, Kurumun kanunla verilen görevlerini etkin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla gerekli bilişim sistemlerini tasarlanması, geliştirmek, yürütmek ve teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde güncelleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir

İl Encümeni



Muammer MUŞMAL
İl Valisi
İl Encümen Başkanı



Enver ERDEM
Genel Sekreter
Encümen Üyesi



Ömer YALÇIN
Mali Hizm. Müd.
Encümen Üyesi



Müslüm KAYA
Yol ve Ulaş. Hiz. Müd.
Encümen Üyesi



Cemil YATKIN
Su ve Knl. Hiz. Müd.
Encümen Üyesi



Müfit ERDEM
Yazı İşleri Müd.
Encümen Üyesi



Ali KARABULUT
İl Gen. Mec. Üyesi
Encümen Üyesi



Süleyman BEKTAŞ
İl Gen. Mec. Üyesi
Encümen Üyesi



Halil GÖRGÖZ
İl Gen. Mec. Üyesi
Encümen Üyesi



M. Ali ÖZDEMİR
İl Gen. Mec. Üyesi
Encümen Üyesi



M. Hanifi COŞKUN
İl Gen. Mec. Üyesi
Encümen Üyesi



Abbas ALTUNIŞIK
Meclis Başkanı



Başkanlık Divanı



Ekrem USLU
I. Başkan Vekili



Halil GÖRGÖZ
II. Başkan Vekili



M. Hanifi COŞKUN
Katip Üye



A. Hamit BAYDAŞ
Katip Üye





Fevzi UZUNOĞLU
Yedek Katip Üye





Cemal YILDIRDIM
Yedek Katip Üye


İl Genel Meclisi

	Adı : Aytunç Soyadı : SUNGUROĞLU Parti : Demokrat Parti İlçe : Merkez İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Elazığ - 1960 Öğrenim Durumu : Lise Mesleği : Serbest
---	---


	Adı : Mehmet Soyadı : KAYA Parti : Demokrat Parti İlçe : Merkez İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Elazığ - 1971 Öğrenim Durumu : İlkokul Mesleği : Serbest
---	--


	Adı : İsmet Soyadı : ELİTOK Parti : Demokrat Parti İlçe : Merkez İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Elazığ - 1947 Öğrenim Durumu : Lise Mesleği : Akaryakıt Bayii
--	--


	Adı : Eser Soyadı : AYDIN Parti : Demokrat Parti İlçe : Merkez İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Elazığ - 1968 Öğrenim Durumu : İlkokul Mesleği : Serbest
---	---


	Adı : Süleyman Soyadı : BEKTAŞ Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Merkez İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Elazığ - 1971 Öğrenim Durumu : Üniversite Mesleği : Emekli
---	--


İl Genel
Meclisi

	Adı : Cemal Soyadı : YILDIRIM Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Merkez İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Çemişgezek -1969 Öğrenim Durumu : İlkokul Mesleği : Serbest
---	--


	Adı : Ekrem Soyadı : USLU Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Merkez İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Elazığ - 1963 Öğrenim Durumu : Üniversite Mesleği : Serbest
---	--


	Adı : Fevzi Soyadı : UZUNOĞLU Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Ağın İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Demirçarık - 1949 Öğrenim Durumu : Lise Mesleği : Emekli
--	---


	Adı : Süleyman Soyadı : USLU Parti : Demokrat Parti İlçe : Ağın İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Ağın - 1951 Öğrenim Durumu : Lise Mesleği : Emekli
---	--


	Adı : Nurettin Soyadı : ÇETİNTAŞ Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Alacakaya İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Palu - 1963 Öğrenim Durumu : Lise Mesleği : Serbest
---	--


İl Genel Meclisi

	Adı : Halim Soyadı : BEYAZELMA Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Alacakay İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Çataklı - 1967 Öğrenim Durumu : Ortaokul Mesleği : Serbest
---	--


	Adı : Mehmet Hanifi Soyadı : COŞKUN Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Arıcak İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Palu - 1956 Öğrenim Durumu : İlkokul Mesleği : Emekli
---	--


	Adı : Mehmet Soyadı : KILIÇ Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Arıcak İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Palu - 1948 Öğrenim Durumu : İlkokul Mesleği : Emekli
--	--


	Adı : Halil Soyadı : GÜRGÖZ Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Baskil İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Topalkem - 1959 Öğrenim Durumu : Yüksek Okul Mesleği : Emekli
---	--


	Adı : Celal Soyadı : SOYLU Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Baskil İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Baskil - 1958 Öğrenim Durumu : Ortaokul Mesleği : Çiftçi
---	--


İl Genel Meclisi

	Adı : Fazlı Soyadı : KIZILASLAN Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Baskil İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Baskil - 1960 Öğrenim Durumu : Ortaokul Mesleği : Çiftçi
---	---


	Adı : A. Hamit Soyadı : BAYDAŞ Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Karakoçan İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Bingöl - 1953 Öğrenim Durumu : Yüksek Okul Mesleği : Emekli
---	--


	Adı : Mehmet Soyadı : ARSLAN Parti : Saadet Partisi İlçe : Karakoçan İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : A.Lahan - 1951 Öğrenim Durumu : İlkokul Mesleği : Şirket Müdürü
--	--


	Adı : Mustafa Soyadı : AKDENİZ Parti : Demokratik Toplum Partisi İlçe : Karakoçan İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Karakoçan - 1958 Öğrenim Durumu : Yüksek Okul Mesleği : Serbest
---	---


	Adı : Yaşar Soyadı : ÇAKMAK Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Keban İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Keban - 1963 Öğrenim Durumu : Ortaokul Mesleği : İşçi
---	---


İl Genel Meclisi

	Adı : Reşit Soyadı : DEMİR Parti : Demokrat Parti İlçe : Keban İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Keban -1941 Öğrenim Durumu : İlkokul Mesleği : İşçi
---	--


	Adı : Yusuf Soyadı : TANGÜNER Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Kovancılar İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Palu - 1956 Öğrenim Durumu : Ortaokul Mesleği : Serbest
---	--


	Adı : M. Baki Soyadı : ÖLÇÜCÜ Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Kovancılar İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Elazığ - 1967 Öğrenim Durumu : Üniversite Mesleği : Veteriner Hekim
--	--


	Adı : M. Ali Soyadı : ÖZDEMİR Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Kovancılar İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Palu - 1938 Öğrenim Durumu : İlkokul Mesleği : Mütahhit
---	--


	Adı : Abbas Soyadı : ALTUNIŞIK Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Maden İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Maden - 1963 Öğrenim Durumu : Üniversite Mesleği : Ziraat Mühendisi
---	--


İl Genel
Meclisi

	Adı : M. Emin Soyadı : TURAN Parti : Demokrat Parti İlçe : Maden İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Maden - 1945 Öğrenim Durumu : İlkokul Mesleği : Emekli
---	---

	Adı : Ali Soyadı : KARABULUT Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Palu İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Palu - 1955 Öğrenim Durumu : Ortaokul Mesleği : Serbest
---	---

	Adı : Necati Soyadı : EKMEKYAPAR Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe : Palu İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Palu - 1943 Öğrenim Durumu : Lise Mesleği : Serbest
--	---

	Adı : Haşim Soyadı : KARACİMŞİT Parti : Demokrat Parti İlçe : Palu İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Palu - 1962 Öğrenim Durumu : İlkokul Mesleği : Çiftçi
---	--

	Adı : M. Nuri Soyadı : ÖZ Parti : Demokrat Parti İlçe : Sivrice İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi : 10. Dönem Doğum Yeri ve Yılı : Dicle - 1961 Öğrenim Durumu : İlkokul Mesleği : Serbest
---	---

İl Genel Meclisi




Adı	: Ahmet
Soyadı	: CANPOLAT
Parti	: Adalet ve Kalkınma Partisi
İlçe	: Sivrice
İl Genel Meclisi Üyeliği Dönemi	: 10. Dönem
Doğum Yeri ve Yılı	: Kürk -1938
Öğrenim Durumu	: Yüksek Okul
Mesleği	: Emekli



1930 Yılı Elazığ Hükümet Konağı


Personel Dağılımı	
Statü	Sayısı
Daimi İşçi	762
Memur	116
Sözleşmeli Personel	6
Toplam	884

PERSONEL DURUMU



Yüksek Okul, 17'si Meslek Lisesi, 17'si Lise, 17'si Ortaokul ve 6'su İlkokul mezunudur.

MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU




Memur Personeli Öğrenim Durumu

Statü	Sayısı
Yüksek Lisans	5
Fakülte	75
Yüksek Okul	40
Meslek Lisesi	8
Lise	18
Ortaokul	6
Toplam	152

İşçi Personeli Öğrenim Durumu

Statü	Sayısı
Fakülte	10
Yüksek Okul	23
Meslek Lisesi	17
Lise	173
Ortaokul	124
İlkokul	385
Toplam	732

İŞÇİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU



İnsan Kaynakları

Memur Personelin Yaş Dağılımı	
Yaş Grubu	Sayısı
25 – 30 Yaş Grubu	11
31 – 35 Yaş Grubu	22
36 – 40 Yaş Grubu	30
41 – 45 Yaş Grubu	37
46 – 50 Yaş Grubu	35
51 – 55 Yaş Grubu	12
56 – 60 Yaş Grubu	5
Toplam	152



İşçi Personelin Yaş Dağılımı	
Yaş Grubu	Sayısı
31 – 35 Yaş Grubu	13
36 – 40 Yaş Grubu	56
41 – 45 Yaş Grubu	204
46 – 50 Yaş Grubu	252
51 – 55 Yaş Grubu	149
56 – 60 Yaş Grubu	48
61 ve Yukarı	10
Toplam	732

Teknokent (Teknopark) Nedir ?

1950'li yıllarda ABD'de kurulan Silikon Vadisi ile ortaya çıkan teknoparklar, dünyada üniversite sanayi işbirliğini sağlama konusundaki en başarılı model olarak öne çıkmıştır. Günümüzde, birçok sanayileşmiş ülke, teknoparkları teknolojik ve ekonomik gelişmenin en önemli aracı olarak görmektedir. ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Çin, Kore, Hindistan, İsrail, Finlandiya gibi birçok ülkede üretim ve hizmet sektörleri ürettikleri katma değer önemli bölümü teknoparklar bünyesinde yürütülen AR-GE çalışmalarına borçludur.

Neden Elazığ Fırat Teknokent

Teknokent bünyesinde yer almak üzere müracaat eden girişimciler genellikle sağlanan desteklerle ilgileniyor. Oysa girişimcilerin Teknokent'e vergi muafiyeti vb. destekler için değil, Teknokent'te bulunmanın avantajlarını yaşamak için gelmelerini öneriyoruz. Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşlar doğal olarak teknoparklar için tanınan muafiyetlerden yararlanacak. Ancak, Teknokent'te yer alan kuruluşlar çok daha farklı avantajlara sahip oluyorlar. Teknoparklar, teknolojik açıdan dünyaya açılan pencerelerdir. Teknoparklar birer teknoloji üssüdür. Teknopark içinde yer alan kuruluşlar, teknoparktaki diğer kuruluşların yaptıklarını görerek teknolojik gelişmeler konusunda yeni eğilimler ve gelişmeleri çok yakından izleyebilecek, benzer konuda çalışan diğer kuruluşlarla işbirliği ve güç birliği yaparak yeni girişimler başlatabilecek, önemli iş potansiyeline sahip olacaklardır. Teknopark içinde yer alan kuruluşlar üniversitedeki laboratuvar, kütüphane, sosyal tesisler vb. imkanlardan kolaylıkla yararlanabilecek, üniversite öğretim üyelerini ve öğrencilerin araştırmacı olarak çalıştırabileceklerdir. Teknoparkların en önemli etkisi cross-fertilization denilen çapraz toplama. Yani, teknopark içinde yer alan kuruluşlar diğer kuruluşların çalışmalarından ilham alarak çok yeni ve orijinal projeler üretecekler, bu durum rekabet güçlerini artıracak, proje sürelerini kısaltacak. Bunlar çok önemli imkânlardır.

Teknokent

Ortaklar

Ortağın Ünvanı	:Fırat Üniversitesi
Sahip Olduğu Hisse	:60.000 Adet
Toplam Hisse	:60.000 Adet
Sahip Olunan Hisseye Karşı Gelen Sermaye	:600.000 YTL



Ortağın Ünvanı	:Ticaret ve Sanayi Odası
Sahip Olduğu Hisse	:20.000 Adet
Toplam Hisse	:20.000 Adet
Sahip Olunan Hisseye Karşı Gelen Sermaye	:200.000 YTL



Ortağın Ünvanı	:Elazığ Belediyesi
Sahip Olduğu Hisse	:10.000 Adet
Toplam Hisse	:10.000 Adet
Sahip Olunan Hisseye Karşı Gelen Sermaye	:100.000 YTL



Ortağın Ünvanı	:Ticaret Borsası
Sahip Olduğu Hisse	:5.000 Adet
Toplam Hisse	:5.000 Adet
Sahip Olunan Hisseye Karşı Gelen Sermaye	:50.000 YTL



Ortağın Ünvanı	:İl Özel İdaresi
Sahip Olduğu Hisse	:5.000 Adet
Toplam Hisse	:5.000 Adet
Sahip Olunan Hisseye Karşı Gelen Sermaye	:50.000 YTL



Sağlanan Avantajlar

Teknokentler üretim ve hizmet sektörüne yeni ürünler, geliştirilmiş ürünler, yeni teknolojiler ve geliştirilmiş teknolojiler üreterek rekabet gücünü artırmaları, kalite ve verimliliği artırmaları konularında önemli destekler sağlamaktadır.

Teknokentler ile üretim ve hizmet sektörü kuruluşları ARGE yapmaya, kendi teknolojilerini üretmeye teşvik edilmektedir. Ülkemizde tekstil sektörü çok gelişmiş olmasına rağmen tekstil teknolojisinin temeli olan tekstil makine sanayinin yetersizliği nedeniyle tekstil sektörü piyasalardaki gelişmelerden çok çabuk etkilenen bir sektör olagelmıştır.

Üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmalar uluslararası endekslere giren itibarlı dergilerde yer almakta, kütüphane raflarını doldurmakta ancak sanayi ve hizmet sektörüne çok az bir miktarda katma değer girişi sağlamaktadır. Bu durum önemli bir kaynak israfına neden olmaktadır. Teknokentler, üniversite ve sanayinin ARGE çalışması yapması konusunda sağladığı desteklerle üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların teknolojiye dönüştürülmesi, bu çalışmaların üretim ve sanayi sektörleri tarafından ürün ve teknolojiye dönüştürülerek ticarileştirilmesi, milli ekonomiye önemli katma değer sağlaması konusunda hayati önem taşımaktadır.

Birçok gelişmiş ülke katma değeri düşük olan tekstil, makine imalat, otomotiv yedek parça, döküm vb. sanayileri geliştirmekte olan ülkelere bırakarak katma değeri yüksek olan ürünleri üretmeyi tercih etmişlerdir. Bu nedenle, Teknokentler, ülkemizde katma değeri yüksek olan ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi açısından önemli bir yönlendirme ve destek aracı olarak görev yapacaktır.

Teknokent

Yönetim Kurulu Üyeleri

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Adresi</u>	<u>Temsil Ettiği Ortak</u>
Doç.Dr. Erhan AKIN	F.Ü.Rektörlüğü	Fırat Üniversitesi
Prof.Dr.Necip İLHAN	F.Ü. Rektörlüğü	Fırat Üniversitesi
Prof.Dr.Kazım ŞAHİN	F.Ü.Rektörlüğü	Fırat Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Hayrettin CAN	F.Ü.Rektörlüğü	Fırat Üniversitesi
Suat ÖZTÜRK	Tic.San.Od.	Ticaret Sanayi Odası
Gazi SAKIN	Elazığ Belediyesi	Elazığ Belediyesi
Mahir CİHANGİROĞLU	Tic.San.Od.	Elazığ Ticaret Sanayi Odası
Mehmet İNCİDELEN	Ticaret Borsası	Elazığ Ticaret Borsası
Cemil YATKIN	Elz.İl Özel İd.	Elazığ İl Özel İdaresi

20 Mayıs 2007 tarih ve 26527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulması öngörülen Fırat Teknokent İl'imizde yukarıda sayılan Kurum Kuruluşu Oda ve Üniversite işbirliği ile kurulmuştur.

İl Genel Meclisinin 07 Şubat 2007 tarih ve 26 sayılı kararı ile 1.000.000,00 YTL ile kurulmuş ve 50.000,00 YTL ile işletmenin % 5 pay ile ortak olmuştur.

İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) küçük girişimcilerin iş kurmasını ve geliştirmesini destekleyen ve kolaylaştıran, dolayısıyla da işletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarını arttıran bir projedir.

“İşletme Kuluçkaları” veya “KOBİ Fidanlığı” olarak adlandırabileceğimiz İŞGEM'ler, bünyelerinde barındırdıkları yeni işletmelere, yönetim danışmanlığı desteği, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunarak adeta onları beslemekte ve en zayıf oldukları iş kurma aşamasını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamaktadır

Elazığ İş Geliştirme Merkezi (Elazığ İŞGEM)'nin kuruluş amacı; ilde, gerek mesleki bir beceriye sahip olmadığı için iş bulamayan kişilere piyasanın talep ettiği becerileri kazandırarak onların nitelikli birer işçi haline getirmek gerekse işletmelerde istihdam edilmekte olan personelin iş verimini yükselterek onların yeni teknolojilere uyumunu ve mesleklerinde gelişmelerini sağlamaktır.

Bu itibarla İl Genel Meclisinin 09.12.2006 tarih ve 163 sayılı kararı ile Elazığ İŞGEM'e ortak olunmasına karar verilmiştir. Şirketin Sermayesi 100.000.00 YTL olarak belirlenmiş.

İl Özel İdaresi 10.000.00 YTL ile işletmenin % 10 hissesine sahip olmuştur. Ön görülen taahhüdün 5.000.00 YTL sini 08.12.2006 tarihinde yerine getirmiştir.

2007 yılında 5799 m2 alanda 22 ana faaliyet kolunda 22 işletme toplam 240 kişi istihdam ile faaliyette bulunmuştur. Faaliyete bulunan 22 işletme 2007 yılı sonu cirosu toplam 540.000,00 YTL dir.

Stratejik Plan ve Performans Programı

Ülkemizde uygulanan yeni stratejiler doğrultusunda hazırlanan kalkınma ve gelişme planları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10 ve 31. maddeleri gereğince İl Özel İdaresi ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluk alanına giren işleri kapsayacak şekilde bir "Stratejik Plan 2007 - 2011" hazırlanmıştır. Stratejik Plan İl Genel Meclisi'nin 09/06/2006 gün ve 90 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

İl Özel İdaresi Yasasının 31. maddesi gereği 2008 yılı performans planımız da Kasım 2007 Ayı toplantısında İl Genel Meclisine sunulmuş, 27/11/2007 gün ve 228 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul edilmiştir.

Planlı ve somut programlara dayalı hizmet üretebilmek, kurum kaynaklarının rasyonel kullanılmasını sağlayacak şekilde yatırım programlarının hazırlanmasına ve bütçe çalışmalarına rehberlik etmek amaçları ile 2008 yılı performans programı hazırlanmıştır.

Hedeflenen sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlendirilmesine temel oluşturulması yer almaktadır.

Stratejik planlama sürecinin etkinliğinin artırılması, kurum geleceği ile ilgili yön gösterici ve hedef belirleyici nitelikte olması, idarecilerin ve her düzeyde görev yapan personelin özverili çalışmalarıyla oluşturdukları katkıları, ortak çabası ve desteği ile sağlanacaktır.

Stratejik planlama ile Elazığ İl Özel İdaresi ve bağlı Müdürlüklerin durum analizlerinin yapılmasının ardından; öncelikli ihtiyaç ve projeler belirlenmiş, uzun dönemli planlamalar yapılacak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak yol haritaları çıkartılmıştır. Plan kapsamında çalışanların, ilgili kurum ve kuruluşların stratejik planlama önerileri de paydaş toplantıları ile değerlendirilmiştir. SWOT (Güçlü, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi çalışması yapılmış, kurumumuzun çalışma ilkeleri, vizyonu ve misyonu belirlenmiştir.

Çalışmalardan elde edilen kazançlarımız, İl Özel İdaresi ve İl Müdürlükleri arasında iletişimin gelişmesi, toplantı sistemli ile çalışma alışkanlığının kazanılması, takım çalışmasının faydalarının görülmesi, veri toplamanın plan yapmak için önemini görülmesi, proje üyelerinin veri analizi yeteneğinin gelişmesi, bütçeleme ve önceliklendirme anlayışını oluşturulması, strateji odaklı düşünme ve hedeflerle yönetim alışkanlığının kazanılmaya başlanması, Elazığ'ın yönetime makro bir bakış açısı getirilmesi olarak sıralanabilir.

Strajedik Konular

NO	STRATEJİK KONULAR
1	Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması ve Geliştirilmesi a) Kurumsal ve idari gelişme b) Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi c) Mahalli Bilgi Bankasının oluşturulması
2	Kırsal Kalkınma a) Fiziki altyapı b) Tarımsal envanter c) Tarımsal üretimin yeniden yapılandırılması d) Sulama suyu
3	Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması a) Fiziki altyapı b) Halk eğitimi ve halkın bilinçlendirilmesi
4	Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi a) Kültür ve turizm alanlarının geliştirilmesi b) Turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
5	Çevresel ve Mekânsal Gelişme a) Fiziki planlama b) Hava, su kirliliği ve katı atık c) Tabii afetler
6	Sosyal Refahın Artırılması a) Mikro yatırımlar b) Sosyal hizmetler ve yardımlar c) Hayırseverler


Temel Politika ve Öncelikler

NO	TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
1	Köylünün (kırsal kesimin) refah düzeyini artırıcı tedbirler alınmalıdır.
2	Sağlık ve eğitim hizmetlerinde kalite artırılmalıdır.
3	Eğitim, sağlık, spor ve sosyal altyapı çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
4	Yeni yapılanma çerçevesinde birimleri oluşturma hazırlığı yapılmalı, ilk etapta ilin coğrafi bilgi sistemini oluşturabilecek bilgi işlem ve strateji geliştirme birimleri kurulmalı. Ekonomist, istatistikçi, şehir plancısı ve sosyolog gibi uzman personelin kurumlardan naklen alınması veya sözleşmeli olarak istihdamı sağlanmalıdır.
5	Yeni kanun ile belirlenen görevleri çerçevesinde personel en kısa zamanda hizmet içi eğitime alınmalıdır.
6	İl Özel İdaresi personeline performansa dayalı, rekabeti sağlayan ücret sistemi getirilmelidir.
7	İnsan kaynakları yönetiminde liyakate dayalı bir kariyer sistemi uygulanmalıdır.
8	Kaynak tasarrufu sağlamak için tarım arazi ve ürün envanteri çıkartılarak yöreye uygun yeni ürünlerin yetiştirilmesi sağlanmalıdır.
9	Organik tarıma yer verilmelidir.
10	Sulama için göletler yapılmalı, sulama projelerinin tamamlanabilmesi için gerekli kaynak sağlanmalıdır.
11	Bağcılık geliştirilmeli, üzüm işleme tesislerinin kurulması için destek verilmelidir.
12	Mera ıslah ve arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmalıdır.
13	Yetiştirilebilecek alanlarda çam veya meşe yerine ceviz, badem, fıstık v.b. ormanları oluşturulmalıdır.
14	Arıcılık desteklenmelidir.
15	Yarımada şeklinde coğrafi konuma sahip olan ilimizde su ürünleri üretimi teşvik edilmelidir.
16	Hayvancılık ve yem bitkileri üretimi destekleme çalışmaları artırılarak devam etmelidir.
17	Tarımda kullanılan ve çevreye olumsuz etkileri bulunan ilaç ve gübre tüketimi kontrol altına alınmalıdır. Bunun için zirai ilaç satışı reçeteye bağlanmalı, kimyevi gübrenin satışı da toprak analizine göre yapılmalıdır.
18	Yatırım öncesi ilgili kuruluşun teknik elemanları ile birlikte fizibilite çalışması yapılmalıdır.
19	Kontrol mekanizmasının daha sağlıklı çalışması için teknik personel sayısı, araç ve donanım artırılmalıdır.
20	Her yatırım etaplanmalı, projeler yöreye, iklime göre hazırlanmalı
21	Bütçe imkânlarında önceliği olan yatırımlar yapılmalıdır.
22	Hayırasever vatandaşların yapacağı yardımlar yol, su kanalizasyon, tarımsal alanlar ile turizm alanındaki restorasyon ve onarımlara kaydırılmalıdır.

NO	TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
23	Köy yerleşik alanının dışına çıkılması önlenmeli, kaçak yapılaşmaya göz yumulmamalı, İl Özel idaresinin hizmetleri yerleşik merkezlere yapılmalıdır.
24	Özel idarenin iş ve işlemleri ile ilgili programlara uyulmalıdır.
25	Özel idarenin programına aldığı yatırımlardan önemli ve öncelikli olanları hayata geçirebilmesi için karar organı olan İl Genel Meclisi bilgilendirilmelidir.
26	İl Özel idaresinin gelirleri artırılmalıdır. Taş Ocakları Nizamnamesi ve Maden Kanunu il özel idaresinin gelirlerini artıracak şekilde günümüz şartlarına uyarlanmalıdır.
27	İl özel idaresi yapacağı her yatırımda, gerçekleştireceği faaliyet alanındaki sivil toplum kuruluşlarının görüş ve desteğini almalıdır.
28	Elazığ ilinin Çevre Düzeni Planı yapılmalıdır.
29	Mahalli istatistikî verileri toplayan, mahalli bilgi bankası kurulmalıdır. Tüm birimler ağ ile birbirine bağlantılı hale getirilmelidir.
30	Harput'ta başlatılmış projeler tamamlanmalı ve hayata geçirilmelidir.
31	Harput Kalesinde başlatılan kazı çalışmaları tamamlanmalı, diğer tarihi kalıntılarda da kazı çalışmaları yapılarak tarih günışığına çıkarılmalıdır.
32	Hazar gölünde bulunan batık şehir araştırılarak, turizmin istifadesine sunulmalı ve tanıtımı yapılmalıdır.
33	Hazar gölü ve Keban barajında su sporları geliştirilmeli ve uluslar arası organizasyonlar yapılmalıdır.
34	Kütüphaneler çağdaş teknolojiye kavuşturularak, kitap arşivi genişletilmeli ve güncelleştirilmelidir.
35	Havaalanı inşaatı kısa sürede tamamlanmalıdır.
36	Doğalgaz projesi tamamlanarak kısa sürede kullanıma sunulmalıdır.
37	Tehdit boyutlarındaki hava ve su kirliliği çözümlenmelidir.
38	İl genel meclisi üyelerine stratejik planın önemi ve bağlayıcılığı, hizmetlerin bu plandaki yol haritasına göre yürütüleceği toplantılarla anlatılmalıdır.
39	Kaymakamların görüş ve önerileriyle kendi hizmet alanlarında yürütülen diğer kamu ve özel sektör yatırımları da dikkate alınmalıdır.
40	İlçe, belde ve köylere semt sahaları yapılmalıdır.
41	Diğer mahalli idarelerle işbirliğine gidilmelidir.
42	Kurumun hizmetleri kamuoyuna medyadan da faydalanarak daha etkin tanıtılmalıdır.
43	İl özel idaresinin bünyesinde bulunan kurumlarla koordinasyonu sağlanmalı, kurumların ihtiyaç ve sorunları doğru tespit edilmelidir.
44	Üniversite, sendika, sanayi ve ticaret odası, meslek odaları ve ELESKAV gibi kuruluşlarla işbirliği ve koordine içinde çalışılması, görüşleri dikkate alınmalıdır.
45	Mevzuatın basitleştirilebilmesi ve yenilenmesi için çalışma alanına giren tüm işlerde, merkezi idareye hazır teklifler götürülmelidir.
46	İlimizin ikinci derece deprem bölgesi olması nedeniyle İl Afet Yönetim Birimi oluşturulmalı, deprem öncesi uyarı sistemi ve erken müdahale imkânları sağlanmalıdır.

2007 Yılı Gelir Bütçesi

AÇIKLAMA	BÜTÇE TAHMİNİ	2007 YILI TAHSİLATI
Vergi Gelirleri	5.001,00	921,18
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.083.009,00	1.101.352,49
Alınan Yardım ve Bağışlar	1,00	58.013.285,03
Diğer Gelirler	12.380.012,00	12.338.799,48
Sermaye Gelirleri	8.531.977,00	2.563.942,00
TOPLAM	22.000.000,00	74.018.300,18

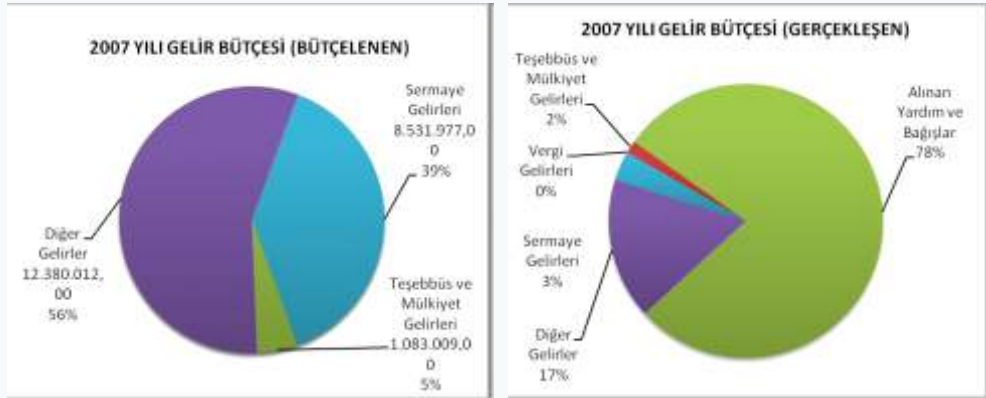

İdaremiz 2007 yılında;

Vergi Gelirlerinden 5.001,00 YTL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 1.083.009,00 YTL Alınan Yardım ve Bağışlardan 1,00 YTL Diğer Gelirlerden 12.380.012,00 YTL Sermaye Gelirlerinden 8.531.977,00 YTL olmak üzere toplam 22.000.000,00 YTL gelir toplamayı hedeflemiştir.

Yıl sonu itibarıyla vergi gelirlerinden 921,18 YTL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 1.101.352,49 YTL Alınan Yardım ve Bağışlardan 58.013.285,03 YTL Diğer Gelirlerden 12.338.799,48 YTL ve Sermaye Gelirlerinden 2.563.942,00 YTL olmak üzere toplam 74.018.300,18 YTL toplam gelir elde etmiştir.

İdaremizin toplam öz geliri 16.005.015,15 YTL dir.

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 Yılı
Gider
Bütçesi

BİRİMİ	Geçen Yılın Devresinden	Bütçe İle Verilen	Ek Ve Oluşan Üstü	Aktarmaya Eklenen	Aktarmaya Dışlanan	Bütçe Ödeneği Toplamı.	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonrakı Yıla Devresinden
GENEL SEKRETERLİK TOPLAMI	13.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	1.399.173,50	218.826,50	0,00	205.826,50	13.000,00
SİVİL SAĞ TOPLAMI	0,00	9,00	0,00	43.950,00	0,00	43.959,00	42.472,53	1.486,47	0,00
EMNİYET MÜD. TOPLAMI	176.625,90	0,00	291.140,00	363.490,74	19.990,74	811.265,90	186.286,78	0,00	624.979,12
TARIM MÜD.TOPLAMI	45.880,40	350.016,00	0,00	68.375,00	68.375,00	395.896,40	202.779,84	193.116,56	0,00
BAYINDIRLIK TOPLAMI	28.340,35	4,00	0,00	0,00	0,00	28.344,35	21.129,40	4,00	7.210,95
SAĞLIK TOPLAMI	1.854.720,06	225.004,00	919.030,22	914.001,38	904.001,38	3.008.754,28	2.027.648,27	21.112,42	959.993,59
GENÇLİK SPOR TOPLAMI	0,00	110.004,00	0,00	50.000,00	0,00	160.004,00	156.577,00	3.427,00	0,00
KÜLTÜR TURİZM TOPLAMI	2.283.542,86	11,00	548.000,00	5.004,20	2.504,20	2.834.053,86	16.043,28	252,72	2.817.757,86
MİLLİ EĞİTİM TOPLAMI	6.959.352,25	4.200.000,00	9.707.076,51	5.064.689,89	5.064.189,89	20.802.928,76	11.679.518,83	0,00	9.123.409,93
HALKEĞİTİM TOPLAMI	0,00	9,00	0,00	10.000,00	0,00	10.009,00	9.270,24	738,76	0,00
SOSYAL HİZ.TOPLAMI	22.175,42	9,00	31.539,04	9.000,00	0,00	62.723,46	56.166,89	926,00	5.630,57
ÖZEL KALEM TOPLAMI	0,00	280.000,00	0,00	102.500,00	0,00	382.500,00	280.761,46	101.738,54	0,00
MALİ HİZMETLER TOPLAMI	213.743,52	5.425.000,00	139.474,65	422.000,00	2.097.500,00	4.102.718,17	3.904.222,00	76.021,52	122.474,65
İNSAN KAYNAKLARI TOPLAMI	1.451.786,13	3.817.507,00	33.120.553,16	77.500,00	60.375,81	38.406.970,48	34.991.153,16	2.431.251,54	984.565,78
YAZI İŞLERİ TOPLAMI	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	460.778,14	64.221,86	0,00
HUKUK MÜŞ.TOPLAMI	0,00	200.000,00	133.600,00	0,00	0,00	333.600,00	158.274,81	157.550,58	17.774,61
DESTEK HİZ.TOPLAMI	64.622,66	2.002.927,00	2.931.300,90	1.351.000,00	46.000,00	6.303.850,56	5.922.898,13	323.984,96	56.967,47
İMAR İSKAN TOPLAMI	50.345,52	15.000,00	1.050.000,00	427.000,00	0,00	1.542.345,52	1.035.398,21	62.192,80	444.754,51
YOL VE ULAŞIM TOPLAMI	75.552,83	1.410.000,00	5.588.582,87	195.000,00	345.000,00	6.924.135,70	6.901.131,06	21.815,27	1.189,37
SU VE KANAL HİZ. TOPLAMI	1.216,23	725.000,00	270.000,00	797.723,50	100.000,00	1.693.939,73	1.544.022,32	132.145,54	17.771,87
AĞIN TOPLAMI	24.682,13	115.700,00	126.995,50	9.000,00	0,00	276.377,63	191.683,01	47.475,78	37.218,84
ALACAKAYA TOPLAMI	35.339,90	94.200,00	177.548,58	14.000,00	0,00	321.088,48	243.756,97	52.705,85	26.625,66
ARICAK TOPLAMI	24.925,55	114.700,00	289.661,42	14.500,00	0,00	443.786,97	376.715,33	49.633,05	17.438,59
BASKIL TOPLAMI	27.578,03	136.200,00	406.656,48	18.000,00	0,00	588.434,51	491.174,01	66.952,71	30.307,79
KARAKOÇAN TOPLAMI	11.056,49	119.200,00	594.120,30	60.000,00	0,00	784.376,79	697.142,98	53.930,86	33.302,95
KEBAN TOPLAMI	22.142,72	114.200,00	152.776,40	13.500,00	0,00	302.619,12	252.109,14	33.679,99	16.829,99
KOVANCIKLAR TOPLAMI	25.585,21	93.700,00	879.042,71	45.000,00	0,00	1.043.327,92	992.150,31	32.129,12	19.048,39
MADEN TOPLAMI	23.757,28	93.700,00	378.139,35	51.500,00	0,00	547.096,63	465.285,79	41.091,80	40.719,04
PALU TOPLAMI	15.054,46	116.200,00	244.627,67	23.875,81	0,00	399.757,94	343.792,86	44.102,82	11.862,26
SIVRICE TOPLAMI	21.020,96	111.700,00	239.629,70	20.500,00	0,00	392.850,66	321.366,99	45.007,35	26.476,32
GENEL TOPLAM	13.472.046,86	22.000.000,00	58.219.495,46	10.107.110,52	10.107.110,52	93.691.542,32	73.971.709,74	4.264.522,37	15.455.310,11

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 Yılı
Gelir
Bütçesi

İli	İlçe	Yatırım	Kurumsal	Elaazığ Merkez İlçe	İl Özel İdaresi Genel Sakatlığı	Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıdan Devreden	Bütçe İle Verilen	Ek Ve Olmayan Üstir	Aktarımla Etilenen	Aktarımla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sınırli Yıla Devreden
44.23.01.00.00	01.1.1.00.000	5	03.6		TEMSİL VE İNANITMA GİDERLERİ	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00	0	0
44.23.01.00.00	01.1.2.00.000	5	09.1		PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	150.000,00	0	0	0	0	0	23.500,00	126.500,00	0	126.500,00	0	0
44.23.01.00.00	01.1.2.00.000	5	09.3		YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	01.1.2.00.000	5	09.4		ÖNGÖRÜLEMİYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	0	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	01.1.2.00.000	5	09.5		DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	01.1.2.00.000	8	09.5		DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000,00	0	0	13.000,00
44.23.01.00.00	01.1.2.00.000	5	09.6		YEDEK ÖDENEK	0	900.000,00	0	0	0	0	0	825.673,50	74.326,50	0	74.326,50	0	0
GENEL SEKRETERLİK TOPLAMI										13.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	1.399.173,50	218.826,50	0,00	205.826,50	13.000,00

İli	İlçe	Yatırım	Kurumsal	Elaazığ Merkez İlçe	İl Sivil Savunma Müdürlüğü	Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıdan Devreden	Bütçe İle Verilen	Ek Ve Olmayan Üstir	Aktarımla Etilenen	Aktarımla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sınırli Yıla Devreden
44.23.01.00.00	02.2.0.00.000	5	03.2		TUKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	2	0	15.000,00	0	0	0	0	15.002,00	15.000,27	1,73	0	
44.23.01.00.00	02.2.0.00.000	5	03.4		GÖREY GİDERLERİ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
44.23.01.00.00	02.2.0.00.000	5	03.5		HİZMET ALIMLARI	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2,00	0	
44.23.01.00.00	02.2.0.00.000	5	03.7		MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	2	0	25.000,00	0	0	0	0	26.002,00	25.997,26	4,74	0	
44.23.01.00.00	02.2.0.00.000	5	03.8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,00	0	
44.23.01.00.00	02.2.0.00.000	5	06.1		İMMANUL MAL ALIMLARI	0	1	0	2.950,00	0	0	0	2.950,00	2.951,00	1.475,00	1.476,00	0	
SİVİL SAVUNMA TOPLAMI										0,00	9,00	0,00	43.950,00	0,00	43.959,00	42.472,53	1.486,47	0,00

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 Yılı
Gelir
Bütçesi

İli Elazığ
İlçesi Merkez
Yürümlü İl Emniyet Müdürlüğü

Kurumsal	Fonk.	FİN. Eko.	Açıklama	Gegen Yıllan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek ve Olçğm Üstü	Aktarımla Etkelen	Aktarımla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonaki Yıla Devreden
44.23.01.00.00	03.1.1.00.000	5	03.2 TÜKETİME YÖNELİK İMAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0	0	3.000,00
44.23.01.00.00	03.1.1.00.000	5	03.8 GAYRİMENKUL İMAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00	0	0	10.000,00
44.23.01.00.00	03.1.1.00.000	8	03.8 GAYRİMENKUL İMAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.594,77	0	0	19.990,74	0	27.585,51	5.015,00	0	22.570,51
44.23.01.00.00	03.1.1.01.000	8	03.8 Emniyet Müd. Hizmet Binaları Onarımı	0	0	56.133,00	0	0	56.133,00	47.791,18	0	8.361,82
44.23.01.00.00	03.1.1.02.000	8	03.8 Zilli Ağar Polis Meslek Yüksek Okulu Onarımı	57.644,83	0	0	0	0	57.644,83	0	0	57.644,83
44.23.01.00.00	03.1.1.05.000	8	03.8 Svrice Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı	24.892,00	0	0	0	0	24.892,00	11.564,00	0	13.328,00
44.23.01.00.00	03.1.1.06.000	8	03.8 Keban yolu 238 Daireli Polis İstasyonları Onarımı	5.214,30	0	34.987,00	0	17.060,74	23.140,56	23.140,56	0	0
44.23.01.00.00	03.1.1.13.000	8	03.8 Emniyet Müd. Muhabere Elektronik Şub. Müd. Polis Raçyası Hiz. Binası On.	2.930,00	0	0	0	2.930,00	0	0	0	0
44.23.01.00.00	03.1.1.14.000	8	03.8 Sosyal Hizmetler Trafik Tesci ve Koruma Şb. Müd. Hiz. Binası Kalorifer Tesisatı ve Mühüratı Onr.	40.000,00	0	0	0	0	40.000,00	35.528,04	0	4.471,96
44.23.01.00.00	03.1.1.15.000	8	03.8 İl Emniyet Müd. Hizmet Binası Nezarethane ve İfade Alma Odaları Onarımı	38.350,00	0	0	0	0	38.350,00	33.748,00	0	4.602,00
44.23.01.00.00	03.1.1.16.000	5	03.2 Kent İzleme Sistemi (Mobese)	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00	0	0	300.000,00
44.23.01.00.00	03.1.1.16.000	8	03.2 Kent İzleme Sistemi (Mobese)	0	0	200.000,00	0	0	200.000,00	0	0	200.000,00
44.23.01.00.00	03.1.1.17.000	5	03.2 Jemmer Çihaz Alımı	0	0	0	30.500,00	0	30.500,00	29.500,00	0	1.000,00
EMNİYET MÜD. TOPRAMI				176.625,90	0,00	291.140,00	363.490,74	19.990,74	8.112.659,90	186.286,78	0,00	604.979,12

2007 Yılı
Gelir
Bütçesi

İli
İlçesi
Yatırımcı

Elazığ
Merkez
Tarım İl Müdürlüğü

Kurumsal	Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıllan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek Ye Olan Üstü	Aktarıyla Eklenen	Aktarıyla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonrakı Yıla Devreden
44.23.01.00.00	04.2.1.00.000	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	350.009,00	0	0	65.595,00	284.414,00	109.427,77	174.986,23	0
44.23.01.00.00	04.2.1.00.000	5	03.4	GÖREY GİDERLERİ	0	0	0	2.600,00	0	2.600,00	0	2.600,00	0
44.23.01.00.00	04.2.1.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0	2	0	1.095,00	0	1.097,00	1.090,32	6,68	0
44.23.01.00.00	04.2.1.00.000	5	03.6	TEKİL VE TANITMA GİDERLERİ	0	1	0	0	0	1	0	1,00	0
44.23.01.00.00	04.2.1.00.000	5	03.7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	1	0	11.400,00	0	11.401,00	10.271,81	1.129,19	0
44.23.01.00.00	04.2.1.00.000	5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	1	0	50.500,00	0	50.501,00	37.444,94	13.056,06	0
44.23.01.00.00	04.2.1.00.000	5	06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	0	2	0	0	0	2	0	2,00	0
44.23.01.00.00	04.2.1.08.000	5	03.7	1 Aderi Sağlıkcu Süt Tankı Alımı	14.780,40	0	0	2.780,00	0	17.560,40	16.225,00	1.335,40	0
44.23.01.00.00	04.2.1.09.000	5	03.7	2 Aderi Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Çihazı Alımı	31.100,00	0	0	0	2.780,00	28.320,00	28.320,00	0	0
				TARIM İMUD TOPLAMI	45.880,40	350.016,00	0,00	68.375,00	68.375,00	395.896,40	202.779,84	183.116,56	0,00

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 Yılı
Gelir
Bütçesi

İli
İlgesi
Yatırma
Kurumsal
Fin. Eko.
Elazığ
Merkez
Sağlık İl Müdürlüğü

Kurumsal	Fin.	Eko.	Açıklama	Gegen Yıdan Devreden	Bütçe İle Verilen	Ek Ve Olmayan Üstü	Aktarılmaya Etilenen	Aktarılmaya Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
44.23.01.00.00	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	1	0	0	0	1	0	1,00	0
44.23.01.00.00	8	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.008,43	0	0	0	0	1.008,43	0		1.008,43
44.23.01.00.00	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0	5.001,00	0	2.658,96	0	7.659,96	5.621,52	2.038,44	0
44.23.01.00.00	5	03.7	MERKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	10.001,00	0	600	0	10.601,00	8.138,96	2.462,04	0
44.23.01.00.00	5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	50.001,00	0	15.000,00	0	65.001,00	57.790,06	7.210,94	0
44.23.01.00.00	8	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	13.066,07	0	47.500,00	0	0	60.566,07	26.636,00		33.930,07
44.23.01.00.00	5	06.1	MAVUL MAL ALIMLARI	0	0	0	9.400,00	0	9.400,00	0	9.400,00	0
44.23.01.00.00	8	06.1	MAVUL MAL ALIMLARI	0	0	90.754,40	89.501,00	0	180.255,40	179.394,99		860,41
44.23.01.00.00	5	06.5	Sivrice Sağlık Ocakı Yapımı	300.000,00	0	0	54.926,14	0	354.926,14	348.982,76		5.943,38
44.23.01.00.00	8	06.5	Elazığ Devlet Hastanesi Depreme Karşı Güçlendirme	89.501,00	0	0	0	89.501,00	0	0		0
44.23.01.00.00	5	06.5	Merkez Yaşakonak Sağlık Ocakı 112 Acil Yrd.İstasyonu Yapımı	66.926,14	0	0	0	66.926,14	0	0		0
44.23.01.00.00	5	06.5	Merkez Yurtbışı Sağlık Ocakı Yapımı	115.226,49	0	0	30.000,00	0	145.226,49	143.717,60		1.508,89
44.23.01.00.00	5	06.5	Merkezİzelpaşa Mah.Sağlık Kompleksi Yapımı	300.000,00	0	0	0	300.000,00	0	0		0
44.23.01.00.00	8	06.5	Merkez Çip Köyü Sağlık Ocakı Yapımı	145.077,97	0	0	0	145.077,97	0	0		0
44.23.01.00.00	8	03.8	Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Onerimi	15.576,65	0	0	0	0	15.576,65	0		15.576,65
44.23.01.00.00	8	06.5	Mer.Hilalient Sağlık Ocakı Yapımı	174.988,00	0	0	0	174.988,00	0	0		0
44.23.01.00.00	8	06.5	Arcak Merkez Sağlık Ocakı Yapımı	421.730,00	0	473.340,00	87.945,49	0	983.035,49	944.806,81		38.228,68
44.23.01.00.00	8	06.7	Pulu Devlet Hastanesi Acil Servis Onerimi	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00	0		100.000,00

2007 Yılı
Gelir
Bütçesi

İli	İlçesi	Yatırması	Elazığ Merkez Sağlık İl Müdürlüğü		Muharrem Gökayoglu Sağlık Ocağı Onarımı	0	0	0	31.694,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
			07.2.1.25.000	06.7																	
44.23.01.00.00			07.2.1.25.000	8	06.7	Muharrem Gökayoglu Sağlık Ocağı Onarımı	0	0	31.694,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44.23.01.00.00			07.2.1.26.000	8	03.8	Baskıl Kuşarayı Sağlık Ocağı Onarımı	0	0	11.020,00	0	0	1.770,00	0	0	0	0	0	0	0		
44.23.01.00.00			07.2.1.27.000	8	03.8	Karakoçan Sencan Sağlık Ocağı Onarımı	0	0	608,47	0	0	608,47	0	0	0	0	0	0	0		
44.23.01.00.00			07.2.1.28.000	8	03.8	Palu Merkez Sağlık Ocağı Onarımı	0	0	3.275,35	0	0	3.275,35	0	0	0	0	0	0	0		
44.23.01.00.00			07.2.1.29.000	8	06.7	Karakoçan Begyurt Sağlık Ocağı Onarımı	0	0	8.907,49	0	0	8.907,49	0	0	0	0	0	0	0		
44.23.01.00.00			07.2.1.30.000	8	06.7	Karakoçan Merkez Sağlık Ocağı Onarımı	0	0	31.266,00	0	0	31.266,00	0	0	0	0	0	0	0		
44.23.01.00.00			07.2.1.31.000	8	06.7	Palu Balıca Sağlık Ocağı Onarımı	0	0	6.848,00	0	0	6.848,00	0	0	0	0	0	0	0		
44.23.01.00.00			07.2.1.33.000	5	06.5	Maden Hazar Sağlık Ocağı Onarımı	0	0	18.000,00	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
44.23.01.00.00			07.2.1.39.000	5	06.1	5 Adet Ambulans Alımı	0	0	160.000,00	0	0	17.658,96	142.341,04	0	0	0	0	0	0		
44.23.01.00.00			07.2.1.41.000	8	06.6	Deri Zührevi ve Lepra Hastalıkları Hastanesi Onarımı	0	0	69.935,82	0	0	3.883,82	73.819,64	0	0	0	0	0	254,64		
44.23.01.00.00			07.2.1.42.000	5	06.5	Alacakoya Toplum Sağlığı Merkezi Yapımı	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	242.471,93		
44.23.01.00.00			07.2.1.42.000	8	06.5	Alacakoya Toplum Sağlığı Merkezi Yapımı	0	0	0	0	0	320.065,97	0	0	0	0	0	0	320.065,97		
44.23.01.00.00			07.2.1.43.000	8	06.5	Halk Sağlığı Laboratuvarı Hizmet Binası Onarımı	0	0	0	0	0	37.500,00	0	0	0	0	0	0	144,54		
44.23.01.00.00			07.2.1.44.000	8	06.7	Merkez Verem Savaş Dispanseri Hizmet Binası Onarımı	0	0	200.000,00	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00		
													1.854.770,06	225.004,00	919.030,22	914.001,38	904.001,38	3.008.754,28	2.027.648,27	21.112,42	959.993,59
													SAĞLIK TOPLAMI						21.112,42	959.993,59	

2007 Yılı
Gelir
Bütçesi

İli Elazığ
İlçesi Merkez
Yatırımcı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Kurumsal	Fonk.	Fin. Eko.	Açıklama	Geçen Yııldan Devreden	Bütçe İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarımla Eklene	Aktarımla Dıştılan	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
44.23.01.00.00	08.1.0.00.0000	5 03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	1	0	50.000,00	0	50.001,00	46.577,00	3.424,00	0
44.23.01.00.00	08.1.0.00.0000	5 03.5	HİZMET ALIMLARI	0	1	0	0	0	1	0	1,00	0
44.23.01.00.00	08.1.0.00.0000	5 03.7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ İHAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	1	0	0	0	1	0	1,00	0
44.23.01.00.00	08.1.0.00.0000	5 03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	110.001,00	0	0	0	110.001,00	110.000,00	1,00	0
			GENÇLİK SPOR TOPLAMI	0,00	110.004,00	0,00	50.000,00	0,00	160.004,00	156.577,00	3.427,00	0,00

2007 Yılı
Gelir
Bütçesi

İli Elazığ
İlçesi Merkez

Yatırımı Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Kurumsal	Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yılden Devreden	Bütçe İle Verilen	Ek Ve Olagan Usfu	Aktarımla Eklenen	Aktarımla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Cidari Toplamı	İstisnai Etilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
44.23.01.00.00	08.2.0.00.00.00	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	5	0	0	0	5	0	5,00	0
44.23.01.00.00	08.2.0.00.00.00	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0	2	0	5.004,20	0	5.006,20	4.762,48	243,72	0
44.23.01.00.00	08.2.0.00.00.00	8	03.5	HİZMET ALIMLARI	309.351,26	0	0	0	0	309.351,26	0	0	309.351,26
44.23.01.00.00	08.2.0.00.00.00	5	03.6	TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ	0	2	0	0	0	2	0	2,00	0
44.23.01.00.00	08.2.0.00.00.00	5	03.7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	1	0	0	0	1	0	1,00	0
44.23.01.00.00	08.2.0.00.00.00	5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	1	0	0	0	1	0	1,00	0
44.23.01.00.00	08.2.0.02.00.00	8	06.5	Kültür Merkezi Binası Yapımı	508.333,80	0	50.000,00	0	0	558.333,80	0	0	558.333,80
44.23.01.00.00	08.2.0.03.00.00	8	06.5	Harput Kalesi Onarımı	2.021,80	0	0	0	0	2.021,80	0	0	2.021,80
44.23.01.00.00	08.2.0.04.00.00	8	06.5	Harput Yerleşim Merkezi Altyapı Uygulamaları	850.000,00	0	0	0	0	850.000,00	0	0	850.000,00
44.23.01.00.00	08.2.0.05.00.00	8	06.5	Harput Koruma Anıçıl İnar Planı Sıkak Sağııklaştırma	458.000,00	0	0	0	0	458.000,00	0	0	458.000,00
44.23.01.00.00	08.2.0.06.00.00	8	06.7	Elağ Müzesi Onarımı	129.131,00	0	498.000,00	0	0	627.131,00	0	0	627.131,00
44.23.01.00.00	08.2.0.07.00.00	5	03.8	Elağ Devlet Klasik Türk Müziğı Korosu Hizmet Binası Onarımı	13.785,00	0	0	0	2.504,20	11.280,80	11.280,80	0	0
44.23.01.00.00	08.2.0.08.00.00	8	03.8	Eski Hükümet Konuğının Kültürevine Donuştürülmesi	12.920,00	0	0	0	0	12.920,00	0	0	12.920,00
KÜLTÜR TURİZM TOPLAMI					2.283.542,86	11,00	548.000,00	5.004,20	2.504,20	2.834.053,86	16.043,28	252,72	2.817.757,86

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 Yılı
Gelir
Bütçesi

İli
İlçesi
Yılınca

Elazığ
Merkez

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kurumsal	Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Çeşen Yılıbın Devreden	Bütçe İle Verilmek	Ek Ve Öleğen Üsta	Aktarımla Etklenen	Aktarımla Düşülen	Bütçe Öleğneğ Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İspat Edilen Öleğnek	Sonraki Yıla Devreden
44.23.01.00.000	09.1.1.01.000	8	06.5	Merkez Sürüşü Mch.100 Öğrenci Kapasiteli Ana Okulu Yapımı	0	0	209.040,00	0	0	209.040,00	0	0	209.040,00
44.23.01.00.000	09.1.2.00.000	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	85.190,53	400.000,00	0	0	162.500,00	322.690,53	321.958,80	0	731,73
44.23.01.00.000	09.1.2.00.000	8	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	177.439,44	0	1.319.896,00	0	33.000,00	1.464.335,44	1.464.334,50	0	0,94
44.23.01.00.000	09.1.2.00.000	8	03.3	YOLLAR	276,1	0	0	0	0	276,1	0	0	276,1
44.23.01.00.000	09.1.2.00.000	5	03.4	GÖREV GİDERLERİ	6.956,30	0	0	0	0	6.956,30	0	0	6.956,30
44.23.01.00.000	09.1.2.00.000	8	03.4	GÖREV GİDERLERİ	951,25	0	0	0	0	951,25	0	0	951,25
44.23.01.00.000	09.1.2.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	40.578,13	0	0	0	0	40.578,13	38.807,29	0	1.770,84
44.23.01.00.000	09.1.2.00.000	8	03.5	HİZMET ALIMLARI	261.724,51	0	609.875,66	0	21.000,00	850.600,17	708.145,31	0	142.454,86
44.23.01.00.000	09.1.2.00.000	8	03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7.142,00	0	0	0	0	7.142,00	0	0	7.142,00
44.23.01.00.000	09.1.2.00.000	5	03.7	MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR. GİD.	111.740,30	0	0	0	0	111.740,30	107.185,08	0	4.555,22
44.23.01.00.000	09.1.2.00.000	8	03.7	MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR. GİD.	34.367,63	0	77.811,00	0	0	112.178,63	70.060,03	0	42.118,60
44.23.01.00.000	09.1.2.00.000	5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.120,00	0	0	150.000,00	0	151.120,00	140.000,00	0	11.120,00
44.23.01.00.000	09.1.2.00.000	8	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.924,29	0	705.888,85	18.000,00	0	727.813,14	680.988,11	0	46.825,03
44.23.01.00.000	09.1.2.00.000	5	06.1	MAVUL MAL ALIMLARI	42.220,92	0	0	12.000,00	0	30.220,92	29.526,14	0	694,78
44.23.01.00.000	09.1.2.00.000	8	06.1	MAVUL MAL ALIMLARI	276.851,64	0	472.994,00	0	35.000,00	714.845,64	680.560,54	0	34.285,10
44.23.01.00.000	09.1.2.01.000	5	06.5	Merkez 18 Desiik Geçiriliğinin Okulu Yapımı	900.000,00	0	0	0	900.000,00	0	0	0	0
44.23.01.00.000	09.1.2.02.000	5	06.5	Merkez 18 Desiik Sürüşü İliğinin Okulu Yapımı	308.916,73	0	0	0	0	308.916,73	0	0	308.916,73
44.23.01.00.000	09.1.2.05.000	8	06.5	Karakoğın Y.I.B. Okulu Yapımı	134.025,97	0	0	0	134.025,97	0	0	0	0
44.23.01.00.000	09.1.2.07.000	5	06.5	Mer.Yönkemek 18 Desiik İliğinin Okulu Yapımı	524.027,15	0	0	0	0	524.027,15	0	0	524.027,15
44.23.01.00.000	09.1.2.08.000	8	06.5	Karakoğın Yılıçtı 8 Desiik İliğinin Okulu Yapımı	6.574,04	0	0	0	0	6.574,04	0	0	6.574,04
44.23.01.00.000	09.1.2.10.000	8	06.5	Kövençler 100 Öğrenci Kapasiteli Ana Okulu Yapımı	116.197,07	0	0	0	116.197,07	0	0	0	0
44.23.01.00.000	09.1.2.16.000	8	03.8	Mer.Dağkenti İliğinin Okulu Onarımı	75.600,00	0	0	0	0	75.600,00	0	0	75.600,00
44.23.01.00.000	09.1.2.17.000	8	06.5	Karakoğın 100 Öğrenci Kapasiteli Ana Okulu Yapımı	188.177,45	0	0	0	188.177,45	0	0	0	0

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 Yılı
Gelir
Bütçesi

İli	İlçesi	Yatırma	Elazığ Merkez İl Millî Eğitim Müdürlüğü																	
44.23.01.00.00	09.1.2.18.000	5	06.5	Arcakç Merkez 12 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	0	0	0	200.000,00	0	0	155.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000,00
44.23.01.00.00	09.1.2.18.000	8	06.5	Arcakç Merkez 12 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	143.735,80	178.200,00	0	0	0	0	300.000,00	321.935,80	0	0	0	0	0	0	0	21.935,80
44.23.01.00.00	09.1.2.19.000	8	06.5	Mer.Dağirmenönü 3 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	12.979,87	0	0	0	0	0	0	12.979,87	0	0	0	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.20.000	8	06.5	Kovançlar Etinözü 8 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	15.689,54	0	0	0	0	0	0	15.689,54	0	0	0	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.22.000	8	06.5	Polu Kesiş 1 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00
44.23.01.00.00	09.1.2.24.000	8	06.7	Bağcı Y.I.B.Okulu Onarımı	0	250.000,00	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.33.000	8	06.5	Merkez Cumhuriyet Lisesi Yapımı	186.970,54	300.000,00	0	0	0	0	0	486.970,54	0	0	0	0	0	0	0	67.062,56
44.23.01.00.00	09.1.2.34.000	8	06.4	İlköğretim Kamuluğarma Gödenleri	78.481,38	0	0	0	0	0	0	78.481,38	0	0	0	0	0	0	0	30.297,94
44.23.01.00.00	09.1.2.36.000	8	06.5	Kovançlar 8 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	6.300,00	0	0	0	0	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.37.000	5	06.5	Merkez Çatıadı 8 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	0	0	0	125.000,00	0	0	0	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	125.000,00
44.23.01.00.00	09.1.2.37.000	8	06.5	Merkez Çatıadı 8 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	338.416,68	0	0	84.025,97	0	0	414.573,40	0	0	0	0	0	0	0	0	7.869,25
44.23.01.00.00	09.1.2.38.000	8	06.5	Merkez Bahçeköprü İlköğretim Okulu 6 Ek. Derslik Yapımı	197.825,50	0	0	0	0	0	0	197.825,50	0	0	0	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.39.000	5	06.5	Arcakç Büküradı 8 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	0	0	0	200.000,00	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000,00
44.23.01.00.00	09.1.2.39.000	8	06.5	Arcakç Büküradı 8 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	329.850,18	415.110,00	0	0	0	0	379.041,51	794.960,18	0	0	0	0	0	0	0	415.918,67
44.23.01.00.00	09.1.2.40.000	8	06.5	Mer.Sarıcaşuk 2 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	94.234,10	0	0	0	0	0	6.695,88	94.234,10	0	0	0	0	0	0	0	87.538,22
44.23.01.00.00	09.1.2.41.000	5	06.5	Svriçe 2 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	0	0	0	85.000,00	0	0	0	85.000,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000,00
44.23.01.00.00	09.1.2.41.000	8	06.5	Svriçe 2 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	102.361,20	297.380,00	0	0	0	0	374.668,50	399.741,20	0	0	0	0	0	0	0	25.072,70
44.23.01.00.00	09.1.2.42.000	8	06.5	Mer.Yazkonak 100 Öğrenci Kapasiteli Anaokulu Yapımı	383.119,00	0	0	0	0	0	152.581,87	383.119,00	0	0	0	0	0	0	0	230.537,13
44.23.01.00.00	09.1.2.43.000	8	06.5	Merkez Evrenpaşa İlköğretim Okulu Onarımı	27.590,66	0	0	0	0	27.590,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.44.000	8	03.8	Merkez 50 Yıl İlköğretim Okulu Onarımı	5.554,00	0	0	0	0	0	5.554,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.554,00
44.23.01.00.00	09.1.2.45.000	8	06.5	Merkez 24 Kasım İlköğretim Okulu Onarımı	19.519,79	0	0	0	0	19.519,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.46.000	8	06.5	Merkez Kuyulu İlköğretim Okulu Onarımı	15.456,88	0	0	0	0	15.456,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.47.000	8	06.5	Merkez Balıkgözü İlköğretim Okulu Onarımı	13.698,86	0	0	0	0	13.698,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 Yılı
Gelir
Bütçesi

İl	Elazığ	İlçe	Merkez	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	Yatırımları	09.1.2.48.000	8	06.5	Merkez Mahallelik İlköğretim Okulu Onarımı	8.851,29	0	0	0	0	8.851,29	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.49.000	8	06.5	Merkez T.O.B.B. İlköğretim Okulu Onarımı	10.000,00	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
44.23.01.00.00	09.1.2.50.000	8	06.5	Merkez Yücel İlköğretim Okulu Onarımı	25.877,06	0	0	0	25.877,06	0	0	0	0	25.877,06	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.51.000	8	06.5	Merkez Yücel İlköğretim Okulu Onarımı	8.981,91	0	0	0	8.981,91	0	0	0	0	8.981,91	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.52.000	8	06.5	Merkez Atatürk İlköğretim Okulu Onarımı	22.251,81	0	0	0	22.251,81	0	0	0	0	22.251,81	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.53.000	8	06.5	Merkez Doğanşuş İlköğretim Okulu Onarımı	18.000,00	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.54.000	8	06.5	Merkez Kemal Gürsel İlköğretim Okulu Onarımı	6.706,00	0	0	0	6.706,00	0	0	0	0	6.706,00	0	0	0	0	6.706,00
44.23.01.00.00	09.1.2.55.000	8	06.5	Merkez Elazığ İlköğretim Okulu Onarımı	9.079,00	0	0	0	9.079,00	0	0	0	0	9.079,00	0	0	0	0	9.079,00
44.23.01.00.00	09.1.2.56.000	8	06.5	Merkez Koruk Köyü İlköğretim Okulu Onarımı	26.266,23	0	0	0	26.266,23	0	0	0	0	26.266,23	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.58.000	8	06.5	S. İvrice Celal İleladi Panسیونلو İlköğ. Okulu Onarımı	65.000,00	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.59.000	8	06.5	Sırıce Cumhuriyet Panسیونلو İlköğretim Okulu Onarımı	78.000,00	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.60.000	8	06.5	Maden Y.I.B.Okulu Onarımı	52.000,00	0	0	0	52.000,00	0	0	0	0	52.000,00	0	0	0	0	52.000,00
44.23.01.00.00	09.1.2.67.000	5	06.5	Merkez 18 Derslik Kaya Karaböyü Anadolu Lisesi Yapımı	186.541,00	0	0	0	186.541,00	0	0	0	0	186.541,00	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.70.000	5	06.5	Merkez 18 Derslik Şair Hayri İlköğretim Okulu Bt. Bina Yapımı	900.000,00	0	0	0	900.000,00	0	0	0	0	900.000,00	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.71.000	5	06.5	Merkez 18 Derslik Gazzi İlköğretim Okulu Et. Bina Yapımı	900.000,00	0	0	0	900.000,00	0	0	0	0	900.000,00	0	0	0	0	647.113,00
44.23.01.00.00	09.1.2.73.000	8	06.5	Diyarbakır Çiğdemir Projesi	222.887,95	0	697.000,00	143.000,00	0	0	0	0	0	1.062.887,95	0	0	0	0	879.403,33
44.23.01.00.00	09.1.2.74.000	8	06.5	Karaböyü YİBO. 300 Kapasiteli Panسیونلو ve Yemekhane Yop.	268.124,57	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	156.417,34
44.23.01.00.00	09.1.2.74.000	8	06.5	Karaböyü YİBO. 300 Kapasiteli Panسیونلو ve Yemekhane Yop.	268.124,57	0	432.441,00	705.663,92	0	0	0	0	0	1.406.229,49	0	0	0	0	46.396,30
44.23.01.00.00	09.1.2.75.000	5	06.5	Merkez Eğitim Kampüsü Yapımı	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.76.000	8	06.5	Merkez Sürsürü Mah. 16 Derslik Lise Yapımı	635.000,00	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0	1.735.000,00	0	0	0	0	1.122.894,84
44.23.01.00.00	09.1.2.77.000	5	06.5	Sırıce Merkez 18 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0
44.23.01.00.00	09.1.2.77.000	8	06.5	Sırıce Merkez 18 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0

İli
İlçesi
Yürütme
Elazığ
Merkez
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Kurumsal	Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıllık Devreden	Büce ile Verilen	Ek W. Olarak Üstü	Aktarımla Edinen	Aktarımla Düşülen	Büce Ödeneği Toplamı	Büce Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonaki Yılı Devreden
44.23.01.00.00	10.7.0.00.00.00	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	6	0	0	0	6	0	0	0
44.23.01.00.00	10.7.0.00.00.00	8	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	2.000,04	0	0	2.000,04	1.021,85	0	978,19
44.23.01.00.00	10.7.0.00.00.00	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0	1	0	9.000,00	0	9.001,00	8.083,00	0	0
44.23.01.00.00	10.7.0.00.00.00	5	03.7	MENKUL MAL GAYRİMÜKADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	1	0	0	0	1	0	0	0
44.23.01.00.00	10.7.0.00.00.00	5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	1	0	0	0	1	0	0	0
44.23.01.00.00	10.7.0.00.00.00	8	06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	0	0	29.539,00	0	0	29.539,00	29.528,62	0	10,38
44.23.01.00.00	10.7.0.02.00.00	8	03.8	Herpaç Yığılması Yurtlu Binası anarımı	18.707,42	0	0	0	0	18.707,42	17.533,42	0	1.174,00
44.23.01.00.00	10.7.0.03.00.00	8	03.8	Merkez Gazi Huzurevi Onarımı	3.468,00	0	0	0	0	3.468,00	0	0	3.468,00
SOSYAL HİZ. TOPLAMI					22.175,42	9,00	31.539,04	9.000,00	0,00	62.725,46	56.166,89	926,00	5.630,57

İli
İlçesi
Yürütme
Elazığ
Merkez
Elazığ İl Özel İdaresi / Mali Hizmetler Müdürlüğü

Kurumsal	Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıllık Devreden	Büce ile Verilen	Ek W. Olarak Üstü	Aktarımla Edinen	Aktarımla Düşülen	Büce Ödeneği Toplamı	Büce Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonaki Yılı Devreden
44.23.01.04.00	01.3.9.00.00.00	5	05.2	HAZINE YARDIMLARI	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00	0	0	0
44.23.01.04.00	01.6.0.00.00.00	5	05.3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	47.500,00	5.000,00	0	0	0	52.500,00	47.500,00	5.000,00	0
44.23.01.04.00	01.6.0.00.00.00	5	05.7	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	0	220.000,00	0	422.000,00	0	642.000,00	641.182,00	818,00	0
44.23.01.04.00	01.6.0.00.00.00	5	07.1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.66.243,52	5.130.000,00	0	0	2.097.500,00	3.198.743,52	3.198.540,00	203,52	0
44.23.01.04.00	01.6.0.00.00.00	8	07.1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	0	0	139.474,65	0	0	139.474,65	17.000,00	0	122.474,65
44.23.01.04.00	10.9.9.00.00.00	5	08.1	YURTIÇI BORÇ VERME	0	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00	0
MALİ HİZMETLER TOPLAMI					213.743,52	5.425.000,00	139.474,65	422.000,00	2.097.500,00	4.102.718,17	3.904.222,00	76.021,52	122.474,65





ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 Yılı
Gelir
Bütçesi

İli
İlçesi
Yürütme
Elazığ İl Özel İdaresi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kurumsal	Fonk.	FİN. Eko.	Açıklama	Gayrim Yüklü Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek Ve Olmayan Üstü	Aktarılmaya Etilenler	Aktarılmaya Düşülen	Bütçe Ödenmiş Toplamı	Bütçe Geliri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	5	01.1 MEMURLAR	0	2.100.000,00	0	0	60.000,00	2.040.000,00	341.497,61	1.698.502,39	0
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	8	01.1 MEMURLAR	118.946,11	0	2.342.541,70	0	0	2.461.487,81	2.244.157,58	15.826,73	217.332,23
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	5	01.2 SOZLEŞMELİ PERSONEL	0	98.000,00	0	60.000,00	0	198.000,00	142.173,27	86.755,41	0
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	5	01.3 İŞÇİLER	0	614.006,00	0	0	0	614.006,00	527.220,59	0	0
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	8	01.3 İŞÇİLER	565.394,29	0	24.364.584,70	0	0	24.929.978,99	24.665.043,64	0	264.935,35
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	5	01.4 GEÇİCİ PERSONEL	0	5.001,00	0	0	0	5.001,00	3.776,05	1.624,95	0
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	5	02.1 MEMURLAR	0	230.000,00	0	0	0	230.000,00	46.797,95	183.202,05	0
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	8	02.1 MEMURLAR	55.577,34	0	293.720,00	0	0	349.297,34	301.049,02	0	48.248,32
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	5	02.3 İŞÇİLER	0	72.000,00	0	17.500,00	0	89.500,00	89.453,18	46,82	0
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	8	02.3 İŞÇİLER	394.104,13	0	4.504.553,60	0	0	4.898.657,73	4.832.606,43	0	66.051,30
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	5	03.3 YOLLUKLAR	0	65.000,00	0	0	0	65.000,00	12.327,49	52.672,51	0
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	8	03.3 YOLLUKLAR	228.970,32	0	687.000,00	0	0	915.970,32	674.732,20	0	241.238,12
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	5	03.5 HİZMET ALIMLARI	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00	6.364,78	8.635,22	0
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	5	03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	91.000,00	0	0	0	91.000,00	43.954,03	47.045,97	0
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	8	03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	38.185,87	0	195.000,00	0	0	233.185,87	179.326,85	0	53.859,02
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	5	05.1 GÖREV ZARARLARI	0	202.500,00	0	0	0	202.500,00	143.713,17	58.786,83	0
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	8	05.1 GÖREV ZARARLARI	20.722,85	0	3.400,00	0	0	24.122,85	7.133,43	0	16.989,42
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	5	05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	50.000,00	0	0	0	50.000,00	46.847,34	3.152,66	0
44.23.01.05.00	01.3.9.00.000	8	05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	14.949,90	0	50.200,00	0	0	65.149,90	3.792,75	0	61.357,15
44.23.01.05.00	01.9.9.00.000	8	01.5 DİĞER PERSONEL TRANSFERLERİ	14.933,32	0	679.533,16	0	375,81	694.110,67	679.555,80	0	14.554,87
44.23.01.05.00	10.7.0.00.000	5	05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	275.000,00	0	0	0	275.000,00	0	275.000,00	0
İNAN KAYNAKLARI				1.451.786,13	3.817.507,00	33.120.553,16	77.500,00	60.375,81	38.406.970,48	34.991.153,16	2.431.251,54	984.565,78
TOPLAMI												

İli Elazığ
İlçesi Merkez
Yatırımca Elazığ İl Özel İdaresi / Hukuk Müşavirliği

Kurumsal	Fonk.	Fin.	Ek.	Açıklama	Geçen Yılıdan Devreden	Bütçe ile Yenilen	Ek Ve Olan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Geliri Toplamı	İzlenilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
44.23.01.24.00	01.3.9.00.00.00	5	03.3	YOLLUKLAR	0	10.000,00	0	0	0	10.000,00	651,55	9.348,45	0
44.23.01.24.00	01.3.9.00.00.00	5	03.4	GÖREV GİDERLERİ	0	175.000,00	0	0	0	175.000,00	40.547,87	134.452,13	0
44.23.01.24.00	01.3.9.00.00.00	8	03.4	GÖREV GİDERLERİ	0	0	133.600,00	0	0	133.600,00	115.825,99	17.774,61	0
44.23.01.24.00	01.3.9.00.00.00	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00	1.250,00	13.750,00	0
				HUKUK MÜŞ. TOPLAMI	0,00	200.000,00	133.600,00	0,00	0,00	333.600,00	158.274,81	157.550,58	17.774,61

İli Elazığ
İlçesi Merkez
Yatırımca Elazığ İl Özel İdaresi / Yazı İşleri Müdürlüğü

Kurumsal	Fonk.	Fin.	Ek.	Açıklama	Geçen Yılıdan Devreden	Bütçe ile Yenilen	Ek Ve Olan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Geliri Toplamı	İzlenilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
44.23.01.18.00	01.1.1.00.00.00	5	01.5	Diğer Personel	0	510.000,00	0	0	0	510.000,00	458.273,64	51.726,36	0
44.23.01.18.00	01.1.1.00.00.00	5	03.3	YOLLUKLAR	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00	2.594,50	12.495,50	0
				YAZI İŞLERİ TOPLAMI	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	460.778,14	64.221,86	0,00

ELAĞIĞ İL ÖZEL İDARESİ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 Yılı
Gelir
Bütçesi

İli	İlçe	Yılı	Kürumsal	Fin.	Eko.	Açıklama	Gelen Yıllık Devreden	Bütçe İle Verilen	E.A. Ve Olmayan Üstü	Aktarılmaya Etkileri	Aktarılmaya Düşülen	Bütçe Ödenen Toplamı	Bütçe Geliri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonrakı Yıla Deviren
44.23.01.31.00	01.3.9.00.000	5	032	TÜKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	948.426,00	0	2.701.300,90	180.000,00	0	1.128.426,00	1.039.824,47	88.601,53	0	
44.23.01.31.00	01.3.9.00.000	8	032	TÜKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.510,43	5.000,00	0	0	0	0	2.705.811,33	2.886.085,03	206,10	17.726,30	
44.23.01.31.00	01.3.9.00.000	5	034	GÖREV GİDERLERİ	32.548,04	0	0	0	0	0	32.548,04	4.793,90	6.811,38	0	
44.23.01.31.00	01.3.9.00.000	8	034	GÖREV GİDERLERİ	0	249.000,00	0	0	106.000,00	0	355.000,00	341.014,64	13.985,36	25.736,66	
44.23.01.31.00	01.3.9.00.000	5	035	HİZMET ALIMLARI	15.690,81	0	0	230.000,00	0	0	245.690,81	239.890,77	5.800,04	6.000,04	
44.23.01.31.00	01.3.9.00.000	5	037	MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	527.000,00	0	0	825.000,00	0	1.352.000,00	1.343.071,76	8.928,24	0	
44.23.01.31.00	01.3.9.00.000	8	037	MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	460,29	0	0	0	0	0	460,29	460,29	0	0	
44.23.01.31.00	01.3.9.00.000	5	038	MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	295.000,00	0	0	46.000,00	0	219.000,00	187.636,07	31.363,93	0	
44.23.01.31.00	01.3.9.00.000	5	061	MANUL MAL ALIMLARI	0	8.501,00	0	0	240.000,00	0	248.501,00	67.601,20	180.899,80	0	
44.23.01.31.00	01.3.9.00.000	8	061	MANUL MAL ALIMLARI	11.213,09	0	0	0	0	0	11.213,09	3.709,62	7.504,47	0	
DESTEK HİZ. TOPLAMI							64.622,66	2.402.927,00	2.931.300,90	1.351.000,00	46.000,00	6.303.850,56	5.922.894,13	323.954,96	56.967,47

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 Yılı
Gelir
Bütçesi

İli	İlçe	Yatırım	Kürumsal	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yılın Devreden	Bütçe ile Verilen	EK Ve Öleğin Üstü	Aktarmayla Eklene	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Geliri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden	
																Fonk.
Elazığ	Merkez	Elazığ İl Özel İdaresi / İmar ve Kentsel İşletme Müdürlüğü	44.23.01.32.00	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00	0	
				8	03.5	Elazığ 60 Kişilik Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı Yapımı	0	0	25.000,00	0	0	25.000,00	21.747,40		3.252,60	
				8	06.5	Elazığ 60 Kişilik Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı Yapımı	0	0	275.000,00	0	0	275.000,00	0		275.000,00	0
				5	06.5	Merkez Harpuileri Yapımı	47.192,80	0	0	0	0	47.192,80	0	47.192,80	0	
				5	06.5	Vilayeler Hizmet Birliği Öğrenci Yurdu Yapımı	0	0	0	427.000,00	0	427.000,00	260.498,09		166.501,91	0
				8	06.5	Vilayeler Hizmet Birliği Öğrenci Yurdu Yapımı	3.152,72	0	750.000,00	0	0	753.152,72	753.152,72		62.192,80	0
						İMAR İSKAN TOPLAMI	50.345,52	15.000,00	1.050.000,00	427.000,00	0,00	1.542.345,52	1.035.398,21	62.192,80	444.754,51	0

İli	İlçe	Yatırım	Kürumsal	Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yılın Devreden	Bütçe ile Verilen	EK Ve Öleğin Üstü	Aktarmayla Eklene	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Geliri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
Elazığ	Merkez	Elazığ İl Özel İdaresi / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	44.23.01.33.00	5	06.5	Astalt Yol Yapımı	0	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	995.998,88	0,12	0
				8	06.5	Astalt Yol Yapımı	221,15	0	4.888.582,87	195.000,00	0	0	5.095.804,02	5.095.804,02	0	0
				5	06.5	Stabilite Yol Yapımı	0	150.000,00	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0
				5	06.5	Kıy Yollarına Köprü ve Sarat Yapılan Yapımı	0	125.000,00	0	0	0	0	125.000,00	122.707,70	2.292,30	0
				8	06.5	Kıy Yollarına Köprü ve Sarat Yapılan Yapımı	98,41	0	690.000,00	0	195.000,00	0	495.098,41	493.909,04		1.189,37
				5	06.1	İş Makinası Alımı	0	135.000,00	0	0	0	0	135.000,00	115.477,15	19.522,85	0
				8	06.1	İş Makinası Alımı	75.233,27	0	0	0	0	0	75.233,27	75.233,27	0	0
						YOL VE ULAŞIM TOPLAMI	75.552,83	1.410.000,00	5.688.582,87	195.000,00	345.000,00	6.924.135,70	6.901.131,06	21.815,27	1.189,37	

2007 Yılı
Gelir
Bütçesi

İli Elazığ
İlçesi Merkez
Yürümcü Elazığ İl Özel İdaresi / Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumsal	Fonk.	Fin.	Etk.	Açıklama	Geçen Yıdan Devreden	Bütçe ile Verilen	Ek Ve Olagan Üstü	Aktarımla Eklene	Aktarımla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Geliri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
44.23.01.34.00	04.2.1.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0	0	0	52.723,50	0	52.723,50	52.716,50	7,00	0
44.23.01.34.00	04.2.1.01.000	5	06.5	Sulama Amnepli Havuz ve Kanalizasyon Yapımı	0	425.000,00	0	500.000,00	0	925.000,00	914.524,29	10.475,71	0
44.23.01.34.00	04.2.1.01.000	8	06.5	Sulama Amnepli Havuz ve Kanalizasyon Yapımı	584,94	0	220.000,00	0	0	220.584,94	217.888,44		2.686,50
44.23.01.34.00	05.2.0.01.000	5	06.5	Köyler Kanalizasyon Yapımı	0	100.000,00	0	145.000,00	0	245.000,00	218.548,96	26.450,04	0
44.23.01.34.00	05.2.0.02.000	5	06.5	Köyler Kanalizasyon Yapımı Avrupa Birliği Hibe Katılımı Projesi	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00		0
44.23.01.34.00	06.3.0.01.000	5	06.5	Köyler İçme Suyu Temini	0	200.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	4.787,21	95.212,79	0
44.23.01.34.00	06.3.0.01.000	8	06.5	Köyler İçme Suyu Temini	631,29	0	0	0	0	631,29	0		631,29
44.23.01.34.00	06.3.0.02.000	8	06.5	T.S.K. İçme ve Kullanma Suyu Projesi	0	0	50.000,00	0	0	50.000,00	35.545,92		14.454,08
SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ					1.216,23	725.000,00	270.000,00	797.723,50	100.000,00	1.693.939,73	1.544.022,32	132.145,54	17.771,87

Birliklere
Yardım

BİRLİKLERE YARDIM HARCAMA KALEMİNDEN MERKEZ VE 10 İLÇE KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE AKTARILAN ÖDENEKLER		
S. No	İlçe Adı	Aktarılan Ödenek
1	Merkez	1.025.440,00
2	Ağın	185.000,00
3	Alacakaya	16.200,00
4	Arıcak	128.000,00
5	Baskil	415.000,00
6	Karakoçan	20.000,00
7	Keban	115.000,00
8	Kovancılar	217.000,00
9	Maden	114.000,00
10	Palu	94.000,00
11	Sivrice	436.900,00
12	Hazargölü Mahalli İdareler Birliği	25.000,00
13	DOKAB	0,00
TOPLAM HARCANAN		2.791.540,00 YTL

Merkez Köylere
Hizmet
Götürme
Birliği

ELAZIĞ İLİ KALKINDIRMA ve KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRİMİ				
S.No	Karar Tarihi	Karar No	Ne İçin Verildiği	Tutarı
1	06.02.2007	13	Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Genel İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere	60.000,00 YTL
2	06.03.2007	33	Çevre ölçüm ve analiz laboratuvarında analizlerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan cihazların alımında kullanılmak üzere	250.000,00 YTL
3	13.03.2007	59	3 Ad.arazili pikapın 1 ay süre ile kiralanması, 1 Ad. Stabilize ve temel asfalt malzemesi sıkıştırma oranını gösteren ölçme cihazı, 2 Ad. CPRS ve 2 Ad.El telsizi alım işi	36.500,00 YTL
4	13.03.2007	65	Gazi And.Teknik lise ve End.Mes.Lise Elektronik Bölümü şefi tarafından hazırlanan "Nitelikli iş gücünün sağlanması 130.00Avruluk projesinin kabul edildiğinden projenin eş finansman katkısı olarak sağlanması için	12.000,00 YTL
5	20.03.2007	68	"Elazığ Okuyor" kampanyası kapsamında alınacak kitap giderlerinde kullanılmak üzere	100.000,00 YTL
6	20.03.2007	69	"Her Köye Bir Orman" kampanyasında ilimiz merkez ve ilçeye bağlı 11 köyde yapılacak orman çalışmalarında kullanılmak üzere	50.000,00 YTL
7	20.03.2007	70	Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca Elazığ-Merkez-Uzuntarla İlköğretim okulunda Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetlerinde kullanılmak üzere	50.000,00 YTL
8	22.05.2007	127	İlçeye bağlı köylerin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere	30.000,00 YTL
9	05.06.2007	144	2 Ad.Kamyon kiralama işi	80.000,00 YTL
10	12.06.2007	148	Sarıçubuk Asfalt şantiyesi için kal-yak alımı	156.940,00 YTL
11	26.06.2007	163	Vali Konağına yapılacak olan 8 araçlık garaj yapımında kullanılmak üzere	60.000,00 YTL
12	10.07.2007	174	Tadım Köyü Fosetik inşaatı yapımı işinde kullanılmak üzere	20.000,00 YTL
13	10.07.2007	179	Bilim Sanat Mer.Müdürlüğünce üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için dış sınıf, sosyal etkinlikler alanı ve spor etkinlikler alanı yapım işi	50.000,00 YTL
14	24.07.2007	192	Birliğin genel ihtiyaçlarında kullanılmak üzere	50.000,00 YTL
15	06.11.2007	259	Valilik Makam aracının onarımı	20.000,00 YTL
			TOPLAM	1.025.440,00 YTL

Ağın
Alacakaya
Arıcak
Baskil
Köylere Hizmet
Götürme
Birliği

AĞIN İLÇESİ				
S. No	Karar Tarihi	Karar No	Ne İçin Verildiği	Tutarı
1	22.05.2007	127	İlçeye bağlı köylerin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere	10.000,00 YTL
2	26.06.2007	161	Saraycık köyü kanalizasyon şebekesi hattının onarımı ve foseptik çukuru yapımında kullanılmak üzere	175.000,00 YTL
TOPLAM				185.000,00 YTL

ALACAKAYA İLÇESİ				
S. No	Karar Tarihi	Karar No	Ne İçin Verildiği	Tutarı
1	16.01.2007	4	Karla Mücadele Kapsamında çalıştırılacak araçların yakıt giderlerinde kull.üz.	6.200,00 YTL
2	22.05.2007	127	İlçeye bağlı köylerin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere	10.000,00 YTL
GENEL TOPLAM				16.200,00 YTL

ARICAK İLÇESİ				
S. No	Karar Tarihi	Karar No	Ne İçin Verildiği	Tutarı
1	20.02.2007	18	Arıcak-Alacakaya bağlantı karayolu stabilize ve onarım işlerinde çalıştırılan araçların kiralama giderleri, motorin alımı ve fazla mesai çalışma ücretleri ile yağış ve heyalan nedeniyle hasar gören Bozcavuş-Göründü ve Göztepe-Çevrecik köy grup yollarında malzemeli bakım, büz boru döşenmesi ve stabilize işlerinde kullanılmak üzere	50.000,00 YTL
2	15.05.2007	121	Arıcak-Alacakaya bağlantı grup yolu stabilize yapımın araç kiralama ve fazla mesai çalışma ücretlerinin ödenmesinde kullanılmak üzere	58.000,00 YTL
3	22.05.2007	127	İlçeye bağlı köylerin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere	10.000,00 YTL
4	12.06.2007	149	Üçöçak beldesi Kutıldüğün beldesiçme suyu tesisi onarımı	10.000,00 YTL
GENEL TOPLAM				128.000,00 YTL

BASKIL İLÇESİ				
S. No	Karar Tarihi	Karar No	Ne İçin Verildiği	Tutarı
1	22.05.2007	129	Köy yolları bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere 2 ad. Dampirli kamyon kiralanması işi	45.000,00 YTL
2	22.05.2007	127	İlçeye bağlı köylerin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere	20.000,00 YTL
3	03.07.2007	172	Höyük Kumlu tarla Köy yolu 1. kat asfalt yapımı işi	200.000,00 YTL
4	03.07.2007	173	5 ad köyün sulama suyu pompa revizyonu	150.000,00 YTL
GENEL TOPLAM				415.000,00 YTL

Karakoçan
Keban
Kovancılar
Maden
Köylere Hizmet
Götürme
Birliği

KARAKOÇAN İLÇESİ				
S. No	Karar Tarihi	Karar No	Ne İçin Verildiği	Tutarı
1	22.05.2007	127	İlçeye bağlı köylerin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere	20.000,00 YTL
GENEL TOPLAM				20.000,00 YTL

KEBAN İLÇESİ				
S.No	Karar Tarihi	Karar No	Ne İçin Verildiği	Tutarı
1	22.05.2007	127	İlçeye bağlı köylerin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere	15.000,00 YTL
2	19.06.2007	154	Dürümlü ve Kopuzlu köy yollarının asfalt çalışmaları için	100.000,00 YTL
GENEL TOPLAM				115.000,00 YTL

KOVANCILAR İLÇESİ				
S.No	Karar Tarihi	Karar No	Ne İçin Verildiği	Tutarı
1	03.04.2007	86	Fahribey Köyünün köy çeşmesi ve havuzunun onarım ve restorasyon işlerinde kullanılmak üzere	5.000,00 YTL
2	08.05.2007	109	Kaymakamlık lojmanı onarım işi için 10.000,00 ve Ekinözü İlköğretim Okuluna bir ilave kat yapım işi için 30.000,00 YTL	40.000,00 YTL
3	22.05.2007	127	İlçeye bağlı köylerin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere	20.000,00 YTL
4	03.07.2007	170	Ağaçlandırma sahalarının çapalama giderleri	12.000,00 YTL
5	24.07.2007	193	Topağaç Köyü Sulama suyu tesisi yapımı	140.000,00 YTL
GENEL TOPLAM				217.000,00 YTL

MADEN İLÇESİ				
S.No	Karar Tarihi	Karar No	Ne İçin Verildiği	Tutarı
1	20.02.2007	19	Atatürk İlköğretim Okulu Kalorifer tesisatının bakım ve onarımında kullanılmak üzere	11.000,00 YTL
2	27.02.2007	23	KHGB'nin genel ihtiyaçlarında kullanılmak üzere	7.000,00 YTL
3	01.05.2007	106	Maden İlçesi Bakımevinin PVC Kapı ve pencere sistemlerinin yapım iinde kullanılmak üzere	6.000,00 YTL
4	22.05.2007	127	İlçeye bağlı köylerin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere	15.000,00 YTL
5	24.07.2007	194	Kapalı Halısaha yapımı	75.000,00 YTL
GENEL TOPLAM				114.000,00 YTL

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

PALU İLÇESİ				
S. No	Karar Tarihi	Karar No	Ne İçin Verildiği	Tutarı
1	22.05.2007	127	İlçeye bağlı köylerin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere	15.000,00 YTL
2	29.05.2007	135	Kaymakamlık lojmanı onarım işi için	20.000,00 YTL
4	03.07.2007	171	Ağaçlandırma sahalarının çapalama giderleri	9.000,00 YTL
5	10.07.2007	175	Karakol gözetleme kulesi yapımı,kuleye yeni yol yapımı	50.000,00 YTL
GENEL TOPLAM				94.000,00 YTL

SİVRİCE İLÇESİ				
S. No	Karar Tarihi	Karar No	Ne İçin Verildiği	Tutarı
1	09.01.2007	1	Köyler Hizmet Götürme Birliğinin genel ihtiyaçlarında kullanılmak üzere	6.500,00 YTL
2	06.03.2007	34	1/1000'lik haritaların hazırlanması işinde kullanılmak üzere	80.000,00 YTL
3	03.04.2007	85	Depremde Kaymakamlık lojmanında oluşan hasarların onarımında kullanılmak üzere	5.000,00 YTL
4	22.05.2007	127	İlçeye bağlı köylerin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere	15.000,00 YTL
5	22.05.2007	129	Köy yollarının bak.ve on.çalışmalarında kullanılmak üzere 1. ad.kırıcı ekskavatör ve 1.ad.kanal kazıcı kiralama işi için 58.000 malzeme ve mıcar temini nakli işi için 122.600 olmak üzere	180.600,00 YTL
6	29.05.2007	134	1/1000'lik haritaların hazırlanması işinde kullanılmak üzere	49.800,00 YTL
7	24.07.2007	195	Hazar Gölü Güney Sahil Yolu tahkimatı işi için	75.000,00 YTL
8	31.07.2007	202	1.Hazar Gölü Plaj şenlikleri	25.000,00 YTL
GENEL TOPLAM				436.900,00 YTL

HAZAR GÖLÜ MAHALLİ İDARELER BİRLİĞİ				
S. No	Karar Tarihi	Karar No	Ne İçin Verildiği	Tutarı
1	31.07.2007	199	Gezin ve Sivrice Belediyelerinin üyesi olduğu Hazar Gölü Mahalli İdareler Birliği tüzüğü doğrultusunda kullanılmak üzere	25.000,00 YTL
GENEL TOPLAM				25.000,00 YTL

Palu
Sivrice
Köylere Hizmet
Götürme
Birliği

Hazar Gölü
Mahalli
İdareler
Birliği



ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

Yol ve
Ulaşım
Hizmetleri
Müdürlüğü
2007 Yılı
Faaliyetleri

2007 YILI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ							
HİZMET TÜRÜ	PROĞRAM	EK PROĞRAM	TOPLAM	UYGULAMA	ÖDENEK	HARCAMA	İŞ ADEĐİ
TESVİYE (km)	13	11,00	24,00	21,00			13
STABİLİZE (km)	345,5	225,65	571,15	563,15	2.746,00 TL	2.193.000,00 TL	145
ASFALT (km)	Yeni	153,4	59	212,4	207,4	3.050.470,00 TL	65
	2.Kat	281,8	-11,3	270,5	270,5	850.430,00 TL	68
Asfalt bütüm alımı					6.100,00 TL	6.100,00 TL	1
ONARIM (km)	129,5	32,5	162	161	488.884,00 TL	488.884,00 TL	41
KÖPRÜ YAPIM	Adet	4	4	4	720.000,00 TL	439.563,00 TL	4
	Acıklık						
BÜZ	30%	1.813		1.813			
	40%	232		232			
	50%	415		415			
	60%	1021		1021			
	80%	50		50			
SANAT YAPILARI	Adet	32	32	32	862.955,00 TL	507.046,00 TL	11
	Uzunluk	671,5		671,5	671,5		
SPİRAL BORU ALIMI	Uzunluk	1373	1373	1373	500.000,00 TL	432.683,00 TL	1
T O P L A M					6.547.558,00 TL	7.968.176,00 TL	349

Yerleşim Yeri	Asfalt			Stabilize			Tepsiye			Ham			Toplam		
	Köy Sayısı	Km	Nüfus	Köy Sayısı	Km	Nüfus	Köy Sayısı	Km	Nüfus	Köy Sayısı	Km	Nüfus	Köy Sayısı	Km	Nüfus
Merkez	155	449	37.578	99	222	4.789	12	21	392	0	0	0	266	692	42.759
Ağın	17	54	1.456	5	10	161	0	3	0	0	0	0	22	67	1.617
Alacakaya	11	50	3.503	13	35	2.249	1	8	35	0	0	0	25	93	5.787
Arıcak	14	44	12.662	7	39	1.393	7	27	1.217	0	0	0	28	110	15.272
Baskil	40	156	4.114	179	431	7.970	26	44	955	0	0	0	245	631	13.039
Karakoçan	36	94	7.989	73	195	5.173	14	29	585	1	4	0	124	322	13.747
Keban	39	128	2.685	29	82	789	0	0	0	0	0	0	68	210	3.474
Kovancılar	60	151	12.833	48	188	2.807	4	17	155	0	0	0	112	356	15.795
Maden	28	89	5.725	66	215	5.004	13	54	741	2	5	60	109	363	11.530
Palu	26	66	8.501	29	101	2.652	4	15	769	0	0	0	59	182	11.922
Sivrice	25	71	2.551	83	224	4.341	24	64	861	1	2	30	133	361	7.783
TOPLAM	451	1.352	99.597	631	1.742	37.328	105	282	5.710	4	11	90	1.191	3.387	142.725

Yerleşim Yeri	Asfalt			Stabilize			Tepsiye			Ham			Toplam		
	Köy Sayısı	Km	Nüfus	Köy Sayısı	Km	Nüfus	Köy Sayısı	Km	Nüfus	Köy Sayısı	Km	Nüfus	Köy Sayısı	Km	Nüfus
Merkez	155	458	37.568	107	219	5.041	3	7	110	0	0	0	265	684	42.719
Ağın	18	60	1.486	4	7	131	0	0	0	0	0	0	22	67	1.617
Alacakaya	11	50	4.805	13	35	947	1	8	35	0	0	0	25	93	5.787
Arıcak	14	46	12.662	7	37	2.111	7	27	499	0	0	0	28	110	15.272
Baskil	45	176	4.376	185	431	8.104	15	36	559	0	0	0	245	643	13.039
Karakoçan	36	94	7.989	78	207	5.304	9	19	454	1	2	0	124	322	13.747
Keban	38	122	2.628	29	84	816	0	0	0	0	0	0	67	206	3.444
Kovancılar	58	146	12.771	52	201	2.964	2	9	60	0	0	0	112	356	15.795
Maden	31	106	6.262	72	219	5.205	5	37	207	2	2	0	110	364	11.674
Palu	27	68	8.703	26	91	2.349	6	19	870	0	0	0	59	178	11.922
Sivrice	28	84	2.656	93	257	4.693	11	25	434	0	0	0	132	366	7.783
TOPLAM	461	1.410	101.906	666	1.788	37.665	59	187	3.228	3	4	0	1.189	3.389	142.799

2006 Yılı
Envanteri

2007 Yılı
Envanteri

İdaremiz yol ve ulaşım hizmetleri sektöründe;

Tesviye yol yapımı için toplam 24 km yol yapmayı hedeflemiş bu planın 21 km gerçekleştirmiştir.

Stabilize yol yapımında 571 yol yapmayı planlamış olan idaremiz 2007 yılında toplam 563 km stabilize yol yapmıştır.

1 kat asfalt yapım programını 212 km olarak belirleyen İdaremiz yıl sonunda 207 km 1. kat asfalt yapmıştır.

2. kat asfalt yapımını 270 km yol olarak öngören İdaremiz sezon sonunda % 100 gerçekleşme ile yerine getirmiş olup toplam 2. kat asfalt yapımı 270 km olarak gerçekleşmiştir.

İdaremiz yapım programlarını sezon başında planlamış olduğu yatırımları % 100 yerine getirmiş bu programlara ek program ile;

Tesviye için 11 km

Stabilize için 225 km

1.kat asfalt için 59 km

Onarım için 32 km ek program yapmıştır.

İdaremiz 2007 yılında 4 adet köprü inşaatı tamamlamıştır.

İdaremiz yine 2007 yılında çeşitli çap ve ebatlarda toplam 3531 metre büz köyollarına döşenmiştir.


2007 yılında 32 adet toplam 671 metre uzunluğunda sanat yapısı gerçekleştirilmiştir.

1373 metre spiral sarımlı boru döşeme işi idaremizce 2007 yılında gerçekleştirilmiştir.


1518 Kamyon yaklaşık 12144 m³ rotbiks malzeme idaremiz asfalt plentinde hazırlanmış olup asfalt bakım ve onarımında kullanılmıştır.

Yapılan bu yatırımların sonunda;

2006 yılında 21 km Tesviyesi bulunan Merkez'in yapılan iyileştirme sonunda tesviyeli yolu 7 km düşürülmüştür. Elazığ ve merkez köylerine yol ve ulaşım hizmetleri için 1.480.500.00 YTL yatırım yapılmıştır.

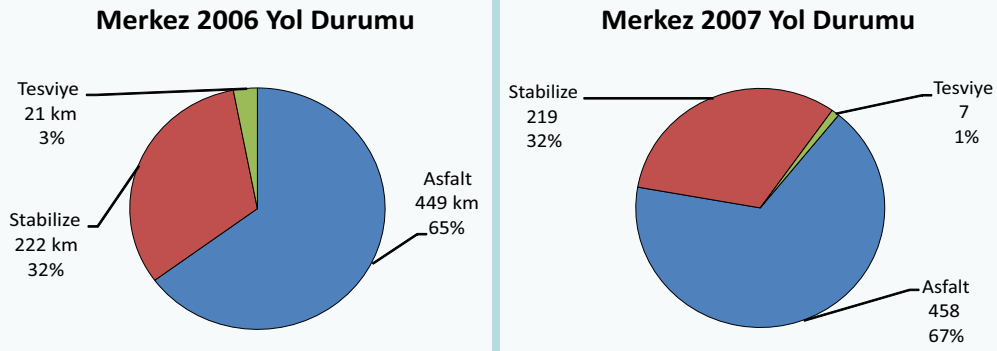


Ağın ilçemizin 2006 yılında 10 km olan stabilize yolu 2007 yılında 7 km düşürülmüş bunun yanında 3 km tesviyesi tamamen iyileştirilmiş ve ağın ilçemizin tesviyeli yolu kalmamıştır. Ağın İlçesine yol ve ulaşım hizmetleri için 238.000.00 YTL yatırım yapılmıştır.

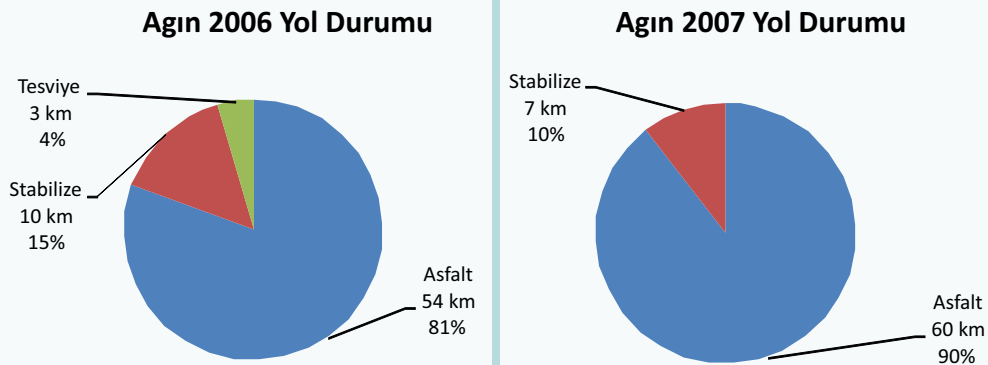


Yol ve
Ulaşım
Hizmetleri
Yatırımları

Alacakaya İlçesine yol ve ulaşım hizmetleri için 313.000.00 YTL yatırım yapılmıştır.

Alacakaya 2006 Yol Durumu

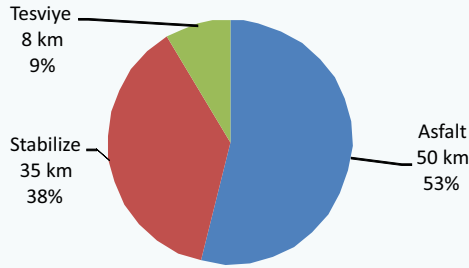


Alacakaya 2007 Yol Durumu

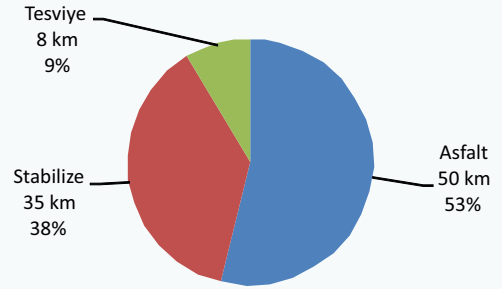


Arıcak İlçesine yol ve ulaşım hizmetleri için 716.750.00 YTL yatırım yapılmıştır.



Arıcak 2006 Yol Durumu

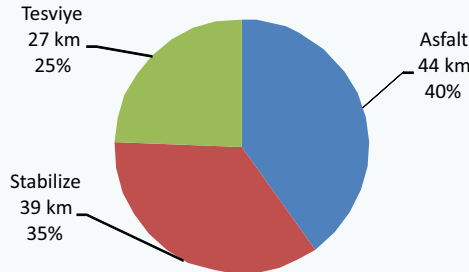



Arıcak 2007 Yol Durumu

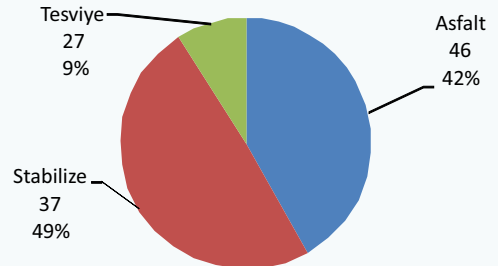

Baskil ilçemizin 2006 yılında 44 km olan Tesviye yol 2007 yılında 36 km düşürülmüştür. Baskil ilçemizin 156 km olan asfalt kaplamalı yolu 2007 yılı sonunda 176 km yükseltilmiştir. Baskil İlçesine yol ve ulaşım hizmetleri için 1.128.250.00 YTL yatırım yapılmıştır.

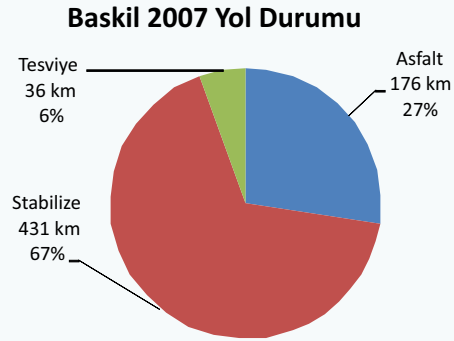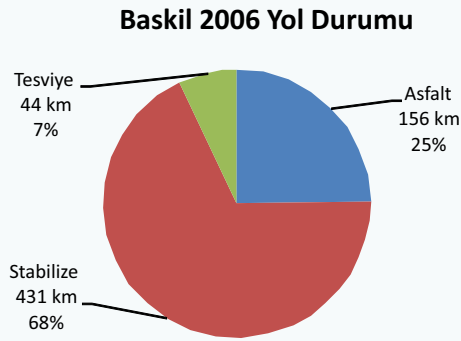


Karakoçan ilçemizin 4 km ham yolu varken 2007 yılında bu Hamyol km 2 km düşürülmüştür. Ayrıca 29 km olan Tesviyeli yolu 2007 yılında 19 km düşürülmüştür. Karakoçan İlçesine yol ve ulaşım hizmetleri için 850.250.00 YTL yatırım yapılmıştır.

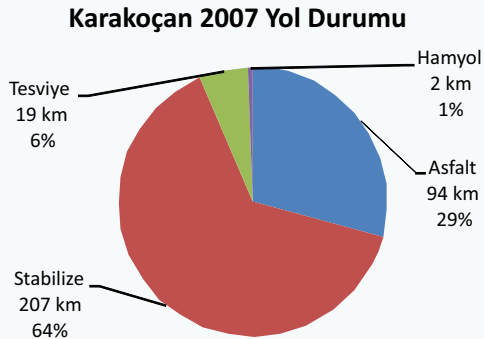
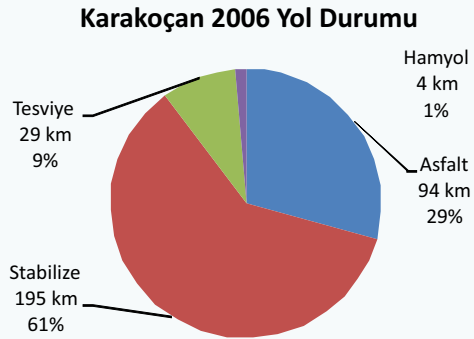


Yol ve Ulaşım Hizmetleri Yatırımları



Keban ilçemizin 2006 yılında 82 km stabilizeli yolu varken 2007 yılında bu yol 84 km çıkartılmıştır. Keban İlçesine yol ve ulaşım hizmetleri için 347.250.00 YTL yatırım yapılmıştır.

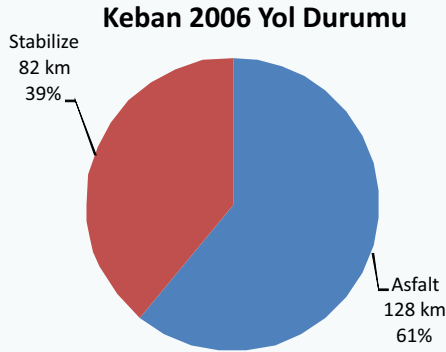



Kovancılar ilçemizin 2006 yılında 17 km olan tesviyeli yolu 2007 yılında 9 km düşürülmüştür. Ayrıca 188 km olan stablize kaplamalı yol km'si 201 km 'ye çıkartılmıştır. Kovancılar ilçesine yol ve ulaşım hizmetleri için 1.097.500.00 YTL yatırım yapılmıştır.

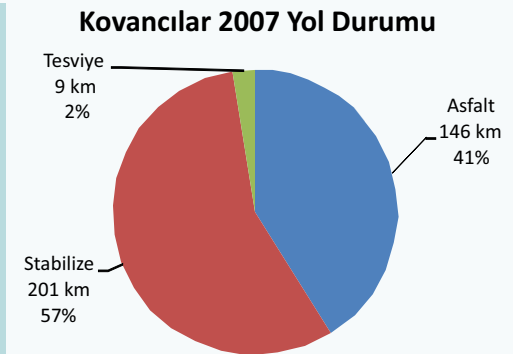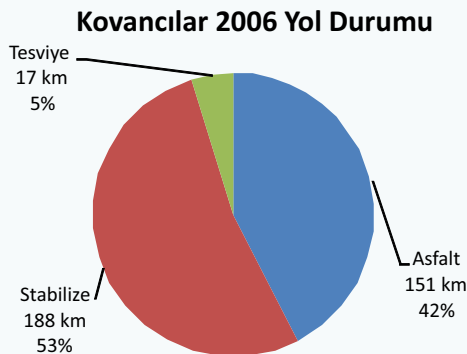

Maden ilçemizde 2006 yılında 5 km olan Hamyol kmsi 2007 yılında 2 km düşürülmüştür. 89 km olan asfalt kaplamalı yol kmsi 2007 yılı çalışmalarından sonra 106 km yükselmiştir. Maden İlçesine yol ve ulaşım hizmetleri için 887.500.00 YTL yatırım yapılmıştır.

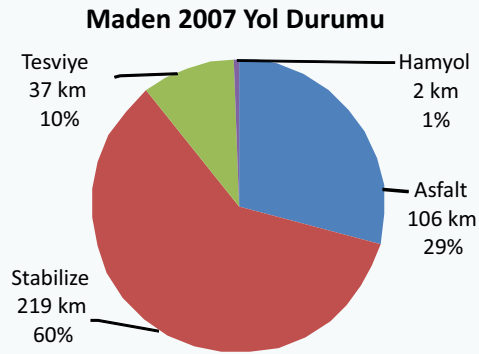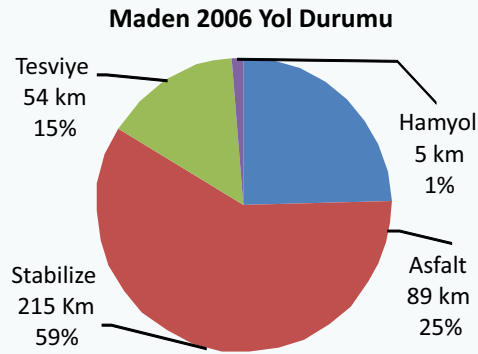


Palu ilçemizde 2006 yılında 66 km olan asfalt kaplamalı yol kmsi 2007 yılında 68 km yükseltilmiştir. Palu İlçesine yol ve ulaşım hizmetleri için 900.500.00 YTL yatırım yapılmıştır.

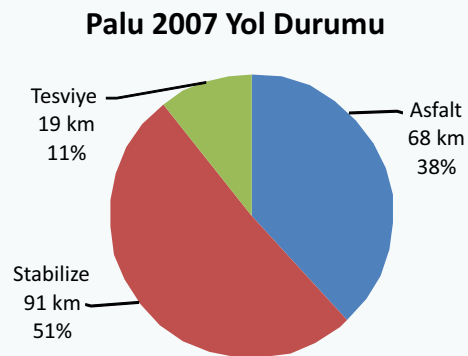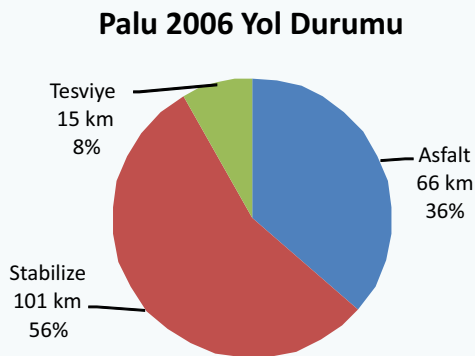


Yol ve Ulaşım Hizmetleri Yatırımları

Sivrice ilçemizde ise; 2 km olan ham yol 2007 yılında tamamen iyileştirilmiş olup, ilçemizde 2007 yılında ham yol bulunmamaktadır. Aynı ilçemizde 2006 yılı sonunda 71 km olan asfalt kaplamalı yol 2007 yılında 84 km çıkarılmıştır. Sivrice İlçesine yol ve ulaşım hizmetleri için 509.000.00 YTL yatırım yapılmıştır.

Sivrice 2006 Yol Durumu

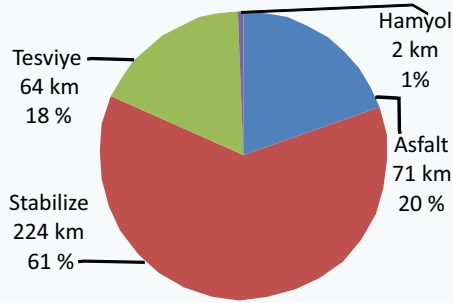

Sivrice 2007 Yol Durumu

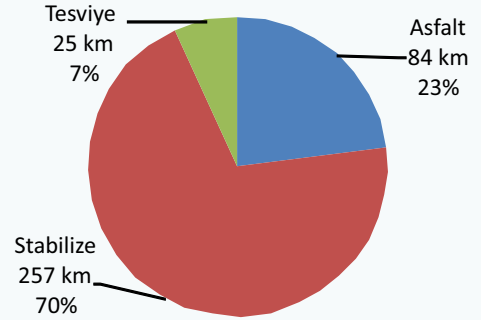



1930'lu Yıllarda Cumhuriyet Meydanındaki Yol Levhası

Su ve Kanal
Hizmetleri
Yatırımları



Su ve Kanal
Hizmetleri
Yatırımları



Su ve Kanal
Hizmetleri
Müdürlüğü
2007 Yılı
Yatırımları

2007 YILI SU KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ						
HİZMET TÜRÜ	PROGRAM	EK PROGRAM	TOPLAM	UYGULAMA	ÖDENEK	HARCAMA
Yapım (Ünite)	185		185	185	7.595.000,00	6.618.325,00
Onarım (Adet)						
Limit (Ünite)	Yeni İş					
	İkmal Onarım					
ASKERİ GARNİZON	Yapım	1	1	1	50.000,00 TL	35.545,92 TL
	Limit (Yeni)					
	Limit (İkmal)					
SONDAJ (Ünite)	Yeni	45	45	45		
	Askeri Garnizon	1	1	1		
	Malzeme Alımı					
TOPLAM					7.645.000,00 TL	6.653.870,92 TL



2007 yılında KÖYDES Projesi kapsamında 185 ünite de içme suyu çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar esnasında 500.000 Metrenin üzerinde kazı ve PVC boru döşemesi yapılmıştır. Yapılan kazı ve PVC boru döşemesinin 102.523 metresi İl Özel İdare si makine ve personeli ile gerçekleştirilmiştir.

Yine 45 adet yerleşim yerlerine içme suyu amaçlı sondaj kuyusu açılmış. Bunun 34 adedi İl Özel İdaresinin iş makineleri ve personeli ile gerçekleştirilmiştir. Toplam sondaj derinliği 5.553 metredir.

Ayrıca 105 ünite de içme suyu amaçlı (kaynak araştırma ve geliştirme) drenaj çalışması yapılmıştır. Bunun yanında 54 ünite de içme suyu amaçlı (elektrik nakil hattı) ENH projesi gerçekleştirilmiştir.

2007 yılı sonu itibariyle hizmet alanımızdaki 544 köyün 531'i (% 98) şebekeye kavuşturulmuştur. Çeşmeli 14 köyün 7'i baraj altında kalması, toprak kayması, heyelan gibi afetten veya yerleşimin az olması veya hiç olmamasından dolayı şebekeli içme suyuna kavuşturulamamıştır. Geri kalan 7 köyümüzde ise yer üstü kaynakları yeterli olmadığından yer altı suları arama çalışmalarından sonuç alınamadığından tesis yapılamamıştır. 2008 yılında bu köylerimizde alternatif çalışmalarımız devam edecektir. Yine 729 mezranın 534'ü şebekeli, 125'i 7 hanenin altında, 70'i şebekesiz durumdadır. İl Genel Meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda 7 hane altında yerleşim yerlerine kapalı şebeke içme suyu götürülmesi ihtiyacını çeşmeli olarak karşılanması ile ilgili karardan dolayı yapılmamış, 7 hane ve altındaki üniteler çıkarıldığından mezralarda şebeke oranı % 88'dir. açılan alan 1.000 Ha. dır.

Kanalizasyon

2006 yılında kanalizasyon tesisi bulunan yerleşim yeri sayısı 66 iken, yeni tesis ikmal edilerek, bu sayı 31/12/2007 tarihi itibarıyla 75'e çıkarılmıştır.

2007 yılında KÖYDES projesi kapsamında kanalizasyon ve arıtma tesisleri için ödenek ayrılmazken yapımı gerçekleştirilen bu 9 adet kanalizasyon tesisinin 8 adedi DOKAB, 1 adedi ise Özel İdare tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Merkez- Tadım ve Ağın –Saraycık köylerimizin kanalizasyon tesislerini geliştirmek; Alacakaya Çataklı köyümüze de yeni tesis yapılması için Özel İdare bütçesinden toplam 440.000 YTL. Ödenek ayrılarak ilgili köylerimizin sorunları giderilmiştir

Yine 2007 yılında Özel İdare kanalıyla malzeme, işçilik, bakım ve onarım olmak üzere toplam 9 adet iş P.E olarak gerçekleştirilmiş olup, bu işler için yaklaşık 76.000.00 YTL. Harcama yapılmıştır.



Sulama

İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme birlikleri eliyle yapılan 3 adet sulama suyu projesi ikmal edilmiştir. Toplam 130 Ha alan sulamaya açılmıştır.

2500 metre Drenflex boru alımı yapılarak 12 köyün sulama suyu drenaj çalışmalarında kullanılmıştır.

17.554 Mt muhtelif çapta sulama borusu alınarak, 25 köy ve mezranın sulama suyu isalesi yapılmış olup, yaklaşık 250 Ha alan sulamaya açılmıştır.

İl Özel İdaresi araçları kullanılarak, 15 köy ve mezranın sulama suyu araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalarda toplam 5.000 mt drenaj yapılmıştır.

Ayrıca, Elazığ 2.Kısım Arazi toplulaştırma işi (Dallica-Fatmalı-Muratçık-Koruk-Pirinçci) 2007 yılında 993.658,00 YTL. Ödenmiştir.110 km tarla içi yol ve parsel planlamaları yapılmıştır.

2.000.000 YTL ödenek aktarıldığı takdirde yılı içerisinde proje doğrultusunda 3.614 Ha alan sulama açılacaktır.

Elazığ Baskil-Gemici- Konacık-Hacıhüseyin –Çiğdemlik köyleri sulama suyu pompa revize işi yaptırılmıştır. Daha önce sulamaya açılmış alanlardan olup, pompaların arızalanması sebebiyle sulama yapılamamıştır. Pompaların revizesiyle sulamaya açılan alan 1.000 Ha.dır.


Ayrıca Sivrice Ilıncık köyü sulamasında kullanılmak üzere pompa alımı yapılmıştır. Bu pompa alımından sonra bu yörede de 20 Ha alan sulamaya açılmış bulunmaktadır. Toplam olarak sulamaya açılan 5.014 Ha.dır.

Su ve Kanal
Hizmetleri
Müdürlüğü
2007 Yılı
Faaliyetleri


ELAZIĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ KÖY İÇMESUYU DURUM TABLOSU

MERKEZ	HİZMET İÇİ								HİZMET DIŞI		GENEL TOPLAM		TOPLAM ÜNİTE
	SULU		YETERSİZ		SUSUZ		TOPLAM		KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	
	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI					
ŞEBEKELİ	131	155											
ÇEŞMELİ	1	16											
TOPLAM	132	171											

Ünite Bazında

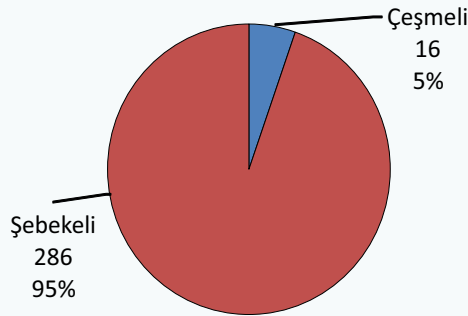


Köy Bazında

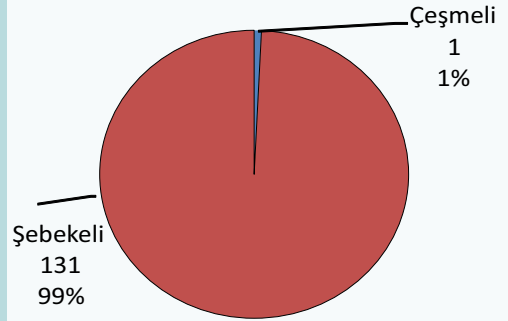


ELAZIĞ İLİ AĞIN İLÇESİ KÖY İÇMESUYU DURUM TABLOSU

AĞIN	HİZMET İÇİ								HİZMET DIŞI		GENEL TOPLAM		TOPLAM ÜNİTE
	SULU		YETERSİZ		SUSUZ		TOPLAM		KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	
	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI					
ŞEBEKELİ	16	6											
ÇEŞMELİ		1											
TOPLAM	16	7											

Ünite Bazında

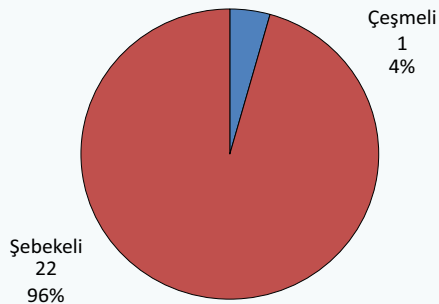


Köy Bazında

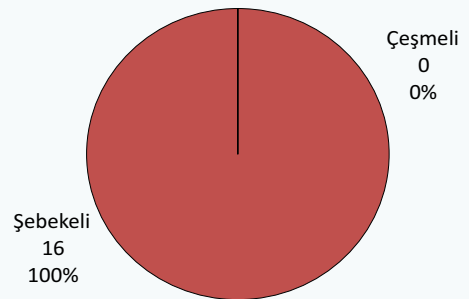


ELAZIĞ İLİ ALACAKAYA İLÇESİ KÖY İÇMESUYU DURUM TABLOSU

ALACAKA YA	HİZMET İÇİ								HİZMET DIŞI		GENEL TOPLAM		TOPLAM ÜNİTE
	SULU		YETERSİZ		SUSUZ		TOPLAM		KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	
	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI					
ŞEBEKELİ	12	12											
ÇEŞMELİ		3											
TOPLAM	12	15											

Ünite Bazında

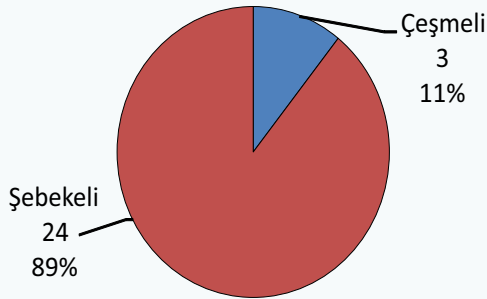


Köy Bazında

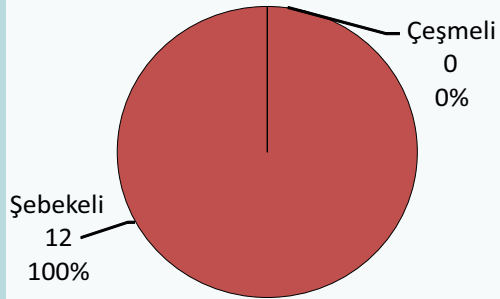


ELAZIĞ İLİ ARICAK İLÇESİ KÖY İÇMESUYU DURUM TABLOSU

ARICAK	HİZMET İÇİ								HİZMET DIŞI		GENEL TOPLAM		TOPLAM ÜNİTE
	SULU		YETERSİZ		SUSUZ		TOPLAM		KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	
	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI					
ŞEBEKELİ	10	8											
ÇEŞMELİ													
TOPLAM	10	8											

Ünite Bazında

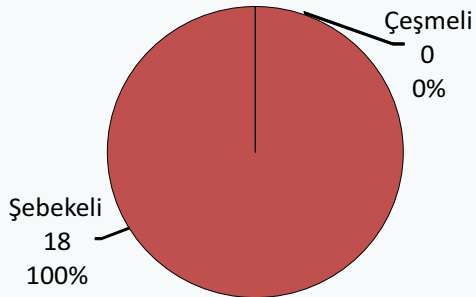

Köy Bazında

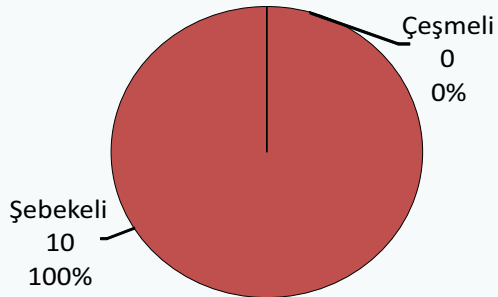


Su ve Kanal
Hizmetleri
Müdürlüğü
2007 Yılı
Faaliyetleri


ELAZIĞ İLİ BASKIL İLÇESİ KÖY İÇMESUYU DURUM TABLOSU

BASKIL	HİZMET İÇİ								HİZMET DIŞI		GENEL TOPLAM		TOPLAM ÜNİTE
	SULU		YETERSİZ		SUSUZ		TOPLAM		KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	
	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI					
ŞEBEKELİ	58	135											
ÇEŞMELİ	4	68											
TOPLAM	62	203											

Ünite Bazında

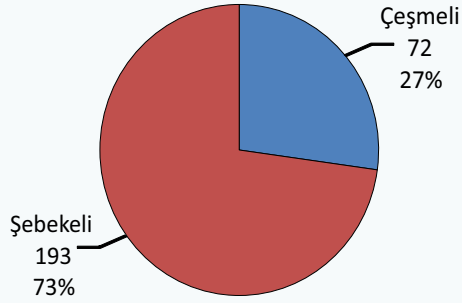


Köy Bazında

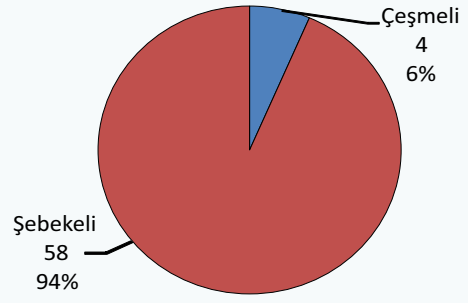


ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ KÖY İÇMESUYU DURUM TABLOSU

KARAKOÇAN	HİZMET İÇİ								HİZMET DIŞI		GENEL TOPLAM		TOPLAM ÜNİTE
	SULU		YETERSİZ		SUSUZ		TOPLAM		KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	
	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI					
ŞEBEKELİ	83	30											
ÇEŞMELİ	2	22											
TOPLAM	85	52											

Ünite Bazında

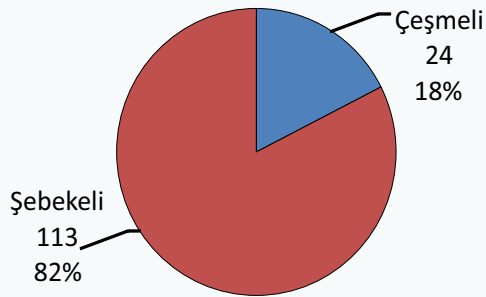


Köy Bazında

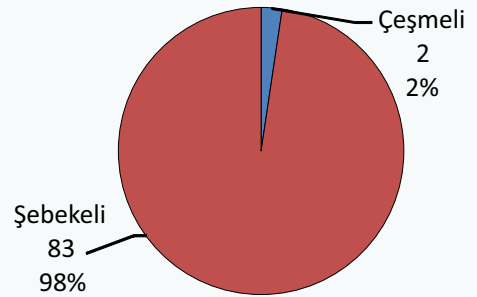


ELAZIĞ İLİ KEBAN İLÇESİ KÖY İÇMESUYU DURUM TABLOSU

KEBAN	HİZMET İÇİ								HİZMET DIŞI		GENEL TOPLAM		TOPLAM ÜNİTE
	SULU		YETERSİZ		SUSUZ		TOPLAM		KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	
	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI					
ŞEBEKELİ	29	26											
ÇEŞMELİ	1	13											
TOPLAM	30	39											

Ünite Bazında

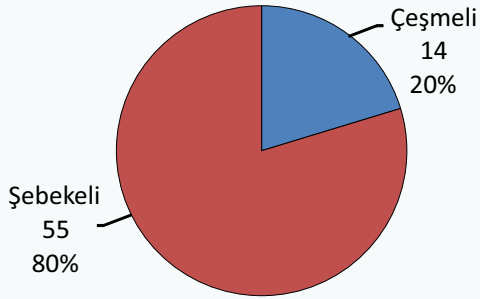


Köy Bazında

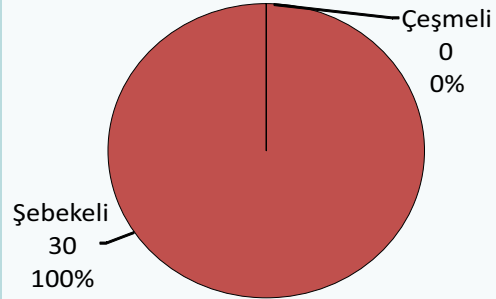


ELAZIĞ İLİ KOVANCILAR İLÇESİ KÖY İÇMESUYU DURUM TABLOSU

KOVANCILAR	HİZMET İÇİ								HİZMET DIŞI		GENEL TOPLAM		TOPLAM ÜNİTE
	SULU		YETERSİZ		SUSUZ		TOPLAM		KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	
	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI					
ŞEBEKELİ	69	23											
ÇEŞMELİ	5	25											
TOPLAM	74	48											

Ünite Bazında

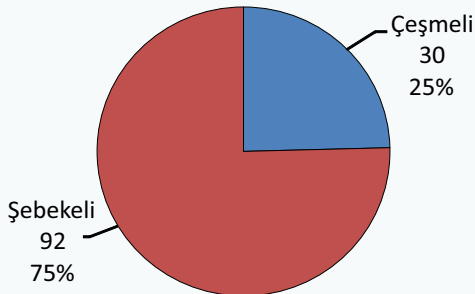

Köy Bazında

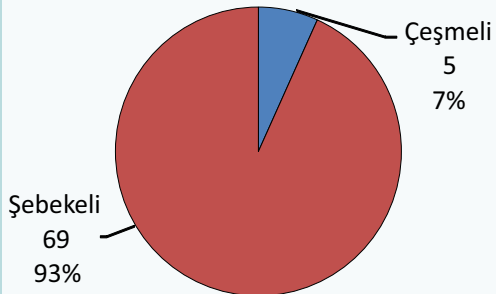


Su ve Kanal
Hizmetleri
Müdürlüğü
2007 Yılı
Faaliyetleri


ELAZIĞ İLİ MADEN İLÇESİ KÖY İÇMESUYU DURUM TABLOSU

MADEN	HİZMET İÇİ								HİZMET DIŞI		GENEL TOPLAM		TOPLAM ÜNİTE
	SULU		YETERSİZ		SUSUZ		TOPLAM		KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	
	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI					
ŞEBEKELİ	36	62											
ÇEŞMELİ	1	10											
TOPLAM	37	72											

Ünite Bazında

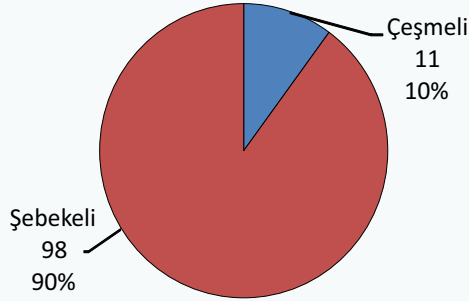


Köy Bazında

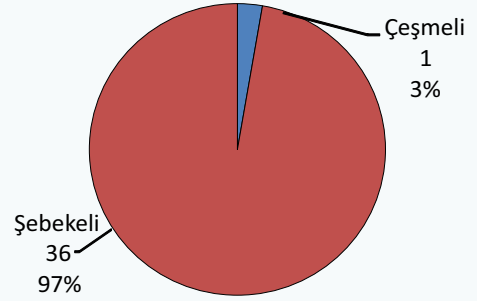


ELAZIĞ İLİ PALU İLÇESİ KÖY İÇMESUYU DURUM TABLOSU

PALU	HİZMET İÇİ								HİZMET DIŞI		GENEL TOPLAM		TOPLAM ÜNİTE
	SULU		YETERSİZ		SUSUZ		TOPLAM		KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	
	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI					
ŞEBEKELİ	35	18											
ÇEŞMELİ		7											
TOPLAM	35	25											

Ünite Bazında

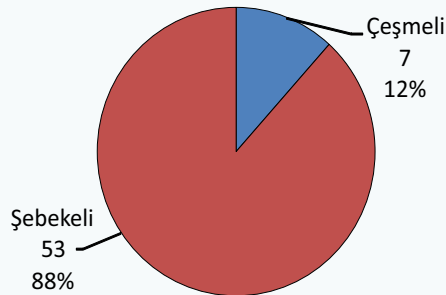

Köy Bazında

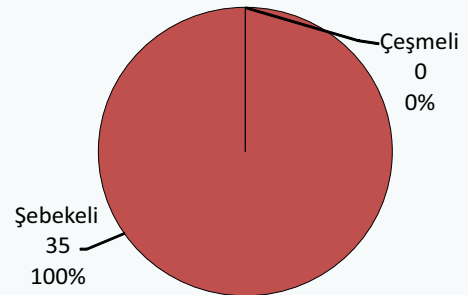


ELAZIĞ İLİ SIVRICE İLÇESİ KÖY İÇMESUYU DURUM TABLOSU


SIVRICE	HİZMET İÇİ								HİZMET DIŐI		GENEL TOPLAM		TOPLAM ÜNİTE
	SULU		YETERSİZ		SUSUZ		TOPLAM		KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	
	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI	KÖY	BAĞLI					
ŐEBEKELİ	49	59											
ÇEŐMELİ	1	30											
TOPLAM	50	89											

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
2007 Yılı Faaliyetleri

Ünite Bazında

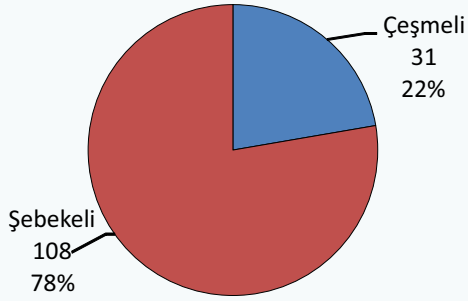

Köy Bazında

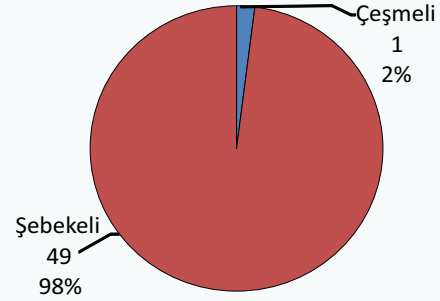

Elazığ İli
Kalkındırma
ve Köylere
Hizmet
Götürme
Birliği

Elazığ
İlçesi
Merkez
Elazığ İli Kalkındırma ve Köylere Hizmet Götürme Birliği

İli
İlçesi
Yarıncık

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Büçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Kavaklınar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	56.327,43	35.104,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
2.	Sarıyakup Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	13.874,67	3.646,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
3.	Bezdemiş Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	12.362,47	5.806,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
4.	Kazılık Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	16.697,09	13.783,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
5.	Gölçe Köyü 60 Konulluk Y.Y.Y.	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	33.114,72	28.570,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
6.	Kapanuşağı Köyü Yeni Cami Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	83.527,24	44.940,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
7.	Uçaçık Köyü Kurucay Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	23.020,91	12.843,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
8.	Kurudere Köyü Kölemşmeç Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	24.012,99	12.655,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
9.	Göl Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	36.046,63	21.398,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
10.	Sarıbük Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	20.530,33	15.024,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
11.	Pirinci Köyü Ve Jandarma K.K.	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	54.515,14	36.902,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
12.	Kıvılcık Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	106.409,91	68.719,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
13.	Örencay Köyü Çatalbent Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	35.533,92	14.754,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
14.	Geçdiköy Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	12.002,74	6.830,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
15.	Kavaklı Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	93.127,03	48.265,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
16.	Gölçe Köyü Yeni Meh. Keson Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	28.827,05	25.815,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
17.	Yenişlik Köyü Karababa Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	32.010,90	22.521,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
18.	İşiyolu Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	39.212,57	22.519,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
19.	Dambüyük Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	16.738,14	7.078,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
20.	Ehildik Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	36.508,49	12.044,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
21.	Dağankuş Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	10.771,73	4.928,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
22.	Şarısar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	33.230,21	23.241,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
23.	Konuk Köyü Ortahan Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	37.514,12	24.881,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
24.	Aydınçık Köyü Düzülür Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	42.970,49	26.812,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

İli: Elazığ
İlçesi: Merkez
Yatırımçı: Elazığ İli Kalkındırma ve Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
25.	Halı	Su ve Kanall Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	117.945,11	107.705,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
26.	Kurudere Köyü Ekinli Mezrası	Su ve Kanall Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi	KÖYDES	54.163,85	39.169,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
27.	Alibeyköy Düzürler Mezrası	Su ve Kanall Hizmetleri	Sondaj	KÖYDES	21.819,53	14.449,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
28.	Öksüzşuğu Köyü Ve Mezraları	Su ve Kanall Hizmetleri	Sondaj	KÖYDES	24.547,31	18.903,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
29.	Karacalı Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	Sondaj	KÖYDES	24.547,31	13.983,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
30.	Doğankuş Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	Sondaj	KÖYDES	17.728,61	5.522,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
31.	Ünverken Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	Sondaj	KÖYDES	24.547,31	19.229,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
32.	Tadım Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	Sondaj	KÖYDES	24.547,31	19.811,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
33.	Hidribaba Köyü Gürdal Mezrası	Su ve Kanall Hizmetleri	Sondaj	KÖYDES	24.547,31	21.130,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
34.	Sedeftepe Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	Sondaj	KÖYDES	24.547,31	20.355,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
35.	Nuralı Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	Sondaj	KÖYDES	24.547,31	21.948,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
36.	Körpe Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	Sondaj	KÖYDES	24.547,31	23.069,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
37.	Koçkale Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	28.439,00	17.802,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
38.	Aşağı-Yukarı Demirtaş Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	36.736,00	21.878,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
39.	Göbaralı Köyü Sarıca Mezrası	Su ve Kanall Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	40.521,00	24.487,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
40.	Sarıllı Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	66.839,00	37.054,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
41.	Kozluk Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	14.517,00	10.371,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
42.	Gökçe Köyü Y.Y.Y.	Su ve Kanall Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	9.070,00	7.297,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
43.	Uçtağaç Köyü Kurucay Mezrası	Su ve Kanall Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	7.754,00	4.501,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
44.	Karalı Köyü Ayrınlı Mezrası	Su ve Kanall Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	25.622	19.478,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
45.	Göl Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	53.049	29.448,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
46.	Gümbüşbağlar Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	10.391,01	7.461,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
47.	Doğankuş Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	34.681,42	23.600,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
48.	Aydıncık Köyü Düzürler Mezrası	Su ve Kanall Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	58.641,58	34.340,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

Elazığ İli
Kalkındırma
ve Köylere
Hizmet
Götürme
Birliği

Elazığ
İlçesi
Merkez
Yatırma
Elazığ İli Kalkındırma ve Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektör	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düğünceler
49.	Yemilik Köyü Karababa Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	30.774,95	17.110,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
50.	Karuk Köyü Ortahan Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	6.124,52	3.186,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
51.	Kayulu Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	58.338,70	32.630,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
52.	Alpaatı Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	10.268,99	8.239,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
53.	Çip Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	8.956,28	7.634,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
54.	Hal Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu ENH	KÖYDES	44.916,30	28.561,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
55.	Merkez Köylere	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Boru ve Mz. Alımı	KÖYDES	218.009,00	218.009,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
56.	Merkez Köylere	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Boru ve Mz. Alımı	KÖYDES	124.279,00	124.279,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
57.	Kuyulu Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Boru ve Mz. Alımı	KÖYDES	192.934,00	192.934,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
58.	Merkez Köylere	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	16.151,85	16.151,85	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
59.	Alinkuşak Kırpe Yolu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KÖYDES	187.407,00	85.225,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
60.	Aftemel - Temel Ve Mırcı Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KÖYDES	749.483,00	169.182,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
61.	Alinkuşak Kırpe Yolu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KÖYDES		77.372,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
62.	Aftemel - Temel Ve Mırcı Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KÖYDES		232.993,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
63.	Aftemel - Temel Ve Mırcı Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KÖYDES		139.269,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
64.	Köy Yoluna Malzeme Taşıma	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KÖYDES	102.546,43	34.737,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
65.	Köy Yoluna Malzeme Taşıma	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KÖYDES	105.398,09	25.664,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
66.	Köy Yoluna Malzeme Taşıma	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KÖYDES		35.578,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
67.	Köy Yoluna Malzeme Taşıma	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KÖYDES		10.957,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
68.	Köy Yoluna Malzeme Taşıma	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KÖYDES		28.134,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
69.	Bilüm Naki	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KÖYDES	223.320,00	304.520,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
70.	Akanekir Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KÖYDES	14.703,00	14.703,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
71.	Arac Kiralama İş	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KÖYDES		19.505,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
72.	Dağırtıcı Kiralama	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KÖYDES		17.841,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

İli
İlçesi
Yarınma
Elazığ İlçe
Merkez
Elazığ İl Kalkındırma ve Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektörü	Yarınma Adı	Büçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Dişünceler
73.	Köy Yollarına Temel Malzeme Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KOYDES		178.933,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
74.	Temel Malzeme Ve Micar Taşınma	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KOYDES		17.397,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
75.	Malzeme Yükleme Nakli Ve Figure İşi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KOYDES		114.139,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
76.	Sanbuk Köyü Yol Betonlaması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KOYDES	41.278,93	32.604,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
77.	Köy Yollarına Temel Malzeme Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KOYDES		45.608,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
78.	Bağlarca Köyü B.A Köprü Yapımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KOYDES	113.008,25	77.094,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
79.	Gökçe Mollaçlı Köprü Yapımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KOYDES	243.516,34	75.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
80.	Merkez Köyler	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KOYDES	6.358,32	100.038,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
81.	Merkez Köyler	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yolları	KOYDES	14.415,97	6.358,32	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
82.	Araç Bakım Ve Onarımı	Araç Bakım Onarımı	Araç Bakım Onarımı	ÖZEL İDARE	50.323,00	50.323,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
83.	Kapalı Spor Salonu	Bakım Onarım	Kapalı Spor Salonu Bakım Onarımı	ÖZEL İDARE	72.228,00	72.228,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
84.	Vali Konağı	Bakım Onarım	Vali Konağı Garaj Yapımı	ÖZEL İDARE	85.655,00	85.655,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
85.	İdaim Köyü	Konaklaşyon	Fosfoçuk Yapımı	ÖZEL İDARE	19.999,00	19.999,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
86.	Bilim Ve Sanat Merkezi	Eğitim Hizmetleri	Bilim ve Sanat Merkezi Bakım Onarımı	ÖZEL İDARE	38.103,00	38.103,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
87.	Araç Kiralama İşi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Araç Kiralaması	ÖZEL İDARE	79.805,00	79.805,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
88.	Kal - Yak Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Asfalt Malzemesi için Kal-Yak Alımı	ÖZEL İDARE	55.951,00	55.951,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
89.	Umutaria Köyü	Eğitim Hizmetleri	Okul Bakım Onarımı	ÖZEL İDARE	50.000,00	50.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
90.	Çev. Ölç. Ve Ara. Labo.	Bakım Onarım	Cihaz Alımı	ÖZEL İDARE	429.973,28	429.973,28	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
91.	Merkez Köyler	Eğitim Hizmetleri	Kitap Alımı	ÖZEL İDARE	97.440,00	97.440,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
92.	Merkez Köyler	Orman	11 Köve Tel ve Cid Alımı	ÖZEL İDARE	46.631,00	46.631,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
93.	DOKAP	Personel Giderleri	Personel Giderleri	ÖZEL İDARE	10.776,39	10.776,39	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
94.	Köy Yolları	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Cihaz Alımı	ÖZEL İDARE	29.754,00	29.754,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
95.	Elazığ Valliliği	Malzeme Alımı	Bilgisayar Alımı	ÖZEL İDARE	30.165,00	30.165,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

Elazığ İli
Kalkındırma
ve Köylere
Hizmet
Götürme
Birliği

Elazığ
İlçe
Merkez
Yatırım
Elazığ İli Kalkındırma ve Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektör	Yatırım Adı	Büçe Türü	Proje Türü	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
97.	Gazi Anadolu Tek.Lise	Eğitim Hizmetleri	AB Hibe Programına Finansman Kalkı	ÖZEL İDARE		12.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
98.	Çallıca Köyü	Sulama Suyu Tesis	Sulama Suyu Tesis Yapımı	ÖZEL İDARE		12.949,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
99.	Kaplıkaya Köyü	Sulama Suyu Tesis	Sulama Suyu Tesis Yapımı	ÖZEL İDARE		30.798,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
100.	Alpaşar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İrnesuyu Tesis Yapımı	ÖZEL İDARE		10.609,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
101.	Yükseldemir Sağ.Öcağı	Sağlık Hizmetleri	Sağlık Öcağı Bakım Onarımı	ÖZEL İDARE		9.940,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
102.	50. Yılı İlköğrenim Okul	Eğitim Hizmetleri	Okul Onarımı	ÖZEL İDARE		14.731,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
103.	Mehmetçik İlköğretim	Eğitim Hizmetleri	Okul Onarımı	ÖZEL İDARE		8.508,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
104.	Kaplıkaya İbo	Eğitim Hizmetleri	Okul Onarımı	ÖZEL İDARE		12.275,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
105.	Güneş Köyü İbo	Eğitim Hizmetleri	Okul Onarımı	ÖZEL İDARE		4.008,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
106.	Elazığ İl. Kalk. Kİgb	Malzeme Alımı	Bilgisayar Programı Alımı	BİRLİK		1.770,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
107.	Elazığ Vailiği	Bakım Onarım	Elazığ Vailiği Garajı Yapımı	BİRLİK		23.600,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
108.	8.Kahraman Kam.	Su ve Kanal Hizmetleri	İrnesuyu Temini Matapomp Alımı	BİRLİK		16.180,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
109.	Yalı Konagi	Malzeme Alımı	Kamera Sistemi Kurulumu	BİRLİK		6.849,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
110.	Mellekn'd Jan. Karakol	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BİRLİK		8.791,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
111.	Henkendi Jan. Karakol	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BİRLİK		4.001,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
112.	Poyraz Jan. Karakol	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BİRLİK		11.839,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
113.	Araç Bakım Ve Onarımı	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BİRLİK		7.063,80	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
114.	Elazığ İl. Kgl. Ve Kİgb	Personel Giderleri	Personel Giderleri	BİRLİK		46.638,87	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
115.	Elazığ İl. Kgl. Ve Kİgb	Hizmet Alımı	Telefon Kullanım Gideri	BİRLİK		1.910,75	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
116.	Kavakınar Köyü	Eğitim Hizmetleri	Kütüphane Yapımı	BİRLİK		997,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
117.	Kanık Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İrnesuyu Tesis Geliştirme	BİRLİK		2.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
118.	Başdere Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Köy Çeşmesi Onarımı	BİRLİK		2.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
119.	Doğanuş Köyü	Bakım Onarım	Köy Kanagi Yapımı	BİRLİK		3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
120.	Kozluk Köyü	Sulama Suyu Tesis	Sulama Suyu Tesis Yapımı	BİRLİK		6.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

İli Elazığ
İlçesi Merkez
Yatırımca Elazığ İli Kalkındırma ve Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektör	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
121.	Beypazarı Köyü	Sulama Suyu Tesisi	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
122.	Ceşeli Köyü	Sulama Suyu Tesisi	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	BRLİK	4.000,00	4.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
123.	Gölmehmut Köyü	Bakım Onarım	Köy Kanacağı Yapımı	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
124.	Arnalık Köyü	Sulama Suyu Tesisi	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	BRLİK	4.000,00	4.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
125.	Sarıbük Köyü	Sulama Suyu Tesisi	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
126.	Sarısuvar Köyü	Sulama Suyu Tesisi	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	BRLİK	4.000,00	4.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
127.	Besoluk Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İrnesuyu Tesis Geliştirme	BRLİK	1.500,00	1.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
128.	Prinççi Köyü	Bakım Onarım	Köy Odası Yapımı	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
129.	Kuyulu Köyü	Bakım Onarım	İmanevi Yapımı	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
130.	Aleca Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İrnesuyu Temini Motopomp Alımı	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
131.	Yanlıca Köyü	Bakım Onarım	Cami Yapımı	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
132.	Yarınar Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
133.	Kovakınar Köyü	Bakım Onarım	Köy Kanacağı Yapımı	BRLİK	4.000,00	4.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
134.	Kepaktaş Köyü	Bakım Onarım	Kütüphane Yapımı	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
135.	Kuşhane Köyü	Eğitim Hizmetleri	Bakım Onarım	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
136.	Karaktepe Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İrnesuyu Drenajı	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
137.	Karucu Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
138.	Çağlar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İrnesuyu Temini Motopomp Alımı	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
139.	Güzelyalı Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
140.	Obuz Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Çeşme ve Havuz Yapımı	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
141.	Kırpa Köyü	Bakım Onarım	Cami İnşaatı Yapımı	BRLİK	4.000,00	4.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
142.	Hat Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İrnesuyu Sondajı Borusu Alımı	BRLİK	4.000,00	4.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
143.	Çallıca Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	1.000,00	1.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
144.	Fatmalı Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

Elazığ İli
Kalkındırma
ve Köylere
Hizmet
Götürme
Birliği

İli Elazığ
İlçesi Merkez
Yanımca Elazığ İli Kalkındırma ve Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektör	Yatırım Adı	Büçe Türü	Proje Türü	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Dişinceler
145.	Avçılı Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
146.	Hıdırbaşa Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
147.	Beşik Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	5.000,00	5.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
148.	Oymağaç Köyü	Sulama Suyu Tesisi	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	BRLİK	2.500,00	2.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
149.	Harmantepe Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
150.	Yükarçalkmak Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	2.500,00	2.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
151.	Cevizdere Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
152.	Sarıbüyük Köyü	Eğitim Hizmetleri	Bakım Onarım	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
153.	Sedeftepe Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Çeşme ve Çevre Düzenlenmesi	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
154.	Yolçatı Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
155.	Avdınlık Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İrimesuyu Tesisi	BRLİK	2.500,00	2.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
156.	Muratlı Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
157.	Yükarıbağ Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Çeşme ve Havuz Yapımı	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
158.	Meşeli Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
159.	Karacavus Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
160.	Balıca Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
161.	Sarıtepe Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Çeşme ve Havuz Yapımı	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
162.	Beşikli Köyü	Bakım Onarım	Bakım Onarım	BRLİK	2.000,00	2.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
163.	Beşik Köyü	Sulama Suyu Tesisi	Sulama Suyu Drenaj Çalışması	BRLİK	4.000,00	4.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
164.	Beljınar Köyü	Sulama Suyu Tesisi	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	BRLİK	3.000,00	3.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

Alacakaya
Köylere
Hizmet
Götürme
Birliđi

İli Elazığ
İlçesi Alacakaya
Yatırımcı Köylere Hizmet Götürme Birliđi

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Çakmakçaya Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt	KÖYDES	140.250,00	127.378,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
2.	Çakmakçaya Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES	65.000,00	83.801,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
3.	Halkalı Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2.Kat Asfalt	KÖYDES	3.750,00	3.750,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
4.	Çarıklı Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES	104.000,00	153.266,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
5.	Çakmakçaya Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	32.500,00	41.378,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
6.	Esenlik Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	65.000,00	113.279,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

Ağın
Köylere
Hizmet
Götürme
Birliği

İli Elazığ
İlçesi Ağın
Yatırıma Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bütçe	Proje	Harcama	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Samançay Köyü Armutlu Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	26.680,00	25.131,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
2.	Bademli Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	10.912,00	9.295,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
3.	A.Yabanlı Köyü O.Yabanlı Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	10.000,00	547,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
4.	Kaşınar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	10.000,00	6.933,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
5.	Öğrendik	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1.Kat Asfalt	KÖYDES	217.700,00	185.457,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
6.	Başınar	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1.Kat Asfalt	KÖYDES	20.620,00	20.620,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
7.	Alıncaya Balkayası Modanlı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2.Kat Asfalt	KÖYDES	21.180,00	21.180,00	70%	Proje Devam Etmektedir.
8.	Sarıcak	Su ve Kanal Hizmetleri	Kanalizasyon	ÖZEL İDARE	175.000,00	175.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
9.	Okul bakım onarım	Eğitim	Kalorifer yapımı	ÖZEL İDARE	14.000,00	13.570,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
10.	Sağlık Ocağı onarımı	Sağlık Hizmetleri	Bakım onarım	ÖZEL İDARE	1.000,00	1.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
11.	Ağın İlçesi Köyleri	Su ve Kanal Hizmetleri	Klorlama cihazı takımı	Birlik	13.300,00	13.300,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
12.	Bahadırar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Artezyen kuyusu motor değ.	Birlik	1.500,00	1.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
13.	Sarıcak	Su ve Kanal Hizmetleri	Kepeç çalıştırma	Birlik	1.459,00	1.459,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
16.	Samançay Köyü, Gümüşsu ve Armutlu mezarları	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize kaplama	Birlik	6.720,00	6.720,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

İli Elazığ
İlçesi Maden
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Yatırma

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Selerli	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	36.597,14	38.250,81	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
2.	Çalkaya	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	48.210,93	54.970,90	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
3.	Dülpınar	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	61.257,18	61.537,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
4.	Nıradiken Merkez	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	54.892,81	63.869,36	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
5.	Tepecik	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	33.724,53	34.830,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
6.	Küçükoşa	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	32.340,75	34.535,69	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
7.	Tekevirler Merkez	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	25.478,67	24.190,00	70%	Proje Devam Etmektedir.
8.	Halı	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	23.458,71	28.290,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
9.	Özurt	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	63.629,89	71.140,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
10.	Çarekli	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	12.453,00	11.002,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
11.	Kızıltepe	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	28.785,03	29.889,68	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
12.	Sağrılı	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	15.040,28	15.516,59	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
13.	Sarıkavak	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	8.340,00	8.340,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
14.	Küçükoşa Köyü-Tepecik-Tekevirler-Balçedere-Hazarıyolu-Altıntarla	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Yol Hizmetleri	KÖYDES	602.963,90	486.313,00	10%	Proje Devam Etmektedir.
15.	Kaşlıca-Ağadibek-Hatunköy-Gezin Küçükoşa-Yesilova- Küçük ova -Gezin Kartaldere	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Yol Hizmetleri	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
16.	Kartaldere 2 Adet	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Yol Hizmetleri	KÖYDES	54.014,18	38.935,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
17.	Kartaldere	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Yol Hizmetleri	KÖYDES	246.337,00	96.679,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
18.	Kayalar - Seyh Bayram	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Yol Hizmetleri	KÖYDES		181.366,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
19.	Örtülü Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Yol Hizmetleri	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
20.	Hatunköy	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Yol Hizmetleri	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
21.	Çakıroğlu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Yol Hizmetleri	KÖYDES	145.467,00	82.269,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
22.	Kaşlıca	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Yol Hizmetleri	KÖYDES	29.013,00	20.059,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
23.	Bakımevi Bakım Onarım	Bakım Onarım	Bakım Onarım	ÖZEL İDARE	6.000,00	6.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
24.	Atatürk İ.Ö.O.	Eğitim Hizmetleri	Bakım Onarım	ÖZEL İDARE	11.000,00	11.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
25.	Janaratör	Yardımlar	Bakım Onarım	ÖZEL İDARE	7.000,00	7.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
26.	Köylere Yardım	Yardımlar	Yardımlar	ÖZEL İDARE	15.000,00	15.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
27.	Y.B.İ.O. Bakım Onarımı	Eğitim Hizmetleri	Bakım Onarım	ÖZEL İDARE	20.000,00	20.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
28.	Anaokulu Tefrişat Alımı	Eğitim Hizmetleri	Malzeme Alımı	ÖZEL İDARE	35.000,00	35.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
29.	Semt Sahası Yapımı	Spor Hizmetleri	Saha Yapımı	ÖZEL İDARE	75.000,00	75.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
30.	Okul Bakım Onarımı	Eğitim Hizmetleri	Bakım Onarım	ÖZEL İDARE	15.000,00	15.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

Kovancılar
Köylere
Hizmet
Götürme
Birliği

İli Elazığ
İlçesi Kovancılar
Yatırımca Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bölçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düğünceler
1.	Gedikyurt Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	176.689,00	99.126,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
2.	Muratbağı Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	83.778,00	47.021,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
3.	Güneşli Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	44.902,00	27.800,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
4.	Kavak Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	112.848,00	76.800,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
5.	Kaplıdere Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	70.696,00	34.900,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
6.	Fahribey Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	88.604,00	68.507,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
7.	Sogaanlı Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Sondaç	KÖYDES	20.919,00	16.900,00	70%	Proje Devam Etmektedir.
8.	Sultanbağı Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	52.443,00	33.700,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
9.	Kökkan Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	65.894,00	32.910,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
10.	Durmuşlar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	52.077,00	47.550,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
11.	İnceadalı Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	32.048,00	25.318,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
12.	Topağaç Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	15.285,00	12.075,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
13.	Ekinözü Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	15.560,00	12.292,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
14.	Süreklili Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis	KÖYDES	51.379,00	40.589,00	10%	Proje Devam Etmektedir.
15.	PVC Barı Alımı	Su ve Kanal Hizmetleri	Malzeme Alımı	KÖYDES		125.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
16.	Okçular - Bayramyazı - Fahribey Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1.Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
17.	Salkımlı Köyü - Çakırkaş Beldesi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1.Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
18.	Kaçar Köyü - Karasungur	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1.Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
19.	Özel Hareker Tb.Yolu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1.Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
20.	Okçular - Bayramyazı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1.Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
21.	Karasungur - Isaoğlu-Yoncalıbayır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2.Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
22.	Bespınar Köyü - Fahribey Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2.Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
23.	Kavak Köyü - Tepebağı Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2.Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.

İli Elazığ
İlçesi Kovancılar
Yatırım Kovayra Hizmet Götürme Birliđi

S.No	Yeri	Sektör	Yatırım Adı	Büçe Türü	Proje Türü	Harcama Türü	Gerçekleşme	Düğünceler
24.	Aş.Mirahmet - Aş.Demirci	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2.Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
25.	Köprüdere - Y.Köy	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2.Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
26.	Gedikyurt	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2.Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
27.	Davali Mezrası - Esentepe	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
28.	Aş.Mirahmet - Hoşirık	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
29.	Selinkomu - İğdeli	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
30.	Değirmenözü - Karınca - Beyazpınar	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
31.	Karasungur - Beşoluk	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
32.	Yukarı Mirahmet - Sürekli	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
33.	Kayalık - Y.Demirci - Çiftlik	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
34.	Bayramyazı - Çakırkaş	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
35.	Micir ve Temel Malzeme Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Malzeme Alımı	KÖYDES		808.748,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
36.	Akayaklı Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Malzeme Alımı	KÖYDES		210.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
37.	Fazla Mesai Ödemesi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Fazla Mesai	KÖYDES		86.160,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
38.	İş Makinesi Kiralaması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Araç Kirası	KÖYDES		122.300,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
39.	Kamyon Kiralama	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Araç Kirası	KÖYDES		113.568,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
40.	Büz Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Malzeme Alımı	KÖYDES		15.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
41.	İşç Ücreti	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	İşç Ücreti	KÖYDES		8.800,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
42.	Çaybağı - M. Ağa Mezrası	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Mentef	KÖYDES		79.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
43.	Uyanık - Osmangöğü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Mentef	KÖYDES		38.827,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
44.	Nişankaya	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Mentef	KÖYDES		24.254,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
45.	İstinat Duvarı - Kum Çimento	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Mentef	KÖYDES		25.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
46.	Okul Onarımları	Eğitim Hizmetleri	Bakım Onarım	ÖZEL İDARE		85.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
47.	Sağlık Onarımları	Sağlık Hizmetleri	Bakım Onarım	ÖZEL İDARE		31.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
48.	Sulama Suyu Tesis İnşaatı	Tarım Hizmetleri	Tesis İnşaatı	ÖZEL İDARE		140.000,00	50%	Proje Devam Etmektedir.

Karakoçan
Köylere
Hizmet
Götürme
Birliği

İli İlçesi Yatırımca
Elazığ Karakoçan Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Büçe Türü	Proje Tutarı	Harçama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Durmuş	Su ve Kanall Hizmetleri	Yeni Tesis	KOYDES	110.000,00	67.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
2.	Çavuşlu - Çayırık Mezarası	Su ve Kanall Hizmetleri	Yeni Tesis	KOYDES	117.401,00	77.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
3.	Behçek Köyü	Su ve Kanall Hizmetleri	Yeni Tesis	KOYDES	88.998,00	44.950,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
4.	Alabal - Değirmendere	Su ve Kanall Hizmetleri	Tesis	KOYDES	53.905,00	36.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
5.	Gündoğdu	Su ve Kanall Hizmetleri	Yeni Tesis	KOYDES	16.026,00	8.902,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
6.	Okçular - Gelincik Mezarası	Su ve Kanall Hizmetleri	Tesis	KOYDES	35.676,00	18.750,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
7.	Yeniköy	Su ve Kanall Hizmetleri	Tesis	KOYDES	12.622,00	6.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
8.	Alınoluk	Su ve Kanall Hizmetleri	Tesis	KOYDES	14.678,00	9.900,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
9.	Kümbet - Dokuzveren Mezarası	Su ve Kanall Hizmetleri	Yeni Tesis	KOYDES	38.515,00	26.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
10.	Ozlüce	Su ve Kanall Hizmetleri	Yeni Tesis	KOYDES	41.189,00	39.900,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
11.	Yenice	Su ve Kanall Hizmetleri	Sondaj	KOYDES	25.746,00	20.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
12.	İsabay	Su ve Kanall Hizmetleri	Sondaj	KOYDES	27.355,00	22.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
13.	Maksutalı	Su ve Kanall Hizmetleri	Sondaj	KOYDES	30.574,00	24.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
14.	PYC Boru Alımı	Su ve Kanall Hizmetleri	Sondaj	KOYDES	93.430,09	700.776,36	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
15.	Arac Kırması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Arac Kırması	KOYDES	700.776,36	63.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
16.	Fazla Mesai Ödemesi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Fazla Mesai	KOYDES	63.000,00	63.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
17.	Akaryakıt Gideri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Arac Kırması	KOYDES	102.938,46	102.938,46	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
18.	Arac Kiralama Gideri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Arac Kirası	KOYDES	119.500,00	119.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
19.	Spiral Sarımsık Boru Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Boru Alımı	KOYDES	34.250,08	34.250,08	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
20.	Tekardık - Yoğuncak Grup Yolu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Astalt Yol Yapımı	KOYDES	54.000,00	41.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
21.	Alınoluk-Kengeri-A.Ovacık-Güllüce - Yüzveler - Kuşçu - Deveci	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Astalt Yol Yapımı	KOYDES	217.000,00	160.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
22.	Yalıntaş - Sarcaviz Mezarası	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	25.000,00	18.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
23.	Ağamzasarı - Seyhüseyin Mezarası	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	23.300,00	19.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
24.	Sarıhan - Doğançukuru Mezarası	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	64.000,00	49.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
25.	Sağın - Yemişlik Mezarası	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	29.000,00	18.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
26.	Akarbaşı - İlberiz Mezarası	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	92.000,00	60.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
27.	Okçular Köyü İçi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	17.000,00	12.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
28.	Çiçek Köyü İçi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	27.000,00	19.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
29.	Beydere	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	86.000,00	60.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
30.	Akbulak - Malsutalı - Akyokuş Grup Yolu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	162.000,00	98.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
31.	Peşayaylası Mevki	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	100.000,00	68.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
32.	Akbulak - Deveci - Gözerek - Yenice-Alınoluk - Hemzalı - Bahçecik - Doğanöğlü - İsabay - Ayoğuş - Cümhuriyet - Kümbet - Köyüsufl - Yüzveler - Kırğılı - Boraklı - Omanlık - Beydere - Dal - Kolluca - Kaşığıllar - Akarbaşı - Çayırdom	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	20.278,00	14.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
33.	Soğucak - Ağamzasarı - Doğanöğlü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	92.850,00	49.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
34.	Okçular - Gelincik Köyü Mezarası	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	7.060,00	4.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
35.	Plavrepa	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	19.310,00	14.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
36.	Akarbaşı - İlberiz - Akyokuş Grup Yolu - Doğanöğlü - Çallıkaya Grup Yolu Deveci Yolu - Okçular Mezarası Boru Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	62.710,00	49.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
37.	Bazlama Köyü İçi Boru Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	15.183,00	14.900,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
38.	Yücelkonak - Çavuşoğlu Boru Alımı İçi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KOYDES	13.712,00	10.900,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

İli Elazığ
İlçesi Arıcak
Yatırımına Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektör	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Bükardı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize-Onarım-1. Kat Asfalt	KÖYDES	255.500,00	255.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
2.	Yeğünbilek	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2. Kat Asfalt	KÖYDES	6.250,00	6.250,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
3.	Karakaş	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize-Onarım	KÖYDES	26.000,00	26.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
4.	Erimli-Güvenevler	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize-Onarım	KÖYDES	65.000,00	65.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
5.	Külize - İlca	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize-Onarım	KÖYDES	13.000,00	13.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
6.	Albayrak - Akıldız	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize-Onarım	KÖYDES	65.000,00	65.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
7.	Doğanyurt - Güvenevler	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize-Onarım	KÖYDES	65.000,00	65.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
8.	Çevrecik - Y.Blek - G. Tepe	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize-Onarım	KÖYDES	104.000,00	104.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
9.	Kutludüğün	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize-Onarım	KÖYDES	65.000,00	65.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
10.	Erimli - Cumhuriyet	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize-Onarım	KÖYDES	52.000,00	52.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
11.	Bükardı - Dicle	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize-Onarım	KÖYDES	40.000,00	40.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
12.	Gözepe - Çevrecik - Göründü - Karakaş	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize-Onarım	ÖZEL İDARE	50.000,00	50.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
13.	Arıcak - Alacakaya	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize-Onarım	ÖZEL İDARE	58.000,00	58.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
14.	Bozcavuş	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	14.000,00	14.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
15.	Karakaş	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	28.000,00	28.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
16.	Kayahisar	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	KÖYDES	28.000,00	28.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
17.	Kutludüğün	Su ve Kanal Hizmetleri	Onarım	ÖZEL İDARE	10.000,00	10.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
18.	Köy Yardımları	Köy Yardımları	Köy Yardımları	ÖZEL İDARE	10.000,00	10.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
19.	Arıcak-Merkez 12 Derslik İÖO Yapımı	Eğitim Hizmetleri	Okul Yapımı	ÖZEL İDARE	455.000,00	455.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
20.	Okul Onarımları	Eğitim Hizmetleri	Okul Bakım Onarımı	ÖZEL İDARE	55.000,00	55.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
21.	Köy Okulları Çevre Duvarı Yapımı	Eğitim Hizmetleri	Sanat Yapıları	ÖZEL İDARE	20.000,00	20.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır

Sivrice
Köylere
Hizmet
Götürme
Birliği

İli
İlçesi
Sivrice
Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Büçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düğünceler
1.	Gelindere Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	207.699,96	169.122,82	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
2.	Düzbahçe Beyler Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	41.441,02	19.129,48	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
3.	Düzbahçe Karzıran Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	28.825,55	17.739,81	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
4.	Soğukpınar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	57.772,30	39.248,45	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
5.	Uslu Yence Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	82.240,41	35.547,08	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
6.	Ürgüç Cambağ Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	61.810,77	33.404,15	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
7.	Yarusağı	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	58.420,78	30.481,71	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
8.	Yürekkaya	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	50.723,48	24.305,43	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
9.	Süreç Gölcük Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	94.514,81	57.536,52	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
10.	Düzbahçe Gökmenler Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	32.979,89	22.231,94	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
11.	Akseli Teşni Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	24.523,94	16.225,35	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
12.	Tarlalepe Tilkı Deresi	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	3.655,25	2.557,65	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
13.	Yardıncılar Ahtaş Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	43.365,89	20.521,95	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
14.	Kamışlık Eski Köy	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	32.020,22	21.240,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
15.	Düzbahçe Değirmenönü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	8.053,34	5.785,54	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
16.	Yürekkaya	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	52.005,58	36.052,54	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
17.	Mollaali Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES		18.000,90	80%	Proje Devam Etmemektedir.
18.	Bekçitepe Kamışlık Kayataş	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES		31.775,91	80%	Proje Devam Etmemektedir.
19.	Sivrice Köyleri	Su ve Kanal Hizmetleri	PVC Boru Alımı	KÖYDES		111.932,81	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
20.	Kösebayır - Dedeyolu - Bekçitepe Yedipınar - Kavak - Gözeli - Duğulu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. - ve 2. Kat Asfalt Yol Yapımı	KÖYDES	259.784,36	232.463,06	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
21.	Düzbahçe - Kamışlık	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt Yol Yapımı	KÖYDES	155.249,88	153.489,38	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
22.	Hazar Gölü Güney Sahil Yolu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize Yol Yapımı (Serme-Sulama-Sıkıştırma)	KÖYDES	510.847,96	304.155,62	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
23.	Hazar Gölü Güney Sahil Yolu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize Yol Yapımı (Yol Genişleme-Kıy Tahkimat)	KÖYDES	401.605,61	184.737,59	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
24.	Sivrice Köyleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Asfalt Yol Yapımı (Araç Kirası)	KÖYDES		53.890,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
25.	Sivrice Köyleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Asfalt Yol Yapımı (Araç Kirası)	KÖYDES		15.500,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
26.	Sivrice Köyleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Asfalt Yol Yapımı (Araç Kirası)	KÖYDES		7.670,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
27.	Hazar Gölü	Müşavirlik Hizmetleri	Harita Üretimi Kıy Kenar Çizgisi Tespiti	ÖZEL İDARE	177.000,00	129.800,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
28.	Sivrice	Eğitim Hizmetleri	Sivrice Merkez 18 Derslik İ.O.Yapım	ÖZEL İDARE	1.012.000,00	767.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
29.	Sivrice Gözeli	Eğitim Hizmetleri	Sivrice Gözeli 6 Daireli Öğretmen Lojmanı	ÖZEL İDARE	465.750,00	277.300,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
30.	Başkaynak - Akbuğday	Eğitim Hizmetleri	Başkaynak -Akbuğday Elbisian I.Ö.O. Ve Lojman Onarımı	ÖZEL İDARE	40.532,32	40.304,86	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
31.	Elmasuyu Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Sonat Yapısı (Köprü Yapımı)	KÖYDES	60.533,44	36.552,90	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

İli Elazığ
İlçesi Palu
Yatırımca Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Kasıl	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
2.	Gömeçbağlar	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
3.	Karasalkım	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
4.	Keklikdere	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
5.	Seydilli	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
6.	Tarhana	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
7.	Yeşilbayır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
8.	Kuşhane - Baltası	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
9.	Keklikdere	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2. Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
10.	Seydilli	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2. Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
11.	Kayaönü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2. Kat Asfalt	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
12.	Köklüce - Dolukçük - Bük	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
13.	Büyükkalın	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
14.	Bölükkelma	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
15.	Küçükçalın	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
16.	Atık	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
17.	Basenk	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
18.	Kırıkbulak	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
19.	Gem Tepe	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
20.	Burgu Dere	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
21.	Tarhana	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.

Palu
Köylere
Hizmet
Götürme
Birliği

İli Elazığ
İlçesi Palu
Yatırımca Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düğünceler
22.	Kasıl	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
23.	Yeşil Boyur	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
24.	Seydilli	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
25.	Örgülü - Balkaya - Karasalkım	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
26.	büyükçalı - Bölükelma -Küçükcalı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
27.	Kökütçe - Dolukçük-Bük	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Onarım	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
28.	Atık - Basenk - Kırıkbulak	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Onarım	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
29.	Gemtepe - Burgu Dere -Iarhana	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Onarım	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
30.	Kasıl - Yeşilboyur	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Onarım	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
31.	Seydilli - Örgülü Mezra Yolu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Onarım	KÖYDES			100%	Proje Gerçekleşmiştir.
32.	Üçdeğirmenler	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köprü	KÖYDES		107.188,77	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
33.	Mıdır ve Temel Malzeme Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Malzeme Alımı	KÖYDES		216.884,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
34.	Mıdır ve Temel Malzeme Nakil	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Araç Kirası	KÖYDES		70.310,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
35.	Baks ve Büz Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Malzeme Alımı	KÖYDES		42.050,67	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
36.	Fazla Mesai Ödemesi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Fazla Mesai	KÖYDES		57.705,26	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
37.	İş Makinesi ve Araç Kiralama	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Araç Kirası	KÖYDES		413.045,39	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
38.	Akaryakıt Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Malzeme Alımı	KÖYDES		81.893,60	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
39.	İş Makinesi ve Araç Kiralama	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Yükleyici	KÖYDES		30.208,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
40.	İş Makinesi ve Araç Kiralama	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Silindir	KÖYDES		7.689,86	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
41.	İş Makinesi ve Araç Kiralama	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Eskavatör	KÖYDES		33.630,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
42.	Beton Boru Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Malzeme Alımı	KÖYDES		1.570,58	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
43.	İş Makinesi ve Araç Kiralama	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Kamyon	KÖYDES		24.400,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
44.	Akaryakıt Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Malzeme Alımı	KÖYDES		40.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

Elazığ
Baskil
Köylere Hizmet Götürme Birliği

İli
İlçesi
Yatırım

S.No	Yeri	Sektör	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Habibuşağı - Konaçk	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	47.668,00	29.793,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
2.	Akdemir	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	259.600,00	109.355,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
3.	Kızıluşağı - Konaçk - Yenioçak	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	233.407,00	141.459,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
4.	İşıklar	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	273.169,00	172.892,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
5.	Bozoğlak	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	58.475,00	36.320,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
6.	Suyatağı	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	26.360,00	17.652,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
7.	Gemici - Alibaba	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	98.715,00	62.876,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
8.	Hacı Mustafa	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	118.400,00	69.981,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
9.	Tatlıpoyam	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	176.500,00	124.171,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
10.	Kumlutarla	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	225.000,00	173.851,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
11.	Aşağı Kuluşağı - İskender	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	16.771,00	9.052,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
12.	Beşbölük	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	5.900,00	3.340,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
13.	Taşanuşağı	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	19.800,00	14.170,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
14.	Resulkehya	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	79.257,00	49.228,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
15.	Karakaş - Ardıçlı	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	55.015,00	34.601,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
16.	Karaali	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	198.320,00	106.462,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
17.	Yukarı Kuluşağı	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	118.418,00	73.223,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
18.	Doğancık - Yukarı Mahalle	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	11.825,00	7.277,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
19.	Akuşağı - Öreşluşağı	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	34.229,00	21.957,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
20.	Aladikme	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	378.100,00	291.279,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
21.	Kuflugün	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	29.118,00	18.763,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
22.	Pınarlı	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	54.587,00	35.785,00		Proje Gerçekleşmiştir.
23.	Eskiköy	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	179.686,00	113.637,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
24.	Deliktaş	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	94.973,00	62.398,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
25.	Karagedik - Kazuşağı	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	37.479,00	24.180,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
26.	PVC Boru Alımı	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Temini	KÖYDES	772.101,00	551.501,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

Baskil
Köylere
Hizmet
Götürme
Birliği

İli Elazığ
İlçesi Baskil
Yatırma Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
27.	Yukarı Kuluşağı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES	75.376,00	57.018,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
28.	Şahindere	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES	24.737,00	20.783,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
29.	Konalga - Ovack	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES	9.962,00	9.794,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
30.	Emirhan - Keçili	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES	33.765,00	26.016,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
31.	Konacak	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES	18.301,00	11.800,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
32.	Bozoğlak	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES	12.003,00	10.608,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
33.	Yaylan - Fırat	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES	27.555,00	25.491,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
34.	Karaali	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES	32.951,00	19.175,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
35.	Hacı Hüseyinler	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES	41.781,00	27.435,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
36.	Kulugün	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES	36.470,00	29.488,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
37.	Kızıluşağı - Çıgdemlik	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES	98.700,00	69.620,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
38.	Sarıtaş - Ballıca	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES	60.781,00	55.400,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
39.	Şahaplı - Kömürhan	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Sanat Yapısı	KÖYDES	325.283,00	174.034,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
40.	Tatlıpayam	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Sanat Yapısı	KÖYDES	38.704,00	25.075,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
41.	Harabakoyş	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Sanat Yapısı	KÖYDES	41.947,00	27.140,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
42.	Eskiköy - Künlügün Grup Yolu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Asfalt Yol Yapımı	KÖYDES	751.641,00	604.902,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
43.	Kumullarla	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Asfalt Yol Yapımı	ÖZEL İDARE	292.000,00	182.061,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
44.	Şahaplı - Kömürhan	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Araç Kirası	ÖZEL İDARE	162.600,00	108.606,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
45.	Fazla Çalışma Ücreti	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Asfalt Yol Yapımı	KÖYDES	30.574,00	30.574,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
46.	Gemicic Pompa Revizesi	Su ve Kanal Hizmetleri	Sulama Pompa Revizesi	ÖZEL İDARE	174.640,00	140.420,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
47.	Meydanak	Su ve Kanal Hizmetleri	Kapalı Sulama Sistemi	ÖZEL İDARE	44.000,00	32.440,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
48.	Okul Onarımları	Eğitim Hizmetleri	Okul Onarımları	ÖZEL İDARE	589.026,00	301.823,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.

İli
İlçesi
Yatırımcı

Elazığ
Keban
Köylere Hizmet Götürme Birliği

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düğünceler
1.	Alhyaka Köyü-Deşe Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Yapımı	KÖYDES	29.952,22	25.402,57	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
2.	Kurşunkaya Köyü-Soğanlı Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Yapımı	KÖYDES	67.329,71	48.211,97	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
3.	Örenyaka Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İsale hattı Yapımı	KÖYDES	53.776,78	51.338,85	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
4.	Alınkürek Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İsale hattı Yapımı	KÖYDES	32.798,22	21.996,62	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
5.	Örenyaka Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	PVC boru alımı	KÖYDES	18.661,20	11.266,05	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
6.	Kurşunkaya Köyü-Soğanlı Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	PVC boru alımı	KÖYDES	19.871,08	11.837,76	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
7.	Alınkürek Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	PVC boru alımı	KÖYDES	13.394,65	14.640,26	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
8.	Bademli Köyü-Sıno Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	PVC boru alımı	KÖYDES	12.150,87	7.547,16	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
9.	KÖYDES Projeleri için	Su ve Kanal Hizmetleri	PVC boru alımı	KÖYDES	20.000,00	19.317,07	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
10.	Göldere Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Yapımı	KÖYDES	77.467,58	58.705,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
11.	Bademli Köyü-Sıno Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Yapımı	KÖYDES	86.282,65	38.534,24	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
12.	Göldere Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	A.G-E.N.H.	KÖYDES	22.094,78	13.405,98	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
13.	Beşdeğirmeni Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İsale hattı Yapımı	KÖYDES	31.911,67	24.780,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
14.	Aslankaşı Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Drenaj çalışması	KÖYDES	7.161,62	5.664,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
15.	Beşdeğirmeni-Aslanlı,Soğuldur, Taşkesen, Bademli,Aşoğçakmak, Kuşçu, Üçpınar, Zırkı Grup Yolu(Keban-Örenyaka)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1 ve 2 kat asfalt yol yapımı için	KÖYDES	109.469,55	56.640,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
16.	Beşdeğirmeni-Aslanlı,Soğuldur, Taşkesen Bademli,Aşoğçakmak, Kuşçu, Üçpınar, Zırkı Grup Yolu(Keban-Örenyaka)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	4.000-m3 mcar nakli	KÖYDES	93.182,32	61.359,88	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
17.	Zırkı Grup Yolu (Keban -Örenyaka arası)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Rolbis nakli	KÖYDES	7.434,00	4.672,80	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
18.	Üçpınar-Kuzucuk(Baskıl)-Soğulsu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize yol yap.	KÖYDES	68.061,22	36.906,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
19.	Alhyaka - Cabbarşağı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize yol yap.	KÖYDES	91.957,40	56.027,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
20.	Güneytepe-Gesan	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize yol yap.	KÖYDES	64.963,72	43.070,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
21.	Kopuzlu Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1.kat asf.malz.na	KÖYDES	93.108,68	92.032,57	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
22.	Dürümlü Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1.kat asf.malz.na	ÖZEL İDARE	55.154,71	60.364,97	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
23.	Dürümlü ve Kopuzlu Köyleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	4430-m3.elektrikli malzeme nakli	ÖZEL İDARE	56.392,60	44.801,36	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
24.	İlçe ve Köy İlgilendirme Okulları	Eğitim Hizmetleri	Okul Bakım Onarım	ÖZEL İDARE	5.000,00	5.000,00	100%	Proje Gerçekleşmiştir.
25.	İlçe Merkez	Spor Hizmetleri	Futbol Sahasının çimlendirilmesi ve onarımı	ÖZEL İDARE	44.051,12	31.860,00		Proje Devam Etmektedir.

Gençlik
ve Spor
İl Müdürlüğü

İl Kültür
ve Turizm
Müdürlüğü

Gençlik
ve Spor
İl Müdürlüğü

İl
İlçesi
Yatırımcı

Elazığ
Merkez
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düğünceler
1.	Merkez	Spor Hizmetleri	Ahmet AYTAZ Spor Salonu Parke ve Çatı Onarımı	ÖZEL İDARE	80.000,00	80.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
2.	Keban	Spor Hizmetleri	Toprak Zeminli Sahanın Çimlendirilmesi ve Alt Yapısının Geliştirilmesi	ÖZEL İDARE	30.000,00	30.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
3.	Merkez	Spor Hizmetleri	Spor kütüphanelerine Spor Malzemesi Yardımı	ÖZEL İDARE	40.000,00	40.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.

İl
İlçesi
Yatırımcı

Elazığ
Merkez
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düğünceler
1.	Elazığ Merkez	Kültür Hizmetleri	Koro Binası Bakım Onarımı	Özel İdare	13.000,00	11.280,80	100%	Proje Tamamlanmıştır.
2.	Elazığ Merkez	Kültür Hizmetleri	Kültür Merkezi İnşaatı	Genel İdare	400.000,00	518.360,00	15%	Proje Devam Etmemektedir.
3.	Elazığ Merkez	Kültür Hizmetleri	Harput Koruma Amaçlı İmar Planı	Genel İdare	458.000,00	34.196,40	10%	Proje Devam Etmemektedir.
4.	Elazığ Merkez	Kültür Hizmetleri	Altyapı Uygulamaları	Genel İdare	185.000,00	185.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.

İl
İlçesi
Yatırımcı

Elazığ
Merkez
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düğünceler
1.	Elazığ Merkez	Sosyal Hizmetler	Huzurevi Ek Bina İnşaatı	Hibe	1.500.000,00	1.000.000,00	66%	Proje Devam Etmemektedir.
2.	Elazığ Merkez	Sosyal Hizmetler	Özürlü Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı	Genel İdare	3.000.000,00	18.000,00		Proje Devam Etmemektedir.

İlçe Sağlık
Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü

İlçe	Yatırım	Sektör	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Türü	Harama Türü	Gerçekleşme Durumu	Düğümler
1.	Merkez	Sağlık Hizmetleri	Eğitim ve Araştırma Hastanesi	GENEL BÜTÇE	8.000.000,00		Bakanlık Yatırım Programına alınmış yatırım tesis yaptırılmamıştır.	8.000 m ² yüzölçümlü poliklinik, idari ve sosyal unitelerden mevcut
2.	Merkez	Sağlık Hizmetleri	Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi	GENEL BÜTÇE				Orman Bölge Müdürlüğü Derneğine ait toplam 4.000 m ² yüzölçümlü tarlanın kamulaştırma işlemleri başlatılmaktadır.
3.	Karakoşan	Sağlık Hizmetleri	Karakoşan Devlet Hastanesi EK Bina	GENEL BÜTÇE				İdare Alanı 594 m ² , kapalı alan 1.188 m ² yüzölçümlü zemini-1 katlından mevcut ek bina yapımı
4.	Kovançlar	Sağlık Hizmetleri	Kovançlar Devlet Hastanesi EK Bina	GENEL BÜTÇE	6.000.000,00			6.000 m ² yüzölçümlü kapalı alan inşaatı edilecek kompleks mevcut binanın geliştirilmesini, yapı hijyeni sağlanmasını, ek bina yapımı ve diğer yatırımları.
5.	Merkez	Sağlık Hizmetleri	Ruhi Sağlık Hastalıkları Hastanesi EK Bina	GENEL BÜTÇE	3.000.000,00			3.000 m ² kapalı alan inşaatı edilecek bina yapımı poliklinik 80 yataklı kapalı servis ve sağlık kuruluşunu yapımı.
6.	İbalo	Sağlık Hizmetleri	Pabuç Devlet Hastanesi	GENEL BÜTÇE				Mevcut binanın geliştirilmesini, yapı hijyeni sağlanmasını, hastane hizmet binası yapımı.
7.	Arcak	Sağlık Hizmetleri	Toplum Sağlık Merkezi ve 8 Adet Lujman	GENEL BÜTÇE	1.075.754,95		Proje bitirilmemiştir.	Bakanlık bütçesinden yatırım bütçe ayrılmıştır.
8.	Merkez	Sağlık Hizmetleri	Yurtbaşı Aile Sağlık Merkezi	ÖZEL İDARE	222.211,65		2007 yılında hizmete alınmıştır.	Toplam 599,26 m ² oturum oduna, 2070,26 m ² kapalı alana sahip tesis
9.	Sivrice	Sağlık Hizmetleri	Sivrice Toplum Sağlık Merkezi	ÖZEL İDARE	485.701,93		Proje bitirilmemiştir.	350 m ² oturum oduna 350 m ² kapalı alana sahip 1. katlı binadır. Binanın
10.	Alacakaya	Sağlık Hizmetleri	Alacakaya Toplum Sağlık Merkezi	ÖZEL İDARE	584.939,50		2007 yılında hizmete alınmıştır.	227,35 m ² oturum oduna, 832 m ² kapalı alana sahip bodrum zemin kat+ 1 katlı
11.	Merkez	Sağlık Hizmetleri	1. Basamak Sağlık Tesisi Küçük Bakım	ÖZEL İDARE		220.000,00	2007 yılında % 20 Fazla Gerçekleşme sağlanmıştır.	mevcut toplam sağlık merkezi binası.
12.	Merkez	Sağlık Hizmetleri	1. Basamak Sağlık Tesisi Büyük Bakım	ÖZEL İDARE		390.057,00		315 m ² oturum oduna, 1.040 m ² kapalı alana sahip toplam sağlık merkezi yapımı.
								45 tane 1 basamak sağlık tesislerinin küçük bakım onarımı gerçekleştirilmiştir.
								4 tane 1 basamak sağlık tesislerinin büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiştir.

İl Elazığ
İlçesi Merkez
Yatırımcı İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Düşünceler
1.	Merkez ve İlçeler	Kentsel İyileştirme	Köy Gelişim Alanı Tahsis	Özel İdare			2007 Yılı içerisinde Karakoçan-Kovanclar-Ağın ve Merkez Köylerden 9 Köy Köy Gelişim alanı için müracaatta bulunmuş olup Köy Gelişim alanı Tespit Komisyonu mahalinde inceleme yapmış olup, iş ve işlemler devam etmektedir.
2.	Merkez ve İlçeler	İmar Hizmetleri	Çevre Düzeni Planı	Özel İdare			İl Çevre Müdürlüğü ile koordinasyonu bir şekilde hazırlanan Hazar Gölü Çevre Düzeni Planı İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tekiğinden sonra İl Genel Meclisine havale edilmiş olup, 03.07.2007 tarih ve 119 sayılı karar ile onaylanmıştır.
3.	Merkez ve İlçeler	Ruhsatlandırma	Denetim - Kum Ocağı	Özel İdare			2007 yılında İlîmiz Merkez ve İlçelerde kurulan toplam 21 adet Kum Ocağına Çalışma Ruhsatı verilmiş olup, 3 Ocak Ruhsat aşamasında, 9 Ocağın ise müracaatları değerlendirilmektedir.
4.	Merkez ve İlçeler	Ruhsatlandırma	Denetim - GSM	Özel İdare			2007 yılında İlîmiz Merkez ve İlçelerde bulunan GSM 172 adet işyeri denetlenmiş olup, denetlenen 153 işletmenin uygun 19'u uygun olmadığı görülmüştür.
5.	Merkez ve İlçeler	Ruhsatlandırma	Denetim - S.Müesses	Özel İdare			2007 yılında İlîmiz Merkez ve İlçelerde bulunan SMüesses 284 adet işyeri denetlenmiş olup, denetlenen 225 işletmenin uygun 59'u uygun olmadığı görülmüştür.
6.	Merkez ve İlçeler	Kentsel İyileştirme	Denetim - Kaçak Yapı	Özel İdare			2007 yılında İlîmiz Merkez ve İlçelerde 8 adet yapı denetlenmiş olup, denetlenen yapılardan ruhsatlandırma işlemleri başlatılmış olup, iş ve işlemler devam etmektedir.
7.	Merkez ve İlçeler	Ruhsatlandırma	İnşaat Ruhsatı	Özel İdare			2007 yılında İlîmiz Merkez ve İlçelerde 30 adet inşaat yapım ruhsatı verilmiş olup, 3 ise yapı kullanım izin belgesi verilmiştir.

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

İl
Milli Eğitim
Müdürlüğü

İli Elazığ
İlçesi Merkez
Yatırımca İl Millî Eğitim Müdürlüğü

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Merkez	Eğitim Hizmetleri	Gazi İlköğretim Okulu Yapımı	ÖZEL İDARE	1.076.820,00	232.887,00	10%	Proje Devam Etmemektedir.
2.	Arcak	Eğitim Hizmetleri	Arcak İlköğretim Okulu Yapımı	ÖZEL İDARE	597.872,00	455.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
3.	Alacakaya	Eğitim Hizmetleri	Çatalklı İlköğretim Okulu Yapımı	ÖZEL İDARE	570.984,00	426.749,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
4.	Arcak	Eğitim Hizmetleri	Bükardı İlköğretim Okulu Yapımı	ÖZEL İDARE	576.191,00	419.191,33	100%	Proje Tamamlanmıştır.
5.	Sivrice	Eğitim Hizmetleri	Atatürk İlköğretim Okulu Yapımı	ÖZEL İDARE	522.416,00	472.307,30	100%	Proje Tamamlanmıştır.
6.	Sivrice	Eğitim Hizmetleri	Celal İLALDI YİBO Deprem Güçlendirilmesi	ÖZEL İDARE	126.000,00	86.947,43	100%	Proje Tamamlanmıştır.
7.	Sivrice	Eğitim Hizmetleri	Cumhuriyet YİBO Deprem Güçlendirilmesi	ÖZEL İDARE	2.896.577,00	2.832.050,53	100%	Proje Tamamlanmıştır.
8.	Karakoçan	Eğitim Hizmetleri	300 Öğrenci Kapasiteli YİBO Pansiyon Binası Yapımı	ÖZEL İDARE	523.000,00	152.581,00	10%	Proje Devam Etmemektedir.
9.	Merkez	Eğitim Hizmetleri	Yazkonak Anaokulu Yapım İşİ	ÖZEL İDARE	523.000,00	0,00	0%	Proje Devam Etmemektedir.
10.	Merkez	Eğitim Hizmetleri	Sürsürü Anaokulu Yapım İşİ	ÖZEL İDARE	1.125.000,00	800.000,00	70%	Proje Devam Etmemektedir.
11.	Sivrice	Eğitim Hizmetleri	Sivrice İlköğretim Okulu Yapımı	ÖZEL İDARE	1.125.000,00	153.184,15	10%	Proje Devam Etmemektedir.
12.	Merkez	Eğitim Hizmetleri	Ziya GÖKALP İlköğretim Okulu Yapımı	ÖZEL İDARE	900.000,00	230.782,00	20%	Proje Devam Etmemektedir.
13.	Polu	Eğitim Hizmetleri	Beyhan İlköğretim Okulu Yapımı	ÖZEL İDARE	150.000,00	0,00	0%	Proje Devam Etmemektedir.
14.	Merkez	Eğitim Hizmetleri	Yenice İlköğretim Okulu Yapımı	ÖZEL İDARE	250.000,00	250.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
15.	Baskil	Eğitim Hizmetleri	YİBO Onarım İşİ	ÖZEL İDARE	197.000,00	0,00	0%	Proje Devam Etmemektedir.
16.	Maden	Eğitim Hizmetleri	Tepecik İlköğretim Okulu Yapımı	ÖZEL İDARE	100.000,00	64.900,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
17.	Merkez	Eğitim Hizmetleri	Yıldızbağları İlköğretim Okulu Yapımı	ÖZEL İDARE	100.000,00	0,00	0%	Proje Devam Etmemektedir.
18.	Polu	Eğitim Hizmetleri	Tarhana İlköğretim Okulu Yapımı	ÖZEL İDARE	100.000,00	0,00	0%	Proje Devam Etmemektedir.
19.	Merkez	Eğitim Hizmetleri	Akçakiraz 60.Yıl İlköğretim Okulu Yapım İşİ	ÖZEL İDARE	100.000,00	0,00	0%	Proje Devam Etmemektedir.
20.	Arcak	Eğitim Hizmetleri	Üççocuk Haberci İlköğretim Okulu Yapım İşİ	ÖZEL İDARE	197.000,00	0,00	0%	Proje Devam Etmemektedir.
21.	Baskil	Eğitim Hizmetleri	Koalköy İlköğretim Okulu Yapım İşİ	ÖZEL İDARE	756.000,00	0,00	0%	Proje Devam Etmemektedir.

İli Elazığ
İlçesi Merkez
Yatırımcı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

S.No	Yeri	Sektör	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Polu							
2.	Baskil							
3.	Sivrice	Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü	Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü	Genel İdare	2.262.000,00	2.247.000,00	100%	1800 ha alanda Yeni Tesis + Dikim + Bakım gerçekleştirilmiştir.
4.	Maden							
5.	Keban							
6.	Merkez							
7.	Maden	Orman Köylüsü	Güneş Enerjisi Su Isıtma	Genel İdare	300.000,00	300.000,00	100%	240 haneye güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi kurulmuştur.
8.	Baskil							
9.	Keban							
10.	Merkez	Ormançılık	Av ve Yaban Hayatı Koruma	Genel İdare	20.000,00	15.063,23	75%	Avcı Eğitimleri ve Doğaya Canlı hayvan yerleştirme
11.	Merkez	Ormançılık	Piknik ve Mesire Yeri Bakım Onarımı	Genel İdare	20.000,00	13.089,24	65%	Piknik Ünitelerinin Bakım Onarımı

İlçe
Bazı
Merkez
İl Tarım Müdürlüğü
Yönergesi

S.No	Yeri	Saklı	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Türü	Harcama Türü	Gerçekleşme	Dağılımlar
1.	Başlı - Karapın Köyü	Tarım Hizmetleri	Su Sulama Tesis Alımı	ÖZEL İDARE	16.225.00	16.225.00	100%	Proje Gerçekleştirilmiştir.
2.	Maden	Tarım Hizmetleri	Patates Tohumu Alımı	ÖZEL İDARE	23.861.25	23.861.25	100%	Proje Gerçekleştirilmiştir.
3.	Kouuk - Honkendi	Tarım Hizmetleri	Erken Uyan Sistemi	ÖZEL İDARE	28.320.00	28.320.00	100%	Proje Gerçekleştirilmiştir.
4.	Merkez ve İlçeler	Tarım Hizmetleri	Apaı Bag Fidanı Dağıtımı	ÖZEL İDARE	150.000.00			Talep olmadıgından proje gerçekleştirilmemiştir.
5.	Merkez ve İlçeler	Tarım Hizmetleri	Çiğci Eğitimi	GENEL İDARE			Sertifikli Hububat Tohumu	20 Köyde toplam 400 Çiğciye eğitim verilmiştir.
6.	Merkez ve İlçeler	Tarım Hizmetleri	Çiğci Eğitimi	GENEL İDARE			Toprak Numune Alımı	26 Köyde toplam 204 Çiğciye eğitim verilmiştir.
7.	Merkez ve İlçeler	Tarım Hizmetleri	Çiğci Eğitimi	GENEL İDARE			Alımları Ürünlerin Etimi	21 Köyde toplam 288 Çiğciye eğitim verilmiştir.
8.	Merkez ve İlçeler	Tarım Hizmetleri	Çiğci Eğitimi	GENEL İDARE			Yoksak Terbiye Sistemi ile Bag	40 Çiğciye %1 İlgellenme-Sulama-Budama konularında teknik yardım
9.	Merkez ve İlçeler	Tarım Hizmetleri	Çiğci Eğitimi	GENEL İDARE			Kurumsalgaına	2007 yılında "Üzüm Yetiştiricileri Birliğı" Kurulmuştur.
10.	Merkez ve İlçeler	Tarım Hizmetleri	Çiğci Eğitimi	GENEL İDARE			Mağazasına Çiğci ve Sabaz Yetiştiriciliğı	12 Köyde toplam 200 Çiğciye eğitim verilmiştir.
11.	Merkez ve İlçeler	Tarım Hizmetleri	Çiğci Eğitimi	GENEL İDARE			Mağazasına ve Dama Sulama Çiğci Yetiştiriciliğı	1 Adetli Demonstasyon Tesi edimiştir.
12.	Merkez ve İlçeler	Tarım Hizmetleri	Çiğci Eğitimi	GENEL İDARE			Yeni Binaları	30 Köyde toplam 480 Çiğciye eğitim verilmiştir.
13.	Merkez ve İlçeler	Tarım Hizmetleri	Çiğci Eğitimi	GENEL İDARE			İlgellenme-Fidan Dikimi Gübreleme Budama Sulama	40 Çiğciye teknik yardım yapılmıştır.
14.	Merkez ve İlçeler	Tarım Hizmetleri	Çiğci Eğitimi	GENEL İDARE			Sertifikalik ve Başur Meyveciliğı Geştirilmesi	16 Köyde toplam 260 Çiğciye eğitim verilmiştir.
15.	Merkez ve İlçeler	Tarım Hizmetleri	Çiğci Eğitimi	GENEL İDARE			Örnek Bahçe Tesisi	2 Çiğciye 18 da alanda örnek bahçe tesisi edilmiştir.
16.	Merkez ve İlçeler	Tarım Hizmetleri	Tescil İşlemleri	GENEL İDARE			Tescil İşlemleri	Özellikle - Bağcılara izin çaplarının tescil işlemlerinde sona gelmiştir.
17.	Merkez ve İlçeler	Hayvancılık Hizmetleri	Sunrı Tohumlama	GENEL İDARE			Sunrı Tohumlama	2007 yılında 11 ayık dönemde toplam 21737 adet sunrıtohumlama yapılmıştır.
18.	Merkez ve İlçeler	Meraz İlahi	Meraz İlahi Projesi	GENEL İDARE			Meraz İlahi	2007 yılında 2 köyde 4 970 dekar alanda Meraz İlahi Projesi hazırlanmış olup, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına gönderilmiştir.
19.	Merkez ve İlçeler	Hayvancılık Hizmetleri	Avcılık	GENEL İDARE			Avcılığın Desteklenmesi	150 Çiğciye 11.0300 adet ana or desteklemesi yapımı için galigıner teminlanmıştır.
20.	Merkez ve İlçeler	Hayvancılık Hizmetleri	Avcılık	GENEL İDARE			Avcılığın Desteklenmesi	46 Çiğciye 119391 kg.İk bal izletimine kapalık 71.635.00 YTL destekleme ödemesi yapılmıştır.
21.	Merkez ve İlçeler	Su Ürünleri	Balıkçılık ve Avcılık	GENEL İDARE			Balık Yetiştiriciliğı - Avcılık - Modern Teknikler Uygulamalar	5 Köyde toplam 40 Balıkçıya eğitim verilmiştir.
22.	Merkez ve İlçeler	Kurumsalgaına	Çiğci Eğitimi	GENEL İDARE			Kurumsalgaına	2007 yılında Genel Kooperatörlük eğitimi programında 9 kooperatörden 70 kooperatife ayarın eğitim verilmiştir.
23.	Merkez ve İlçeler	Kurumsalgaına	Çiğci Eğitimi	GENEL İDARE			Kurumsalgaına	43 Kadın Çiğciye Hayvancılık projeleri ve kooperatörlük konularında eğitim verilmiştir.



ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

Elazığ İl Özel İdaresi 2007 yılında hizmet alanını sürekli genişletmiş yatırım ve hizmetlerini çeşitlendirerek Elazığ'ın kalkınmasında ve genişlemede büyük katkılar yapacak önemli işlerin ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde öncü kuruluş olmuştur.

Muammer MUŞMAL
Vali

Kamu hizmetleri bireye en yakın yönetimler tarafından verilmesinden daha güzel bir şey yoktur.

Abbas ALTUNIŞIK
İl Genel Meclis Başkanı

Kamu mali yönetim sisteminin temel bileşenleri olan stratejik plan, performans programından sonra faaliyet raporunun da hayata geçirilmesinin mutluluğunu tüm ekibimle birlikte yaşıyorum.

Enver ERDEM
Vali Yardımcısı
Genel Sekreter
