



T.C.
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAMSUN SU ve KANALİZASYON İDARESİ

SASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2024 | FAALİYET
RAPORU

www.saski.gov.tr



*Mesuliyet yükü her şeyden,
ölümünden de ağırdır.*

K. Atatürk



Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip ERDOĞAN

BAŞKANIMIZIN MESAJI

Değerli Samsunlular,

Yaşanabilir, dirençli ve sürdürülebilir şehirler inşa etmenin temel taşlarından biri güçlü altyapıdır. Su ve kanalizasyon hizmetleri, şehir hayatının en hayati unsurlarındandır. Musluğumuzdan akan temiz su, sağlıklı bir çevre, altyapı sistemlerinin görünmeyen ama vazgeçilmez birer ürünüdür. Bu hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi, sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda insan odaklı belediyeçilik anlayışının bir göstergesidir.

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak, her alanda olduğu gibi altyapı yönetiminde de sadece bugünü değil, geleceği düşünen; kaynaklarını akılcı kullanan ve çevreye duyarlı bir yaklaşımı benimsiyoruz. SASKİ eliyle yürütülen çalışmalar, bu vizyonun en önemli yansımalarındandır. 2024 yılı, altyapı alanında şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik önemli yatırımların ve sistemli hizmet süreçlerinin hayata geçirildiği, dolu dolu bir yıl olmuştur.

Bu dönemde içme suyu hatlarından içme suyu arıtma tesisine, içme suyu depolarından yağmursuyu ve atık su hatlarına kadar pek çok alanda kapsamlı projeler gerçekleştirilmiş; kırsal mahallelerden şehir merkezine kadar altyapı ağıımız güçlendirilmiştir. Kuraklık gibi iklim temelli risklere karşı alınan önlemler, şehrimizin su güvenliği açısından kritik adımlar olmuş; çevre dostu uygulamalarla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakma yönünde önemli mesafeler kat edilmiştir.

Bugün geldiğimiz noktada, SASKİ'nin sadece yatırım yapan değil, aynı zamanda mevcut tesislerini etkin şekilde işleten, enerji verimliliğini ve dijitalleşmeyi önceleyen, her alanda kaliteyi hedefleyen bir yapıya kavuştuğunu memnuniyetle görüyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş birliği içinde olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarına ve en önemlisi bu hizmetleri sahiplenen siz değerli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

2025 yılına da aynı kararlılık ve vizyonla giriyoruz. Yeni dönemde de altyapı alanında yenilikçi, çevreci ve teknoloji odaklı projelerle şehrimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.

Bu faaliyet raporunun şehrimize, kurumumuza ve paydaşlarımıza değerli katkılar sunmasını temenni eder, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.

Halit Doğan
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



Değerli Hemşehrilerimiz,

Yaşadığımız şehri birlikte şekillendiriyor ve paylaşıyoruz. Sizlerin talepleri ve desteğiyle daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek için geçmişte olduğu gibi, 2024 yılında da var gücümüzle çalıştık.

Altyapı hizmetlerinde sadece bugünü değil yarını da gözeten, çevreye duyarlı ve kaynakları koruyan bir yönetim anlayışıyla kentimizin fenni ve kalıcı bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük.

2024 yılında gerçekleştirdiğimiz yoğun yatırım çalışmaları neticesinde; Samsun genelinde 794 km içme suyu hattı, 113 km kanalizasyon hattı ve 32 km yağmur suyu hattı inşa edilerek altyapımız güçlendirilmiştir. 94 adet içme suyu deposu tamamlanmış, Scada Merkezi inşa edilmiş ve 1.9 km dere ıslahı gerçekleştirilmiştir.

Bafra-Alaçam İsale Hattı Projesi ile Alaçam ve Yakakent ilçelerine içme suyu temin edilmiştir. Divanbaşı Göleti'nden Kavak Güven Göleti'ne terfi ve isale hattı ile su aktarılmış, böylece 2024 yılında yaşanan kuraklık döneminde Kavak ilçe merkezi ve çevresindeki kırsal mahallelerde su kesintisi

yaşanmasının önüne geçilmiştir. Atakum ve İlkadım ilçelerinin üst kotları ve gelişme alanlarının içme suyu altyapısı yenilenerek güçlendirilmiş, Terme Örencik İçmesuyu Arıtma Tesisi tamamlanarak devreye alınmış ve bu tesisten kırsal mahallelere içme suyu sağlayacak olan iletim hatlarının inşaatına başlanılmıştır. İdari ekiplerimizin yürüttüğü altyapı çalışmaları da dahil olmak üzere 2024 yılı gider bütçemizin yaklaşık yarısı yatırım harcamalarına ayrılmıştır.

Her yıl artan nüfus, iklim değişikliği ve kentleşme baskısı, su yönetimini daha da stratejik hâle getirmektedir. Bu doğrultuda şehrimizin altyapısını uzun vadeli ihtiyaçları karşılayacak şekilde kalıcı hale getirmek amacıyla 5 milyar 890 milyon TL olan 2025 yılı gider bütçemizden Selahattin Ereren 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı, Salıpazarı Barajı İletim Hattı İnşaatı, Atakum İlçesi Atıksu Kolektör Hattı İnşaatı ve İlkadım İlçesi Atıksu Kolektör Hattı İnşaatı gibi önemli projelere kaynak ayrılmıştır.

Şehrimize kesintisiz ve sağlıklı su ve atıksu hizmeti sunmak yalnızca yeni yatırımlar yapmakla sınırlı değildir. Mevcut altyapıların ve tesislerin etkin şekilde işletilmesi de en az yeni projeler kadar büyük bir özveri ve uzmanlık gerektirmektedir. Bu kapsamda, 20 bin kilometreyi aşan içme suyu ve kanalizasyon hatları ile 22 içme suyu arıtma tesisi ve 29 atıksu arıtma tesisi, 191 adet içmesuyu terfi merkezi, 78 adet atıksu terfi merkezi ve 5 adet yağmursuyu terfi merkezinin bakım - onarımları yapılmakta ve 7/24 kesintisiz işletilmektedir.

Gelecekte daha dayanıklı, çevreci ve çağın gereklerine uygun altyapılar inşa etme ve aynı zamanda mevcut sistemleri koruyup geliştirme noktasındaki kararlılığımız devam etmektedir. Unutmayalım ki su, hepimizin ortak değeri ve yaşam kaynağıdır. Bu faaliyetlerin sürdürülebilirliği için sizlerin duyarlılığı ve desteği her zaman en büyük gücümüzdür.

Bu vesileyle; sürdürülebilir, yenilikçi ve bütüncül yaklaşımlarla su yönetiminde bölgesel ölçekte öncü konuma gelen Kurumumuzun büyüme ve dönüşüm sürecinde özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma, iş birliği içinde olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarına ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit DOĞAN liderliğinde bizlere güvenen siz değerli Samsunlulara içtenlikle teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Dr. Bahattin YANIK
Genel Müdür

Meclis Üyeleri



Halit DOĞAN
AK PARTİ
Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı



İhsan KURNAZ
AK PARTİ
Belediye Başkanı



Hamit KILIÇ
AK PARTİ
Belediye Başkanı



İbrahim SANDIKÇI
AK PARTİ
Belediye Başkanı



Murat GÜL
AK PARTİ
Belediye Başkanı



Şenol KUL
AK PARTİ
Belediye Başkanı



Mustafa CANDAL
AK PARTİ
Belediye Başkanı



Murat İKİZ
AK PARTİ
Belediye Başkanı



Osman TOPALOĞLU
AK PARTİ
Belediye Başkanı



Refahittin ŞENCAN
AK PARTİ
Belediye Başkanı



Adnan TOPAL
AK PARTİ
Belediye Başkanı



Şerafettin AYDOĞDU
AK PARTİ
Belediye Başkanı



Şerif KILAĞUZ
MHP
Belediye Başkanı



Ramazan ÖZDEMİR
MHP
Belediye Başkanı



Serhat TÜRKEL
CHP
Belediye Başkanı



Şerif ÜN
Yeniden Refah Partisi
Belediye Başkanı



Refaettin KARACA
Bağımsız
Belediye Başkanı



Hüseyin DÜNDAR
Bağımsız
Belediye Başkanı



İbrahim GÜVEN
MHP
Meclis Üyesi



Mustafa SEVEN
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Serkan AKYÜZ
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Resul Fethi AKYÜZ
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Murat CEVAHİR
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Eyüp Sabri ŞAHİN
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Soner TAŞ
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Mücahit YILMAZ
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Mehmet KÖSE
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Nihat SOĞUK
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Sefacan TORAMAN
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Muzafer EMUCE
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Melek KUBALAS
AK PARTİ
Meclis Üyesi

Meclis Üyeleri



Ali ALPER
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Salt SARIER
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Sezai DEMİRKAN
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Halil İbrahim DOĞAN
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Ahmet Şevket
KARAÇUHA
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Mümin Osman
ERTAN
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Mehmet ÖZDEN
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Bahri KARA
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Mustafa BOYACI
AK PARTİ
Meclis Üyesi




Aydın ÇİFT
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Sadettin KÜÇÜKALİ
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Semih ALPER
AK PARTİ
Meclis Üyesi



İsmail ŞENGÜL
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Recep Kemal
CERTEL
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Ali ŞAFAK
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Yusuf AYDIN
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Recep KAÇAR
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Mustafa SARIOĞLU
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Ali ŞENGÜL
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Turan OKUR
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Namık SARIOĞLU
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Asalet YAPICI
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Melvüt BERÇİNLİ
AK PARTİ
Meclis Üyesi



Ali SUKAS
MHP
Meclis Üyesi



Ahmet HATİNOĞLU
MHP
Meclis Üyesi



Abdurrahman
ÇAMAŞ
MHP
Meclis Üyesi



Deniz ATALAY
MHP
Meclis Üyesi



Adem MEMİŞ
MHP
Meclis Üyesi



Şenel CINDIK
MHP
Meclis Üyesi



Sadık SAĞLAM
MHP
Meclis Üyesi



İsmail KAZANÇ
MHP
Meclis Üyesi



Ahmet DEMİRTAŞ
MHP
Meclis Üyesi



Ramazan İSENÇ
MHP
Meclis Üyesi



Fikret PEKAL
CHP
Meclis Üyesi



Ali KANDEMİR
CHP
Meclis Üyesi



Kayhan DOĞAN
CHP
Meclis Üyesi

Meclis Üyeleri



Atilla TEKCAN
CHP
Meclis Üyesi



Hasan İPEK
CHP
Meclis Üyesi



Nakif YILMAZ
CHP
Meclis Üyesi



İsmail YÜKSEL
CHP
Meclis Üyesi



Murat ERAL
CHP
Meclis Üyesi



Mehmet KURT
CHP
Meclis Üyesi



Şerife ACAR
DÖNDÜR
CHP
Meclis Üyesi



Cafer Tayyar TABAK
CHP
Meclis Üyesi



Kerim AKDENK
Yeniden Refah Partisi
Meclis Üyesi



Mehmet KURT
Yeniden Refah Partisi
Meclis Üyesi



Recep AYDIN
Yeniden Refah Partisi
Meclis Üyesi



Mehmet UYANIK
Yeniden Refah Partisi
Meclis Üyesi



Osman ATLI
Yeniden Refah Partisi
Meclis Üyesi



Ali YİĞİT
Yeniden Refah Partisi
Meclis Üyesi



Talat EYÜPOĞLU
İyi Parti
Meclis Üyesi



Murat ŞAHİN
İyi Parti
Meclis Üyesi



Kadir GÜNTAY
İyi Parti
Meclis Üyesi



Veysel ŞAHİNAL
Büyük Birlik Partisi
Meclis Üyesi




Özkan KARAKAYA
Bağımsız
Meclis Üyesi



Ramazan ÇOTUR
Bağımsız
Meclis Üyesi

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

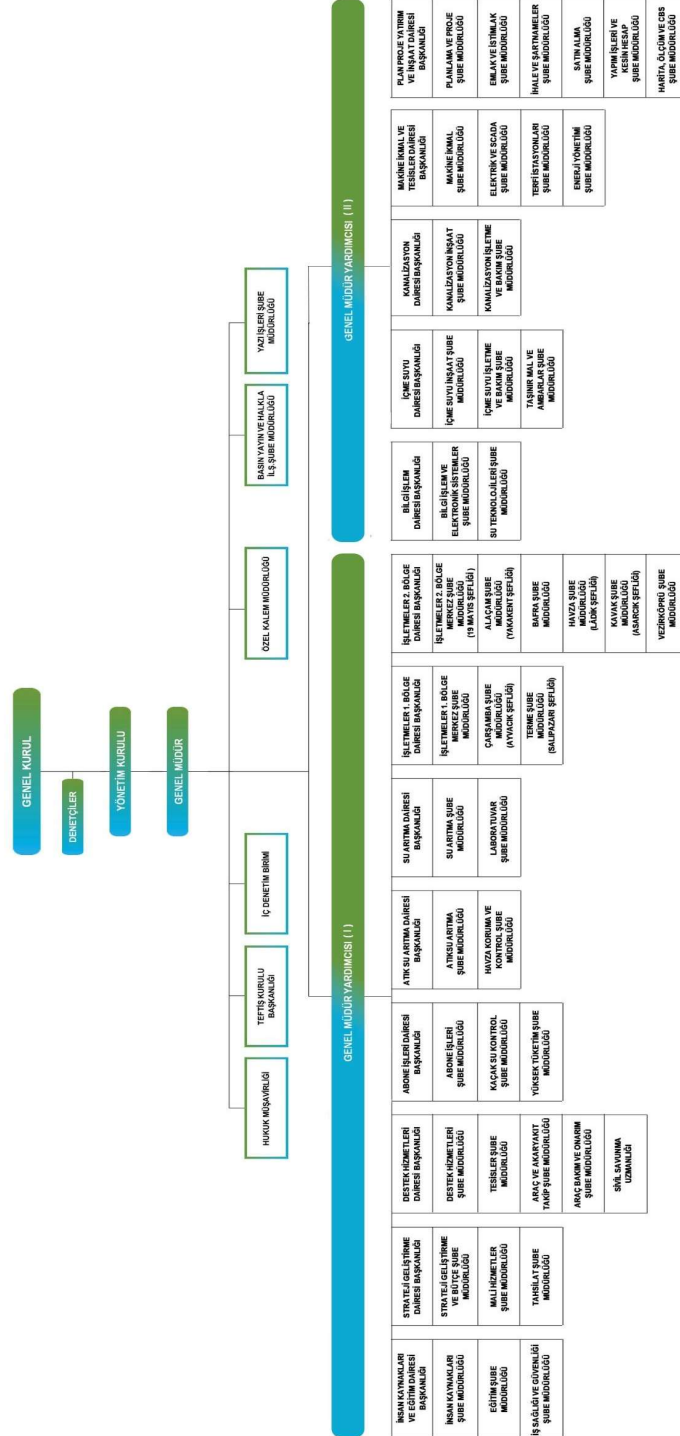

İÇİNDEKİLER

Başkanımızın Mesajı
Genel Müdürümüzün Mesajı
SASKİ Genel Kurul Üyeleri
Organizasyon Şeması

I - GENEL BİLGİLER

A - Misyon ve Vizyon	15
B - Yetki Görev ve Sorumluluklar	16
C - İdareye İlişkin Bilgiler	18
1 - Fiziksel Yapı	18
2 - Örgüt Yapısı	24
3 - İnsan Kaynakları	28
4 - Bilgi ve Teknolojik Gelişmeler	32
5 - Sunulan Hizmetler ve Faaliyet Alanı	37
6 - Yönetim ve İz Kontrol Sistemi	70

II - AMAÇ ve HEDEFLER

A - İdarenin Amaç ve Hedefleri	74
B - Temel Politikalar ve Öncelikler	75

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

A - Mali Bilgiler	78
1 - Bütçe Uygulama Sonuçları	78
2 - Temel Mali Tablolara İlişkin Bilgiler	82
B - Performans Bilgileri	88
1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri	88
2 - Performans Sonuç Tabloları	145

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A - Üstünlükler	163
B - Zayıflıklar	163
C - Değerlendirme	163

V - ÖNERİ ve TEDBİRLER

EKLER



1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

MİSYON ve VİZYON
YETKİ ve SORUMLULUKLAR
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER



B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Tarihçe

Genel Müdürlüğümüz, 2560 sayılı Kanun ve bu Kanunda değişiklik yapan 3009 sayılı Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 3305 sayılı Kanun uyarınca, 1995 yılında Bakanlar Kurulunun 94/6372 sayılı Kararıyla Samsun ilinde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) adı ile kurulmuştur. SASKİ Genel Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.

SASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet alanı, 12.11.2012 tarihinde onaylanarak, 06.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı *On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun* ile İl Mülki sınırlarına genişletilmiştir. Dolayısıyla Genel Müdürlüğümüz; Samsun'da 4 İlçe Belediyesine hizmet verirken (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy) 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla 13 İlçe Belediyesinin de ilave olmasıyla (Alaçam, Asarcık, Ayvacı, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Lâdik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent) bütün il sınırına hizmet götürmekle yükümlü hale gelmiştir.

Yetki

SASKİ Genel Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı Kanunda belirtilen su ve kanalizasyon hizmetlerini sorumluluk alanında gerçekleştirmekle görevli olup bu görevlerini Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşan organları vasıtasıyla yerine getirmektedir

Görev ve Sorumluluklar

SASKİ'nin görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır.

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım-onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım-onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, SASKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksat ile kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1 - Fiziksel Yapı

Kurumumuzun hizmet yapılanması fiziksel olarak merkezde yer alan Genel Müdürlük (Atakum), Ahullu (Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü) ve Derebağçe (Şantiye) yerleşkelerinin yanı sıra; Alaçam, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, 19 Mayıs, Terme, Vezirköprü İlçe Şube Müdürlükleri ile Asarcık, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Yakakent Şube Şeflikleri şeklinde oluşturulmuştur.


Fiziki kaynaklarımız arasında; 22 adet içme suyu arıtma tesisi, 29 adet atık su arıtma tesisi, 1.969 adet içme suyu deposu, 191 adet içme suyu terfi merkezi, 450 adet sondaj tesisi, 78 adet atık su terfi merkezi ile 5 adet yağmur suyu terfi merkezi yer almaktadır.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Kapasitesi (m³/gün)	Modüler İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Kapasitesi (m³/gün)
Selahattin Ereren	200.000	Çarşamba Sefalı	12.960
19 Mayıs Barajı	100.000	Terme Emiryusuf	9.936
19 Mayıs Nebiyan	13.824	Vezirköprü Merkez	9.072
Havza Şehit Kemal Sayar	8.640	Kavak Merkez	8.640
Havza Merkez	6.048	Çarşamba Demiraslan	6.221
Terme Örencik	4.320	Vezirköprü Başalan	5.184
Bafra Batı Sahası	3.974	Çarşamba Durusu	3.456
Bafra Hacıoğlu	3.456	Salıpazarı Çiftlik	2.160
Terme Bazlamaç	2.333	Alaçam Etyemez	1.123
Terme Sakarlı	2.160	Asarcık Yayla - Kılavuzlu	346
Terme Evcı	1.987		
Terme Kocaman	950		
Toplam	347.692		59.098
Genel Toplam		406.790	

İçme Suyu Sondaj - Depo - Terfi Merkezleri

İlçesi	İçme Suyu Terfi Merkezi	Sondaj	İçme Suyu Deposu
Alaçam	8	24	104
Asarcık	9	27	95
Atakum	23	10	99
Ayvacık	20	16	126
Bafra	11	31	167
Canik	19	33	90
Çarşamba	9	55	88
Havza	11	41	204
İlkadım	10	10	42
Kavak	18	52	207
Ladik	1	10	83
19 Mayıs	9	11	103
Salıpazarı	2	7	90
Tekkeköy	25	12	112
Terme	4	32	54
Vezirköprü	10	67	246
Yakakent	2	12	59
Toplam	191	450	1.969

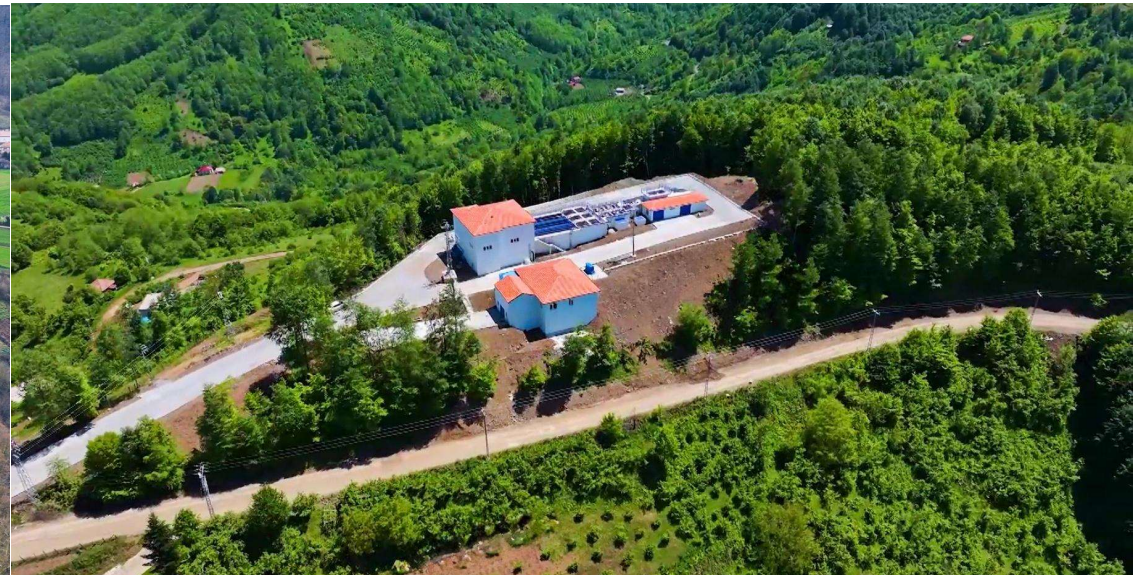

Atık Su Arıtma Tesisleri

Atık Su Arıtma Tesisleri	Kapasitesi (m ³ /gün)	Modüler Atık Su Arıtma Tesisleri	Kapasitesi (m ³ /gün)
Doğu İleri Biyolojik	105.000	Asarcık	600
Bafra Biyolojik	35.000	Dikbıyık (Çarşamba)	600
Çarşamba İleri Biyolojik	15.500	Sakarlı (Terme)	600
Batı İleri Biyolojik	12.256	Narlısaray (Vezirköprü)	500
Terme Biyolojik	8.878	Şeyhüven (Çarşamba)	400
Ladik İleri Biyolojik	6.500	Göl (Vezirköprü)	300
Vezirköprü Biyolojik	6.187	Hamamayağı (Ladik)	100
Kavak İleri Biyolojik	6.000	Kuşkayaşı (19 Mayıs)	60
Salıpazarı İleri Biyolojik	6.000	Köprübaşı 1 (Tekkeköy)	60
19 Mayıs İleri Biyolojik	3.840	Köprübaşı 2 (Tekkeköy)	60
Havza Biyolojik	3.556	Tepeören (Vezirköprü)	50
Alaçam Biyolojik	1.950	Kızılcaören (Vezirköprü)	25
Yakakent İleri Biyolojik	1.500	Yörükçal (Vezirköprü)	25
Terme Evcı Biyolojik	1.000		
Ayvacı Biyolojik	500		
*SASKİ-BAT İleri Biyolojik	2.500		
Toplam	216.167		3.380
Genel Toplam		219.547	

* Mülkiyeti BAT'a ait olup işletmesi protokol ile İdaremize devredilmiştir.

Atık Su ve Yağmur Suyu Terfi Merkezleri

İlçesi	Atık Su Terfi Merkezi	Yağmur Suyu Terfi Merkezi
Alaçam	2	
Asarcık	2	
Atakum	8	2
Ayvacı	3	
Bafra	1	1
Canik	1	1
Çarşamba	19	
İlkadım	3	
19 Mayıs	11	
Tekkeköy	4	
Terme	17	1
Vezirköprü	3	
Yakakent	4	
Toplam	78	5



Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi

Resmî Araç Dağılımı

Araç Grupları	Adet	Araç Grupları	Adet
Paletli Ekskavatör	6	Su Tankeri	20
Lastikli Ekskavatör	3	Kompresör	1
Kazıcı Yükleyici	75	Mobil Vinç	1
Lastikli Yükleyici	3	Atık Kamyonu	2
Lastikli Mini Yükleyici	7	Kamyon Çekici Yarı Römork	4
Kaptı Kaçtı	3	Kamyon (Damperli)	58
Asfalt Yama Silindiri	1	Kamyon Açık Kasa	2
Forklift	2	Kamyonet	23
Traktör	4	Minibüs (Koltuklu)	2
Tır (Low-Bed)	1	Pikap (4x4 Arazi Aracı)	13
Vidanjör	15	Kamyonet (Kanal Görüntüleme)	1
Kombine –Kanal Temizleme	19	Akaryakıt Tankeri	1
Greyder	2	Otomobil	1
Toplam	270		

Kiralık Araç Dağılımı (31.12.2024)

Araç Grupları	Adet
Binek	17
Ekskavatör	3
Kamyonet (Camlı-Van)	102
Kamyonet (Çift kabin)	38
Kazıcı Yükleyici	5
Pikap (4x4 Arazi Aracı)	17
Vidanjör	3
Su Tankeri	6
Tır	2
Toplam	193

Yıllar İtibarıyla Akaryakıt Tüketim Değerleri

Yıl	Tüketim (Litre)	Tutar (TL)
2020	2.361.979,00	11.594.440,73
2021	2.944.392,00	15.784.085,71
2022	3.226.316,00	68.749.570,42
2023	3.111.820,00	88.554.821,52
2024	3.146.053,00	104.861.984,30



2 - Örgüt Yapısı

SASKİ Genel Müdürlüğü

- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcıları
- 1. Hukuk Müşavirliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
- Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
- Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
- İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
- İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
- İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
- Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı



ile bunlara bağlı alt kademe birimlerinden teşekkül eder.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, SASKİ Genel Kurulu olarak 2560 sayılı Kanunun 4. maddesine göre görevli ve yetkilidir. Büyükşehir Belediye Başkanı ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki diğer belediyelerin başkanları SASKİ Genel Kurulunun doğal üyesidir.

SASKİ Genel Kurulu, Kanunda yazılı yetki ve görevleri doğrultusunda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan gündem ile toplanır.

SASKİ Yönetim Kurulu 1 başkan ve 5 üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde ise yaşlı olanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.





3 - İnsan Kaynakları

Kurumumuzda 2024 yılı sonu itibarıyla; 263 memur, 85 sürekli işçi, 1 geçici işçi ve 994 şirket işçisi (Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi) olmak üzere toplam 1.343 personel görev yapmaktadır.

Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek verimliliği artırmak amacıyla 2024 yılında 270 personelin katılımı ile mesleki ve mevzuat bilgilerini içeren 19 farklı konu başlığında eğitim programları düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen online eğitimlere de yıl içerisinde katılım sağlanmaktadır. Buna ek olarak 2024 yılı içerisinde 16 öğrenciye Kurumumuzda staj yapma imkânı sağlanmıştır.


Ayrıca tüm birimlerimizin toplam 28 başlıkta eğitim ve seminer ihtiyacı olduğu belirlenmiş ve Kurum stratejilerine uygun olarak 2025 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı oluşturulmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından 27 farklı konu başlığıyla temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş, eğitime toplam 1363 personelin katılımı sağlanmıştır. 12 farklı konu başlığında Kontrol Mühendisleri Bilgilendirme eğitimi verilmiş, 82 personelin katılımı sağlanmıştır. 2024 yılı içerisinde meydana gelen iş kazaları nedeniyle 30 personele farklı konu başlıklarında 180 dakika (kişi başı) işe dönüş eğitimi verilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak üzere personelimiz arasından Arama-Kurtarma ve Tahliye Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi ile İlk Yardım Ekibi oluşturulmuştur. Kurumumuz genelinde risk değerlendirme raporları ve acil durum planları oluşturularak ilgili birimlere gönderilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Talimatı revize edilmiştir. Personelin kişisel koruyucu donanımlarının temini sağlanarak personele dağıtımı yapılmıştır. Tüm işyerlerimizin ziyaret edilmesi sonucunda hazırlanan 35 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Raporu ilgili birimlere gönderilmiştir.

İşyeri Hekimliğimiz tarafından 2024 yılında tüm personelin periyodik muayeneleri gerçekleştirilmiş, gerekli tetkikler yaptırılmış ve sağlık açısından riskli görülen personelin sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Personel Durum Grafiği

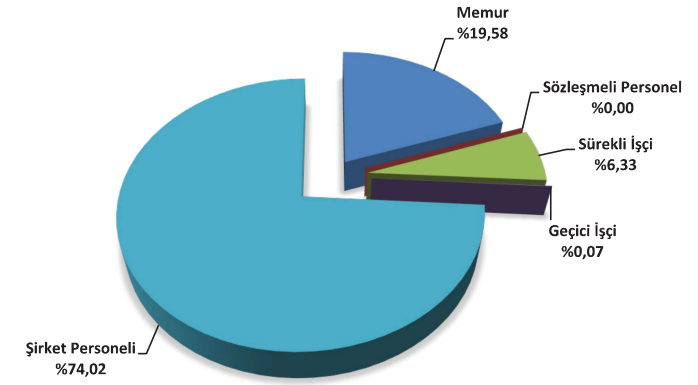


Yıllar İtibarıyla Personel Durumu

Statü	2020	2021	2022	2023	2024
Memur	296	282	275	271	263
Sözleşmeli Personel	17	16	17	-	-
Sürekli İşçi	214	200	186	101	85
Geçici İşçi	21	18	16	1	1
Şirket İşçisi	776	809	903	1.004	994
Toplam Personel Sayısı	1.324	1.325	1.397	1.377	1.343


Personelin Cinsiyet ve Yaş Durumlarına Göre Dağılımı

Statü	Çalışan Sayısı	Cinsiyet		Yaş Aralığı			
		Erkek	Kadın	29 yaş ve altı	30-49 yaş arası	50-59 yaş arası	60 yaş ve üzeri
Memur	263	210	53	7	164	78	14
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-	-	-	-
Sürekli İşçi	85	79	6	-	49	36	-
Geçici İşçi	1	1	-	-	1	-	-
Şirket İşçisi	994	943	51	148	746	96	4
Toplam Personel	1.343	1.233	110	155	960	210	18

Personel Cinsiyet Dağılım Grafiği




Personel Yaş Dağılımı Grafiği

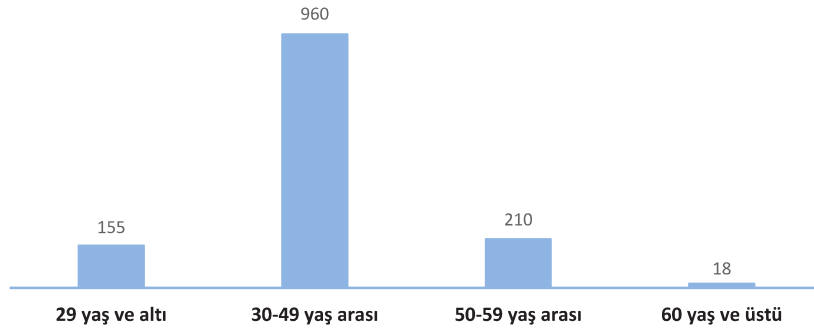

Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı

Statü	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora	Toplam
Memur	-	5	37	46	137	34	4	263
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-	-	-	-	-
Sürekli İşçi	32	12	24	7	10	-	-	85
Geçici İşçi	-	-	1	-	-	-	-	1
Şirket İşçisi	173	208	416	104	89	4	-	994
Toplam Personel Sayısı	205	225	478	157	236	38	4	1.343

Personelin Eğitim Durumu Dağılım Grafiği

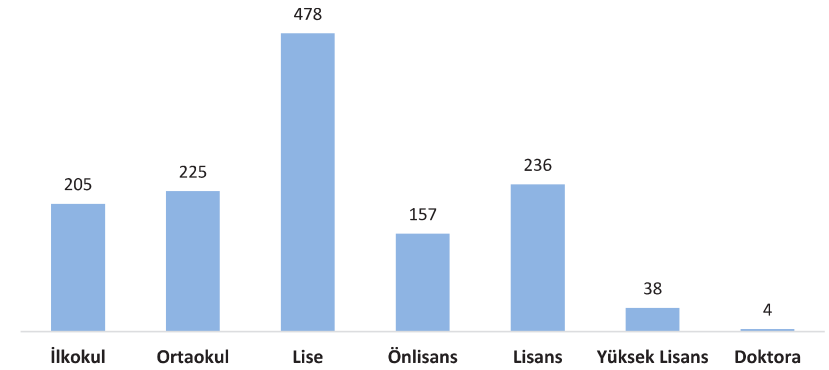

4 - Bilgi ve Teknolojik Gelişmeler

Kurumumuzda görevli büro ve saha personeli, iş ve işlemlerini bilişim cihazları aracılığı ile yapmaktadır. Bu kapsamda 2024 yılında 370 adet teknik servis iş emri tamamlanmıştır. 2024 yılı sonu itibarıyla Kurumumuzun donanım envanteri aşağıdaki gibidir.

Donanım Envanteri

Cihaz Adı	Adet	Cihaz Adı	Adet
Bilgisayar (Masaüstü)	602	Güvenlik Görüntü Kayıt Sunucusu	73
Bilgisayar (Dizüstü)	64	Güvenlik Kamerası	552
Sunucu	19	Sistem Odası Güvenli Geçiş Sistemi	1
Tablet	114	Akıllı Faks Sistemi	2
Monitör	657	IP Telefon Santrali	16
Barkod Okuyucu	45	Sabit Telefon	505
Barkod Yazıcı	45	İş Emri Mobil Cihazı	347
Plotter	4	Projeksiyon Cihazı	13
Lazer Yazıcı	219	PDKS Cihazı	77
Nokta Vuruşlu Yazıcı	3	Tarayıcı	38
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	23		

Network Sistemleri

Genel Müdürlüğümüzün tüm lokasyonlarında network iletişimi switch, modem ve firewall cihazları ile sağlanmaktadır. Network yapısında fiber, radyolink, GSM, VPN topolojileri kullanılmaktadır. Teknolojinin son imkanları kullanılarak network cihazları üzerinden birimlerin data, ses ve kamera verileri güvenli bir şekilde iletilmektedir.


Ayrıca kurumsal bilgi kaynaklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik duvarı, DDos koruması, antivirüs yazılımı ve Log Yönetim Sistemi gibi bileşenler altyapımızda konumlandırılmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün internet erişimi, merkezi olarak kullanılan yüksek hızlı Metro Ethernet bağlantısıyla sağlanmaktadır. Ayrıca ilçeler ve diğer tesisler ile güvenli veri alışverişini sağlamak için çok noktadan çok noktaya özel devreler tesis edilmiştir.

Depolama Sistemleri

Personel arasında oluşturulan ve güvenlik riskleri olan ortak klasör paylaşımlarının önüne geçilerek Dosya Paylaşım Sunucusu (File Server) kurulumu yapılmıştır. Böylece Kurum içi dosya paylaşımının belirli yetkiler dahilinde ve güvenlik standartları çerçevesinde gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda, hizmet veren mevcut depolama cihazlarının tam disk kapasitesi ile çalıştığı göz önünde bulundurularak, ilerleyen süreçte, yeni depolama üniteleri ve disk temini ile birlikte birimlerin dosya paylaşımı için ihtiyaç duyduğu alanların sağlanabilmesi ve buna bağlı olarak da yeterli seviyede yedekleme işleminin yapılabilmesi hedeflenmektedir.

Teknik Servis Hizmetleri

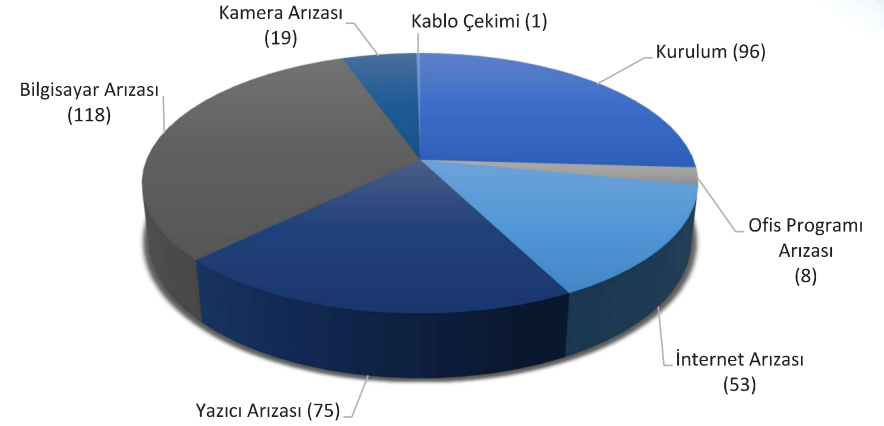

İş Emri Sistemi

Birimlerin iş süreçlerini daha efektif yürütebilmeleri için detaylı ekip tanım ekranı geliştirilmiştir. Bu sayede işletme birimlerinin bilgi işlem desteğine ihtiyaç duymadan saha süreçlerini yürütmesine olanak sağlanmıştır.

The screenshot displays the 'İş Emri Sistemi' (Work Order System) interface. It features several tabs for data entry and management:

- Personel Tanımları (Personnel List):** Includes fields for Ekip (730), İlgili Birim (KANAL), Şantiye, and Formen (474). It has a search bar and a 'Ekip Tanımları' button.
- Arac Plaka Tanımları (Vehicle Plate List):** Includes fields for Görev No, Plaka No, Makine No, and Makine. It has a search bar and an 'Arac Plaka Tanımları' button.
- Ekibe Tanımlı Personeller (Personnel Assigned to Team):** A table with columns for Personel Id, Adı, Soyadı, and Ekip Id. It shows 'Kayıt yok' (No record) and a 'Tabloda herhangi bir veri mevcut değil' (No data in table) message.
- Ekibe Tanımlı Araçlar (Vehicles Assigned to Team):** A table with columns for Görev No, Plaka No, Makine No, and Makine. It shows 'Kayıt yok' and a 'Tabloda herhangi bir veri mevcut değil' message.
- Ekibe Tanımlı Malzemeler (Materials Assigned to Team):** A table with columns for Malzeme Id, Malzeme, Miktar, Kullanılan, and Kalan. It shows 'Kayıt yok' and a 'Tabloda herhangi bir veri mevcut değil' message.
- Ekibe Saha Tanımı (Field Definition for Team):** A table with columns for Arıza Türü No, Arıza Açıklama, İlçe Açıklama, and Mahalle Açıklama. It shows 'Kayıt yok' and a 'Tabloda herhangi bir veri mevcut değil' message.

İşletme birimlerinin saha süreçlerini daha verimli takip edebilmeleri için ekiplerin sonuçlandırdıkları iş emirlerine ait bilgileri içeren özet ekran tasarlanmıştır. Bu ekranda; iş emrinde çalışan personel bilgileri, kullanılan malzemeler, zemin tahrip fotoğrafları ile araç bilgileri gibi takibi önem arz eden verilere yer verilmiştir.

Bildirim Detayı	
Bildirim Id	907296
Vatandaş Ad Soyad	RESUL ***
Vatandaş Tel	544 ***
Bildirim Adresi	ESENEVLER MAH. NİŞANTAŞI CAD. 27 ATAĞUM
Bildirim Açıklaması	YOLDAN SU ARIZASI HK. Muhattap Talebi: VATANDAŞ EVİN BODRUMUNA TEMİZ SU OLDUĞU İÇİN TESİSATÇI İLE BİRLİKTE DİNLEME CİHAZIYLA İŞLEM SAĞLADIKLARINI VE YOL TARAFINDA KALAN YERDE SASKİ'YE AİT BORUDA PATLAK OLDUĞUNU TESPİT ETTİKLERİNİ BİLDİRİR. BU PATLAKIN KONTROL EDİLMESİ VE TAMİR EDİLMESİNİ TALEP ETMEKTEDİR.
Başvuru Şekli	185
Cari Tip	Vatandaş
Aciliyet Durumu	Acil Değil
Yönlendirildiği Birim	ATAKUM - İçmesuyu Birimi
Sorun Türü	YOLDAN SU ARIZASI
Arıza Durumu	İÇMESUYU-VANA YENİLENDİ
Bulunduğu Ekip	YALÇIN EROL
İşlem Yapan Personel	ÇÖZÜM MERKEZİ
Bildirim Tarihi	2025-04-06
Bildirim Durumu	Arşivde
Bildirim Kimde	AHMET KAHYA
Bitiş Tarihi	2025-04-07
Sonuç Açıklaması	kullanılan malzemeler 1 adet 110 pik kolye 1 adet 1½ vana 1 adet 1 vana 2 adet 1½ demir nipel 2 adet 50x1½ kablın dişi adaptör 1 adet 50x50 kablın direk 1 adet 50x32x50 kablın te 1 adet 32x32 kablın direk 2 adet 32x1 kablın dişi adaptör 3 adet 1 demir direk 2 m 50x16 kangal boru 2 m 32x16 kangal boru

Malzeme Detayı

10

Ara

3 kayıttan 1 - 3 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

Malzeme No	Malzeme	Adet	Birim Fiyat	Tutar	Sahibi	Kullanıcı
4242	1/2" ŞİBER VANA	1	66,40	66,40	K	YALÇIN
4689	50 KELEPÇE (SFERO KOLYE)	1	173,00	173,00	K	YALÇIN
5707	63 X 50 KABLIN REDİKSİYON MANŞON	1	10,77	10,77	K	YALÇIN

3 kayıttan 1 - 3 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

Makina Detayı

10

Ara

3 kayıttan 1 - 3 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

Makina No	Plaka	Süre	Adet	Birim Fiyat	Tutar	Sahibi	Kullanıcı
2	55213571	360	1	204,12	1.224,72	K	SİSTEM
40	34FP6922	0	1	0,00	0,00	K	SİSTEM
41	55LV908	360	1	204,12	1.224,72	K	SİSTEM

Araç Takip Sistemi Entegrasyonu

Hizmet araçlarının güzergah, kilometre ve yakıt gibi takibi önem arz eden verileri, ilgili servis sağlayıcılardan alınarak harita tabanlı uygulama ve raporlamalarda kullanılmıştır. Bu sayede karar destek sistemleri geliştirilerek birimlerin hizmet standartlarını artırmalarına katkıda bulunulmuştur.



Yatırım Takibi ve Varlık Yönetimi Yazılımı

Yatırımların fiziki takibi için İş Emri Sistemi ile Yatırım İzleme Sistemi ilişkilendirilmiş olup Yatırım İzleme Sistemi ekranlarında birim taleplerine göre iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Yatırımların nakdi takibi için muhasebe sistemi ile yatırımlar ilişkilendirilerek hangi yatırıma ne kadar ödeme yapıldığının takip edilebilmesi için veri toplanmaya başlanmıştır.

Kurum varlıklarının ekipman kartı ve parametre ekranları geliştirilmiş olup 3.066 taşınmaza ait veriler Varlık Yönetimi Sistemi'ne işlenmiştir. Bu sayede uzun soluklu ve topyekûn çalışma gerektiren Varlık Yönetim Sistemi'nin temelleri atılmıştır.

5 - Sunulan Hizmetler ve Faaliyet Alanı

a. Abone Hizmetleri

Abone Yönetimi

Kurumumuz tarafından Samsun il sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza abone hizmetleri verilmekte olup, 2024 yılı sonu itibarıyla 632.437 adet mesken (%87,60), 57.437 adet işyeri (%7,96), 25.057 adet inşaat (%3,47), 3.568 adet resmi kurum (%0,49) ve 3.494 adet diğer (%0,48) olmak üzere toplam 721.994 adet abonemiz bulunmaktadır. Yıl içerisinde merkez mahallelerde 71.485.493 m³, kırsal mahallelerde 14.730.170 m³ olmak üzere toplam 86.215.663 m³ su tahakkuku yapılmıştır. 2024 yılında 22.716 adet yeni abonelik tesis edilmiştir.


Abonelerimiz, şubelerimize gelmeden www.saski.gov.tr ağ adresi veya e-Devlet portalı üzerinden; abonelik bilgileri sorgulama, borç yapılandırma başvurusu, borç bilgileri sorgulama ve ödeme, abonelik sözleşme fesih başvurusu, abonelik devri (isim değişikliği başvurusu ve takibi) işlemlerini yapabilmektedir.

Kurumumuzda, 2024 yılında abonelik devir işlemlerinin %33'ü çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilmiştir. Bu oran ilk olarak 2020 yılında %8, 2021 yılında %14, 2022 yılında %17, 2023 yılında ise %27 olarak gerçekleşmişti. Görüldüğü üzere internet üzerinden gerçekleştirilebilir işlem türü ve işlem sayısı yıllar itibarıyla daha da artmaktadır.




QR kodu okutarak direkt işlem yapabilirsiniz.

Yıllar İtibarıyla Abonelik İşlem Sayıları

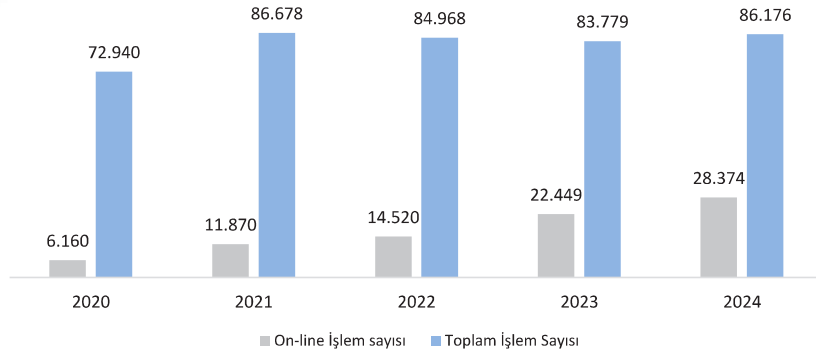

Faaliyet Alanı

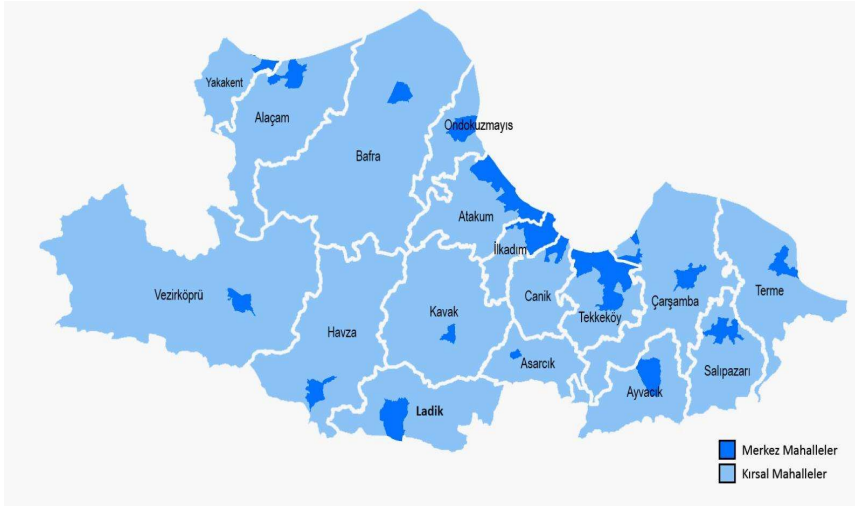

SASKİ Genel Müdürlüğü, 22 Mart 2008 tarih 26824 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5747 sayılı *Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun* gereği 4 ilçe belediyesine (Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy) su ve kanalizasyon hizmetlerini götürmekle yükümlü iken, 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı *On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun* ile Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent ilçeleri olmak üzere 13 ilçe belediyesinin ilave olmasıyla 17 ilçenin tamamına aynı hizmetleri götürmekle yükümlü hale gelmiştir.


Abone Bilgileri

Kurumumuzda, 2024 yılında 22.716 adet yeni abonelik tesis edilmiş ve toplam abone sayısı yıl sonu itibarıyla 721.994'e ulaşmıştır. Önceki yıla göre abone sayısında %3,25 oranında bir artış gerçekleştirilmiştir.

İlçelere ve Türüne Göre Abone Sayıları

İlçesi	Mesken		İşyeri	Resmi Daire	Şantiye	Bedelsiz	Diğer	Atık Su	Toplam
	Merkez	Kırsal							
Alaçam	6.344	5.340	912	139	310	40	16	10	13.111
Asarcık	1.265	4.234	329	54	80	0	1	2	5965
Atakum	120.761	3.005	8.059	487	8.267	76	92	77	140.824
Ayvacık	2.129	4.063	267	83	131	1	4	1	6.679
Bafra	49.917	19.422	6.240	278	1.760	68	1.094	79	78.858
Canik	40.537	5.443	4.803	314	2.811	72	32	75	54.087
Çarşamba	33.965	25.074	4.955	258	1.865	46	35	70	66.268
Havza	11.430	7.311	1.270	173	400	12	32	40	20.668
İlkadım	153.379	2.089	18.859	811	4.719	183	155	80	180.275
Kavak	5.896	7.279	656	115	532	15	4	23	14.520
Ladik	5.057	4.111	503	84	255	5	2	4	10.021
Salıpazarı	3.280	1.583	394	56	278	24	139	3	5.757
Tekkeköy	19.924	4.869	4.316	210	982	71	133	191	30.696
Terme	16.137	19.496	2.375	151	727	8	321	46	39.261
Vezirköprü	15.703	12.816	2.066	208	789	3	17	12	31.614
Yakakent	4.178	407	343	43	256	5	5	11	5.248
19 Mayıs	8.823	7.170	1.090	104	895	18	25	17	18.142
Ara Toplam	498.725	133.712							
Toplam	632.437	57.437	3.568	25.057	647	2.107	741	721.994	

Yıllar İtibarıyla Merkez-Kırsal Abone Sayıları

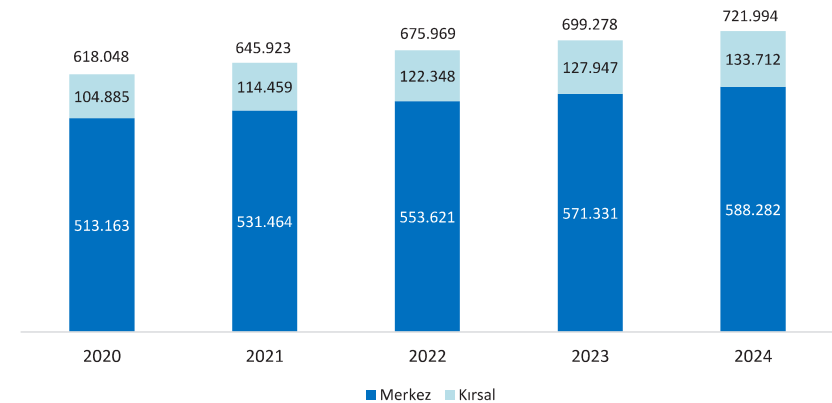


Tahakkuk Bilgileri

2024 yılında tahakkuk edilen su miktarı, 86.215.663 m³ olarak gerçekleşmiştir. İlçeler bazında en yüksek tahakkuk oranı %25,72 ile İlkadım ilçesine ait iken en düşük tahakkuk oranı ise %0,39 ile Ayvacı ilçesine aittir. Abone türüne göre en yüksek tahakkuk oranı %70,36'lık pay ile mesken abonelerine ait iken en düşük tahakkuk oranı ise %1,46 ile inşaat abonelerimize aittir.

İlçelere ve Abone Türlerine Göre Tahakkuk Miktarları (m³)

İlçe	Mesken Merkez	Mesken Kırsal	İşyeri	Resmi Daire	İnşaat	OSB	Diğer	Bedelsiz	Toplam
Alaçam	445.984	667.580	44.023	54.763	6.193		842	142.472	1.361.857
Asarcık	93.157	375.502	15.109	33.817	2.507		631		520.723
Atakum	11.640.806	346.910	1.130.395	2.208.700	536.231		35.026	3.162.842	19.060.910
Ayvacı	136.035	147.459	11.299	35.494	6.151		417	1.325	338.180
Bafra	4.344.260	2.612.836	429.777	436.407	61.920	118.076	5.994	353.320	8.362.590
Canik	3.537.217	544.541	471.090	313.965	145.956		23.405	805.934	5.842.108
Çarşamba	3.155.338	3.046.258	405.127	421.441	86.260	52.706	4.519	83.203	7.254.852
Havza	1.021.099	844.012	135.945	114.949	21.147		383.971	13.336	2.534.459
İlkadım	14.417.958	228.504	1.711.876	1.753.873	206.209	48.527	52.766	3.758.372	22.178.085
Kavak	487.764	500.513	101.794	206.388	28.058	130.476	1.180	16.037	1.472.210
Ladik	423.782	377.884	55.635	59.070	10.912		289	34.156	961.728
19.May	716.187	779.408	151.312	107.773	30.001		23.427	113.804	1.921.912
Salıpazarı	252.024	172.984	32.413	23.428	12.343		2.952	6.930	503.074
Tekkeköy	2.063.286	493.217	757.441	237.933	56.724	1.010.816	2.919	1.518.064	6.140.400
Terme	1.445.328	1.883.596	414.163	100.014	28.119		3.055	23.787	3.898.062
Vezirköprü	1.485.414	1.677.760	126.347	178.768	16.280		2.907	7.360	3.494.836
Yakakent	266.517	29.465	34.614	7.571	5.448		370	25.692	369.677
Ara Toplam	45.932.156	14.728.429							
Toplam	60.660.585	6.028.360	6.294.354	1.260.459	1.360.601	544.670	10.066.634	86.215.663	

Yıllar İtibarıyla Tahakkuk Miktarları (m³)

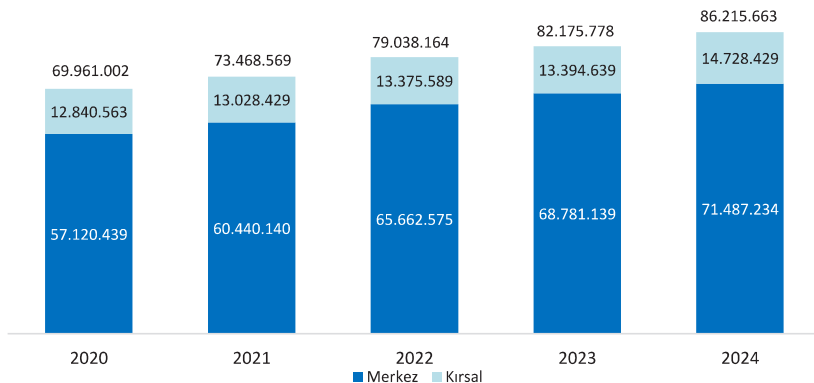

Daha etkin ve verimli bir tüketim analizi yapılabilmesi için SASKİ Yönetim Kurulunun 26.07.2024 tarihli kararı ile Yüksek Tüketim Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Bahse konu Şube Müdürlüğünce 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- İlk aşamada 57.437 adet işyeri abonesi nezdinde detaylı saha çalışması yapılarak aboneler faaliyet türlerine göre 55 başlıkta sınıflandırılmıştır.
- Faaliyet türlerinin ortalama kullanımlarına göre kıyas tüketimleri belirlenmiştir.
- İşyeri tarifi uygulanması gereken ancak İdaremize bildirmeksizin mesken tarifesinden su kullandığı tespit edilen aboneler hakkında cezai işlem uygulanmıştır.
- 1.398 iş emri oluşturularak saha ekiplerince yerinde kontroller gerçekleştirilmiştir.

Sadece yukarıdaki faaliyetler sonucunda 2024 yılında 9.326.004,90 TL ek gelir elde edilmiştir.

Sayaç Bilgileri

Kurumumuz tarafından 2024 yılı içerisinde 21.431 adet yeni aboneye sıfır endeksli sayaçlar takılmış olup bununla birlikte bozuk, patlak veya damga ömrünü doldurmuş (10 yıl ve üzeri) toplam 7.840 adet sayacın da değişimi yapılarak abonelere verilen suyun sağlıklı ölçümü sağlanmıştır. Ölçüm hassasiyeti yüksek yeni sayaçlar sayesinde muhtemel tahakkuk kayıplarının da önüne geçilmiştir. 2024 yılında abonelerimizin talebi üzerine 163 adet şikâyetli sayaç muayenesi gerçekleştirilmiş olup 131 adet sayaçta herhangi bir ölçüm hatası olmadığı tespit edilmiştir. Ölçüm hassasiyetini kaybettiği tespit edilen 32 adet arızalı su sayacının değişimi yapılmış ve hatalı tahakkuklar fiili duruma uygun şekilde düzeltilmiştir.

Yıllar İtibarıyla Sayaç Değişim Bilgileri (adet)

İşlem Tipi	2020	2021	2022	2023	2024
Yeni Abone Sayacı	26.926	27.875	30.046	23.309	21.431
10 Yıllık Damga Ömrünü Doldurmuş	85.700	59.270	13.135	5.320	1.573
Patlak/Hasarlı	7.611	10.003	7.499	3.162	2.701
Arızalı	4.149	4.118	2.725	2.621	1.830
Diğer	1.904	2.191	1.030	1.199	1.736
Toplam	126.290	103.457	54.435	35.611	29.271

Kaçak ve Usulsüz Kullanım Tespiti

Kurumumuz tarafından yer altı veya yer üstü su kaynaklarından yasal olmayan yöntemlerle su temin eden ve/veya kullananlar periyodik bir şekilde takip edilerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

Kurumumuza gelen şikâyet veya ihbarların mahallinde kontrolü, rutin kontroller sırasında kaçak/usulsüz su kullananların tespiti, Çözüm Merkezinden gelen başvuru ve ihbarların değerlendirilip sonuçlandırılması, su borcundan dolayı kesilen-sökülen sayaçların ve kapaması yapılan aboneliklerin kontrolü ve inşaatların periyodik denetim iş ve işlemleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bahse konu kontroller sonucunda ilgili mevzuat çerçevesinde kaçak ve/veya usulsüz su kullananlar hakkında gerekli idari ve hukuki iş ve işlemler yapılmaktadır. 2024 yılında 2.211 aboneye kaçak ve/veya usulsüz su kullanımı için ceza tutanağı düzenlenmiş olup toplam 24.298.363,99 TL tutarında tahakkuk işlemi yapılmıştır.

Abone İlişkileri Yönetimi

Kurumsal itibarımızın artırılması ve hizmet kalitesi ile işletme verimliliğinin yükseltilmesi amacıyla Kurumumuzun vatandaş ile iletişim konusunda en önemli araçlarından biri 7/24 rahatlıkla ulaşılabilen ALO 185 Çözüm Merkezimizdir. ALO 185 Çözüm Merkezimize 2024 yılında gelen toplam çağrı sayısı 191.260 adettir.

Abonelerimize ve personelimize yönelik olarak su kesintisi de dahil olmak üzere çeşitli bilgilendirmeler içeren 8.743.899 adet bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.

Elektronik posta yoluyla 413, internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla 2.080 ve CİMER kanalıyla 1.794 olmak üzere toplam 4.287 adet talep ve şikâyet Kurumumuza iletilmiş olup bu kapsamdaki başvurular ilgili birimlerimizce çözüme kavuşturulmuştur.

b. İçme Suyu Temini

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yanı sıra nüfus artışının su temini üzerinde oluşturduğu stresi ortadan kaldırmak ve su arzı güvenliğini sağlamak üzere kırsal kesimler dahil ilimizin tamamında ilave su temin projeleri hayata geçirilmekte, su kaynakları çeşitlendirilmekte ve kayıp-kaçak oranının düşürülmesi amacıyla içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına öncelik verilmektedir. Bu bağlamda şehrin doğu bölgesindeki Salıpazarı, Terme ve Çarşamba ilçe merkezleri ile civar mahallelere içme suyu temin etmek üzere Salıpazarı Barajı, Arıtma Tesisi ve İsale Hattı Projesi geliştirilmiştir. Bu projenin tamamlanması ile bahsedilen yerleşim yerlerine günde 100.000 m³ içme ve kullanma suyu temin edilerek bölgenin uzun vadeli su ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Benzer şekilde şehrin batı bölgesindeki 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçe merkezleri ve civar kırsal mahallelerin tamamı ile Atakum ilçesinin bir kısmına içme ve kullanma suyu temin etmek maksadıyla projelendirilerek inşaat çalışmalarına başlanılan 100.000 m³/gün kapasiteli 19 Mayıs Barajı ve Arıtma Tesisi tamamlanmıştır. İsale hattı inşaatı 2023 yılında bitirilen bu proje ile belirtilen yerleşim yerlerine memba kalitesinde kesintisiz içme suyu temin edilmiştir. Terme ve Salıpazarı ilçelerinin üst kotlarında yer alan mahallelere içme ve kullanma suyu temin etmek üzere Kızlar Çayı'ndan temin edilen ham suyun arıtılacağı Terme Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yapımı tamamlanmıştır.

Kuraklıkla mücadele stratejimiz kapsamında içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Çarşamba, Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerine içme ve kullanma suyu temin edilen Çakmak Baraj Gölüne, Yeşilırmak nehrinden 1 m³/s ham su takviyesi yapılarak ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hizmete alınmıştır.

Mevcut İçme Suyu Kaynakları

Kaynak Adı	Kapasitesi (m ³ /yıl)
Çakmak Barajı	126.144.000
19 Mayıs Barajı	31.536.000
Yeşilırmak	28.382.400
Derin Kuyular	25.656.640
Yerel Kaynaklar	25.000.000
Bayramköyü Barajı	5.000.000
Güven Göleti	3.153.600
Dereköy Barajı	3.153.600
Duruçay Göleti	1.892.160
Terme Örencik Arıtma (Kızlar Çayı)	1.576.800
Toplam	251.495.200

Samsun ilinin Atakum, Canik, Çarşamba (Dikbıyık), İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, Abdal Deresi üzerinde inşa edilen ve yıllık verimi 126.144.000 m³ olan Çakmak Barajı'ndan sağlanan ham suyun 200.000 m³/gün kapasiteli Selahattin Erenen İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılmasıyla karşılanmaktadır. Çakmak Barajı ve Kurtahmetli sondajlarından temin edilen ham su, Sefalı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtıldıktan sonra içme ve kullanma suyu olarak Çarşamba ilçe merkezine verilmektedir.

Terme ilçe merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı Köybucağı Mevkiindeki keson ve sondajlar ile kısmen Emiryusuf İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden karşılanmaktadır. Salıpazarı ilçe merkezine içme ve kullanma suyu, Salıpazarı Çiftlik İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi'nden, Ayvacık ilçe merkezine içme ve kullanma suyu ise sondajlardan sağlanmaktadır.

Asarcık ilçe merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı Karamuk kaynağı ve sondajlardan, Kavak ilçe merkezinin ise Kavak Güven Göleti'nden alınan ham suyun Kavak İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılmasıyla karşılanmaktadır. Ladik ilçe merkezine içme ve kullanma suyu, Akdağ ve Akyar kaynağı ile sondajlardan, Havza ilçe merkezine ise Akyar ve Ayvalı kaynakları ile Havza İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden temin edilmektedir. Vezirköprü ilçe merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı Kargucak kaynağı ve Karapınar sondajlarının yanı sıra Tepeören drenajı ve DSİ Bayramköyü Barajı'ndan alınan ham suyun Vezirköprü İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi'nde arıtılmasıyla karşılanmaktadır.

19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçe merkezlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı 19 Mayıs Barajı'ndan temin edilen ham suyun arıtıldığı 19 Mayıs Barajı Arıtma Tesisi'nden sağlanmaktadır.

Planlanan İçme Suyu Kaynakları

Kaynak Adı	Planlanan Miktar (m ³ /yıl)
Salıpazarı Barajı	25.740.000
Toplam	25.740.000


Su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, su verimliliği noktasında hayati derecede öneme sahip bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzun yıllar boyunca gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımları vasıtasıyla hem yeni hat yapılmakta hem de eski hatlar yenilenmektedir. Bu sayede eski ve sürekli arıza veren hatlarda meydana gelen su kaybının engellenmesi sağlanmaktadır. SASKİ olarak su kayıp – kaçaklarını azaltmak için yapılan çalışmalarla Samsun ili nüfusunun yaklaşık %50'sinin yaşadığı Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinin oluşturduğu merkez ilçelerde kayıp kaçak oranı 2019 yılında %37 mertebesindeyken bu oran 2024 yılı sonu itibarıyla %24,66 seviyesine indirilmiştir. Benzer şekilde Samsun il genelinde 2019 yılında %38,85 olan kayıp – kaçak oranı 2024 yılı sonunda %32,00 'ye indirilmiştir. Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması Kurumumuzun önceliklerinden olup kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için gerekli önlemler alınmaktadır.


2024 Yılı Standart Su Dengesi Formu

	Sisteme Giren Su Miktarı (m ³ /gün)	İzinli Tüketim (m ³ /gün)	Su Kayıpları (m ³ /gün)	Kayıp-Kaçak Oranı (%)
Samsun Geneli	132.803.891	90.308.992	42.494.899	32,00
Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçeleri	73.200.112	55.146.683	18.053.429	24,66
Diğer 13 İlçe	59.603.779	35.162.309	24.441.470	41,01


Standart Su Dengesi Formu; Tarım ve Orman Bakanlığının *İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıpları Yıllık Raporu* doğrultusunda hazırlanmıştır.

Yıllar İtibarıyla Su Kayıp/Kaçak Oranı (%)

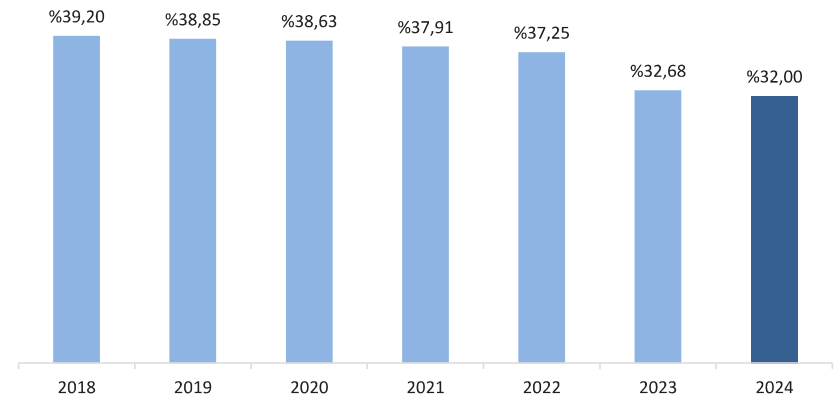


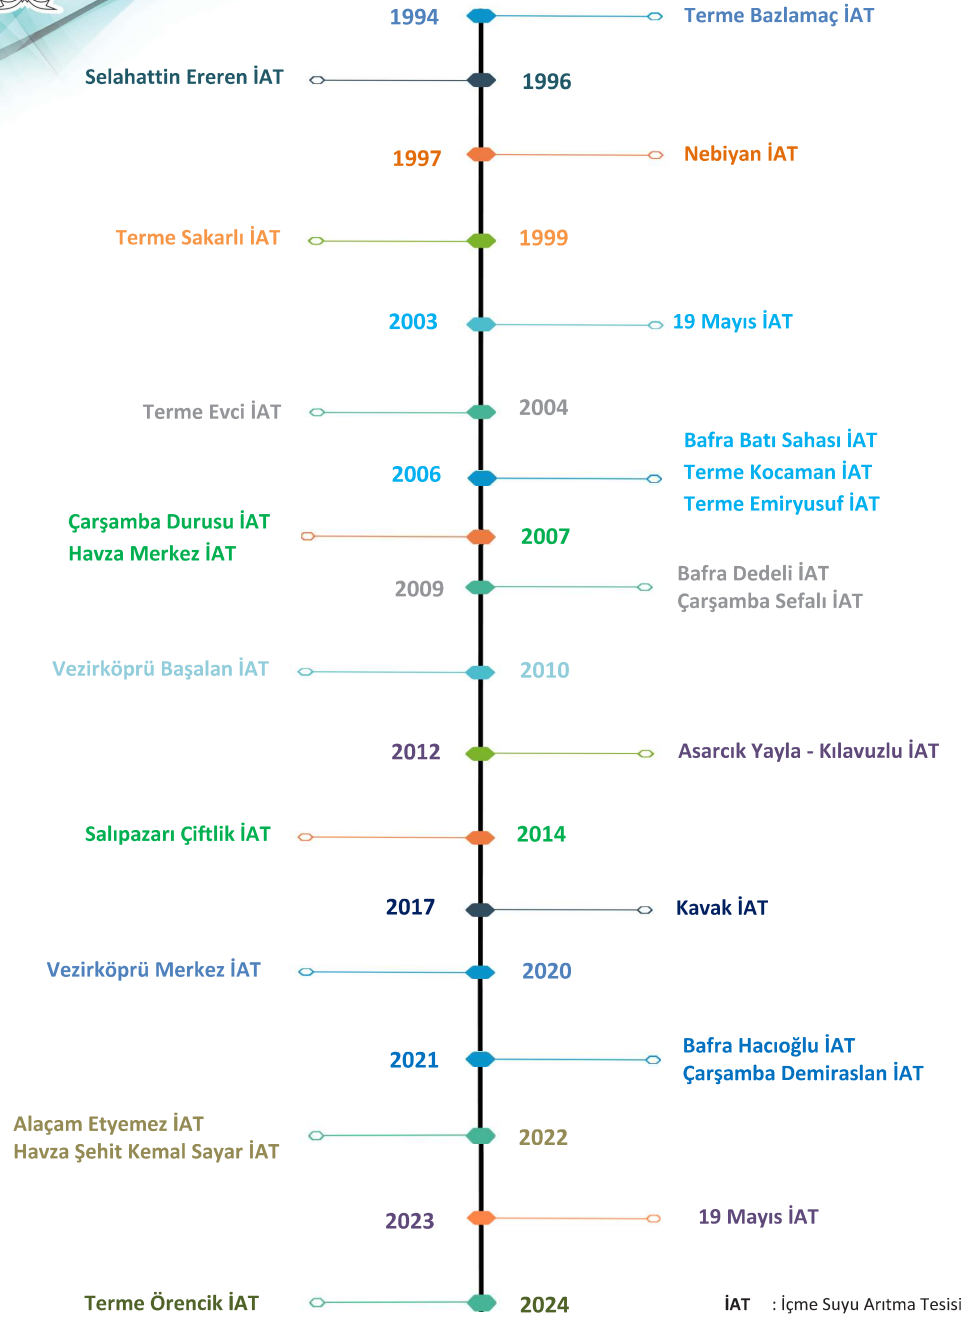

Yıllar İtibarıyla İçme Suyu Problemi Çözülen Kırsal Mahalle Sayısı

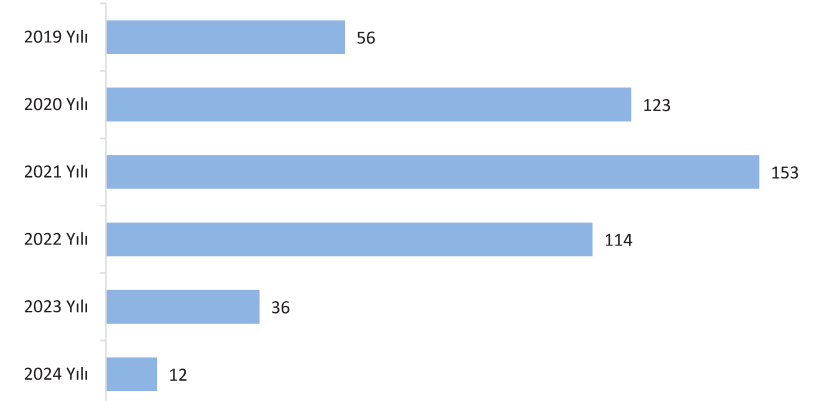

2019-2024 yılları arasında 494 kırsal mahallenin içme suyu problemi çözülmüştür. Kalan 77 kırsal mahalle için çalışmalar devam etmektedir.



Su Kalitesi ve Analizi

Çeşitli kaynaklardan şebekeye verilen içme ve kullanma sularının mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan hijyenik olması halk sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklara klor dozaj sistemleri kurulmakta ve bölgesel kaynakların sürekli olarak dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. Klor dozaj sistemleri 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Klor dozaj sistemlerinin ayar ve periyodik bakımları ile klor ölçümleri klorlama ekibi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

Samsun il sınırları içinde ihtiyaç duyulan noktalara numune alma kutuları ve klor cihazlarının montajının yapılması, klorlama noktalarında bakiye klorun şebekenin en uç noktasında 0,2-0,5 ppm aralığında olmasını sağlamak amacıyla klor takviyesinin yapılması, klor cihazlarının ayarlarının yapılması ve içme-kullanma suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'te belirtilen kriterlere uygunluğunun takibi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda klorlama işlemi gerçekleştirilen toplam 703 noktanın takibi yapılmaktadır. Kurumumuzca dezenfeksiyon amacıyla 2024 yılı içerisinde 329.385 kg mayi klor ve 526.410 kg sodyum hipoklorit kullanılmıştır.

Kurum laboratuvarımız; Temiz Su Laboratuvarı, Numune Kabul ve Raporlama Birimi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı ile Atık Su Laboratuvarı olmak üzere toplam 4 kısımdan oluşmaktadır. Temiz Su ve Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda, içme ve kullanma suyu, yüzeysel su kaynakları ve yer altı su kaynakları matrislerinde toplam 40 parametrenin ulusal ve uluslararası metotlar kullanarak kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirilmektedir. Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi binasında kurulan atık su laboratuvarında atık su matrisinde 5 parametrenin analizi yapılmaktadır.

Laboratuvarımız en son 17.09.2024 tarihinde TÜRKAK denetimine katılmıştır. Bu kapsamda temiz su matrisinde 12 ve atık su matrisinde 3 parametrede akredite sonuç alınabilmektedir.

2024 yılında alınan 14.456 adet numune üzerinde; 66.127 adet kimyasal, 5.180 adet bakteriyolojik analiz olmak üzere toplam 71.307 adet parametrenin analizi yapılmıştır.

Günlük analiz sayımız 2024 yılı itibarıyla 195'e ulaşmıştır.



İçme Suyu SCADA Sistemi

SCADA Sistemi ile Samsun ili genelindeki su kaynakları ve terfi merkezleri, ana su depoları, isale hatları ve tasfiye tesislerinden oluşan ana dağıtım sistemi uzaktan kontrol ve kumanda edilmektedir. SCADA Sistemi'ndeki PLC, modem, seviye sensörü gibi enstrümanların işletme, bakım ve onarımı yapılarak abonelere kesintisiz su hizmeti sağlanması için çalışmalar yürütülmektedir.

Bu doğrultuda SCADA operatörleri tarafından 7/24 izlenen SCADA sisteminde 2.965 alarm oluşmuş olup uzaktan müdahale ile çözülen arızalar dahil 768 otomasyon arızası giderilmiştir.

2024 yılı içerisinde istasyonlarda arızalı durumda olan 21 adet PLC'ye müdahale edilip arızaların giderimi sağlanmıştır.

Olası arızaların azaltılması ve işletme sırasında verim artışı elde edilmesi amacıyla SCADA sistemindeki 45 adet içme suyu tesisinin panosu revize edilmiştir.

2024 yılında içme suyu depolarında 110 adet seviye sensörü kullanılmıştır.

Şehrimizdeki içme suyu tesislerinde yeni panosu yapılan toplam 45 adet istasyonun montaj, programlama ve devreye alma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu çalışmalar neticesinde 2024 yılı itibarıyla; 121 adet içme suyu deposu, 124 adet içme suyu depo ve terfi merkezi, 10 adet içme suyu terfi merkezi, 8 adet içme suyu arıtma tesisi, 4 adet baraj gözlem istasyonu, 41 adet içme suyu sondajı ve 9 adet içme suyu kesonu olmak üzere toplam 317 adet içme suyu tesisi SCADA sisteminden izlenebilir hale gelmiştir.

Bu tesislerin 80 tanesinde toplam 150 motor uzaktan kontrol edilebilmektedir. Uzaktan kumanda işlemlerindeki senaryolar iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir şekilde yazılmış olup uzaktan kumanda özelliği saha çalışmaları esnasında yazılımsal olarak engellenebilmektedir.

İÇME SUYU SCADA SİSTEMİ

121

İçme Suyu
Deposu

124

İçme Suyu
Depo ve Terfi Merkezi

10

İçme Suyu
Terfi Merkezi

8

İçme Suyu
Arıtma Tesisi

4

Baraj
Gözlem İstasyonu


50

İçme Suyu
Sondaj ve Kesonu

Toplam

317 Nokta

SASKİ SCADA KONTROL MERKEZİ

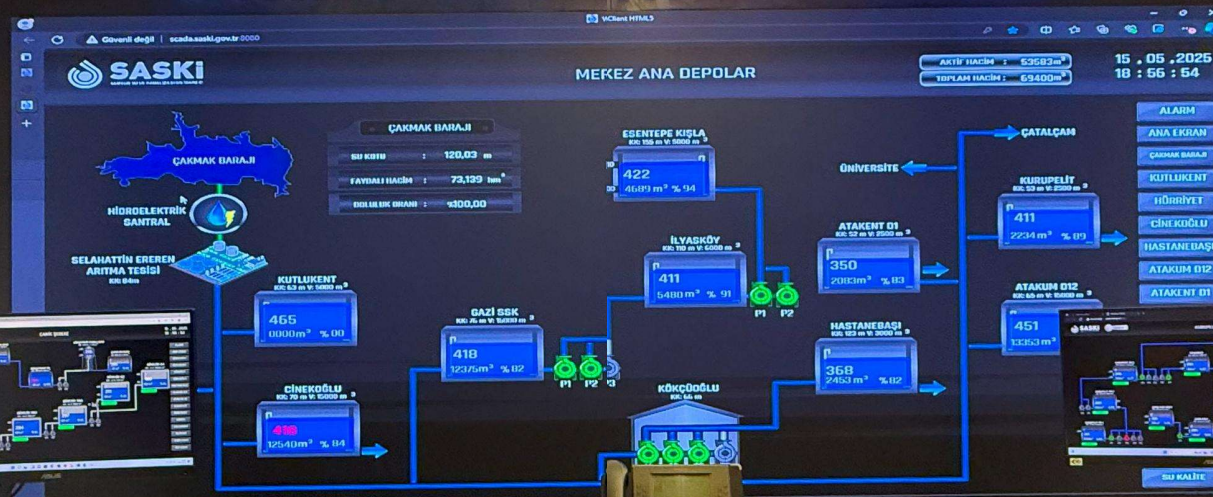

c. Atık Su Bertarafı


Yerleşim yerlerinden gelen evsel atık sular, kanalizasyon şebeke ve kollektör hatlarıyla terfi merkezlerine buradan da atık su arıtma tesislerine aktarılmaktadır. Atık su arıtma tesislerine ulaşan atık sular, ilgili Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilmektedir. İlimiz genelinde yapımı tamamlanarak işletmeye alınan 29 adet atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. İdareміz tarafından 9 adet ileri biyolojik, 6 adet biyolojik, 9 adet paket, 1 adet stabilizasyon havuzu ile 4 adet doğal arıtma olmak üzere toplam 29 adet atık su arıtma tesisi işletilmektedir. İlimizin en büyük ilçelerinden biri olan Çarşamba'nın atık sularının arıtıldığı Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatına 2020 yılında başlanılarak 2023 yılında tamamlanmıştır. Böylece Samsun'da bütün ilçe merkezleri atık su arıtma tesisine kavuşmuştur. Atık su arıtma tesislerimizin 5 tanesinde derin deniz deşarjı bulunmakta olup, derin deniz deşarj hatları kıydan 1.000-2.500 m açıkta ve deniz yüzeyinden 15-25 m derinde yer almaktadır.

Mevcut atık su arıtma tesislerimiz ile toplam şehir nüfusunun %85'ine atık su arıtma hizmeti verilmektedir. Nüfusun geri kalan kısmının atık suları foseptiklerde toplanmaktadır. Foseptiklerde biriken atık sular, vidanjörlerle periyodik olarak atık su arıtma tesislerine taşınmaktadır.

Havza Koruma ve Ruhsatlandırma Çalışmaları

İdareміz tarafından yapımı tamamlanan kanalizasyon hatlarının, atık su terfi merkezlerinin ve atık su arıtma tesislerinin çevreye zarar vermeden çalışmasını sağlamak amacıyla işletmelere ait ruhsat ve denetleme faaliyetleri çerçevesinde yeni ruhsatlandırma, ruhsat yenileme, periyodik numune alma, analiz yapma/yaptırma, ölçme ve periyodik kontrol faaliyetleri yürütülmekte olup, deşarj standartlarını sağlayan firmalara Bağlantı Kalite Kontrol Belgesi düzenlenmektedir.

Çarşamba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çakmak Barajı ile 19 Mayıs ilçesi sınırları içerisinde bulunan 19 Mayıs Barajı havzaları için Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlemesi çalışmaları onaylanmak ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne sunulmuştur.

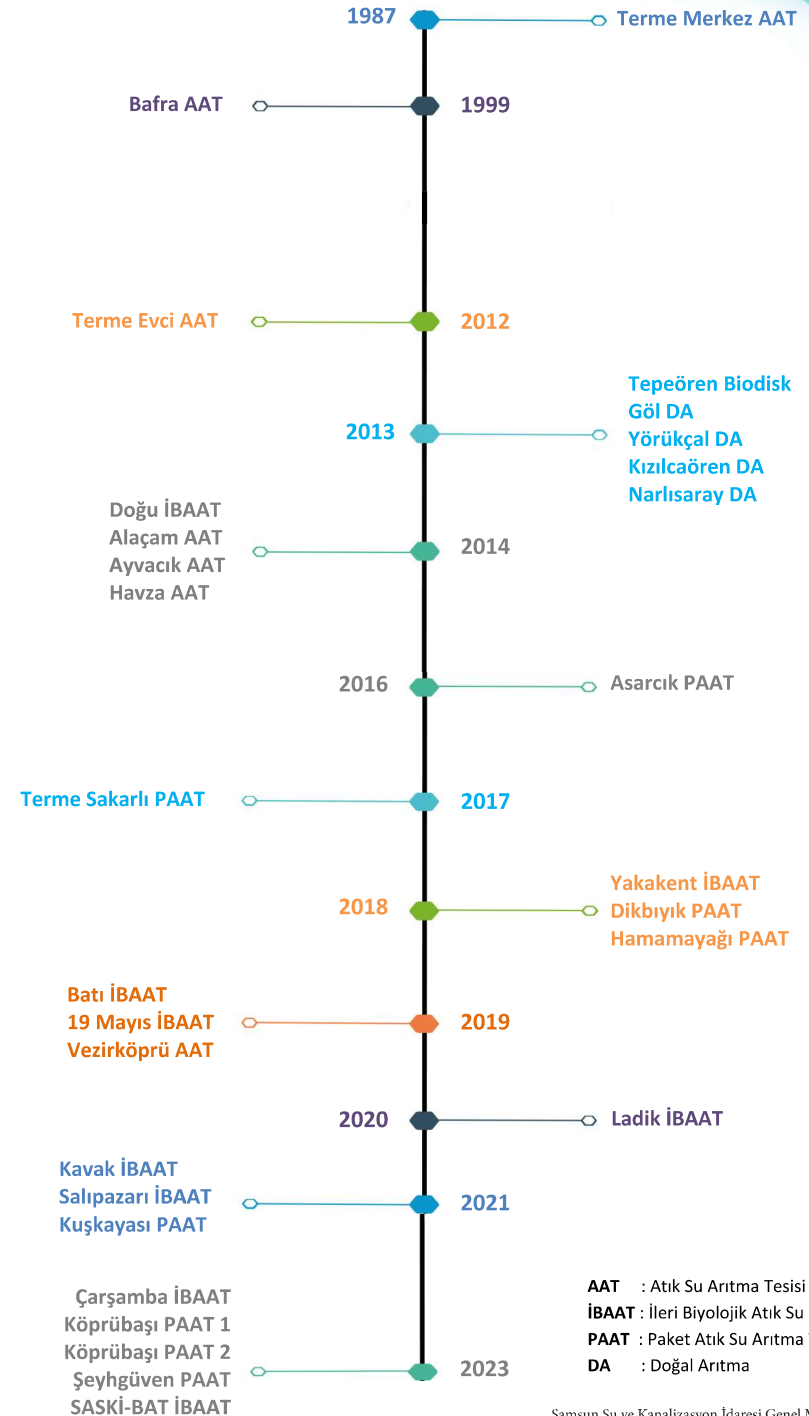

Atık Su Arıtma Tesisleri İşletme Değerleri

Atık Su Arıtma Tesisleri	Kapasite (m³/gün)	Debi (m³/yıl)	Elektrik (kWh/yıl)
Doğu İleri Biyolojik	105.000	60.124.231	8.702.564,825
Bafra Biyolojik	35.000	6.258.714	1.305.739,235
Çarşamba İleri Biyolojik	15.500	4.174.793	1.377.724,878
Batı İleri Biyolojik	12.256	4.024.652	626.524,879
Terme Merkez	8.878	3.221.664	171.460,111
Ladik İleri Biyolojik	6.500	1.305.026	278.556,365
Vezirköprü Biyolojik	6.187	821.635	63.886,701
Kavak İleri Biyolojik	6.000	988.364	371.257,969
Salıpazarı İleri Biyolojik	6.000	642.314	396.074,070
19 Mayıs İleri Biyolojik	3.840	1.399.654	723.834,855
Havza Biyolojik	3.556	1.265.014	171.407,332
SASKİ-BAT İleri Biyolojik	2.500	328.614	72.041,174
Alaçam Biyolojik	1.950	525.044	121.502,088
Yakakent İleri Biyolojik	1.500	476.014	321.520,043
Terme Evci Biyolojik	1.000	368.054	34.555,461
Vezirköprü Doğal Arıtmalar (Yörükçal, Göl, Narlısaray, Kızılcaören)	850	93.447	-
Terme Sakarlı PAAT	600	183.560	65.357,880
Asarcık PAAT	600	176.528	16.647,594
Dikbıyık PAAT	600	142.154	33.284,407
Ayvacık Biyolojik	500	179.635	15.659,392
Şeyhgüven PAAT	400	97.104	60.368,903
Hamamayağı PAAT	100	28.002	2.698,269
Kuşkayası PAAT	60	18.652	2.274,269
Köprübaşı PAAT 1	60	14.255	3.508,074
Köprübaşı PAAT 2	60	13.964	3.859,814
Tepeören Biodisk	50	17.141	-
Toplam	219.547	86.888.229	14.942.308,588
Günlük Ortalama	601,49	238.049,94	40.937,832

Şehrimizdeki atık suların çok büyük bir kısmı atık su arıtma tesislerimizde toplanmakta ve tesislerde toplanan atık suların %85'i ileri biyolojik arıtmadan geçirilmekte, kalan kısmı ise biyolojik arıtmaya tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla tesislerimizde toplanan atık suların tamamı arıtılarak deşarj edilmektedir.



Doğu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi


Yağmur Suyu Yönetimi

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önemli etkilerinden biri de yağışların yer ve zaman bakımından düzensizliğidir. Bu durum ülkemiz ve şehrimiz açısından değerlendirildiğinde de yağış rejiminin düzensiz olduğu görülmektedir.

Yağışların düzensizliği ve bu durumun oluşturabileceği kuraklığa karşı içme suyu yatırımları hayata geçirilmekte ve içme suyu kaynak çeşitlendirmesi yapılarak şehrin su ihtiyacı uzun yıllar garanti altına alınmaktadır. Ani yağışların oluşturduğu taşkınlarla karşı önlem almak amacıyla yağmur suyu hatları ve terfi merkezleri inşa edilmekte ve dere ıslahları yapılmaktadır.

Bu kapsamda 2024 yılında 31 km yağmur suyu hattı imalatı ve 26,3 km dere temizliği gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca gerek derelerin gerekse yağmur suyu hatlarının ihtiyaç duyulduğu anda işlevsel biçimde çalışabilmesi için gerekli bakım, onarım ve temizlik faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülmektedir. Dere temizlikleri kapsamında 2024 yılında derelerin denizle bağlantı kısımlarında biriken çamur, sazlık, balçık türü tortular temizlenerek tıkanmalar önlenmiştir. Menfez ve derelerin belirli yerlerinde bulunan çöktürme yapılarında biriken balçık, çamur gibi tortular düzenli aralıklarla temizlenmiştir.

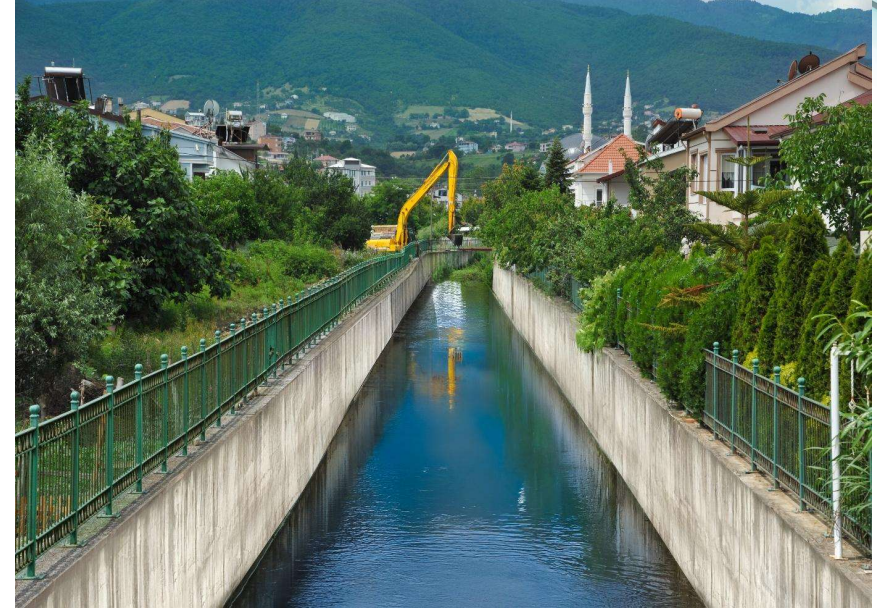

Atık Su SCADA Sistemi

SCADA Sistemi ile Samsun ili genelindeki atık su terfi merkezleri ve atık su arıtma tesislerinden oluşan atık su sistemi uzaktan kontrol ve kumanda edilmektedir. Bu doğrultuda SCADA Sistemi'ndeki PLC, modem, seviye sensörü gibi enstrümanların işletme, bakım ve onarımı yapılarak atık su bertarafının kesintisiz sağlanması için çalışmalar yürütülmektedir.

Bu doğrultuda SCADA operatörleri tarafından 7/24 izlenen sistemde 165 alarm oluşmuş olup uzaktan müdahale ile çözülen arızalar dahil 22 tesiste otomasyon arızası giderilmiştir.

2024 yılı içerisinde istasyonlarda arızalı durumda olan 10 adet PLC'ye müdahale edilip arızalarının giderilmesi sağlanmıştır.

Olası arızaların azaltılması ve işletme verimliliğinin artırılması amacıyla SCADA sistemindeki 2 adet atık su arıtma tesisinin panosu revize edilmiştir.

Şehrimizin atık su arıtma tesislerinde bulunan 4 adet seviye sensörünün değişimi yapılarak devreye alınması sağlanmıştır.

Samsun ili genelinde 5 adet atık su terfi merkezi ve 3 adet yağmur suyu keson terfi merkezinin SCADA Sistemi'ne aktarımı gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu çalışmalar neticesinde; 15 adet atık su terfi merkezi, 3 adet yağmursuyu keson terfi merkezi ve 6 adet atık su paket arıtma tesisinden oluşan toplam 24 adet atık su tesisi izlenebilir hale getirilmiştir.

Bu tesislerin 15 tanesinde toplam 82 adet motor uzaktan kontrol edilebilmektedir. Uzaktan kumanda işlemlerindeki senaryolar iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir şekilde yazılmış olup uzaktan kumanda özelliği saha çalışmaları esnasında yazılımsal olarak engellenebilmektedir.

Atık Su
SCADA
Sistemi

15

Atık Su
Terfi Merkezi

3

Yağmur Suyu
Terfi Merkezi


6

Atık Su
Arıtma Tesisi

Toplam

24 Nokta



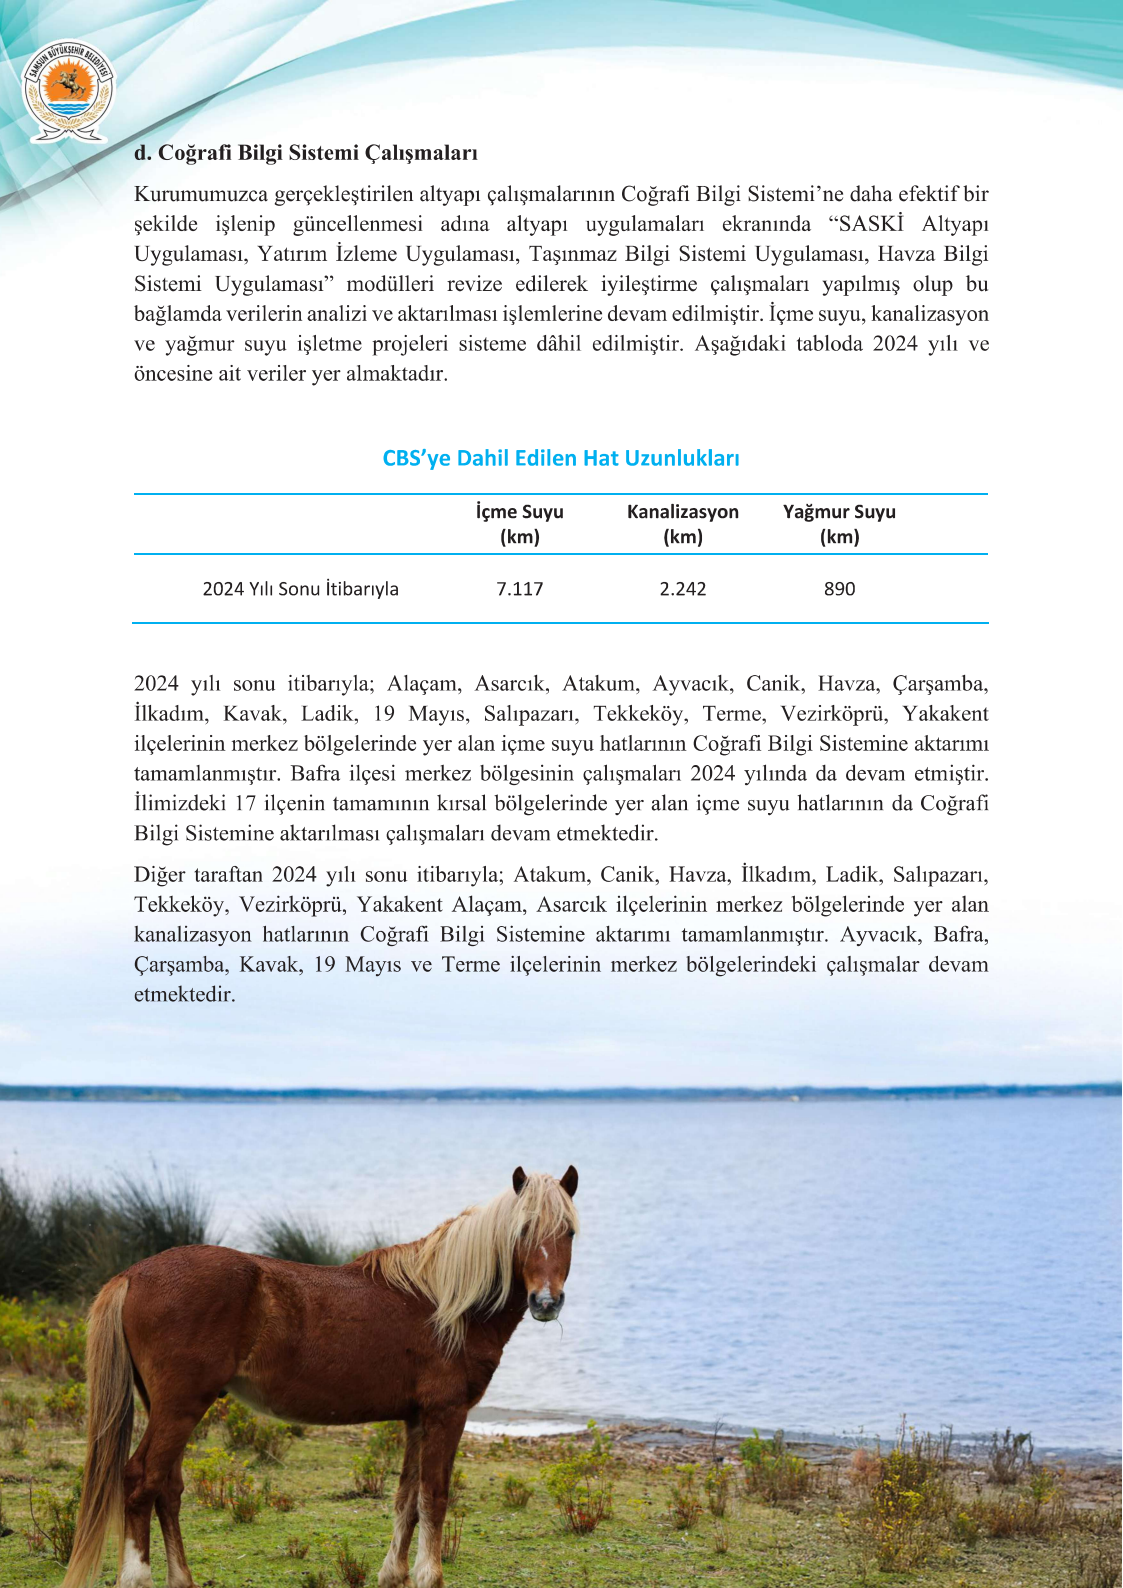

d. Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları

Kurumumuzca gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının Coğrafi Bilgi Sistemi'ne daha efektif bir şekilde işlenip güncellenmesi adına altyapı uygulamaları ekranında “SASKİ Altyapı Uygulaması, Yatırım İzleme Uygulaması, Taşınmaz Bilgi Sistemi Uygulaması, Havza Bilgi Sistemi Uygulaması” modülleri revize edilerek iyileştirme çalışmaları yapılmış olup bu bağlamda verilerin analizi ve aktarılması işlemlerine devam edilmiştir. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu işletme projeleri sisteme dâhil edilmiştir. Aşağıdaki tabloda 2024 yılı ve öncesine ait veriler yer almaktadır.

CBS'ye Dahil Edilen Hat Uzunlukları

	İçme Suyu (km)	Kanalizasyon (km)	Yağmur Suyu (km)
2024 Yılı Sonu İtibarıyla	7.117	2.242	890

2024 yılı sonu itibarıyla; Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Canik, Havza, Çarşamba, İlkadım, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Yakakent ilçelerinin merkez bölgelerinde yer alan içme suyu hatlarının Coğrafi Bilgi Sistemine aktarımı tamamlanmıştır. Bafra ilçesi merkez bölgesinin çalışmaları 2024 yılında da devam etmiştir. İlimizdeki 17 ilçenin tamamının kırsal bölgelerinde yer alan içme suyu hatlarının da Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması çalışmaları devam etmektedir.

Diğer taraftan 2024 yılı sonu itibarıyla; Atakum, Canik, Havza, İlkadım, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü, Yakakent Alaçam, Asarcık ilçelerinin merkez bölgelerinde yer alan kanalizasyon hatlarının Coğrafi Bilgi Sistemine aktarımı tamamlanmıştır. Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Kavak, 19 Mayıs ve Terme ilçelerinin merkez bölgelerindeki çalışmalar devam etmektedir.



e. Bakım ve Onarım Çalışmaları

İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca Yapılan Çalışmalar

Samsun genelinde 2024 yılında idari ekip ve ekipmanlar ile 383.398 m içme suyu şebeke ve iletim hattı, 7.167 adet abone bağlantısı, 40.020 adet içme suyu şebeke ve abone arızası onarımı, 28.531 adet tanker ile su temini ve 962 adet depo temizliği yapılmıştır. Ayrıca yüklenici ekipler ile 410.354 m içme suyu şebeke ve iletim hattı, 94 adet depo, 18 adet terfi binası yapılmış ve 6 adet sondaj kuyusu açılmıştır.



Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca Yapılan Çalışmalar

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 2024 yılı içerisinde idari ekiplerce 62.982 m kanalizasyon hattı, 9.815 m yağmursuyu hattı, 4 adet atık su terfi merkezi inşa edilmiş ve 4.216 adet kanalizasyon arızası onarımı, kombine makinesiyle 24.396 adet kanalizasyon ve yağmur suyu hattı tıkanıklık giderimi, vidanjörle 26.569 adet foseptik çekimi, 12.978 adet ızgara temizliği, 2.084 adet muayene bacası yükseltilmesi-alçaltılması, 202.517 m kanalizasyon ve yağmur suyu hattı temizliği ve 26.320 m dere temizliği gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yüklenici ekipler ile 49.982 m kanalizasyon hattı ile 22.457 m yağmursuyu hattı yapılmıştır.



Makine, İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığınca Yapılan Çalışmalar


Samsun genelinde 2024 yılında 126 adet içme suyu pompa-motor grubunun kurulum işleri yapılmıştır. İçme suyu terfi merkezlerinde 2023 yılında 182 adet pompa arızası meydana gelmişken, yapılan önleyici bakım çalışmaları sonucunda 2024 yılında söz konusu pompa arızaları 168'e kadar düşürülmüştür. Bunun dışında, 88 adet mekanik arıza, 620 adet mekanik bakım, 324 adet muhtelif kaynak işleri, 64 adet boru tamir ve 32 adet köprü geçişi arıza giderimi ve onarım işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 6.037 adet elektrik otomasyon ve 198 adet asenkron elektrik motor arızasına müdahale edilmiştir.

İçme suyu ve atık su tesislerinde kullanılan 191 adet jeneratörde meydana gelen 235 adet arızaya müdahale edilmiş, 374 adet periyodik bakım gerçekleştirilmiştir. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan eski yıldız-üçgen bağlantılı MCC panoların yerine atölyemizde imalatı yapılan yeni sürücülü MCC panoların montajı yapılmıştır. Derebahçe yerleşkesinde yer alan pano imalat atölyesinde 2024 yılında toplam 210 adet elektrik panosu idari ekiplerimiz marifetiyle üretilmiştir.

Atık su terfi merkezlerinde yaklaşık 17.000 adet sepet ve sabit ızgara temizliği yapılmıştır. 78 adet atık su terfi merkezi ve 5 adet yağmur suyu terfi merkezinde yer alan 102 adet atık su pompasında meydana gelen arızalara ekiplerimizce müdahale edilerek yaklaşık olarak **13.060.000,00 TL** tasarruf sağlanmıştır.



Yıllar İtibarıyla Bakım ve Onarımı Yapılan Motor Sayısı

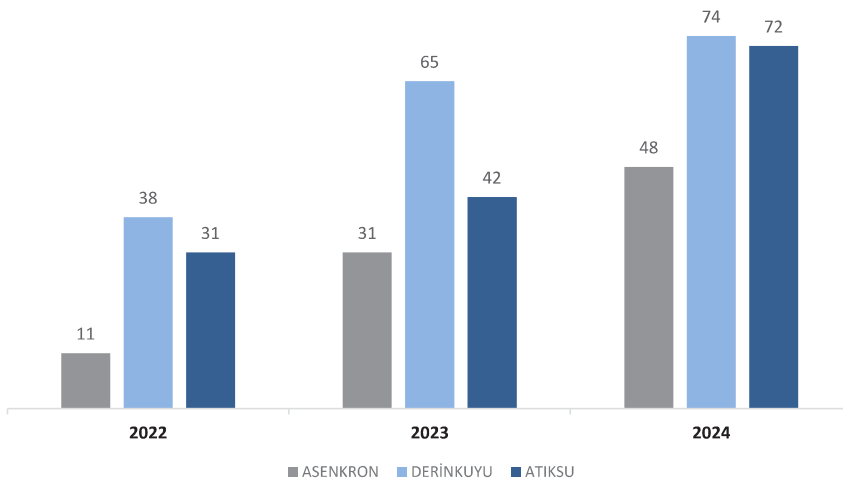

19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hatlarının 2023 ve 2024 yıllarında hizmete alınmasıyla 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerine kesintisiz ve memba kalitesinde içme suyu sağlanmış ve bunun yanı sıra yüksek enerji sarfiyatına sahip bazı tesislerin kullanımı azaltılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır. Sonuç olarak 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hatlarının devreye alınmasıyla 2024 yılında 12.199.223 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bu tasarrufun 2024 yılı Aralık ayı birim fiyatlarına göre parasal karşılığı 51.422.992,24 TL'dir. Bahse konu yatırım sayesinde sağlanan enerji tasarrufu aşağıda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

-19 Mayıs ilçesine geçmiş yıllarda 13 adet sondajdan içme suyu temin edilirken 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin devreye alınmasıyla bölgedeki abonelerimize cazibeli bir şekilde içme suyu sağlanmış ve böylece sondajlar devre dışı bırakılarak enerji tüketimine son verilmiştir.

-19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hatları tamamlanarak devreye alınmadan önce Bafra ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacı, sondajlardan temin edilen suyun enerji tüketimi fazla olan membranlı filtreleme sistemine haiz tesiste artıldıktan sonra pompalarla şehir merkezindeki Fevzi Çakmak İçme Suyu Deposu'na terfi edilerek karşılanırken 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hatlarının devreye alınması ile Bafra ilçe merkezine cazibeli bir şekilde içme suyu temin edilmiş ve ciddi enerji tasarrufu sağlanmıştır.

-Kesintisiz ve daha kaliteli su arzının yanı sıra enerji tasarrufu da sağladığımız diğer ilçelerimiz ise Alaçam ve Yakakent'tir. Daha önce Alaçam ve Yakakent ilçelerimizde yer alan sondajlardan bölgeye su temin edilmekteyken 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hatlarının devreye alınmasıyla Bafra Çetinkaya İçme Suyu Deposuna cazibeli olarak ulaşan su, bu tesisten terfi edilerek Alaçam ve Yakakent ilçe merkezlerine ulaştırılmış ve böylece büyük oranda enerji tasarrufu sağlanmıştır.

6 - Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresinin yönetimi; Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşmaktadır.

Genel Kurul

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, SASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Kurulun Başkanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki İlçe Belediye Başkanları Büyükşehir Belediye Meclisinin doğal üyesidir. SASKİ Genel Kurulunun görev ve yetkileri 2560 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu

SASKİ Yönetim Kurulu 1 Başkan ve 5 üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde ise yaşlı olanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır.

Denetçiler

SASKİ Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, Genel Kurul tarafından seçilen 2 (iki) denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler SASKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve mevzuat dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul'a sunarlar.

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, Denetçilerin haricinde Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından da denetlenmektedir. Teftiş Kurulu Başkanı doğrudan Genel Müdüre bağlı olup, bu kontrolleri Genel Müdür adına yapar. İçişleri Bakanlığı ise vesayet denetimi kapsamında, genel iş yürütümünü teftiş etmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetim yapılmaktadır.

7 - Teftiş Kurulunca Yürütülen Faaliyetler

SASKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı, uhdesinde bulunan ve mesleğe girdikten sonraki eğitim ve sınav şartlarını yerine getirmek suretiyle yetki alan müfettiş ve müfettiş yardımcılarını aracılığı ile Genel Müdürlüğün yönetimi ve denetimi altındaki birim ve kişilerin iş ve işlemlerine ilişkin; her türlü teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetini yürütür. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 2024 takvim yılına ilişkin faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır.

- 1 adet inceleme ve denetim dosyasının işlemleri tamamlanmıştır.
- 5 adet soruşturma dosyasının işlemleri tamamlanmıştır.

- Samsun Valiliğinden gelen 1 adet ön inceleme dosyasının işlemleri tamamlanmıştır.
- 2024 yılında başlayan 1 adet birim teftiş dosyasının işlemleri devam etmektedir.
- 2024 yılında başlayan 1 adet soruşturma dosyasının işlemleri devam etmektedir.

8 - 1. Hukuk Müşavirliğince Yürütülen Faaliyetler

Hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde 1. Hukuk Müşavirliğimizce Genel Kurul toplantılarının mevzuata uygun yapılması ve alınan kararların mevzuata uygunluğunun sağlanması amacıyla toplantılara iştirak edilmiş; Genel Kurul'da görüşülecek konuların ön incelemesi yapılmış ve Genel Müdürlüğümüzün taraf olduğu sözleşme ve protokol taslaklarına ilişkin görüş ve değerlendirmeler ilgili birimlere bildirilmiştir.

Kurumumuzun taraf olduğu 291 adet dava açılmıştır. Genel Müdürlüğümüz tarafından açılan toplam dava sayısı 14 iken Genel Müdürlüğümüz aleyhine açılan dava sayısı 277 olarak gerçekleşmiştir.

Açılan davalardan 40 tanesi karara bağlanmış olup bu davaların 9 tanesi Kurumumuz lehine sonuçlanmıştır. Sonuçlanan bu davaların 3 tanesi adli yargıda, 6 tanesi ise idari yargıda görülmüştür. Bunların yanı sıra Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 38 adet suç duyurusunda bulunulmuş olup bu kapsamda Başsavcılık tarafından açılan dosyalara ilişkin işlemler devam etmektedir.

6325 sayılı Kanun kapsamında yürütülen zorunlu arabuluculuk faaliyetlerine katılmak amacıyla Makam onayı ile arabuluculuk komisyonları oluşturulmuş, bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce taraf olunan 196 adet dosyada arabuluculuk süreci yürütülmüştür.

2024 yılı içerisinde 1.371 adet icra takibi başlatılmış olup Genel Müdürlüğümüzün alacaklı olduğu toplam 1.043 adet icra dosyası infaz edilmiştir.

2024 yılı Bütçe Kararnamesi uyarınca diğer kişi, kurum veya kuruluşlara ait mal ve malzemelere verilen hasarların sulh yoluyla tazmini adına kurulan Zarar Ziyan Komisyonu tarafından 46 adet dosya neticelendirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimler tarafından Makam onayı ile talep edilen 5 adet hukuki görüş talebi değerlendirilerek söz konusu birimlere mütalaa verilmiştir.



2.BÖLÜM AMAÇ ve HEDEFLER

İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ
TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaçlar
1 En kaliteli içme suyunu sağlamak
2 Atık suların etkili yönetimini sağlamak
3 Yönetsel sistemi geliştirmek
Hedefler
1.1 İçme sularının arıtılması ve sağlıklı içme suyunun arzı
1.2 İçme suyu temini için şebeke ve isale hattı etüd proje ve fizibilite raporlarını hazırlamak
1.3 İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak
1.4 Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması
1.5 İçme suyu sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek
1.6 İçme suyu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması
2.1 Kanalizasyon ve dere ıslahı projelerini hazırlamak
2.2 Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak
2.3 Atık su arıtma tesisi inşaatı projelerini hazırlamak
2.4 Atık su arıtma tesislerinin sürekli ve verimli olarak çalıştırılması ile proses kontrollerinin yapılması
2.5 Atık su terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması
3.1 Bilgi ve teknolojik sistemin geliştirilmesi
3.2 Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi
3.3 Devir abonelik işlemlerinin tamamını abonenin başvurduğu gün sonuçlandırmak
3.4 Yeni aboneler için kullanılacak ve teknolojik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının temini
3.5 Mali disiplini sağlamak
3.6 Personelin mesleki yetkinliğinin artırılması ve kişisel gelişiminin sağlanması
3.7 Vatandaş ve kurumlardan gelen talep ve şikayetlere etkin şekilde cevap vermek
3.8 Kurumsal imajı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak
3.9 İçme suyu kaynakları, su ve atık su arıtma tesislerinin güvenliğini sağlamak

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Kurumumuz amaç ve hedeflerinin oluşmasındaki belirleyici etken 11. Kalkınma Planıdır. Bahse konu Planda yer alan ve Kurumumuza amaç ve hedefleri açısından yol gösteren bazı önemli maddeler aşağıda sıralanmıştır.

Mevcut Su Kaynaklarının Korunması

Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla nehir havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları ve içme suyu havzaları koruma eylem planları tamamlanacaktır.

Yeni Su Kaynaklarının Bulunması

Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği ile nüfus artışına karşın yeni su kaynaklarının bulunması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda yeni su kaynakları bulunup şehrimizin hizmetine kazandırılacaktır.

Hinterland Kapsamında Yeni Bağlanan Beldelerin Su ve Kanalizasyon Altyapılarının Tamamlanması

Samsun ilinde 957.900 (ha) hizmet alanında, 1.382.376 vatandaşımıza hizmet götürmek için içme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu birimlerin işletme performansı ve yatırım verimliliği artırılacaktır.

Atık Suları Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırmak ve Geri Kazanımları Sağlamak

Sağlıklı bir ortamda yaşamının en önemli unsuru çevreyi korumaktır. Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması deniz, göl, akarsu gibi kaynakların temiz kalması ve sağlıklı bir ortamın oluşması için bir zorunluluktur. Bu nedenle atık su arıtma tesislerimize ulaşan evsel ve endüstriyel atık suların herhangi bir çevre problemi oluşturmadan uzaklaştırılması sağlanacaktır.

Kurumsal Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak

Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Toplumsal çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.



3. BÖLÜM FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

**MALİ BİLGİLER
PERFORMANS BİLGİLERİ**

A. MALİ BİLGİLER

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

Genel Müdürlüğümüzün 2024 yılı bütçesi; işletme ve yatırım gereksinimleri ile gelir-gider dengesi esas alınarak hazırlanmıştır.

2024 yılı Gider Bütçesi (ek bütçe dahil) 4.141.000.000,00 TL olarak öngörülmüş, buna karşılık 4.098.377.887,68 TL harcama yapılmış ve gider bütçesi gerçekleşme oranı %98,97 olmuştur.

2024 yılı Gelir Bütçesinin (ek bütçe dahil) 3.711.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmiş olup 3.691.414.368,11 TL gelir elde edilmiş ve gelir bütçesinde %99,47 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2024 yılında muhasebe iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yürütülerek; bütçe, bilanço ve finansman ile ilgili işlemler eksiksiz yerine getirilmiştir.

2024 yılı harcamaları, bütçe tertiplerine uygun olarak yapılmıştır.

2024 yılı Gider Bütçesinde;

- Personel Gideri için öngörülen 287.258.604,36 TL tutarındaki ödeneğin 283.176.585,93 TL'si harcanarak %98,58 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 35.498.541,77 TL ödeneğin 34.763.585,64 TL'si kullanılmış ve gerçekleşme oranı %97,93 olmuştur.

- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için tahsis edilen 1.849.457.803,06 TL tutarındaki ödeneğin 1.833.678.935,82 TL'si kullanılmış ve %99,15 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

- Faiz Giderleri için öngörülen 360.939.000,00 TL ödeneğin 360.550.559,57 TL'lik kısmı kullanılarak %99,89 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

- Cari Transferler için ayrılan 32.925.025,70 TL ödeneğin %91,20'si kullanılmak suretiyle 30.026.712,18 TL harcama yapılmıştır.

- Sermaye Giderleri için tahsis edilen 1.569.706.025,11 TL ödeneğin 1.551.181.508,54 TL'si kullanılarak %98,82 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.


- Borç Verme için öngörülen 5.115.000,00 TL ödeneğin 5.000.000,00 TL'si kullanılarak %97,75 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.



2024 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri

Ekonomik Sınıflandırma	Gider Çeşidi	2024 Yılı Bütçe Ödeneği (TL)	2024 Yılı Toplam Harcama (TL)
01	Personel Giderleri	287.258.604,36	283.176.585,93
01 01	Memurlar	198.555.266,33	196.669.734,06
01 02	Sözleşmeli Personel	4.000,00	0,00
01 03	İşçiler	88.699.338,03	86.506.851,87
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35.498.541,77	34.763.585,64
02 01	Memurlar	20.436.000,00	19.923.969,24
02 02	Sözleşmeli Personel	2.000,00	0,00
02 03	İşçiler	15.060.541,77	14.839.616,40
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.849.457.803,06	1.833.678.935,82
03 01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	67.798.632,00	67.426.947,84
03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	450.683.695,68	446.291.539,71
03 03	Yolluklar	1.051.518,00	515.382,92
03 04	Görev Giderleri	14.060.438,03	13.494.785,03
03 05	Hizmet Alımları	1.047.203.210,03	1.041.348.026,74
03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	404.000,00	263.548,78
03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları	100.968.770,00	97.069.619,11
03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	167.287.539,32	167.269.085,69
04	Faiz Giderleri	360.939.000,00	360.550.559,57
04 02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	321.439.000,00	321.153.279,14
04 03	Dış Borç Faiz Giderleri	39.500.000,00	39.397.280,43
05	Cari Transferler	32.925.025,70	30.026.712,18
05 01	Görev Zararları (SGK MOSİP Ödemeleri)	12.000.000,00	9.464.528,27
05 03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Transferler	0,00	0,00
05 08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	20.925.025,70	20.562.183,91
06	Sermaye Giderleri	1.569.706.025,11	1.551.181.508,54
06 01	Mamul Mal Alımları	109.521.567,20	92.211.428,31
06 03	Gayri Maddi Hak Alımları	311.390,00	311.390,00
06 04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0,00	0,00
06 05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.346.339.877,91	1.345.357.545,97
06 06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	101.000.000,00	100.944.925,30
06 07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	12.533.190,00	12.356.218,96
08	Borç Verme	5.115.000,00	5.000.000,00
08 01	Yurtiçi Borç Verme	5.115.000,00	5.000.000,00
09	Yedek Ödenek	100.000,00	0,00
09 01	Personel Giderleri Karşılama Ödeneği	100.000,00	0,00
09 06	Yedek Ödenek	0,00	0,00
Toplam		4.141.000.000,00	4.098.377.887,68

2024 Yılı Gider Bütçesi Oransal Harcama Dağılımı

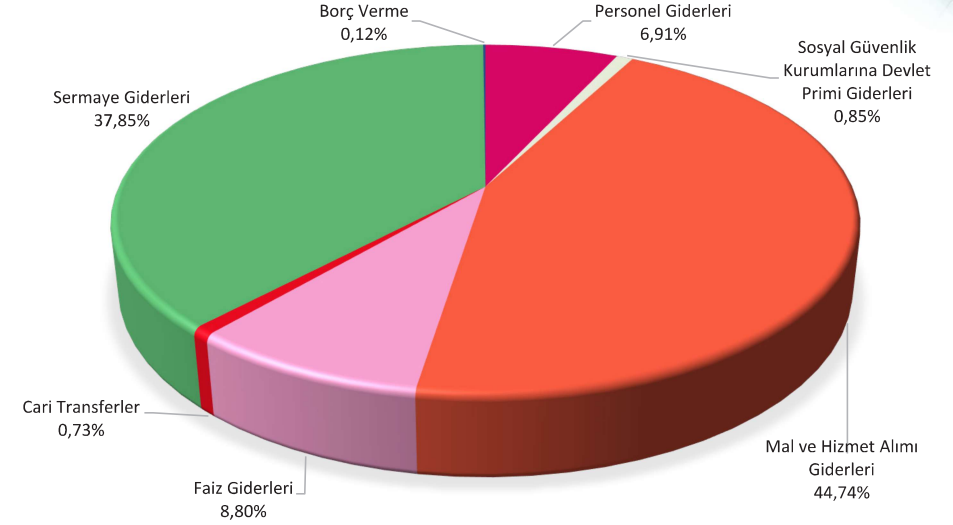

Yıllar İtibarıyla Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri


Yıl	Bütçe (A) (TL)	Harcama (B) (TL)	Oran (B/A) (%)
2020	540.000.000,00	527.642.825,31	97,71
2021	684.000.000,00	652.865.101,49	95,45
2022	1.245.000.000,00	1.235.075.475,65	99,20
2023	2.281.547.145,60	2.266.663.908,03	99,35
2024	4.141.000.000,00	4.098.377.887,68	98,97

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Bilgiler

2024 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi

Gelir Cinsi	Tahsilat Tutarı (TL)	Oran %
Su ve Atık Su Geliri	2.133.182.005,46	57,78
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	632.173.209,25	17,13
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	36.751.095,07	1,00
Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	27.347.446,22	0,74
Diğer Gelirler	861.960.612,11	23,35
TOPLAM	3.691.414.368,11	100,00%

2024 Yılı Gerçekleşen Gelir Bütçesinin Oransal Dağılımı

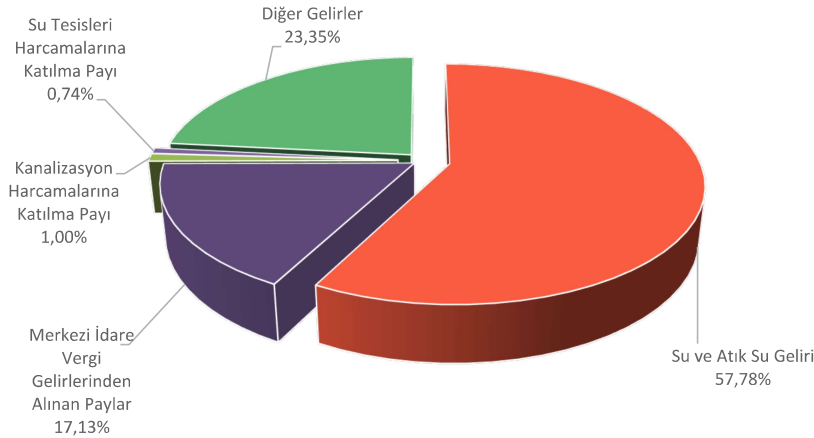

Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçesi Gerçekleşme Bilgileri

Yıl	Gelir Bütçesi (TL) (A)	Gerçekleşen Gelir (TL) (B)	Oran % (B/A)
2020	450.000.000,00	426.492.114,00	94,78
2021	551.000.000,00	571.485.318,55	103,72
2022	1.076.000.000,00	1.004.721.831,57	93,38
2023	1.880.000.000,00	1.929.822.990,82	102,65
2024	3.711.000.000,00	3.691.414.368,11	99,47

2024 Yılı Faaliyet Gelirlerine İlişkin Tahakkuk ve Tahsilat Bilgileri

Gelir Kalemleri	Toplam Tahakkuk (TL)	Toplam Tahsilat (TL)	Oran (%)
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	3.090.648,30	2.927.079,72	94,71%
Diğer Mal Satış Gelirleri	5.559,22	0,00	0,00%
Proje Onay Bedeli	5.447,58	663,20	12,17%
Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	2.352.287.863,21	2.133.182.005,46	90,69%
Diğer Hizmet Gelirleri	848.306.178,61	764.592.598,51	90,13%
Yeniden Değerlendirme Farkları	4.170,04	4.170,04	100,00%
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	7.576.487,89	7.425.988,22	98,01%
Takipteki Kurum Alacakları	174,51	174,51	100,00%
Kişilerden Alacaklar Faizleri	134.398,90	134.398,90	100,00%
Mevduat Faizleri	9.614.850,86	9.614.850,86	100,00%
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	632.173.209,25	632.173.209,25	100,00%
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	40.963.251,60	36.751.095,07	89,72%
Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	29.128.682,53	27.347.446,22	93,88%
Diğer İdari Para Cezaları	535.029,69	535.029,69	100,00%
7256 sayılı Kanuna Göre Yi/ÜFE Tutarı	857.686,48	0,00	0,00%
7256 sayılı Kanuna Göre Katsayı Tutarı	2.446.639,42	0,00	0,00%
7326 sayılı Kanuna Göre TÜFE/ÜFE Tutarı	27.599,13	27.560,81	99,86%
7326 sayılı Kanuna Göre Katsayı Tutarı	280.658,82	278.928,21	99,38%
7440 sayılı Kanuna Göre Geç Ödeme Zammı	8.581,45	8.327,63	97,04%
7440 sayılı Kanuna Göre Yi/ÜFE Tutarı	253.949,36	91.204,97	35,91%
7440 sayılı Kanuna Göre Katsayı Tutarı	237.902,45	150.922,88	63,44%
Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları	57.956.960,87	47.635.767,94	82,19%
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	645.665,30	645.665,30	100,00%
Kişilerden Alacaklar	140.679,40	140.679,40	100,00%
Enerji Kaynaklarından Gelirler	2.122.439,45	2.122.439,45	100,00%
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	23.082.714,35	23.082.714,35	100,00%
Taşınır Satış Gelirleri	112.766,33	112.766,33	100,00%
Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri	1.296.052,08	1.296.052,08	100,00%
Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar	1.132.629,11	1.132.629,11	100,00%
GENEL TOPLAM	4.014.428.876,19	3.691.414.368,11	91,95%

SASKİ Genel Müdürlüğü Bilançosu

AKTİF		2024 (TL)
I DÖNEN VARLIKLAR		1.095.327.553,93
10-HAZİR DEĞERLER		12.642.841,53
102 BANKA HESABI		7.208.598,88
105 DÖVİZ HESABI		36.804,60
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAK YATIRIM HESABI		5.397.438,05
12-FAALİYET ALACAKLARI		323.014.508,08
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		322.775.100,93
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI		239.407,15
13-KURUM ALACAKLARI		192.931.769,58
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		20.000.000,00
139 DİĞER KAMU ALACAKLARI		172.931.769,58
14-DİĞER ALACAKLAR		516.998,06
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		516.998,06
15-İLK MADDE VE MALZEME HESABI		379.352.516,70
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		379.352.516,70
16-ÖNÖDEMELER		26.206.377,81
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		8.986.910,61
165 M.DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİ HESABI		17.219.467,20
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		160.662.542,17
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		160.662.542,17
II DURAN VARLIKLAR		9.264.645.158,59
22-GELİRLERDEN ALACAKLAR HESAPLARI		8.440.144,72
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		8.440.144,72
24-MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER		1.902.667,96
241 MAL VE HİZMET ÜR. KUR. YAT. SERM. HES.		5.652.667,96
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		-3.750.000,00
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR		9.254.302.345,91
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		348.356.421,79
251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		8.924.789.093,40
252 BİNALAR HESABI		625.878.834,10
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR		250.061.447,55
254 TAŞITLAR HESABI		222.516.719,73
255 DEMİRBAŞ HESABI		31.173.489,11
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		-2.519.711.297,99
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR		1.371.237.638,22
260 HAKLAR HESABI		6.133.595,49
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI		0,00
268 ÖZEL MALİYETLER AMORTİSMANI (-)		6.133.595,49
294 ELDEN ÇIK. STOKLAR VE MAD.		12.414.534,09
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HES. (-)		-12.414.534,09
AKTİF TOPLAMI		10.359.972.712,52
NAZİM HESAPLAR		
9 DİPNOT - NAZİM HESAPLAR		255.702.991,01
90- ÖDENEK HESAPLARI		17.219.467,20
906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI		17.219.467,20
91- NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER		195.981.964,34
910 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANET HESABI		188.740.444,76
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		7.241.519,58
92 -TAAHHÜT HESAPLAR		4.961.125,80
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI		4.961.125,80
94 -ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI		29.609.562,00
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		29.609.562,00
99 DİĞER VARLIK HESAPLAR		7.930.871,67
990 KİRAYA VERİLEN İRTİFAK. HK. TES. EDİLEN. MAD. DUR. VAR. KAY. DEĞ. HES.		835.466,33
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ		7.095.405,34
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		255.702.991,01
GENEL TOPLAM		10.615.675.703,53

SASKİ Genel Müdürlüğü Bilançosu

PASİF		2024 (TL)
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.109.279.337,06
30-KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		429.518.133,67
300 BANKA KREDİLERİ HESABI		333.701.724,50
303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR		333.701.724,50
31-KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR		70.660.376,14
310 DIŞ MALİ BORÇLAR		70.660.376,14
32-FAALİYET BORÇLARI		366.233.794,46
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		366.233.794,46
33-EMANET YABANCI KAYNAKLAR		40.168.937,38
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAT HESABI		11.821.702,92
333 EMANETLER HESABI		28.347.234,46
36-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		104.680.245,45
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		16.634.311,28
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		3.143.874,44
362 DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR		17.180.031,53
368 VADESİ GEÇMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİLER		67.722.028,20
37-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		45.971.621,47
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		45.971.621,47
39-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI		52.046.228,49
397 SAYIM FAZLALARI HESABI		52.046.228,49
IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.654.722.487,98
40-UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		861.923.501,40
400 BANKA KREDİLERİ HESABI		466.181.637,60
403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR		395.741.863,80
41-UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR		684.019.545,10
410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI(KFW)		684.019.545,10
43-DİĞER BORÇLAR		735.227.256,59
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		716.851.023,40
438 KAMUYA OLAN ERT. VEYA TAKSİTLENMİŞ BORÇ. HES.		18.376.233,19
47- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		373.552.184,89
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		373.552.184,89
V ÖZ KAYNAKLAR		6.595.970.887,48
50-NET DEĞER		216.191.583,77
500 NET DEĞER HESABI		216.191.583,77
57-GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET		6.620.781.099,92
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET		6.620.781.099,92
58-GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET (-)		-2.411.996.286,92
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET (-)		-2.411.996.286,92
59-DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		2.170.994.490,71
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		2.170.994.490,71
PASİF TOPLAMI		10.359.972.712,52
NAZİM HESAPLAR		
9 DİPNOT - NAZİM HESAPLAR		255.702.991,01
90- ÖDENEK HESAPLARI		17.219.467,20
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI		17.219.467,20
91- NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİ. AİT MENKUL KIYMETLER		195.981.964,34
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANET HESABI		188.740.444,76
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI		7.241.519,58
92 -TAAHHÜT HESAPLAR		4.961.125,80
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI		4.961.125,80
94 -ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI		29.609.562,00
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EM. HES.		29.609.562,00
99 DİĞER VARLIK HESAPLAR		7.930.871,67
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI		7.930.871,67
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		255.702.991,01
GENEL TOPLAM		10.615.675.703,53



B. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

İlimizde, ilçe merkezi ve kırsal mahalle ayrımı yapılmaksızın ihtiyaç öncelikleri esas alınmak suretiyle içme suyu, atık su, yağmur suyu, mekanik ve elektrikle ilgili altyapı çalışmalarına 2024 yılında da yoğun bir şekilde devam edilmiştir. Bu kapsamda yüklenici ve idari ekiplerce gerçekleştirilen imalatlar ile bu imalatlarda kullanılmak amacıyla satın alınan mallara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

Yatırımlar

İşin Cinsi	Birimi	Yüklenici	İdari Ekipler	Toplam	Yüklenici (TL)	İdari Ekipler (TL)	Toplam (TL)
İçme Suyu Hattı*	m	410.354	383.398	793.752	354.080.551,00	296.196.600,22	650.277.151,22
Kanalizasyon Hattı*	m	49.982	62.982	112.964	78.247.918,94	162.282.284,99	240.530.203,93
Yağmur Suyu Hattı*	m	22.457	9.815	32.272	74.264.370,00	32.600.898,75	106.865.268,75
Dere Islahı	m	1.900		1.900	120.200.947,69		120.200.947,69
İçme Suyu Depo	adet	94		94	96.584.273,00		96.584.273,00
Atık Su Terfi Merkezi	adet		4	4		49.810.785,20	49.810.785,20
İnşa Edilen Keson-Kaptaj	adet	5		5	3.278.788,00		3.278.788,00
İçme Suyu Terfi Merkezi	adet	18		18	38.586.231,00		38.586.231,00
Su Sondaj Kuyuları Açılması	adet	6		6	1.812.096,00		1.812.096,00
Enerji Nakil Hatları	m	9.360		9.360	27.056.895,00		27.056.895,00
Toplam					794.112.070,63	540.890.569,16	1.335.002.639,79

* İdare malı malzeme kullanılarak yapılmıştır.

Mal Alımları

Alınan Malın Cinsi	Tutar (TL)
Duktil Boru	215.425.300,21
Polietilen Boru	100.585.371,22
O-PVC Boru	10.347.721,70
U-PVC Boru	360.000,00
Beton Boru ve Baca Elemanları	86.746.270,00
Sfero Kapak	14.665.000,00
İzgara	10.330.344,00
Prefabrik Kutu Menfez	7.349.886,00
İçme Suyu Boru Ek Parçaları	15.779.982,77
Pompa ve Motor	33.230.001,74
Muhtelif Elektrik ve Mekanik Malzeme	26.217.192,00
Vana	8.860.763,50
Toplam	529.897.833,14

Altyapı Yatırımlarının İlçelere Göre Dağılımı

Bölge	İçme Suyu (m)	Kanalizasyon (m)	Yağmur Suyu (m)	İçme Suyu Deposu (adet)	İçme Suyu Terfi Merkezi (adet)	Atık Su Terfi Merkezi (adet)
Alaçam	62.654,00	1.266,00	204,00	7	2	
Asarcık	26.579,00	260,00	20,00	8		
Atakum	141.463,00	36.036,00	1.976,00	6		
Ayvacık	34.936,00	1.065,00		12	5	
Bafra	77.429,00	4.636,00	1.141,00	15	1	
Canik	34.287,00	5.560,00	2.956,00	1	2	
Çarşamba	55.349,00	10.712,00	6.904,00	2	1	4
Havza	35.002,00	2.257,00	262,00	10		
İlkadım	42.813,00	17.282,00	9.770,00	4	1	
Kavak	41.949,00	1.214,00	75,00	5	1	
Ladik	7.436,00	839,00				
19 Mayıs	11.300,00	14.177,00	130,00	4	1	
Salıpazarı	39.068,00	568,00				
Tekkeköy	39.613,00	5.314,00	3.484,00	4	4	
Terme	87.711,00	5.123,00	5.336,00	1		
Vezirköprü	39.349,00	6.206,00		13		
Yakakent	16.814,00	449,00	14,00	2		
Toplam	793.752,00	112.964,00	32.272,00	94	18	4



Duktıl Boru



Polietilen Boru



O-PVC Boru



Beton Boru

a- Proje Çalışmaları

İçme suyu, atık su ve yağmursuyu gibi yaşam kalitesini doğrudan etkileyen altyapı çalışmaları günümüzde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle fenni bir proje olmaksızın çağdaş yaşam standartlarına uygun bir altyapıdan bahsedilemeyecektir. Dolayısıyla Genel Müdürlüğümüz altyapı çalışmalarına ayrı bir önem vermekte ve gelecek yıllarda yapılması planlanan altyapı yatırımlarına ait projeler İdaremizce önceden dizayn edilmektedir.

Projelerin hazırlanma sürecinde; altyapı ihtiyacı belirlenerek, yatırımın gerekliliği araştırılmakta, proje sınırları belirlenmekte, arazi çalışmaları ve harita alımı gerçekleştirilmekte, çalışma altlığı oluşturulmakta, nüfus ve mevcut altyapı bilgileri derlenmekte, hidrolojik, hidrolik, statik ve betonarme gibi gerekli tüm hesaplamalar ve çizimler yapılmakta, yersel tetkiki gerçekleştirilmekte ve onay alınmaktadır. Bahse konu işlemlerin sonucunda tatbikat projeleri hazırlanarak uygulamacı birime ulaştırılmaktadır. Bu bağlamda uzman proje ekibimiz tarafından içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve dere ıslahı, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, enerji üretim santralleri, gölet ve baraj yapımı yatırımları için ihtiyaçlar doğrultusunda projelendirme yapılmaktadır.

Bu ilkeler doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce 2024 yılı içinde 900 km içme suyu hattı, 267 km kanalizasyon hattı, 1 km dere ıslahı, 101 km yağmur suyu hattı projesi hazırlanmıştır.



İdari Ekiplerimiz Tarafından 2024 Yılında Hazırlanan Projeler

No	İşin Adı	İşin Kapsamı
1	Havza İlçesi Karabük Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi	2.600 m içme suyu hattı
2	Vezirköprü İlçesi Habibfakı Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	2.000 m içme suyu şebeke hattı, 2 adet depo
3	Havza İlçesi Yazıkışla Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	7.650 m içme suyu isale hattı
4	Çarşamba İlçesi Kestanepınar Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	87.550 m içme suyu isale hattı, 3 adet terfi merkezi ve 12 adet yeni depo
5	Canik İlçesi Düvecik Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	2.450 m içme suyu hattı, 3 adet içme suyu deposu ve 3 adet terfi merkezi
6	Bafra İlçesi Başaran Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	3.950 m içme suyu isale hattı
7	Çarşamba İlçesi Çatak Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	20.000 m içme suyu isale hattı, 2 adet terfi merkezi ve 3 adet yeni depo
8	19 Mayıs İlçesi Kuşkaya Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	5.500 m içme suyu hattı, 3 adet içme suyu deposu
9	19 Mayıs İlçesi Beylik Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	3.400 m içme suyu hattı, 2 adet içme suyu deposu ve 1 adet terfi merkezi
10	Salıpazarı İlçesi Konakören Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	41.000 m içme suyu hattı, 6 adet içme suyu deposu
11	Atakum İlçesi Elmaçukuru Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	68.000 m içme suyu hattı, 9 adet içme suyu deposu
12	Havza İlçesi-Besi Çiftliği İçme Suyu Temini Projesi	3.350 m içme suyu hattı, 1 adet terfi merkezi
13	Ayvacı İlçesi Karaağaç Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	1.150 m içme suyu hattı, 1 adet terfi merkezi
14	Kavak İlçesi Güven Göleti Hamsu Temini Projesi	12.000 m içme suyu hattı, 1 adet su alma yapısı
15	Çarşamba İlçesi Orduköy Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	19.500 m içme suyu hattı, 3 adet içme suyu deposu ve 1 adet terfi merkezi
16	Havza İlçesi Güvercinlik Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	6.500 m içme suyu isale hattı
17	Asarcık İlçesi Esentepe Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	3.500 m içme suyu isale hattı
18	Vezirköprü İlçesi Kocakaya ve Saraycık-Oba Mahalleleri İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	27.500 m içme suyu hattı, 9 adet içme suyu deposu ve 3 adet terfi merkezi
19	Vezirköprü İlçesi Sırbaşmak Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	4.500 m içme suyu isale hattı
20	Havza İlçesi Kamlık Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi	5.700 m içme suyu isale hattı

İdari Ekiplerimiz Tarafından 2024 Yılında Hazırlanan Projeler

No	İşin Adı	İşin Kapsamı
21	Kavak İlçesi Şeyhresul Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	16.800 m içme suyu hattı, 2 adet içme suyu deposu ve 2 adet terfi merkezi
22	Asarcık ve Kavak İlçeleri Merkez İçme Suyu Temini Projesi	68.000 m içme suyu hattı, 5 adet içme suyu deposu ve 2 adet terfi merkezi
23	İlkadım İlçesi Kapaklı Mahallesi İçme Suyu Projesi	2.350 m içme suyu hattı, 1 adet terfi merkezi
24	Vezirköprü İlçesi Devalan Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	10.250 m içme suyu hattı, 2 adet içme suyu deposu ve 1 adet terfi merkezi
25	Bafra İlçesi Hacıoğlu Grubu İçme Suyu Temini Projesi	8.450 m içme suyu hattı, 2 adet terfi merkezi
26	Salıpazarı İlçesi Güzelvatan Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	34.050 m içme suyu hattı, 5 adet içme suyu deposu ve 1 adet terfi merkezi
27	Canik İlçesi Yaylaköy Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	2.300 m içme suyu hattı ve 1 adet terfi merkezi
28	Vezirköprü İlçesi Yolpınar Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	3.300 m içme suyu hattı
29	Vezirköprü İlçesi Mezraa Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi	8.000 m içme suyu hattı, 4 adet içme suyu deposu
30	Terme İlçesi Evcı Mahallesi Hamsu Hattı Projesi	6.150 m içme suyu hattı ve 1 adet terfi merkezi
31	Asarcık İlçesi Aydıncık Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	1.500 m içme suyu hattı, 1 adet içme suyu deposu ve 1 adet terfi merkezi
32	Ayvacak İlçesi Keskinoğlu Grubu İçme Suyu Temini Projesi	8.000 m içme suyu hattı, 1 adet içme suyu deposu, 5 adet terfi merkezi ve 1 adet sondaj
33	Ayvacak İlçesi Söğütpınar Grubu İçme Suyu Temini Projesi	5.700 m içme suyu hattı, 1 adet içme suyu deposu, 2 adet terfi merkezi
34	Salıpazarı İlçesi Emiryusuf İAT Hamsu Hattı Projesi	2.150 m içme suyu hattı, 1 adet terfi merkezi ve 1 adet su alma yapısı
35	Kavak İlçesi Çiçekyazı Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	1.000 m içme suyu hattı, 1 adet içme suyu deposu ve 1 adet sondaj
36	Canik İlçesi Gürgenyatak Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	4.850 m içme suyu hattı, 1 adet içme suyu deposu ve 2 adet terfi merkezi
37	Ayvacak İlçesi Döngelyatak Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	21.650 m içme suyu hattı, 6 adet içme suyu deposu ve 2 adet terfi merkezi
38	Bafra İlçesi Başkaya Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	1.250 m içme suyu isale hattı, 1 adet terfi merkezi ve 1 adet su alma yapısı
39	Çarşamba İlçesi Kemer Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	1.700 m içme suyu hattı, 1 adet içme suyu deposu ve 1 adet terfi merkezi

İdari Ekiplerimiz Tarafından 2024 Yılında Hazırlanan Projeler

No	İşin Adı	İşin Kapsamı
40	Alaçam İlçesi Kışlakonak Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	4.600 m içme suyu hattı
41	Havza İlçesi Merkez İçme Suyu Temini Projesi	4.350 m içme suyu hattı, 1 adet içme suyu deposu
42	Alaçam İlçesi Doğankent Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	5.450 m içme suyu hattı, 3 adet içme suyu deposu
43	Canik İlçesi Kaşayla Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	25.000 m içme suyu hattı, 2 adet içme suyu deposu ve 3 adet terfi merkezi
44	Ladik İlçesi Ağcakaya Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	2.150 m içme suyu hattı, 1 adet su alma yapısı ve 1 adet terfi merkezi
45	Ladik İlçesi Güvenli Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	3.200 m içme suyu hattı
46	Terme İlçesi Kazımkarabekirpaşa Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	10.200 m içme suyu hattı ve 1 adet depo
47	Terme İlçesi Ambartepi Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi	48.000 m içme suyu hattı ve 9 adet depo
48	Bafra İlçesi Çulhakoca Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	5.050 m içme suyu hattı, 2 adet içme suyu deposu ve 1 adet terfi merkezi
49	Alaçam İlçesi Doyran-Toplu Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	30.750 m içme suyu hattı
50	Asarcık İlçesi Merkez Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	2.700 m içme suyu hattı
51	Atakum İlçesi Gürgenpınar Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi	13.900 m içme suyu hattı
52	Atakum İlçesi Karakavuk Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi	20.695 m içme suyu hattı, 2 adet içme suyu deposu, 3 adet terfi merkezi ve 1 adet maslak
53	Atakum İlçesi Meyvalı Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi	7.000 m içme suyu hattı
54	Atakum İlçesi Taflan Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi	33.900 m içme suyu hattı, 1 adet içme suyu deposu
55	Ayvacak İlçesi Muhtelif Mahalleler İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	10.675 m içme suyu hattı
56	İlkadım İlçesi Kırsal Mahalleler İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	50.100 m içme suyu hattı 1 adet içme suyu deposu ve 2 adet terfi merkezi ve 1 adet maslak
57	Kavak İlçesi Bayraklı Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	9.840 m içme suyu isale hattı ve 1 adet içme suyu deposu
58	Kavak İlçesi Sakarca Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	5.050 m içme suyu hattı

İdari Ekiplerimiz Tarafından 2024 Yılında Hazırlanan Projeler

59	Salıpazarı İlçesi Biçme Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi	12.900 m içme suyu hattı ve 1 adet içme suyu deposu
60	Salıpazarı İlçesi Karayonca Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	5.200 m içme suyu hattı, 1 adet içme suyu deposu
61	Vezirköprü İlçesi Esentepe Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	2.800 m içme suyu hattı
62	Vezirköprü İlçesi Karkucak Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	8.695 m içme suyu hattı
63	Vezirköprü İlçesi Öğürlü Mahallesi İçme Suyu Temini ve Şebeke Projesi	15.802 m içme suyu hattı, 1 adet içme suyu deposu, 3 adet terfi merkezi, 2 adet su alma yapısı ve 1 adet maslak
64	19 Mayıs İlçesi Dereköy Mahallesi Atık Su Projesi	15.000 m atık su hattı
65	19 Mayıs İlçesi Yörükler Mahallesi Atık Su Projesi	21.500 m atık su hattı
66	Atakum İlçesi Büyükoyumca Mahallesi (Kamalı tarafı) Atık Su Projesi	19.800 m atık su hattı
67	Atakum İlçesi Büyükoyumca Mahallesi (Üniversite tarafı) Atık Su Projesi	5.700 m atık su
68	Atakum İlçesi Kamalı Mahallesi Atık Su Projesi	11.500 m atık su hattı
69	Atakum İlçesi Çakırlar-Yalı Mahallesi Atık Su Projesi	8.750 m atık su hattı
70	Havza İlçesi Değirmenüstü Mahallesi Atık Su Projesi	8.650 m atık su hattı
71	İlkadım İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklar Atık Su Projesi	10.100 m atık su hattı
72	İlkadım İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklar Yağmursuyu Projesi	8.250 m yağmursuyu
73	Tekkeköy İlçesi Yeni Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Projesi	15.000 m atık su
74	Tekkeköy İlçesi Yeni Organize Sanayi Bölgesi Yağmursuyu Projesi	12.000 m yağmursuyu
75	Terme Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Projesi	9.900 m atık su
76	Terme Organize Sanayi Bölgesi Yağmursuyu Projesi	4.200 m atık su
77	İlkadım İlçesi Kılıçdede, Bahçelievler ve İstasyon Mahalleleri Atık Su Projesi	7.465 m atık su

İdari Ekiplerimiz Tarafından 2024 Yılında Hazırlanan Projeler

78	İlkadım İlçesi Kılıçdede, Bahçelievler ve İstasyon Mahalleleri Yağmursuyu Projesi	6.260 m yağmursuyu
79	Terme İlçesi Bazlamaç Mahallesi Atık Su Projesi	15.080 m atık su
80	Bafra İlçesi Örencik Mahallesi Atık Su Projesi	5.170 m atık su
81	İlkadım İlçesi Kavacık Mahalleleri Atık Su Projesi	10.150 m atık su
82	Alaçam İlçesi Muhtelif Mahallerde Atık Su Projesi	2.040 m atık su
83	Alaçam İlçesi Muhtelif Mahallerde Yağmursuyu Projesi	1.400 m yağmursuyu
84	Atakum İlçesi Muhtelif Mahallerde Atık Su Projesi	31.700 m atık su
85	Atakum İlçesi Muhtelif Mahallerde Yağmursuyu Projesi	16.420 m yağmursuyu
86	Bafra İlçesi Muhtelif Mahallerde Yağmursuyu Projesi	2.400 m yağmursuyu
87	Canik İlçesi Muhtelif Mahallerde Atık Su Projesi	14.420 m atık su
88	Canik İlçesi Muhtelif Mahallerde Yağmursuyu Projesi	12.430 m yağmursuyu
89	Çarşamba İlçesi Muhtelif Mahallerde Atık Su Projesi	3.860 m atık su
90	Çarşamba İlçesi Muhtelif Mahallerde Yağmursuyu Projesi	4.520 m yağmursuyu
91	Ondokuzmayıs İlçesi Muhtelif Mahallerde Atık Su Projesi	4.430 m atık su
92	Ondokuzmayıs İlçesi Muhtelif Mahallerde Yağmursuyu Projesi	2.600 m yağmursuyu
93	İlkadım İlçesi Muhtelif Mahallerde Atık Su Projesi	25.680 m atık su
94	İlkadım İlçesi Muhtelif Mahallerde Yağmursuyu Projesi	22.655 m yağmursuyu
95	Kavak İlçesi Muhtelif Mahallerde Atık Su Projesi	2.730 m atık su
96	Ladik İlçesi Muhtelif Mahallerde Atık Su Projesi	8.670 m atık su

İdari Ekiplerimiz Tarafından 2024 Yılında Hazırlanan Projeler

97	Tekkeköy İlçesi Muhtelif Mahallerde Atık Su Projesi	8540 m atık su
98	Tekkeköy İlçesi Muhtelif Mahallerde Yağmursuyu Projesi	5.985 m yağmursuyu
100	Havza İlçesi Muhtelif Mahallerde Atık Su Projesi	8.700 m atık su
101	Terme İlçesi Muhtelif Mahallerde Atık Su Projesi	3.440 m atık su
102	Vezirköprü İlçesi Muhtelif Mahallerde Atık Su Projesi	1.735 m atık su
103	Vezirköprü İlçesi Muhtelif Mahallerde Yağmursuyu Projesi	235 m yağmursuyu
104	Yakakent İlçesi Muhtelif Mahallerde Atık Su Projesi	240 m atık su
105	Salıpazarı İlçesi Muhtelif Mahallerde Atık Su Projesi	305 m atık su



b- Genel Müdürlüğümüzce Gerçekleştirilen Yatırımlar

b.1. İdari Ekipler Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler

b.1.1. İçme Suyu Temini Faaliyetleri

19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı

19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı Projesi kapsamında, 19 Mayıs, Atakum (Taflan Mahallesi), Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerine memba kalitesinde içme suyu sağlayacak, 100.000 m³/gün kapasiteli 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve 50 km uzunluğunda isale hattı inşa edilerek 2023 yılında devreye alınmıştır. 400.000 kişiye içme suyu temin edilen proje ile aynı zamanda yılda 12.199.223 kWh enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Esas itibarıyla projenin 19 Mayıs Barajı ile Bafra arasındaki iletim hattının DSİ tarafından yapımına başlanmış ancak hattın yaklaşık üçte ikisi tamamlanabilmiştir. İletim hattının kalan kısmı İdaremizce 2023 yılında tamamlanarak Atakum (Taflan), 19 Mayıs ve Bafra ilçelerine içme suyu temin edilmiştir. Buna ilave olarak 2023 yılında Alaçam ile Yakakent arasındaki iletim hattı yüklenici ve İdari ekiplerimiz tarafından yapılmıştır. 2024 yılında ise Bafra Çetinkaya içme suyu deposu ile Alaçam arasındaki terfi merkezi, terfi hattı ve iletim hattı Genel Müdürlüğümüzce inşa edilerek Alaçam ve Yakakent ilçe merkezlerine içme suyu temin edilmiştir.



Kavak ve Atakum Kırsal Mahallelerine İçme Suyu Temini

Kavak ilçe merkezi ile 36 kırsal mahallesine, Kavak Cezaevine ve Atakum ilçesinin 9 kırsal mahallesine içme suyu sağlayacak olan Kavak İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi 2 katına (50 l/s'den 100 l/s'ye) çıkarılmıştır. Kavak Güven Göletindeki su seviyesinin düşmesi durumunda arıtma tesisine ham su temininde kesinti yaşanmaması için göletin mansabına içme suyu terfi merkezi inşa edilmiştir. 2024 yılında yaşanan kuraklıkta Göletteki su miktarı %3'e kadar düşmüştür. Bu nedenle söz konusu yerleşim yerlerinin susuz kalmaması için Divanbaşı Göletinden acil su takviyesi yapılmıştır.

Yukarıda bahsedilen işlere ilişkin 2024 yılı içerisinde İdari ekiplerimiz tarafından Kavak ilçesinin Alaçam, Başalan ve Azaklı mahallelerinde 5 km, Atakum ilçesinin Elmaçukuru, Aslandamı, Şenyurt, Kasnakçımermer, Kabadüz mahallelerinde ise 25,7 km içme suyu hattı yapılmıştır.

Havza Kırsal Mahallelerine İçme Suyu Temini

Havza ilçesi Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden temin edilen suyun Ağdırhasan, Çeltek, Eymir, Paşapınarı ve Gelincik mahallelerine iletilmesi için 2023 yılında İdari ekipler tarafından toplam 34 km içme suyu hattı yapılmıştır. Bu iş kapsamında 2024 yılında ise Ilıca, Dereköy, Celil, Demiryurt ve Cevizlik mahallelerinde 6,3 km içme suyu hattı İdari ekiplerimiz tarafından yapılmıştır.

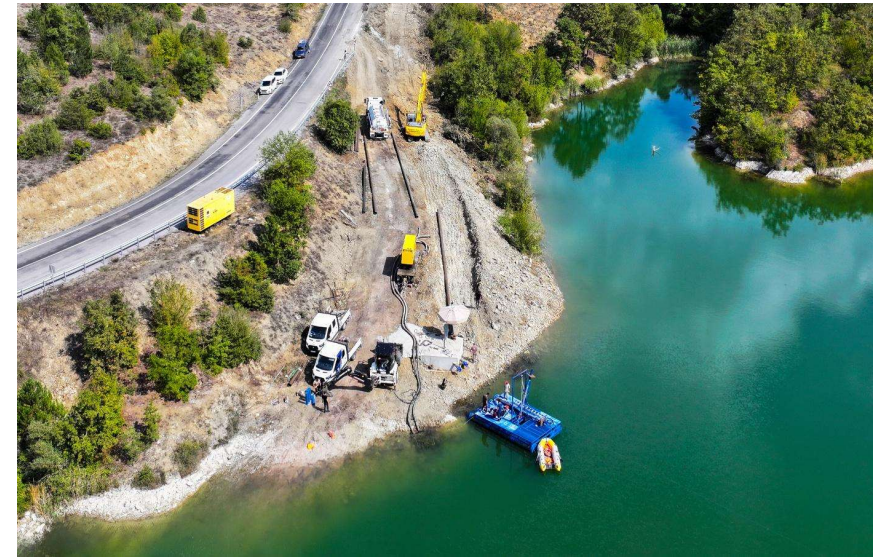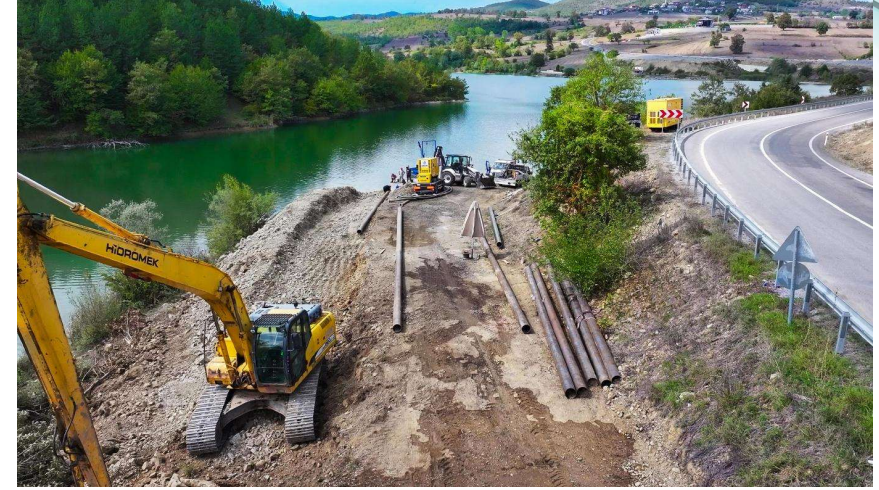

Tekkeköy Kırsal Mahallelerine İçme Suyu Temini

Bu iş kapsamında; Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden ve muhtelif sondajlardan temin edilen suyun kırsal mahallelere ulaştırılması için 2019 yılında 9 km, 2020 yılında 3 km, 2021 yılında 67 km, 2022 yılında 61 km, 2023 yılında 29 km olmak üzere toplam 169 km içme suyu iletim hattı yapılmış olup 2023 yılı sonuna kadar 25 kırsal mahalleye içme suyu temin edilmiştir. 2024 yılında ise İdari ekipler tarafından Tekkeköy ilçesi Fındıcak, Yeşilalan, Karışlar, Yağbasan, Bakacak ve Pelitoğlu mahalleleri ile Canik ilçesi Hacnaipili, Düzündiç, Başalan ve Gödekli mahallelerinde 39,5 km içme suyu hattı yapılmıştır.


Atakum İlçesi Üst Kotları ve Gelişme Alanı Su Temin Projesi

Atakum ilçesi Toybelen, Kamalı, Küçükkolpınar, Büyükkolpınar, Balaç, İstiklal, Mevlana, Çobanoğlu, Çobanlı, Beypınar, Köseli, Kesilli, Sarışık, Sarayköy, Çatmaoluk, Kulcadağ mahalleleri ve İlkadım ilçesi Ahullu ve Derecik mahalleleri olmak üzere toplam 18 mahallenin nüfus artışı ve yapılaşma hızı nedeniyle artan su ihtiyacının kesintisiz olarak karşılanabilmesi amaçlanmaktadır.

Bu iş kapsamında, Toybelen Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış ve su kaybına neden olan mevcut 100 m³ hacmindeki içme suyu deposu yerine 2023 yılında 1.000 m³ hacminde yeni içme suyu deposu inşa edilmiş ve bölgede değişik cins ve çaplarda 15 km içme suyu hattı yapılmıştır. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde fiyat farkı ve KDV dâhil 45.136.513,56 TL harcama yapılmıştır.

Projeye dair yapım işlerine 2024 yılında da devam edilerek İlkadım ilçesi Ahullu Mahallesinde 500 m³ hacminde içme suyu deposu yapılmış ve değişik cins ve çaplarda 14,8 km içme suyu hattı inşa edilerek 2024 yılı içerisinde fiyat farkı ve KDV dâhil 41.828.980,06 TL harcama yapılmıştır.

ATAKUM İLÇESİ'NİN ÜST KOTLARI VE GELİŞME ALANI SU TEMİN PROJESİ

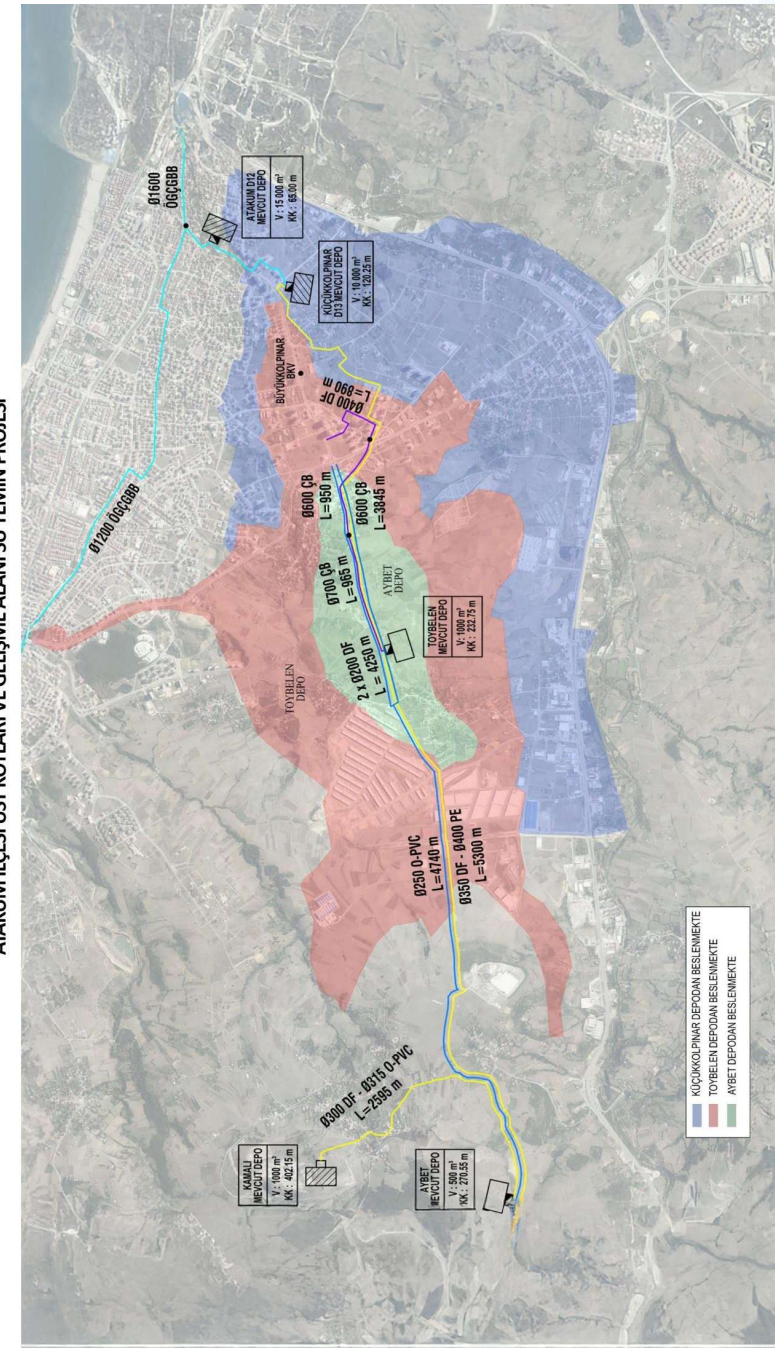


İlkadım İlçesi Üst Kotları ve Gelişme Alanı Su Temin Projesi

Proje kapsamında; İlkadım ilçesinin genişleme alanı olan Kavaklılar, Kışla, Kavacık, Çatkaya, Aşağıavdan, Gürgendağ ve Mahmurdağı depoları ile su arzı sağlanan mahallelerde hızla artan nüfusun içme suyu ihtiyacını kesintisiz olarak karşılayabilmek amacıyla Çelikalan, Bilmece, Gürgendağ, Çanakçı, Yukarıavdan, Aşağıavdan, Akgöl, Kadamut, Çivril, Kavacık, Kuşçulu mahallelerine toplam 34.960 m içme suyu hattı ile Çatkaya Mahallesi'ne 1.000 m³ hacminde içme suyu deposu yapılması öngörülmüştür.

Bu kapsamda 2024 yılı itibarıyla çalışmalara başlanmış olup 9.322 m içme suyu hattı yapılmış ve Çatkaya Mahallesi'ne 1.000 m³ hacminde yeni içme suyu deposu inşa edilmiştir. 2024 yılı içerisinde fiyat farkı ve KDV dâhil 42.189.575,08 TL harcama yapılmış olup 2025 yılında İdari ekiplerimiz ve yüklenici ekipleri marifetiyle çalışmalar devam etmektedir.

İLKADIM İLÇESİ ÜST KOTLARI VE GELİŞME ALANI SU TEMİN PROJESİ

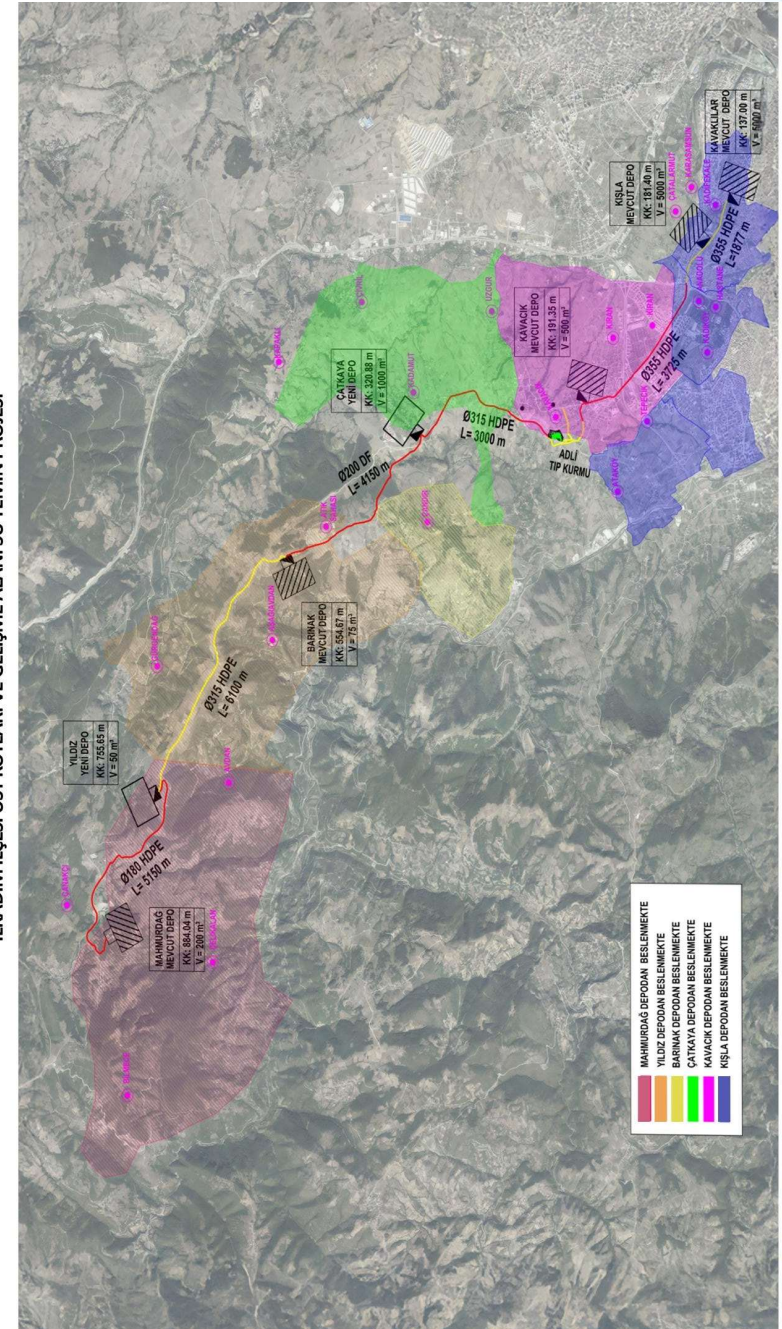

b.1.3. Kanalizasyon ve Yağmursuyu Faaliyetleri

İdari ekipler marifetiyle 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmalarına ilişkin bilgiler ilçe bazında aşağıda sunulmuştur.

Atakum İlçesi

Atakum ilçesinin muhtelif mahallelerinde 21,8 km kanalizasyon hattı ve 694 adet parsel bağlantısı ile 0,9 km yağmursuyu hattı ve 456 adet ızgara imalatı gerçekleştirilmiştir.

İlkadım İlçesi

İlkadım ilçesinin muhtelif mahallelerinde 9 km kanalizasyon hattı ve 276 adet parsel bağlantısı ile 3,1 km yağmursuyu hattı ve 459 adet ızgara imalatı gerçekleştirilmiştir.

Canik İlçesi

Canik ilçesinin muhtelif mahallelerinde 3,1 km kanalizasyon hattı ve 97 adet parsel bağlantısı ile 0,7 km yağmursuyu hattı ve 291 adet ızgara imalatı gerçekleştirilmiştir.

Tekkeköy İlçesi

Tekkeköy ilçesinin muhtelif mahallelerinde 5,5 km kanalizasyon hattı ve 119 adet parsel bağlantısı ile 3,4 km yağmursuyu hattı ve 110 adet ızgara imalatı gerçekleştirilmiştir.

19 Mayıs İlçesi

19 Mayıs ilçesinin muhtelif mahallelerinde 2,6 km kanalizasyon hattı ve 4 adet parsel bağlantısı imalatı gerçekleştirilmiştir.

Bafra İlçesi

Bafra ilçesinin muhtelif mahallelerinde 1,2 km kanalizasyon hattı ile 0,5 km yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştirilmiştir.



b.2. Yükleniciler Marifetiyle Gerçekleştirilen Faaliyetler

19 MAYIS BARAJI İSALE HATTI İKMAL İNŞAATI

Projenin Yeri : 19 Mayıs ve Bafra

Sözleşme Tarihi : 17.03.2023

Bitiş Tarihi : 15.05.2024

Sözleşme Bedeli : 67.912.545,89 TL
(İş artışı ve KDV dâhil)



İş kapsamında idare malı malzeme ile 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden Bafra ilçe merkezine arıtılmış içme suyu temin etmek amacıyla 1200 mm – 1100 mm aralığındaki çaplarda 15.055 m uzunluğunda çelik boru ile içme suyu hattı yapılması planlanmakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2023 yılında, kapasitesi 100.000 m³/gün olan 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden 19 Mayıs, Atakum (Taflan Mahallesi) ve Bafra ilçelerine içme suyu sağlayacak olan 50 km uzunluğundaki isale hattının 15.055 m'lik kısmı tamamlanarak söz konusu ilçelere içme suyu temin edilmiştir.


2024 yılında, sözleşme kapsamında iş artışı yapılarak içme suyu ihtiyacı sondaj kuyularından sağlanan Alaçam ve Yakakent ilçelerine arıtılmış içme suyu temin etmek için Bafra ve Alaçam ilçeleri arasına 32 km uzunluğunda ve 350 mm çapında duktıl boru hattı imalatı tamamlanmıştır.

Bu yatırım ile 400.000 kişiye içme suyu temin edilmiş ve aynı zamanda yılda 12.199.223 kWh enerji tasarrufu da sağlanmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **19.800.773,86 TL**



19 MAYIS BARAJI İÇMESUYU TEMİN PROJESİ

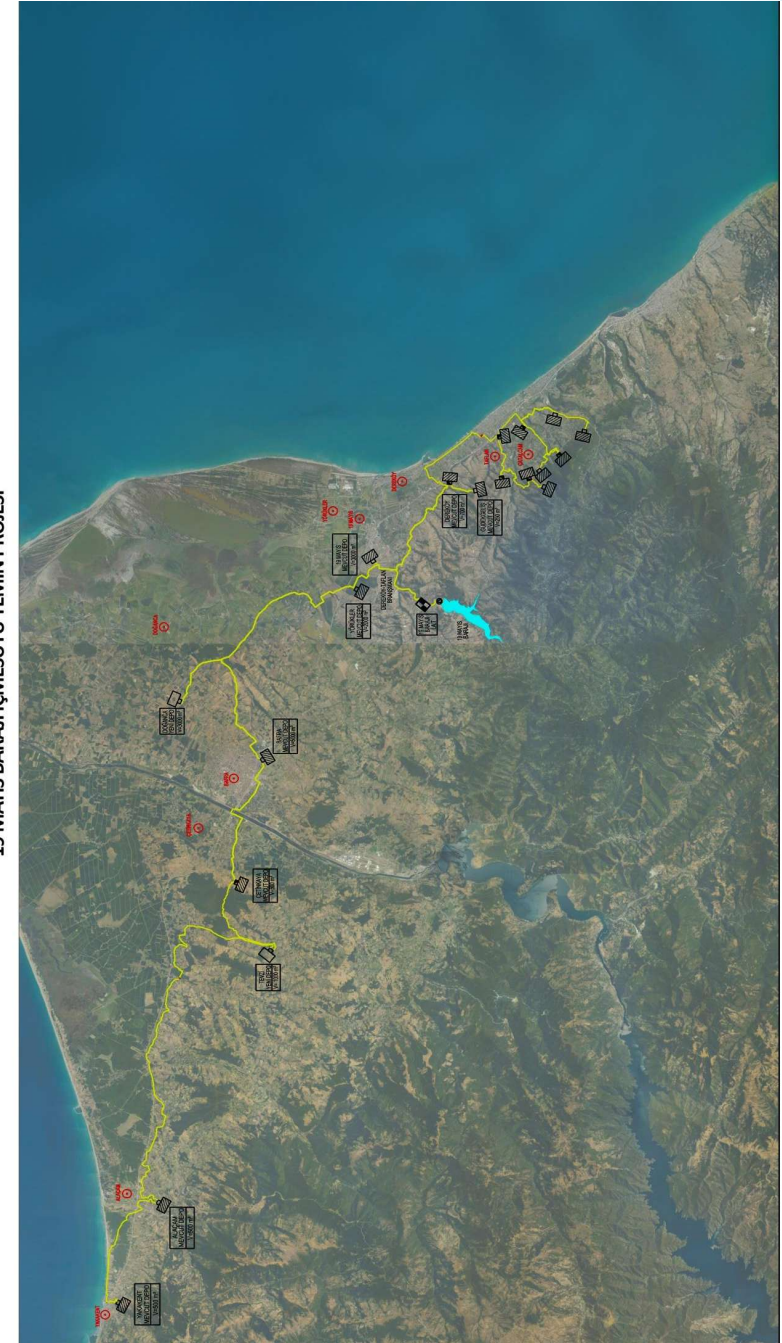

Yapılan Hatlar

SAMSUN İLİ VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ KIRSAL MAHALLELER İÇME SUYU İNŞAATI

Projenin Yeri : Vezirköprü

Sözleşme Tarihi : 26.04.2023

Bitiş Tarihi : 27.04.2024

Sözleşme Bedeli : 81.094.384,90 TL (KDV dâhil)



İş kapsamında, İdare malı malzeme ile Vezirköprü ilçesi kırsal mahallelerinde 187.603 m içme suyu hattı imalatı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2023 yılında, Samsun ili muhtelif kırsal mahallelerinde 142.439 m içme suyu hattı ile 91 adet abone bağlantısı yapılmıştır.


2024 yılında, Narlısaray Mahallesinde 2 adet sondaj kuyusundan temin edilen 70 l/s su ile Narlısaray, Samukalan, İncesu, Karlı, Yağınözü, Adatepe, Akören, Avdan mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için değişik cins ve çapta 8,6 km uzunluğunda içme suyu hattı ile Havza İlçesi Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden temin edilen memba kalitesindeki içme suyu, Vezirköprü ilçesi Devalan, Yolpınar, Alancık, İmircik, Yağcımahmut, Çekalan, Çamlıdere, Güldere ve Hecimli mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için değişik cins ve çapta 13,6 km uzunluğunda içme suyu hattı yapılmıştır.

Ayrıca Toybelen İçme Suyu Projesi kapsamında; Ahullu içme suyu deposu ile Kamalı içme suyu deposu arasında kalan 12,8 km uzunluğunda değişik cins ve çapta içme suyu hattı da tamamlanmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **21.031.934,41 TL**



VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELER İÇMESUYU TEMİN PROJESİ

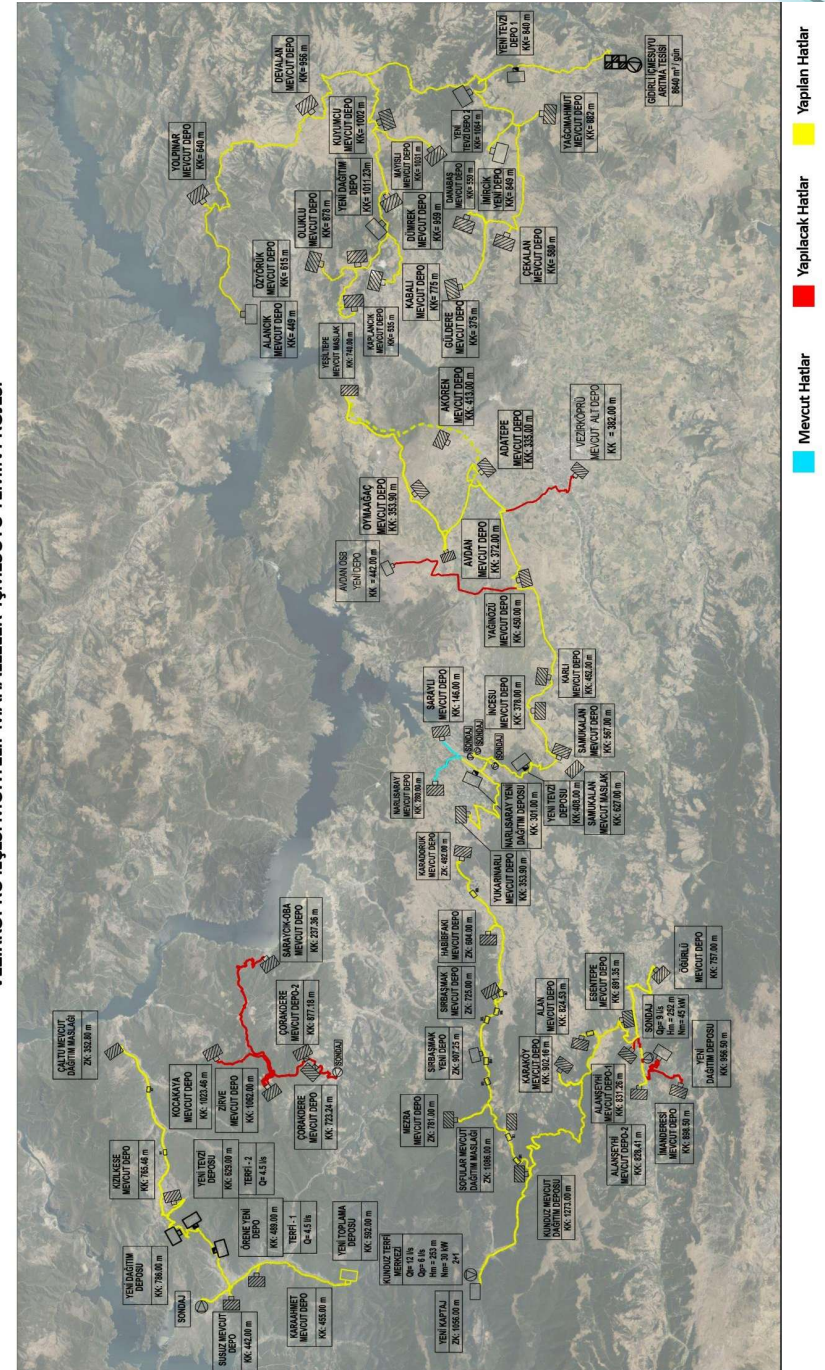

SAMSUN İLİ MERKEZ İLÇELERDE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI VE ABONE BAĞLANTISI YAPILMASI

Projenin Yeri : Merkez İlçeler

Sözleşme Tarihi : 27.11.2023

Bitiş Tarihi : 27.05.2024

Sözleşme Bedeli : 35.720.105,44 TL (KDV dâhil)



İş kapsamında, idare malı malzeme ile 69.751 metre içme suyu hattı ile 200 adet abone bağlantısı yapılması yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2023 yılında, 42 km içme suyu hattı yapılmıştır.


2024 yılında, Kavak Güven Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden temin edilen artırılmış içme suyunun, Atakum ilçesi Aslandamı, Ayvalı, Elmaçukuru, Erikli, Güney, Kabadüz, Kasnakçımermer, Şenyurt ve Akalan mahalleleri ile Bafra ilçesinin Asmaçam mahallesine ulaştırılması maksadıyla yüklenici marifetiyle 36,7 km uzunluğunda içme suyu hattı yapılmıştır.

Ayrıca aynı iş kapsamında Alanlı ve Çatalçam mahallelerine su temini sağlamak amacıyla değişik cins ve çapta 18,3 km içme suyu hattı da yapılmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **21.052.478,42 TL**



KAVAK İLÇESİ KIRSAL MAHALELER İÇMESUYU TEMİNİ PROJESİ

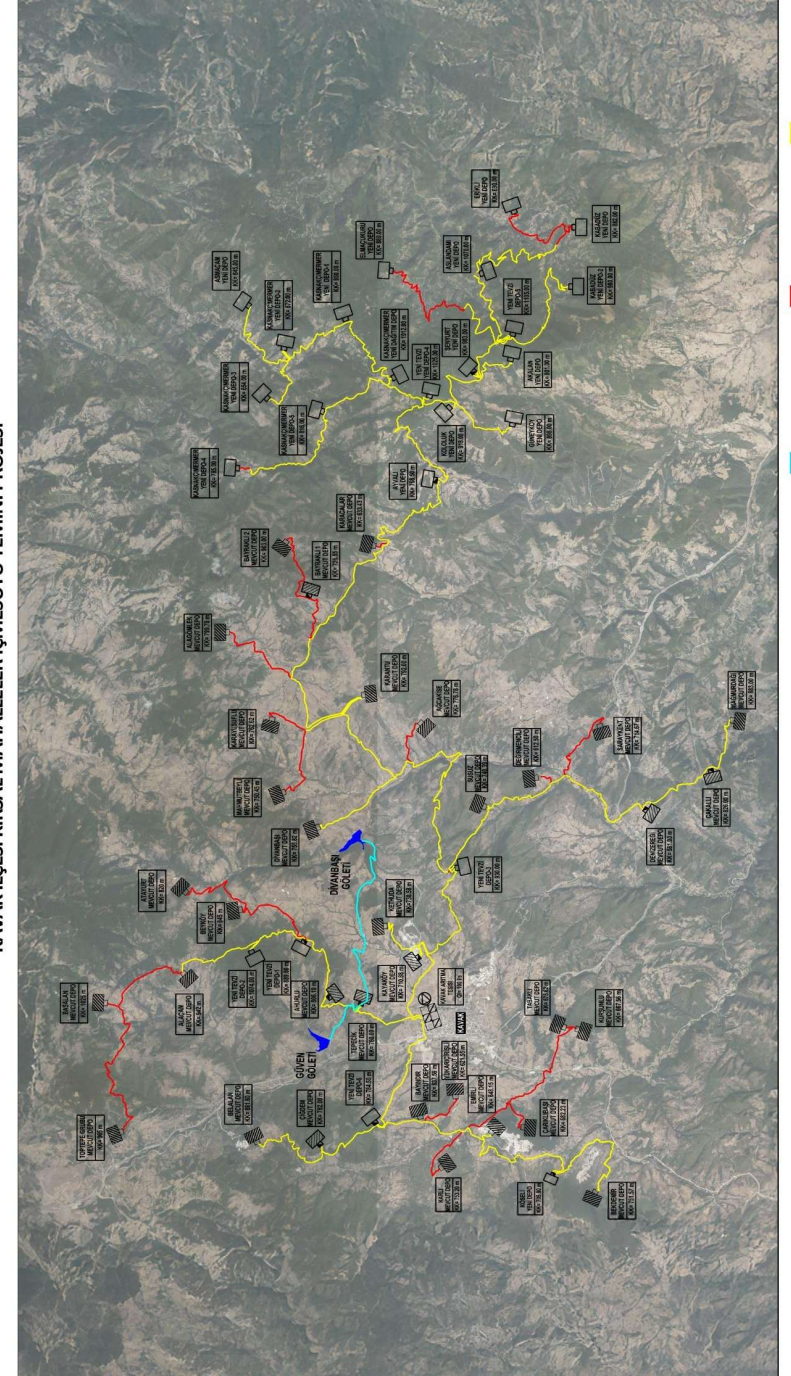

SAMSUN İLİ CANIK İLÇESİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU İNŞAATI

Projenin Yeri : Canik

Sözleşme Tarihi : 28.07.2022

Bitiş Tarihi : 31.12.2024

Sözleşme Bedeli : 33.580.873,61 TL
(İş artışı ve KDV dâhil)

İş kapsamında, İdare malı malzeme ile 50.800 m içme suyu hattı, 500 adet abone bağlantısı, 31.800 m kanalizasyon hattı, 500 adet parsel bağlantısı, 14.275 m yağmur suyu hattı ve 1.500 adet ızgara yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2022 yılında, 11.763 m kanalizasyon hattı, 5 adet parsel bağlantısı ve 1.356 m yağmursuyu hattı yapılmıştır.


2023 yılında, 8.507 m içme suyu hattı, 44 adet abone bağlantısı, 27.989 m kanalizasyon hattı, 15 adet parsel bağlantısı ve 10.953 m yağmursuyu hattı yapılmıştır.

2024 yılında, 43.088,26 m içme suyu hattı, 7 adet abone bağlantısı, 824,31 m kanalizasyon hattı, 1 adet parsel bağlantısı ve 1.755,85 m yağmur suyu hattı yapılmıştır.

İmalatı tamamlanan 43.088,26 m içme suyu hattının 7.033,55 metrelik kısmı Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi, 36.054,71 metrelik kısmı ise Canik Şehir Hastanesi ile Canik ilçesi Düvecik, Atatürk, Dereler ve Kozlu mahallelerine içme suyu temin etmek amacıyla yapılmıştır.

İmalatı tamamlanan 1.755,85 m yağmursuyu hattının tamamı Canik ilçe sınırları içerisinde meydana gelen sel ve su baskınlarının önüne geçerek kalıcı çözüm üretmek amacıyla yapılmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **16.543.103,62 TL**




CANIK ŞEHİR HASTANESİ İÇMESUYU PROJESİ



Yapılan Hatlar

GÜLSAN VE ESKİ SANAYİ YAĞMURSUYU PROJESİ

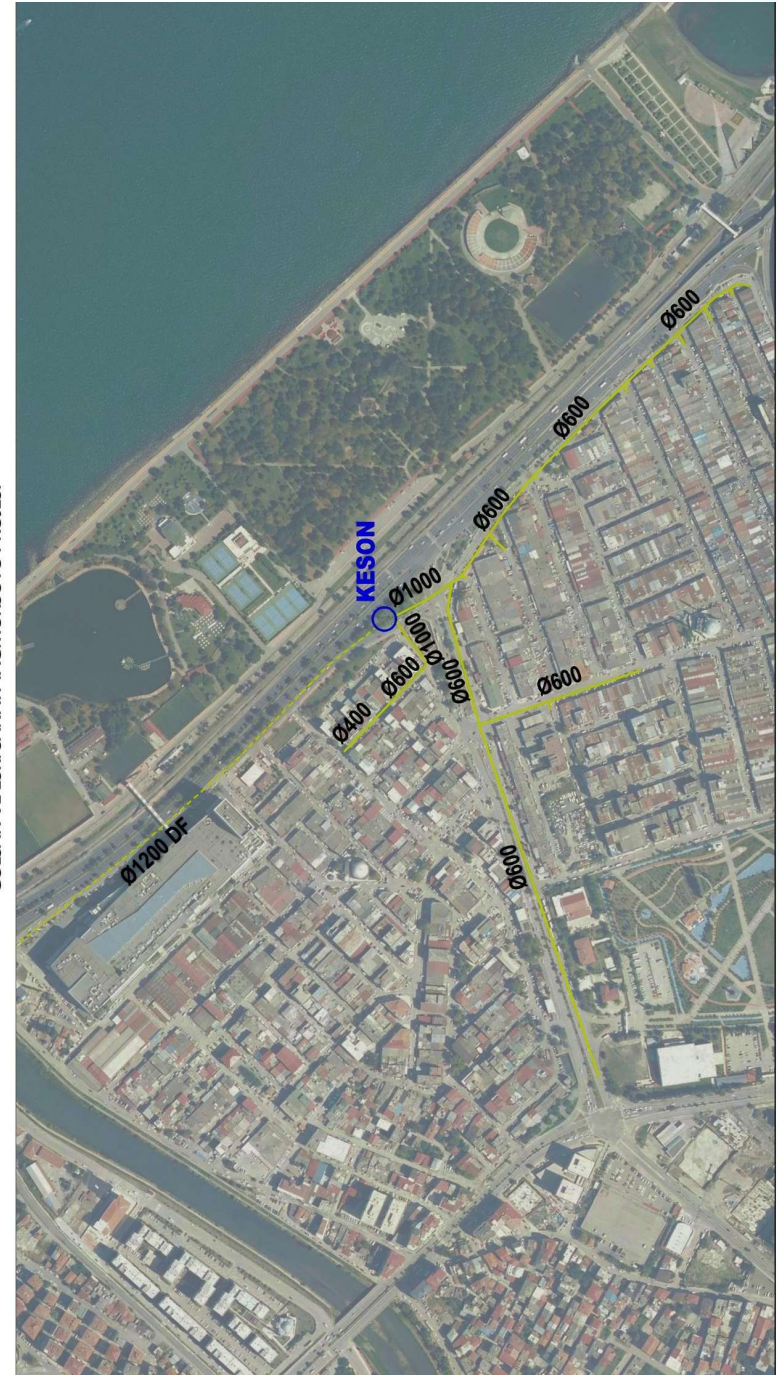

Yapılan Hatlar

SAMSUN İLİ BAFRA İLÇESİ İÇMESUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU İNŞAATI

Projenin Yeri : Bafra

Sözleşme Tarihi : 23.05.2022

Bitiş Tarihi : 12.06.2024

Sözleşme Bedeli : 51.632.031,22 TL
(İş artışı ve KDV dâhil)

İş kapsamında, İdare malı malzeme ile 113.240 m içme suyu hattı, 3.500 adet abone bağlantısı, 12.541 m kanalizasyon hattı, 700 adet parsel bağlantısı, 13.493 m yağmur suyu hattı, 1.000 adet ızgara yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2022 yılında, 26.646 m içme suyu hattı, 14 adet abone bağlantısı, 4.324 m kanalizasyon hattı, 129 adet parsel bağlantısı, 6.229 m yağmursuyu hattı ve 55 adet ızgara imalatı yapılmıştır.


2023 yılında, 111.777 m içme suyu hattı, 24.663 m abone bağlantı hattı, 4.559 adet içme suyu abone bağlantısı, 10.653 m kanalizasyon hattı, 11.751 m yağmursuyu hattı, 1.519 m ızgara bağlantısı, 474 adet ızgara, 2.015 m parsel bağlantısı, 306 adet parsel bacası yapılmıştır.

2024 yılında, 4.173 m içme suyu hattı, 24.310 m abone bağlantı hattı, 4.387 adet içme suyu abone bağlantısı, 40 adet ızgara yapılmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **10.487.816,40 TL**



BAFRA İLÇESİ İÇMESUYU PROJESİ

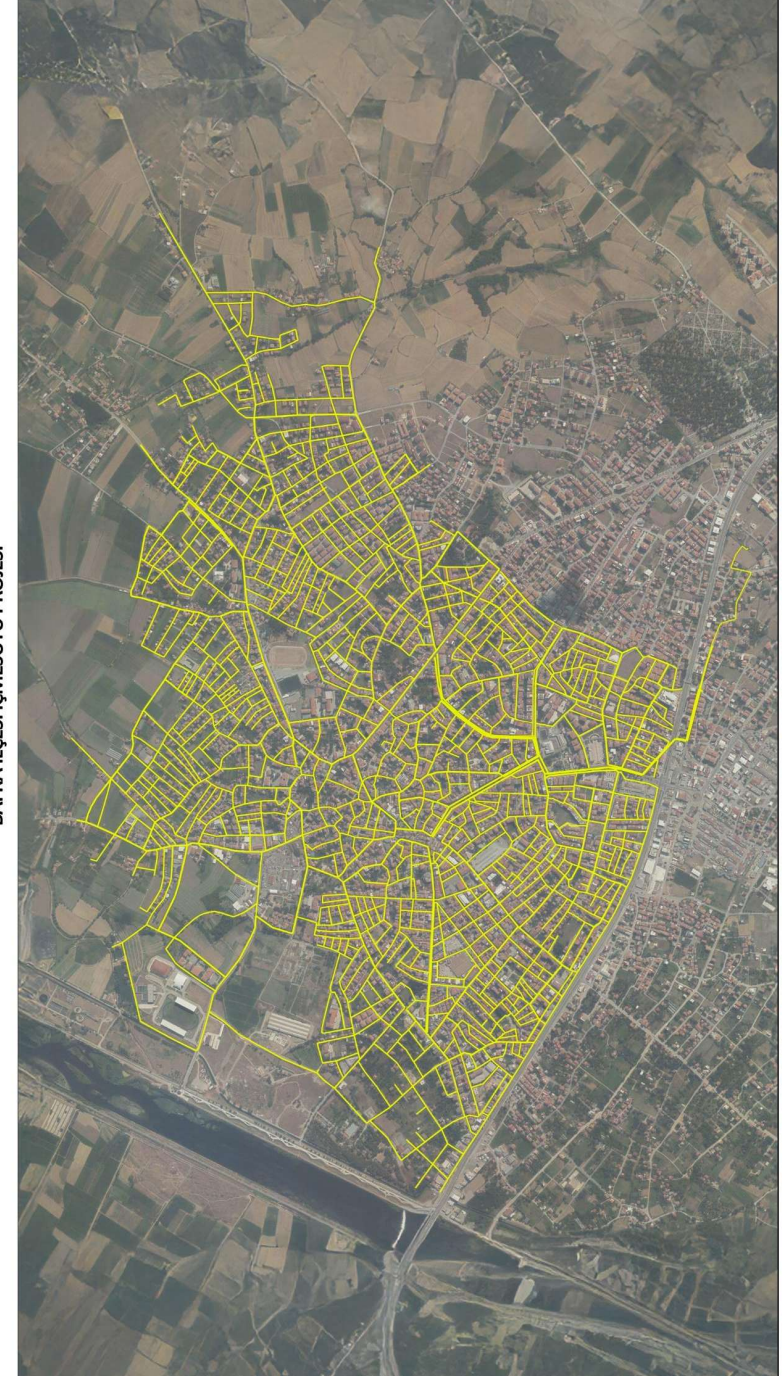

Yapılan Hatlar

SAMSUN İLİ ÇARŞAMBA İLÇESİ BATI KISMI İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU İNŞAATI

Projenin Yeri : Çarşamba

Sözleşme Tarihi : 17.06.2022

Bitiş Tarihi : 12.08.2024

Sözleşme Bedeli : 45.661.050,18 TL
(İş artışı ve KDV dâhil)



İş kapsamında, İdare malı malzeme ile 46.621 m içme suyu hattı, 1.500 adet abone bağlantısı, 30.536 m kanalizasyon hattı, 1.300 adet parsel bağlantısı, 16.069 m yağmur suyu hattı ve 700 adet ızgara yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2022 yılında, 9.574 m içme suyu hattı, 5.559 m kanalizasyon hattı, 46 adet parsel bağlantısı, 1.704 m yağmursuyu hattı ve 130 adet ızgara imalatı yapılmıştır.


2023 yılında, 43.196 m içme suyu hattı, 817 adet abone bağlantısı, 26.084 m kanalizasyon hattı, 125 adet parsel bağlantısı, 14.838 m yağmursuyu hattı, 421 adet ızgara imalatı yapılmıştır.

2024 yılında, 11.640 m içme suyu hattı, 166 adet abone bağlantısı, 3.456 m kanalizasyon hattı, 26 adet parsel bağlantısı, 2.913 m yağmur suyu hattı ve 675 adet ızgara imalatı yapılmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **15.931.973,60 TL**

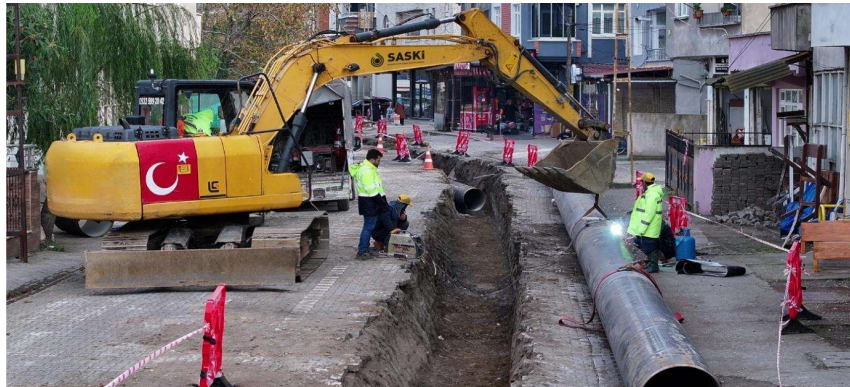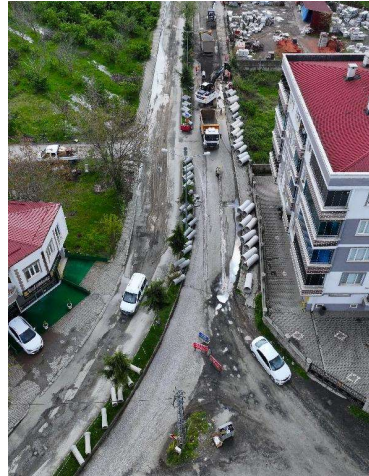

ÇARŞAMBA İLÇESİ TAMAMLANAN ALTYAPI İMALATLARI

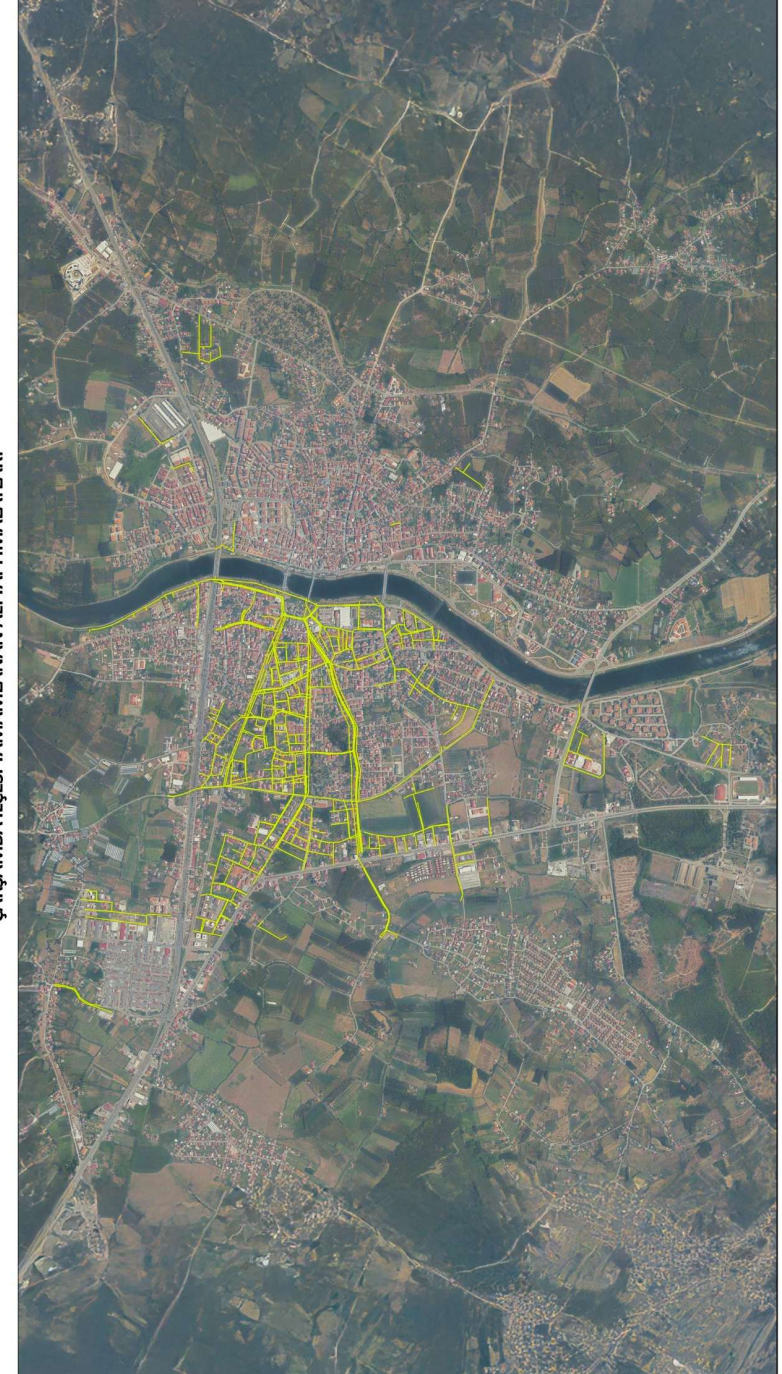

Yapılan Hatlar

SAMSUN İLİ TERME İLÇESİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU İNŞAATI

Projenin Yeri : Terme

Sözleşme Tarihi : 20.06.2022

Bitiş Tarihi : 09.12.2024

Sözleşme Bedeli : 33.390.561,77 TL
(İş artışı ve KDV dâhil)



İş kapsamında, İdare malı malzeme ile; 16.276 m içme suyu hattı, 1.000 adet abone bağlantısı, 15.486 m kanalizasyon hattı, 1.000 adet parsel bağlantısı, 12.062 m yağmur suyu hattı ve 1.000 adet ızgara yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2022 yılında, 4.275 m içme suyu hattı, 6.894 m kanalizasyon hattı ile 1.158 m yağmursuyu hattı yapılmıştır.

2023 yılında, 20.564 m içme suyu hattı, 284 adet abone bağlantısı, 16.554 m kanalizasyon hattı, 38 adet parsel bağlantısı, 5.826 m yağmursuyu hattı ile 72 adet ızgara yapılmıştır.

2024 yılında, 23.904 m içme suyu hattı, 124 adet abone bağlantısı, 8.942 m kanalizasyon hattı, 29 adet parsel bağlantısı ve 6.383 m yağmursuyu hattı ile 68 adet ızgara yapılmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **24.402.259,70 TL**

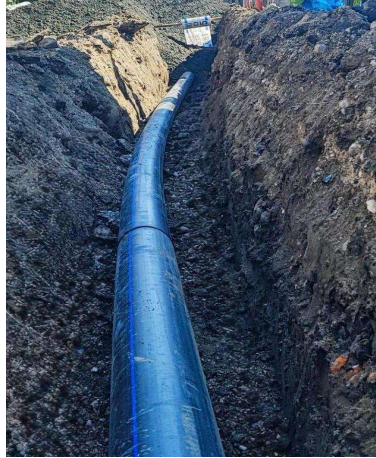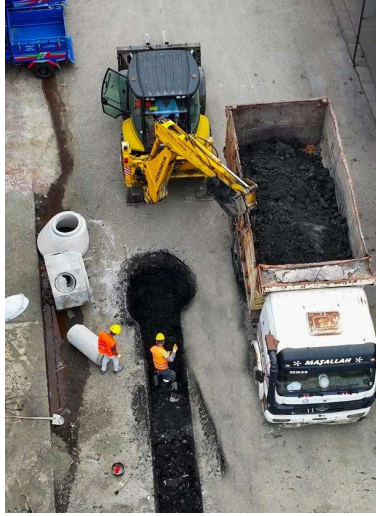

SAMSUN İLİ MUHTELİF İLÇELER İÇME SUYU İNŞAATI

Projenin Yeri : Muhtelif İlçeler

Sözleşme Tarihi : 14.09.2023

Bitiş Tarihi : 19.04.2024

Sözleşme Bedeli : 78.582.749,97 TL
(İş artışı ve KDV dâhil)

İş kapsamında, İdare malı malzeme ile 136.901 m içme suyu hattı yapılması ve 63 adet prekast betonarme içme suyu deposu yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2023 yılında, 27.960 m içme suyu hattı yapılmıştır.

2024 yılında, 161.821,29 m içme suyu hattı ve 25 adet içme suyu deposu yapılmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **76.915.898,77 TL**



SAMSUN İLİ LADİK, KAVAK VE ASARCİK İLÇELERİ ACIL İÇME SUYU İNŞAATI

Projenin Yeri : Kavak

Sözleşme Tarihi : 09.09.2024


Bitiş Tarihi : 09.11.2024

Sözleşme Bedeli : 21.617.391,00 TL (KDV dâhil)

İş kapsamında, İdare malı malzeme ile 11.990 m içme suyu hattı yapılması ve çeşitli elektrik işleri yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2024 yılında, Kavak İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su sağlayan Güven Göleti ile Divanbaşı Göleti arasında 11.290 m içme suyu iletim hattı yapılarak bölgedeki muhtemel kuraklık problemi çözüme kavuşturulmuştur.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **21.707.488,76 TL**

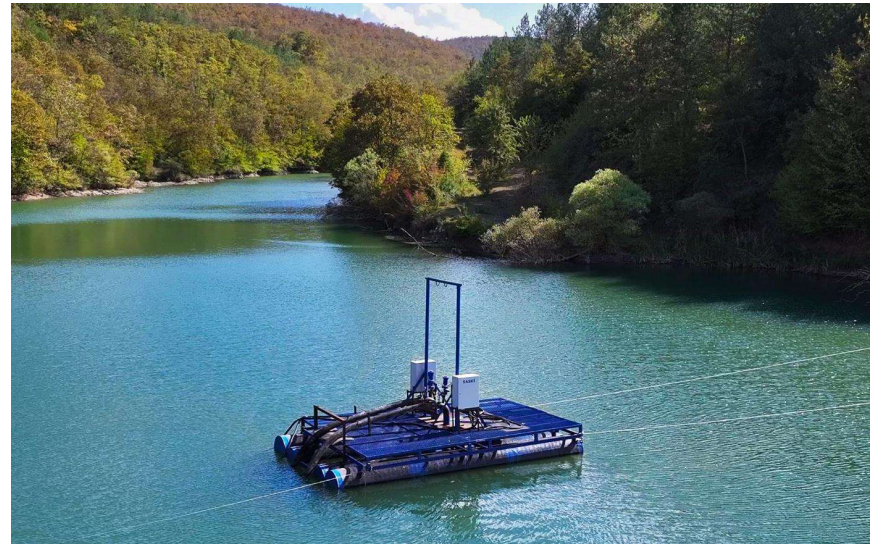

SAMSUN İLİ MUHTELİF İLÇELER KIRSAL MAHALLELERİ İÇME SUYU İNŞAATI

Projenin Yeri : Muhtelif İlçeler

Sözleşme Tarihi : 06.09.2024

Bitiş Tarihi : 06.12.2025

Sözleşme Bedeli : 115.643.129,00 TL (KDV dahil)




İş kapsamında, idare malı malzeme ile 410.008,79 m içme suyu hattı ve 20.326,85 m abone hattı yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2024 yılında, değişik cins ve çapta 54,4 km uzunluğunda içme suyu hattı yapılmıştır. Bu proje ile yapımı tamamlanarak hizmete alınan 50 l/s kapasiteli Örencik Arıtma Tesisi'nden Terme ilçesi Örencik, İlimdağ, Kesikkaya, Ambartepe, Kocamanbaşı, Oğuzlu, Akçaykaracalı, Kazımkarabekirpaşa mahalleleri ve Salıpazarı ilçesi Güzelvatan Mahallesi olmak üzere toplam 9 mahallenin içme suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **18.823.641,08 TL**



TERME İLÇESİ ÖRENCİK ARITMA TESİSİ İÇMESUYU PROJESİ

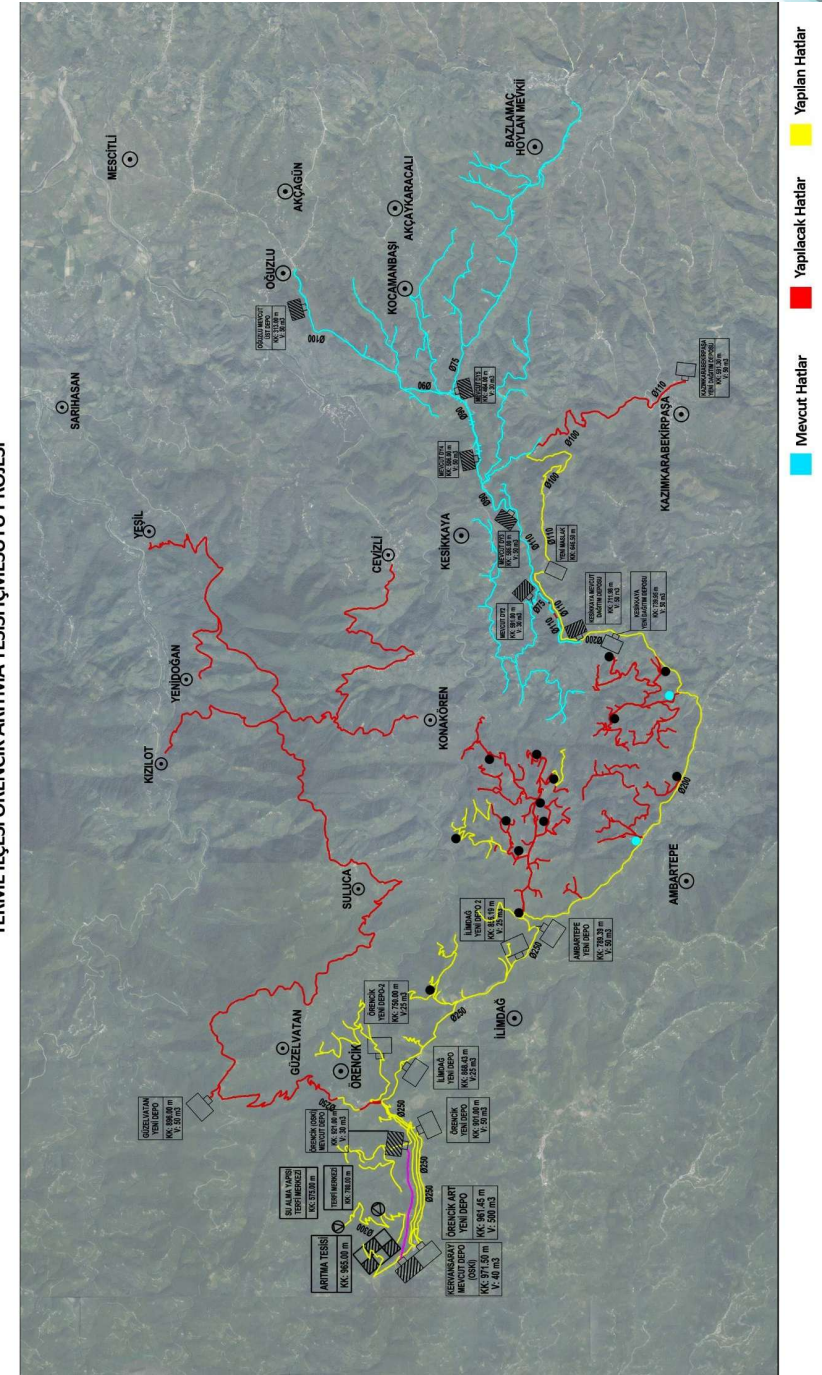

SAMSUN İLİ İLKADIM, ATAKUM VE 19 MAYIS İLÇELERİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI

Projenin Yeri : Atakum, İlkadım, 19 Mayıs
Sözleşme Tarihi : 25.04.2023
Bitiş Tarihi : 18.07.2024
Sözleşme Bedeli : 72.947.432,028 TL (İş Artışı ve KDV dâhil)

İş kapsamında, idare malı malzeme ile 29.345 m kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 30.545 m parsel bağlantısı, 7.204 m ızgara bağlantısı yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2023 yılında, 32.144,15 m kanalizasyon hattı, 8.391,92 m yağmursuyu hattı, 211,65 m ızgara bağlantısı, 72 adet ızgara, 971,76 m parsel bağlantısı ve 152 adet parsel bacası yapılmıştır.


2024 yılında, 32.936,62 m kanalizasyon hattı, 10.245,87 m yağmursuyu hattı, 515,16 m ızgara bağlantısı, 1.084 adet ızgara, 983 m parsel bağlantısı ve 155 adet parsel bacası yapılmıştır.

Ayrıca İlkadım ilçesi, Baruthane ve Kalkancı mahalleleri ile Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde muhtelif çaplarda yağmursuyu hattı ve bu hatların ızgara imalatları yapılmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **29.533.171,86TL**



19 MAYIS - ATAKUM ATIKSU PROJESİ

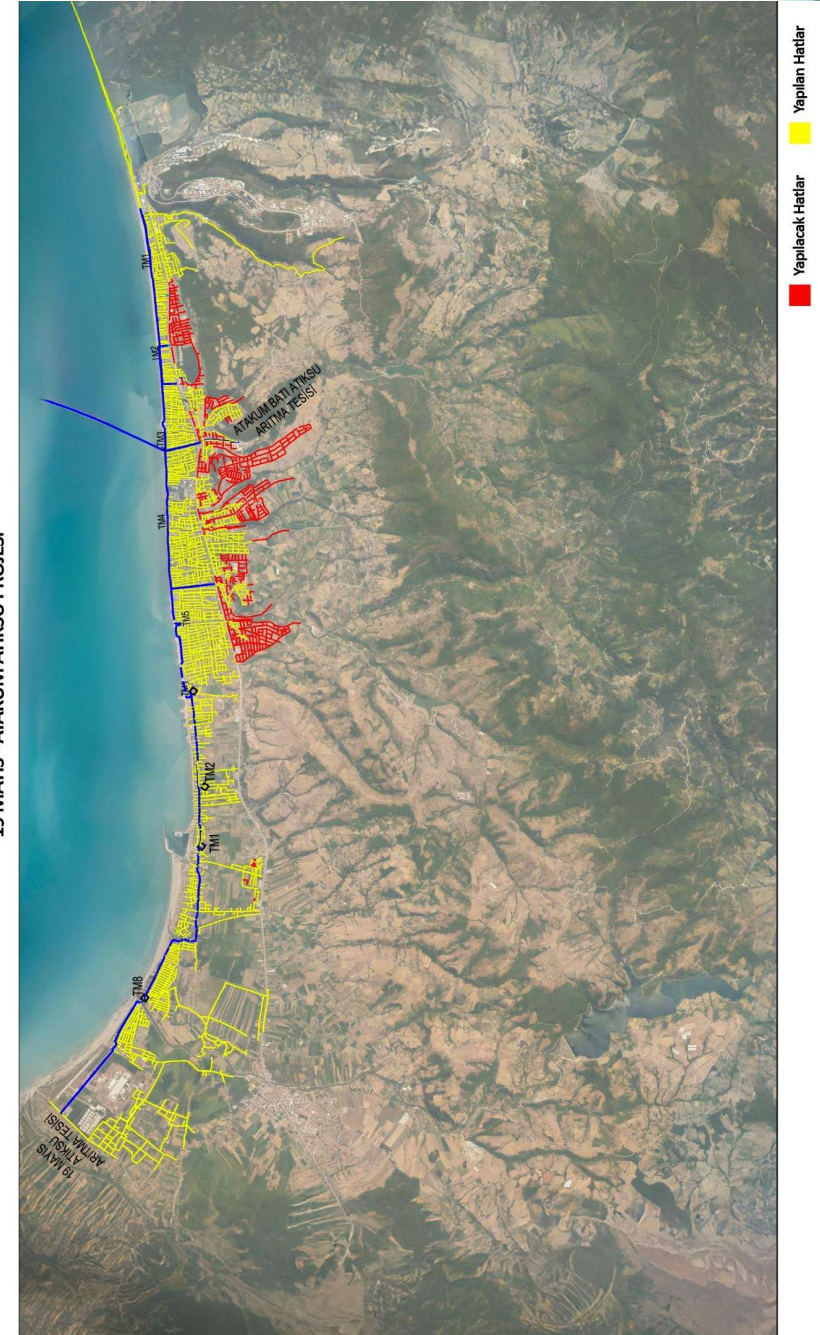

SAMSUN İLİ MERKEZ İLÇELER KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI

Projenin Yeri : Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy

Sözleşme Tarihi : 08.07.2024

Bitiş Tarihi : 11.07.2025

Sözleşme Bedeli : 76.919.249,40 TL (KDV dâhil)

İş kapsamında, İdare malı malzeme ile 35.400 m kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 4.522 m parsel bağlantısı, 2.030 m ızgara bağlantısı yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.


2024 yılında, 35.000 m kanalizasyon hattı, 5.600 m yağmursuyu hattı, 2.000 m ızgara bağlantısı, 306 adet ızgara, 210 m parsel bağlantısı ve 15 adet parsel bacası yapılmıştır.

Bu proje ile kanalizasyon altyapısı bulunmayan 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi, Atakum ilçesi İncesu Yalı, Büyükoymca ve Körfez mahallelerinin fenni kanalizasyon altyapısına kavuşması ve Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Şehit Ünal Caddesi ile Atatürk Bulvarı çevresinde oluşan sel ve su baskınlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **53.772.807,52 TL**



ATAKUM İLÇESİ BÜYÜKOYMCA MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI PROJESİ

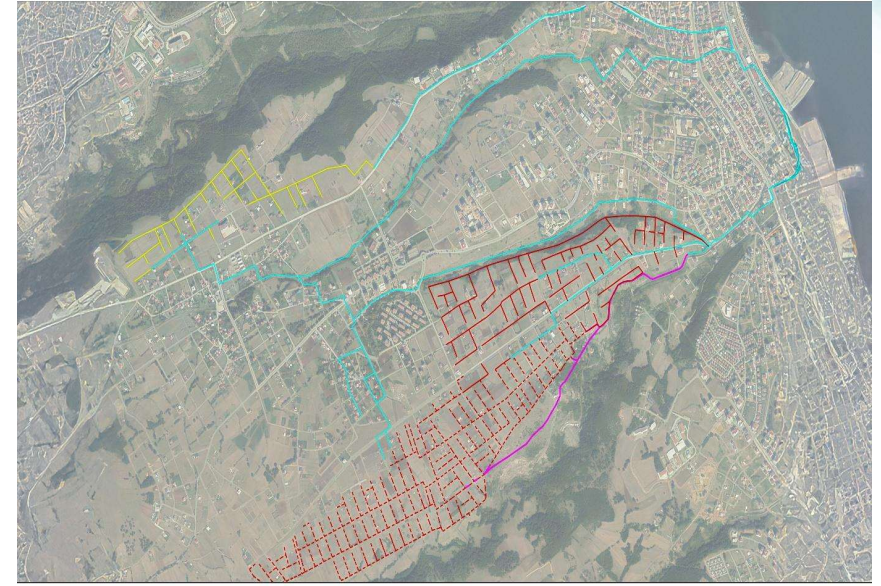

ATAKUM İLÇESİ ESENEVLER MAHALLESİ ŞEHİT ÜNAL CADDESİ İLE ATATÜRK BULVARI ARASI YAĞMURSUYU HATTI PROJESİ



SAMSUN İLİ ATAĞUM VE İLKADIM İLÇELERİ YAĞMURSUYU KOLEKTÖR HATTI İNŞAATI

Projenin Yeri : Atakum, İlkadım

Sözleşme Tarihi : 08.09.2023

Bitiş Tarihi : 05.03.2024


Sözleşme Bedeli : 31.229.422,92 TL (İş Artışı ve KDV dâhil)

İş kapsamında, idare malı malzeme ile 3.872 m yağmursuyu hattı, 3.085 m ızgara bağlantısı yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2023 yılında, 5.403,48 m yağmursuyu hattı, 297,35 m ızgara bağlantısı ve 6 adet ızgara yapılmıştır.

2024 yılında, 5.945,29 m yağmursuyu hattı, 484,81 m ızgara bağlantısı, 42 adet ızgara yapılmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **7.353.231,56 TL**

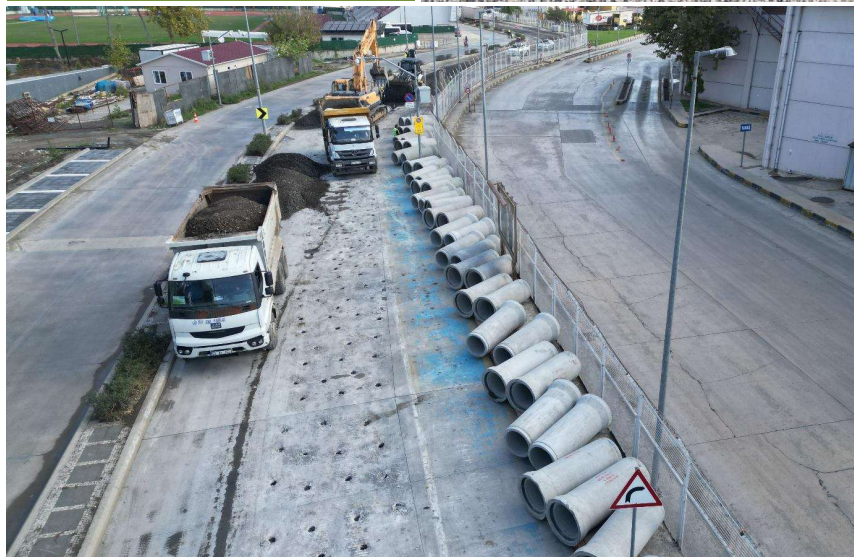

ATAKUM - TÜRK-İŞ YAĞMURSUYU PROJESİ



19 MAYIS İLÇESİ DEREKÖY MAHALLESİ PARSEL BACASI VE BAĞLANTILARININ YAPILMASI

Projenin Yeri : 19 Mayıs
Sözleşme Tarihi : 26.04.2024
Bitiş Tarihi : 19.08.2024 (Süre uzatımı)
Sözleşme Bedeli : 1.992.000,00 TL (KDV dâhil)

İş kapsamında, İdare malı malzeme ile kanalizasyon parsel bağlantısı ve kanalizasyon parsel bacası yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2024 yılında, 2.011 m kanalizasyon parsel bağlantısı ile 377 adet kanalizasyon parsel bacası yapılmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (KDV dâhil): **1.774.235,65 TL**

SAMSUN İLİ MUHTELİF İLÇELERDE PARSEL BACASI VE BAĞLANTILARININ YAPILMASI

Projenin Yeri : Atakum, İlkadım
Sözleşme Tarihi : 10.11.2023
Bitiş Tarihi : 19.01.2024
Sözleşme Bedeli : 1.388.100,00 TL (KDV dâhil)

İş kapsamında, İdare malı malzeme kullanılarak kanalizasyon hattı, kanalizasyon parsel bağlantısı ile değişik çaplarda kanalizasyon parsel ve muayene bacası yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2024 yılında, 847,16 m kanalizasyon hattı, 574,57 m kanalizasyon parsel bağlantısı, 80 adet kanalizasyon parsel bacası ve 15 adet kanalizasyon muayene bacası yapılmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (KDV dâhil): **1.199.746,50 TL**

YAĞMURSUYU KESON TERFİ MERKEZİ İNŞAATI (1.KISIM)

Projenin Yeri : Canik, Bafra, Terme
Sözleşme Tarihi : 16.08.2023
Bitiş Tarihi : 21.03.2024
Sözleşme Bedeli : 9.066.000,00 TL (KDV dâhil)

İş kapsamında, Canik ilçe sınırları içerisinde bulunan sanayi bölgesinde, Terme ilçesi Çay Mahallesi ve Bafra ilçe merkezinde meydana gelen sel ve su baskınlarının önüne geçerek kalıcı çözüm üretmek amacıyla 3 adet keson terfi merkezinin inşası ile idare malı beton ve demir kullanılarak Canik ilçesinde 6 m çapında, Bafra ve Terme ilçelerinde 10 m çapında keson imalatı yer almaktadır.

Canik terfi merkezinde her biri 500 lt/s kapasiteli 4 adet, Terme terfi merkezinde her biri 450 lt/s kapasiteli 5 adet ve Bafra terfi merkezinde her biri 450 lt/s kapasiteli 5 adet pompa kullanılacaktır.

Canik ilçesinde bulunan keson imalatı tamamlanmış olup Terme ilçesinde bulunan kesonun çarık imalatı, radye temel imalatı ve perdesinin 7 metrelik kısmı tamamlanmıştır.

Söz konusu terfi merkezlerinin yağmursuyu hatları ilgili ilçelerin altyapı projeleri kapsamında yapılmaktadır. Elektrik işleri ise Yağmursuyu Keson Terfi Merkezi İnşaatı (2.Kısım) kapsamında yapılmaktadır. Terfi merkezlerinde idare malı pompa kullanılmaktadır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **4.715.421,16 TL**



YAĞMUR SUYU KESON TERFİ MERKEZİ İNŞAATI (2.KISIM)

Projenin Yeri : Canik, Bafra, Terme
Sözleşme Tarihi : 16.08.2023
Bitiş Tarihi : 21.03.2024 (Süre uzatımı)
Sözleşme Bedeli : 27.750.024,00 TL (İş artışı ve KDV dâhil)

İş kapsamında Canik, Bafra ve Terme ilçelerinde tesis edilen yağmur suyu keson terfi merkezlerinin enerji nakil hatları, trafo tesisleri, elektrik enstrümanları ve otomasyon sistemlerinin yapımı yer almaktadır.

Canik ilçesinde bulunan yağmur suyu keson terfi merkezinin elektrik işleri tamamlanmıştır. Terme ve Bafra ilçelerinde bulunan tesislerin enerji nakil hattı ve trafo merkezleri tesis edilmiş olup kalan işlerin yapımı devam etmektedir.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (KDV dâhil): **6.430.845,48 TL**



HOZAN DERESİ POLATLI BULVARI GEÇİŞİ İNŞAATI İŞİ

Projenin Yeri : İlkadım
Sözleşme Tarihi : 10.01.2024
Bitiş Tarihi : 29.03.2024
Sözleşme Bedeli : 10.414.052,04 TL (KDV dâhil)

İş kapsamında, 102,54 m betonarme açık kesit ile 21,46 m betonarme kutu kesit imalatı yapılması yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2024 yılında, 8,38 m betonarme U kesit, 72,84 m betonarme konsollu U kesit ve 45,72 m betonarme kutu kesit dere ıslahı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu imalatlar ile İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı güzergâhında oluşabilecek sel baskınlarının önüne geçilmiştir.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **11.421.849,85 TL**



Öncesi



Sonrası

ATAKUM VE İLKADIM İLÇELERİNDE MUHTELİF DERE ISLAHI İNŞAATI

Projenin Yeri : İlkadım, Atakum
Sözleşme Tarihi : 10.01.2024
Bitiş Tarihi : 31.10.2024
Sözleşme Bedeli : 95.279.310,24 TL (KDV dâhil)

İş kapsamında, Atakum ilçesi Sazak Deresi'nde 341,51 m ve İlkadım ilçesi Kışla Deresi'nde 1.438,44 m dere ıslahı yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2024 yılında, sel ve su baskınlarının önüne geçilmesi amacıyla Atakum ilçesi Sazak Deresi ile İlkadım ilçesi Hozan ve Kışla Dereleri ıslah edilmiştir. Bu çalışma ile İlkadım ilçesindeki yağmursularının büyük bir bölümü Mert Irmağı'na, Atakum ilçesindeki yağmursularının büyük bir bölümü ise denize aktarılmıştır.

Yine aynı iş kapsamında hazır kutu menfez kullanılarak Atakum ilçesinde 40,38 m, İlkadım ilçesi Polatlı Bulvarı'nda ise 77,15 m yol geçişi yapılmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **107.279.031,06 TL**

SAMSUN İLİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARININ TEMİZLİĞİ

Projenin Yeri : Atakum, İlkadım, Tekkeköy
Sözleşme Tarihi : 10.01.2024
Bitiş Tarihi : 06.09.2024 (Süre uzatımı)
Sözleşme Bedeli : 44.154.648,02 TL (KDV dâhil)

İş kapsamında, toplam 310.528,16 m atık su hattı, yağmursuyu hattı ve kutu menfez temizliği ile 200 adet muayene baca kapağının yol üst seviyesine getirilmesi, 100 adet mevcut hat üstü baca kapağı yapılması ve 100 m³ kum tutucu temizliği yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2024 yılında, 124.080,78 m hat temizliği ile 14.922,84 m kutu menfez temizliği yapılmış, 1.623 adet muayene baca kapağı yol üst seviyesine getirilmiş, 39 adet mevcut hat üstü baca kapağı yapılmış ve 673,62 m³ kum tutucu temizliği gerçekleştirilmiştir.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (KDV dâhil): **44.126.805,64 TL**



b.3. İçme Suyu Arıtma Tesisi, Depo, Sondaj Binası ve Terfi Merkezi Yatırımları

SELAHATTİN EREREN İÇME SUYU ARITMA TESİSİ 3 ADET FİLTRE HAVUZLARI TADİLATI

Projenin Yeri : Tekkeköy

Sözleşme Tarihi : 14.08.2024

Bitiş Tarihi : 15.11.2024

Sözleşme Bedeli : 11.160.000,00 TL (KDV dâhil)

İş kapsamında, Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesis'i'nde içme suyu kalitesini artırmak amacıyla 8, 12 ve 16 numaralı 3 adet filtre havuzunun tadilatı yer almaktadır.

Havuzlarda yer alan kumlar boşaltılmış, betonarme yüzey kaplamaları ve nozul plakaları sökülüş, dilatasyon derz yenilenmiş, çatlakların onarımı yapılmış, betonarme yüzeylerde yalıtım işlemi gerçekleştirilmiştir. Yalıtım ve tadilat işlemine müteakip yeni nozul plakaları, nozullar ve kumlar filtrelerle yerleştirilmiştir.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **11.159.777,64 TL**



MUHTELİF İLÇELERDE İÇME SUYU DEPOSU VE TERFİ BİNASI İNŞAATI

Projenin Yeri : Muhtelif İlçeler

Sözleşme Tarihi : 02.07.2024

Bitiş Tarihi : 04.04.2025

Sözleşme Bedeli : 87.687.400,00 TL
(İş artışı ve KDV dâhil)

İş kapsamında, 33 adet prekast betonarme, 12 adet GRP modüler, 2 adet 100 tonluk, 2 adet 500 tonluk, 1 adet 1.000 tonluk betonarme içme suyu deposu ile 1 adet içme suyu terfi istasyonu yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2024 yılında, 43 adet prekast betonarme, 12 adet GRP modüler, 2 adet 500 tonluk ve 1 adet 1.000 tonluk betonarme içme suyu deposu ile 1 adet içme suyu terfi istasyonu yapılmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **92.243.617,08 TL**

SAMSUN İLİ MUHTELİF İLÇELER İÇME SUYU DEPO İNŞAATI

Projenin Yeri : Muhtelif İlçeler

Sözleşme Tarihi : 08.09.2023

Bitiş Tarihi : 21.09.2024

Sözleşme Bedeli : 27.140.000,00 TL
(KDV dâhil)

İş kapsamında, 6 adet betonarme içme suyu deposu yapımı yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2024 yılında, 5 adet depo ve 4 adet terfi merkezi imalatı yapılmıştır.

İlkadım ilçesinde bulunan Toybelen Deposu yerine 1.000 m³ hacminde yeni içme suyu deposu ve 1 adet terfi binası inşaatı, Alaçam ilçesinde 1.000 m³ hacminde yeni içme suyu deposu inşaatı, Çarşamba ilçesinde 100 m³ hacminde ayaklı depo inşaatı, Vezirköprü ilçesinde 1 adet 100 m³ ve 1 adet 80 m³ hacminde betonarme depo imalatı gerçekleştirilmiştir.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **17.286.035,50 TL**



b.4. Elektrik, Makine Bakım ve Onarım Yatırımları

SASKİ ELEKTRİK YAPIM BAKIM VE ONARIM İŞLERİ

Projenin Yeri : Samsun Muhtelif İlçeler

Sözleşme Tarihi : 26.07.2024

Bitiş Tarihi : 23.10.2025

Sözleşme Bedeli : 52.671.666,66 TL (KDV dâhil)

İş kapsamında, İdaremize ait tesislerin enerji nakil hatları ve trafoları ile reaktif enerji tüketimi olan tesislerin kompanzasyon bakım-onarımlarının yapılması yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2024 yılında, yeni yapılan muhtelif tesislerimiz için 12 adet yeni enerji nakil hattı yapılmış, 22 adet mevcut tesisin de enerji nakil hattı ve trafo merkezi tadilatı gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte İdaremize ait reaktif enerji tüketimi olan tesislerin kompanzasyon bakım ve onarımları yapılarak tüketimlerin mevzuatta belirtilen sınırlar içerisinde kalması için gerekli tedbirler alınmıştır. Enerji İzleme Sistemi ile tesislerin reaktif tüketimleri anlık takip edilerek önleyici ve düzeltici faaliyetlerde bulunulmuştur. İdaremize 2019 yılında 580.264,91 TL reaktif tüketim bedeli yansımış iken yapılan çalışmalarla bu bedel düşürülerek 2020 yılında 109.153,09 TL, 2021 yılında 132.206,86 TL, 2022 yılında 38.120,02 TL, 2023 yılında 67.360,73 TL, 2024 yılında 161.121,26 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında oluşan 161.121,26 TL'lik reaktif tüketim bedeli sözleşme hükümleri kapsamında yükleniciye rücu edilmiştir. İdaremizce elektrik dağıtım firmasına yapılan itiraz neticesinde söz konusu reaktif tüketim bedeli iptal edilerek bu bedelle birlikte toplam 226.838,48 TL iade alınmıştır. Dolayısıyla bu işlem sonucunda İdaremiz 65.717,22 TL kâr elde etmiştir. 2024 yılında toplam 92 tesisin reaktif tüketim yapmaması için bakım-onarım çalışması yapılmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **20.562.554,64-TL**

ELEKTRİK YAPIM VE BAKIM İŞLERİ

Projenin Yeri : Samsun Muhtelif İlçeler

Sözleşme Tarihi : 24.01.2024


Bitiş Tarihi : 10.06.2024

Sözleşme Bedeli : 10.914.801,00 TL
(KDV dâhil)

İş kapsamında, İdaremizin yeni planladığı veya mevcutta bulunan tesislerin enerji nakil hatları ile mevcut enerji nakil hatlarının tadilatları, elektrik tesisatı ve pano yapım işleri, muhtelif arızalara müdahale ve vinç çalıştırma işlerinin yapılması yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2024 yılında, muhtelif tesislerimiz için 4 adet yeni enerji nakil hattı, mevcut 2 adet tesis için güç artışı ve muhtelif tesislerde de arıza, tamir, tadilat işleri yapılarak tesislerin problemsiz bir şekilde işletilmesi sağlanmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **10.905.145,68 TL**

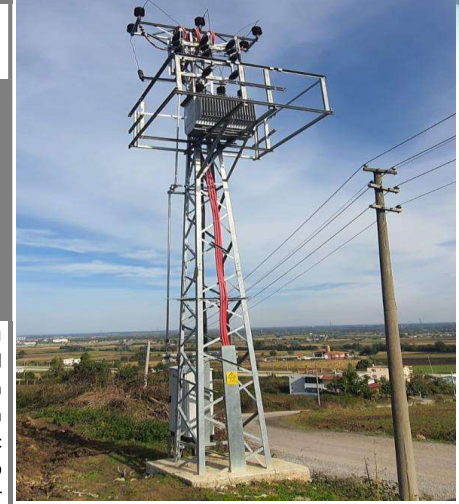

MUHTELİF TESİSLERİN ELEKTRİK İŞLERİ

Projenin Yeri : Samsun Muhtelif İlçeler

Sözleşme Tarihi : 21.09.2023

Bitiş Tarihi : 10.07.2024

Sözleşme Bedeli : 30.360.445,34TL
(KDV dâhil)

İş kapsamında, İdaremizin yeni planladığı veya mevcutta bulunan tesislerin AG ve OG olmak üzere enerji nakil hatları, mevcut enerji nakil hatlarının tadilatları, elektrik tesisatı ve pano yapım işleri, çevre düzenleme ve altyapı çalışmalarının yapılması yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2024 yılında, muhtelif tesislerimiz için 8 adet yeni enerji nakil hattı ve 1 adet güç artışı ile bu tesislerdeki elektrik işleri yapılmıştır. Ayrıca İdaremizin tesis ettiği ve edeceği yerlerde kullanılmak üzere sayaç panolarının alımı da gerçekleştirilmiştir.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **11.843.397,37 TL**



SAMSUN İLİ SU SONDAJ KUYULARI AÇILMASI İŞİ

Projenin Yeri : Muhtelif İlçeler

Sözleşme Tarihi : 17.10.2024

Bitiş Tarihi : 20.02.2025

Sözleşme Bedeli : 4.715.280,00 TL (KDV dâhil)

İş kapsamında, toplam 900 m içme suyu sondaj kuyusu açılması yer almakta olup gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2024 yılında, Yakakent İlçesi Karaaba Mahallesi'nde 136 m, Yassıdağ Mahallesi'nde 164 m ile Vezirköprü İlçesi Özkuruçay Mahallesi'nde 32 m derinliğinde sondaj kuyuları açılmıştır.

2024 yılında yapılan harcama tutarı (Fiyat Farkı ve KDV dâhil): **1.814.016,00 TL**



2. Performans Sonuç Tabloları

AMAÇ 1	EN KALİTELİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK				
Hedef 1.1	İçme suyu arıtma ve sağlıklı içme suyunun arzı				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 1.1.1 Teknoloji ve sistemler açısından yenilenen su arıtma tesisi sayısı	Adet	2	2	100,00%	0,00%
Açıklama	Terme Emiryusuf İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde kesintisiz klorlama için gaz klor sistemine geçilmiş ayrıca Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde yer alan 3 adet kum filtresi ünitesinde komple bakım, onarım ve kum değişimi yapılarak daha sağlıklı içme ve kullanma suyu temini sağlanmıştır.				
Sorumlu Birim	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 1	EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK				
Hedef 1.2	İçme suyu temini için şebeke ve isale hattı etüt proje ve fizibilite raporlarını hazırlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 1.2.1 Projelendirilen içme suyu şebeke ve isale hattı uzunluğu	km	500	900	180,00%	80,00%
Açıklama	İlgili Daire Başkanlıklarından gelen talepler üzerine hazırlanan proje metrajları artmıştır.				
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 1	EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK				
Hedef 1.3	İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 1.3.1 İnşa edilen depo sayısı	Adet	70	94	134,29%	34,29%
Açıklama	Şehrin içilebilir nitelikte içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek için planlamanın üzerinde bir performans sergilenmiştir.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 1	EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK				
Hedef 1.3	İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 1.3.2 İnşa edilen terfi merkezi sayısı	Adet	10	18	180,00%	80,00%
Açıklama	Şehrin içilebilir nitelikte içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek için planlamanın üzerinde bir performans sergilenmiştir.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 1	EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK				
Hedef 1.3	İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 1.3.3 Yeni yapılan ve yenilenen içme suyu hattı uzunluğu	km	400	793,75	198,43%	98,43%
Açıklama	Şehrin içilebilir nitelikte içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek için planlamanın üzerinde bir performans sergilenmiştir.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 1	EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK				
Hedef 1.3	İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 1.3.4 Temizlik, bakım ve onarımı yapılan içme suyu tesislerinin sayısı	Adet	500	962	192,40%	92,40%
Açıklama	Sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini amacıyla mevcut içme suyu depoları temizlenmiş, dezenfeksiyon işlemleri yapılmış ve hedefin üzerinde performans gösterilmiştir.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 1	EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK				
Hedef 1.4	Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 1.4.1 Yeni bir gölet yapımı tamamlanma oranı (kümülatif)	Yüzde	0	0	-	-
Açıklama	İçme suyu temininin, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve yapımına başlanılan barajlardan sağlanması planlandığı için gölet yapımına ihtiyaç duyulmamıştır.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 1	EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK				
Hedef 1.4	Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 1.4.2 Tesis edilen sondaj kuyusu sayısı	Adet	5	6	120,00%	20,00%
Açıklama	Etüt çalışmaları uygun sonuç veren mahallelerde sondaj kuyuları açılmış, izleme sonucunda içilebilir nitelikte içme suyuna sahip kuyular inşa edilmiştir.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 1	EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK				
Hedef 1.4	Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 1.4.3 Tesis edilen su alma yapısı sayısı	Adet	1	3	300,00%	200,00%
Açıklama	Etüt çalışmaları uygun sonuç veren ve izleme sonucunda içilebilir nitelikte içme suyuna sahip su alma yapıları inşa edilmiştir.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 1	EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK				
Hedef 1.4	Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 1.4.4 Kaptaj yapımı sayısı	Adet	1	2	200,00%	100,00%
Açıklama	Etüt çalışmaları uygun sonuç veren ve izleme sonucunda içilebilir nitelikte içme suyuna sahip kaptajlar inşa edilmiştir.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 1	EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK				
Hedef 1.4	Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 1.4.5 Kaynak etüdü sayısı	Adet	30	43	143,33%	43,33%
Açıklama	İçme suyu ihtiyacı olan mahalleler için hidrojeolojik etüt ve jeofizik rezistivite çalışmaları yapılarak su kaynakları araştırılmış ve hedefin üzerinde bir performans gerçekleştirilmiştir.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 1	EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK				
Hedef 1.5	İçme suyu sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 1.5.1 Şebekeye verilen su miktarının ölçülme sayısı	Adet	30	48	160,00%	60,00%
Açıklama	Şehre verilen suyun kayıp oranını düşürmek amacıyla 48 noktada ölçüm yapılarak hedefin üzerinde performans gerçekleştirilmiştir.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 1	EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK				
Hedef 1.6	İçme suyu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 1.6.1 Revizyonu yapılan içme suyu terfi motopomp grubu sayısı	Adet	130	126	96,92%	-3,08%
Açıklama	Samsun genelinde 126 adet içme suyu pompa-motor grubunun devreye alma ve revizyon işlemleri yapılarak hedef büyük ölçüde tamamlanmıştır.				
Sorumlu Birim	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 1	EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK				
Hedef 1.6	İçme suyu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 1.6.2 Devreye alınması planlanan içme suyu terfi merkezi sayısı	Adet	20	18	90,00%	-10,00%
Açıklama	Samsun genelinde 18 adet içme suyu terfi merkezi inşa edilerek hedef büyük ölçüde tamamlanmıştır.				
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 2	ATIK SULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.1	Kanalizasyon, dere ıslahı projelerini hazırlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 2.1.1 Projelendirilen kanalizasyon şebeke ve kollektör hattı uzunluğu	Km	150	380	253,33%	153,33%
Açıklama	İlgili Daire Başkanlıklarından gelen talepler üzerine hazırlanan proje metrajları artmıştır.				
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 2	ATIK SULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.1	Kanalizasyon, dere ıslahı projelerini hazırlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 2.1.2 Islah projesi yapılan dere ıslahı uzunluğu	Km	5	1,3	26,00%	-74,00%
Açıklama	Bütçe ve yatırım planlamaları doğrultusunda projelendirme yapılmıştır.				
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 2	ATIK SULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.2	Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 2.2.1 Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu	Km	150	112,96	75,31%	-24,69%
Açıklama	Şehrimizin muhtelif bölgelerindeki kanalizasyon hattı ihtiyaçlarına göre imalat yapılmıştır. Ayrıca yıllara sari olarak devam eden projelerimiz bulunmaktadır.				
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 2	ATIK SULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.2	Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 2.2.2 Yapılan bina bağlantısı sayısı	Adet	2.200	1.602	72,81%	27,19%
Açıklama	Bina bağlantıları, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yapılmaktadır.				
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 2	ATIK SULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.2	Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 2.2.3 Yapılan dere ıslahı uzunluğu	Km	1,5	1,9	126,67%	26,67%
Açıklama	Kışla, Hozan ve Sazak Dereleri ıslah edilerek hedefin üzerinde performans sergilenmiştir.				
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 2	ATIK SULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.2	Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 2.2.4 Foseptik yapımı sayısı	Adet	15	0	-	-
Açıklama	Foseptik ihtiyacı olmadığı için hedefe yönelik bir işlem yapılmamıştır.				
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 2	ATIK SULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.3	Atık su arıtma tesisi inşaatı projelerini hazırlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 2.3.1 Projelendirilen ileri biyolojik atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	1	1	100,00%	0,00%
Açıklama	Belirtilen hedefe ulaşılmıştır.				
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 2	ATIK SULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.3	Atık su arıtma tesisi inşaatı projelerini hazırlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 2.3.2 Projelendirilen biyolojik atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	0	0	-	-
Açıklama					
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 2	ATIK SULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.3	Atık su arıtma tesisi inşaatı projelerini hazırlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 2.3.3 Projelendirilen paket atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	0	0	-	-
Açıklama					
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 2	ATIK SULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.4	Atık su arıtma tesislerinin sürekli ve verimli olarak çalıştırılması ile proses kontrollerinin yapılması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 2.4.1 Havza koruma planlarının hazırlanması	Adet	0	0	-	-
Açıklama					
Sorumlu Birim	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 2	ATIK SULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.4	Atık su arıtma tesislerinin sürekli ve verimli olarak çalıştırılması ile proses kontrollerinin yapılması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 2.4.2 Çamur susuzlaştırma ünitelerinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak için alınacak polielektrolit miktarı	Ton	45	51,25	113,88%	13,88%
Açıklama	Belirtilen hedefe ulaşılmıştır.				
Sorumlu Birim	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 2	ATIK SULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.4	Atık su arıtma tesislerinin sürekli ve verimli olarak çalıştırılması ile proses kontrollerinin yapılması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 2.4.3 Atık su arıtma tesislerinin performans takibini sağlamak için kurulacak online izleme sistemi sayısı	Adet	1	1	100,00%	0,00%
Açıklama	Belirtilen hedefe ulaşılmıştır.				
Sorumlu Birim	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 2	ATIK SULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.5	Atık su terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 2.5.1 Devreye alınması planlanan atık su terfi merkezi sayısı	Adet	2	4	200,00%	100,00%
Açıklama	İl genelinde 4 adet atık su terfi merkezi devreye alınmıştır.				
Sorumlu Birim	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 2	ATIK SULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK				
Hedef 2.5	Atık su terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 2.5.2 Revizyonu yapılan atık su terfi dalgıç pompa grubu sayısı	Adet	80	15	18,75%	-81,25%
Açıklama	Samsun genelinde 15 adet atık su terfi dalgıç pompa grubunun revizyon işleri yapılmıştır.				
Sorumlu Birim	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.1	Bilgi ve teknolojik sistemin geliştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.1.1 Ağ oluşturan cihazların fiziksel ve mantıksal yerleşiminin tespiti, ağ güvenliği ve trafiğinin yönetimi oranı	Yüzde	15	15	100,00%	0,00%
Açıklama	Planlanan oranda ağ iyileştirme yapılmıştır.				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.1	Bilgi ve teknolojik sistemin geliştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.1.2 CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) yazılım ve donanımlarının kurulması, işletilmesi ve sayısallaştırılan verilerin işlenmesi oranı	Yüzde	80	80	100,00%	0,00%
Açıklama	Belirtilen hedefe ulaşılmıştır.				
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.1	Bilgi ve teknolojik sistemin geliştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.1.3 Gerekli yazılım ve donanımların sağlanarak SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) merkez ile haberleştirilen istasyon sayısı	Adet	70	50	71,43%	-28,57%
Açıklama	Pasif konuma geçen sondaj ve depolar nedeniyle merkez ile haberleştirilen istasyon sayısında düşüş yaşanmıştır.				
Sorumlu Birim	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.2	Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.2.1 SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) dahil edilmesi planlanan içme suyu terfi merkezi sayısı	Adet	5	30	600,00%	500,00%
Açıklama	Yeni yatırımlarla tesis lokasyonlarının çoğaltılması, otomasyon sistemine duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bununla beraber otomasyon ekibi sayısının artırılması ve personelin tecrübe kazanması, sahadaki çalışma oranının planlananın üzerinde gerçekleşmesini sağlamıştır.				
Sorumlu Birim	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.2	Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.2.2 SCADA'ya dahil edilmesi planlanan atık su terfi merkezi sayısı	Adet	5	8	160,00%	60,00%
Açıklama	Yıl içerisinde 8 adet atık su terfi merkezi sisteme dahil edilmiştir.				
Sorumlu Birim	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.2	Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.2.3 SCADA'ya dahil edilmesi planlanan kuyu ve depoların sayısı	Adet	10	15	150,00%	50,00%
Açıklama	Hedefin üzerinde bir performans gerçekleştirilmiştir.				
Sorumlu Birim	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.2	Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.2.4 Otomasyon sistemine dahil edilmesi planlanan elektrik sayacı sayısı	Adet	4	49	1225,00%	1125,00%
Açıklama	Yeni yatırımlarla tesis lokasyonlarının çoğalması, otomasyon sistemine duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bununla beraber otomasyon ekibi sayısının artırılması ve personelin tecrübe kazanması, sahadaki çalışma oranının planlananın üzerinde gerçekleşmesini sağlamıştır.				
Sorumlu Birim	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.3	Devir abonelik işlemlerinin tamamını abonenin başvurduğu gün sonuçlandırmak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.3.1 TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi), UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) ve e-devlet işlemlerinin abonelik bilgi yönetim sistemine entegrasyonunun tamamlanması	Yüzde	100	100	100,00%	0,00%
Açıklama	Belirtilen hedefe ulaşılmıştır.				
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.4	Yeni aboneler için kullanılacak ve teknolojik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının değişimi				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.4.1 Değiştirilen sayaç sayısı	Adet	8.000	7.840	94,00%	-6,00%
Açıklama	Belirtilen hedef büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.				
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.5	Mali disiplini sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.5.1 Gider bütçesi gerçekleşme oranı (Bütçe Gideri / Tahmini Bütçe)	Yüzde	100	98,97	98,97%	-1,03%
Açıklama	Belirtilen hedef büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.				
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.5	Mali disiplini sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.5.2 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (Bütçe Geliri / Tahmini Bütçe)	Yüzde	100	99,47	99,47%	-0,53%
Açıklama	Belirtilen hedef büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.				
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.5	Mali disiplini sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.5.3 Hazırlanacak rapor sayısı (Bütçe, Stratejik Plan, Faaliyet raporu, performans raporu, kesin hesap)	Adet	5	5	100,00%	0,00%
Açıklama	Mali şeffaflık gereği; stratejik plan, performans programı, bütçe, faaliyet raporu ve kesin hesap raporları zamanında hazırlanmıştır.				
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.6	Personelin mesleki yetkinliğinin artırılması ve kişisel gelişiminin sağlanması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.6.1 Hizmet içi verilen eğitim sayısı	Adet	15	19	126,67%	26,67%
Açıklama	Planlanan eğitimler dışında kamu kurumlarının kurumumuza eğitim verme talepleri üzerine farklı eğitimler de yapılmıştır.				
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.6	Personelin mesleki yetkinliğinin artırılması ve kişisel gelişiminin sağlanması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.6.2 Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	Adet	300	270	90,00%	-10,00%
Açıklama	Hedef büyük oranda gerçekleştirilmiştir.				
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.7	Vatandaş ve kurumlardan gelen talep ve şikayetlere etkin şekilde cevap vermek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.7.1 CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve dış kurumların talep ve şikayetlerine cevap verilme oranı	Yüzde	100	100	100,00%	0,00%
Açıklama	Kurumumuza gelen tüm CİMER başvurularına cevap verilmiştir.				
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.7	Vatandaş ve kurumlardan gelen talep ve şikayetlere etkin şekilde cevap vermek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.7.2 Vatandaşların talep ve şikayetlerini değerlendirmek üzere talep ve şikayet masası kurulması	Yüzde	100	100	100,00%	0,00%
Açıklama	Gelen tüm talep ve şikayetlere cevap verilmiştir.				
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.8	Kurumsal imajı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.8.1 Çekilen kurumsal tanıtım filmi sayısı	Adet	2	0	0,00%	-100,00%
Açıklama	Tasarıf tedbirleri kapsamında kurumsal tanıtım işlemleri sosyal medya aracılığı ile yapılmıştır.				
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.8	Kurumsal imajı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.8.2 Kurumsal tanıtım için yayımlanan broşür sayısı	Adet	10.000	0	0,00%	-100,00%
Açıklama	Tasarruf tedbirleri kapsamında kurumsal tanıtım işlemleri sosyal medya aracılığı ile yapılmıştır.				
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.8	Kurumsal imajı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.8.3 Suyun tasarrufu için yayımlanan basılı ve görsel yayın sayısı (afiş, billboard vb.)	Adet	10.000	0	0,00%	-100,00%
Açıklama	Tasarruf tedbirleri kapsamında su tasarrufuna yönelik bilgilendirme işlemleri sosyal medya aracılığı ile yapılmıştır.				
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.9	İçme suyu kaynakları, su ve atık su arıtma tesislerinin güvenliğini sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.9.1 İçme suyu kaynakları, su ve atık su arıtma tesislerinin güvenlik kameralarının sayısını arttırmak (kümülatif)	Adet	20	11	55,00%	-45,00%
Açıklama	Birim talepleri doğrultusunda güvenlik kamerası montaj işlemleri gerçekleştirilmiştir.				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				

AMAÇ 3	YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK				
Hedef 3.9	İçme suyu kaynakları, su ve atık su arıtma tesislerinin güvenliğini sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Gerçekleşme Seviyesi	Hedef Sapma
PG 3.9.2 İçme suyu kaynakları, su ve atık su arıtma tesislerinin güvenlik koşullarının (kulübeler, çevre peyzajı ve ışıklandırma vb.) iyileştirilme oranı (kümülatif)	Yüzde	80	80	100,00%	0,00%
Açıklama	Belirtilen hedefe ulaşılmıştır.				
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				

4. BÖLÜM KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜSTÜNLÜKLER
ZAYIFLIKLAR
DEĞERLENDİRME

A. ÜSTÜNLÜKLER

- Kırsal mahallelerin büyük çoğunluğuna içme suyu temin edilmiş ve abonelik işlemlerinin yapılmış olması
- Güçlü makine parkı ve yetişmiş personel gücü sayesinde altyapı yatırımlarının önemli bir kısmının İdaremiz imkanları ile yapıyor olması
- İlçe merkezlerinin tamamında atık su arıtma tesislerine sahip olunması
- Atık su arıtma tesislerinin Bakanlık Entegre Bilgi Sistemine kayıtlı olması
- Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin güçlü olması
- Alo 185 çağrı merkezi hizmetinin etkin çalışması
- Aboneler için yeterli sayıda alternatif ödeme mecralarının bulunması
- Arızalara kısa sürede müdahale edilmesi
- e-Devlet üzerinden abonelik devir işlemlerinin yapılabilmesi
- Yatırım harcamalarının gider bütçesi içerisindeki payının yüksek olması
- İç denetim ve rehberlik faaliyetlerine azami önem verilmesi

B. ZAYIFLIKLAR

- Hizmet binası ve şantiyelerimizin yetersiz olması
- Arşiv ve ambarların fiziki yapılarının yetersiz olması
- Altyapı bilgilerinin tamamının sayısallaştırılarak dijital ortama aktarılamamış olması

C. DEĞERLENDİRME

Stratejik yönetimin ilk adımı olan Kurumun mevcut durum analizi ve değerlendirilmesi Stratejik Plan'da olduğu gibi Faaliyet Raporu'nda da yer almaktadır.

İdaremiz başarılı birçok proje ve faaliyete imza atmış olsa da geliştirilmesi gereken zayıf yönlerimiz bulunmaktadır. Gelecek yıllarda yapmayı hedeflediğimiz planlama ve çalışmalarla zayıf yönlerimizi azaltmayı amaçlamaktayız.

2020-2024 Stratejik Planı'nda 11. Kalkınma Planı ile uyumlu 3 amaç, 20 hedef ve bunlara bağlı proje ve faaliyetler belirlenmiştir. Bu amaç ve hedeflerin belirlenmesinde Kurum içi birimlerimiz kadar dış paydaşlarımızın da katkısı olmuştur. Yapılacak proje ve faaliyetlerde diğer Kurumlarla koordinasyon ve iletişim oldukça önemlidir.

İdareimizin stratejik yönetimde sonuç odaklı olması için Stratejik Plan ve Performans Programı'nın hazırlanmış olması yalnız başına yeterli değildir. Programın yanı sıra uygulanabilirlik ve performans kriterlerine uygunluk takibi yapılabilmesi için ilgili birim faaliyetlerinin ve performans gerçekleştirmelerinin analiz edilerek sürekli izlenmesi gerekmektedir. Bu gerekçe ile analizi yapılan performans gerçekleştirmeleri raporlanarak Kurumsal faaliyette meydana gelen iyileşmeler takip edilmelidir.

5. BÖLÜM ÖNERİ ve TEDBİRLER

EKLER :

EK-1: MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak, idaremiz harcama birimlerinin sorumluluğunda yürütülen iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve rehberlik hizmeti verildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini, değerlendirildiğini ve sonuçların harcama yetkililerine ve üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

Mali kanunlar ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğumu beyan ederim.

Faaliyet Raporunun “III/A – Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (17/03/2025)



Mesut YILMAZ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

EK-2: ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak; idaremin bütçesinin kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plan ve performans programları ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanmasını ve uygulanmasını, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesini, kullanılmasını ve kayıp ve suistimale karşı korunmasını sağlamaktan ve harcama birimlerinde mali yönetim ve iç kontrol sisteminin işleyişini izlemekten ve gerekli tedbirleri almaktan sorumluyum.

Bu çerçevede idarem bünyesinde oluşturulan ve uygulanan iç kontrol sisteminin; faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını beyan ederim.

İdaremin stratejik planında ve performans programında açıklanan amaç ve hedeflere yönelik kurumsal risklerin belirlendiğini, değerlendirildiğini, risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için ilave risk yönetimi faaliyetlerinin uygulandığını ve raporlandığını bildiririm.

Bu güvence, gözetim sorumluluğum çerçevesinde edindiğim bilgi ve değerlendirmelere, harcama yetkilileri tarafından sunulan birim faaliyet raporlarına ve iç kontrol güvence beyanlarına, mali hizmetler birimince sunulan iç kontrol sistemi değerlendirme raporu ile mali hizmetler birim yöneticisinin beyanına ve iç denetim raporları ile iç denetim biriminin kapsamlı görüşüne dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (17/03/2025)



Dr. Bahattin YANIK
Genel Müdür

EK-3: HARCAMA YETKİLİSİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (17/03/2025)

Ali Osman YAYLA	Pınar BÖLÜKBAŞI	Yusuf ŞEN	Osman Can MERCİMEKÇİ	Yasin Ali YAĞCI	Eser ÖNCEL	Günday KARA	Bayram YAMAN
							
Su Arıtma Dairesi Başkanı	İçme Suyu Dairesi Başkanı	Kapalı Alanlar Dairesi Başkanı V.	Buğra İşleri Dairesi Başkanı	Akova İşleri Dairesi Başkanı V.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı	Su Arıtma Dairesi Başkanı V.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı V.

Yusuf MUTLU	Emre BAYRI	Tuncay BULDAN	İsmail ÖZTÜRK	Hüseyin Hakkı AKBULUT	Bilal BÜYÜKBAŞ	Aysel YILMAZ
						
Maliye, İdari ve Teftiş Dairesi Başkanı	Teftiş Kurulu Başkanı	A. Hukuk Müaviri V.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanı	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanı V.	

19 MAYIS

ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK ve SPOR BAYRAMIMIZ

Kutlu Olsun



SASKİ
SPORDA DA
VAR



T.C.
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAMSUN SU ve KANALİZASYON İDARESİ

SASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2024
FAALİYET
RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAMSUN SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME ve BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0 362 311 20 00 / 2114 - 2355 | Faks: 0 362 432 44 45 - 432 25 07
e-mail: saski@saski.gov.tr

[/GenelSaski](#) [/saskikurumsal](#) [/saskisamsun](#)

www.saski.gov.tr
