

2023 FAALİYET RAPORU

BUSKİ



2023 Yılı Faaliyet Raporu
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Elektronik dosya örneğini,
www.buski.gov.tr
adresinde bulabilirsiniz.

100

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI

*Vatanını en çok seven,
görevini en iyi yapandır.*

K. Atatürk





K. Atatürk





Doğancı ve Nilüfer barajlarıyla birlikte Bursa'nın 2060 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak olan "Çınarcık İçme Suyu Projesi"nde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Bu kapsamda, içme suyunu Çınarcık Barajı'ndan şehre ulaştıracak hattın imalatını, milletvekillerimizin de katıldığı törenle başlattık. İmalat dahilinde 68 kilometre isale hattı, 3 adet su deposu ve günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşa edeceğiz. İmalat sürecini, 2025'in ikinci yarısında tamamlamayı hedefliyoruz.

Çınarcık İçme Suyu Barajı'ndan Bursa'ya su vermeye başladığımız gün, Bursa'nın içme suyu tarihinde yeni bir milâdın da başlangıcı olacak. Sudaki kayıp kaçakla mücadelede elde ettiğimiz üstün başarı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığınca Ocak 2023'te başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Türkiye 1.'liği ödülü ile ödüllendirildi.

Bizim için büyük bir onur vesilesi olan bu ödül, sudaki kayıp kaçakla mücadelede sergilediğimiz başarımızın da tescili oldu.

Altyapı çalışmaları ile ilgili beni en çok sevindiren konuların başında, 17 ilçemizin tamamında altyapı seferberliği başlatmış olmamız geliyor. Çalışmalarımız sayesinde, pek çok ilçemizin mahallelerinde yıllardır süregelen tankerle su taşıma çilesine son verdik. Bununla birlikte yeni kanalizasyon hatları ile paket atık su arıtma tesisleri ve içme suyu arıtma tesislerini ilçelerimize kazandırdık.

BUSKİ marifetiyle gerçekleştirdiğimiz bütün bu çalışmalar, bizim için iftihar vesilesidir. Sözlerimin sonunda, her birinizi, en içten duygularımla selâmlarım. Sağlıcakla kalın...

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı



Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye, iklim deęiřiklięinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenecek ölkeler arasında kabul ediliyor. Ölkede havzalarındaki su varlıęının iklim deęiřiklięine baęlı olarak gelecekte nasıl etkileneceęine iliřkin projeksiyonlar, su kaynaklarının gelecek yüzyıl ierisinde yüzde 30’a varan oranlarda azalabileceęini gösteriyor. Artan nüfus, kentleřme, sanayi ve tarım faaliyetleriyle birlikte su talebi de doęru orantılı olarak artış gösteriyor. Bütün bu veriler, “suyun verimli tüketimi” kavramını beraberinde getiriyor. Su kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak, yařanabilecek birçok maddi ve manevi kaybın önüne geçecektir.

BUSKİ’nin kuruluşunda yüzde 65 seviyesinde olan kayıp-kaak oranımızı, yaptığımız teknolojik yatırımlar ve ime suyu hatlarındaki iyileřtirmelerle yüzde 20’nin altına geriletme başarısı gösterdik. Bu oranın, Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğunu dikkatlerinize sunarım.

Tarım ve Orman Bakanlıęınca Ocak 2023’te bařlatılan “Su Verimlilięi Seferberlięi” kapsamında yerel yönetimler nezdinde yapılan deęerlendirmede, sudaki kayıp kaakla mücadelede Türkiye 1.’si seildik. Yaptığımız yatırımlarla kayıp-kaak oranlarının Türkiye ortalamasının altında olması nedeniyle řehrimiz ödüllendirildi. Bu ödöl, aynı zamanda Bursa’mızın öncü ve örnek konumunun da önemli bir kanıtı oldu.

Büyükřehir Belediyemizin vizyonu ile saęlıklı ve kesintisiz ime suyu temininde elde ettiğimiz örnek başarıyı, atık suların insan ve çevre saęlığına tehdit oluřturmaya cak biçimde arıtılması hususunda da gösterdik. Büyükşehir Belediyemizin öncülüęünde gerekleřtirdiğimiz atık su arıtma tesisi yatırımlarında zirveye yürüyoruz. Bursa’nın yüzde 95’ini kapsayacak řekilde atık su arıtımı saęladık.

Bursa’da suyun yönetimi ve daęıtımından sorumlu olan BUSKİ, bu konuda üzerine düşen görevi, dün olduęu gibi bugün de aynı kararlılıkla sürdürmektedir. Bu vesileyle, her birinize, saęlıklı ve huzur dolu günler dilerim.

Güngör GÜLENCİ
BUSKİ Genel Müdürü

2023

FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER



BUSKİ



01

GENEL BİLGİLER**A. MİSYON - VİZYON VE İLKELER**

18

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

20

B.1. Kanunlarla Verilen

20

B.2. Yönetmelik ve Yönergeler

22

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

24

C.1. Fiziksel Yapı

24

C.2. Teşkilat Yapısı

29

C.3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

32

C.4. İnsan Kaynakları

36

C.5. Sunulan Hizmetler

39

C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

84

02

AMAÇ VE HEDEFLER**A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER**

88

B. İDARENİN STRATEJİK PLANINDA YER ALAN

90

AMAÇ VE HEDEFLER

03

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**A. MALİ BİLGİLER**

94

A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları

94

A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

96

A.3. Mali Denetim Sonuçları

101

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

103

B.1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri

103

B.2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

160

B.3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları

180

B.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

181

04

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**A. ÜSTÜNLÜKLER**

184

B. ZAYIFLIKLAR

185

C. DEĞERLENDİRME

186

05

ÖNERİ VE TEDBİRLER**A. ÖNERİ VE TEDBİRLER**

190

06

EKLER

EK 1 - Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

194

EK 2 - Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

195

EK 3 - Harcama Birimlerinin İç Kontrol Güvence Beyanı





196

TABLOLAR

TABLO NO	SAYFA NO	AÇIKLAMA
1	20-21	Kanunlarla Verilen Yetki Görev ve Sorumluluklar
2	22	Yönetmelikler ile Verilen Yetki, Görev ve Sorumluluklar
3	23	Yönergeler ile Verilen Yetki, Görev ve Sorumluluklar
4	24	Merkez Hizmet Binaları (Acemler Kampüsü)
5	24	İlçe Hizmet Binaları
6	25	Tahsilat Şubeleri
7	25	İlçe Bazında Terfi Tesisleri
8	26	İlçe Bazında Kuyular
9	27	İlçe Bazında Kurum ve Kiralık Araç ve İş Makinesi Listesi
10	33	Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri
11	34	2023 Yılında Yapılan Güncelleme
12	35	Buski Harita Bilgi ve Belgeleri Arşivi (Habba)
13	36	Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı
14	36	Yaş Grubuna Göre Personel Sayısı
15	36	Cinsiyete Göre Personel Sayısı
16	37	Çalışma Süresine Göre Personel Sayısı
17	37	Öğrenim Durumuna Göre Personel Sayısı
18	39	Barajlar
19	40	İlçe Bazında İçmesuyu Arıtma Tesisleri
20	42	İlçe Bazında İçmesuyu Proje Metrajları
21	43	İlçe Bazında İçmesuyu İmalatı
22	44	2023 Yılı Yapımı Tamamlanan Depolar
23	45	İçmesuyu Laboratuvar Faaliyetleri
24	45	İlçe Bazında Katodik Koruma Yapılan Çelik Boru Hattı Uzunluğu
25	46	İlçe Bazında İçmesuyu Arıza İhbarları
26	46	İlçe Bazında İçmesuyu Evsel Bağlantı Çalışmaları
27	47	İlçe Bazında Gölet, Sulama Havuzu ve Tesisleri
28	48	2023 Yılında SCADA Kapsamında İşletmeye Alınan İstasyonlar
29	52	İlçe Bazında Atıksu, Yağmursuyu ve Dere Islahı Proje Metrajları
30	53	İlçe Bazında Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İmalatı
31	55	Atıksu Arıtma Çeşitleri ve Arıtma Değerleri
32	55	İlçe Bazında Bölgesel Büyük Atıksu Arıtma Tesisleri
33	56-57	İlçe Bazında Paket Atıksu Arıtma Tesisleri
34	58-59	İlçe Bazında Doğal Atıksu Arıtma Tesisleri
35	60	Atıksu Deşarj İzni Ruhsatı İşlemleri
36	61	İlçe Bazında Kanal Arıza İhbarları
37	61	İlçe Bazında Kanalizasyon Evsel Bağlantı Çalışmaları
38	62	İlçe Bazında Abone Sayıları
39	62	Türlerine Göre Abone Sayıları
40	63	İlçe Bazında Su Tahakkuk Miktarları
41	64	İlçe Bazında Su Gelirleri Tahakkuk Tutarı
42	65	İlçe Bazında Su Gelirleri Tahsilat Tutarı
43	69	İlçe Bazında Yapılan Asfalt Yama, Asfalt Kaplama ve Sathi Kaplama Çalışmaları
44	70	İlçe Bazında Kamulaştırılan Alan
45	71	İlçe Bazında Tahsis, Tescil, İrtifak Alanları ve Sayıları
46	72	2023 Yılı Elektrik Enerjisi Tüketimi
47	72	Güneş Enerjisi Sistemi
48	72	Hidroelektrik Santral Sistemi
49	72	Çamur Yakma Sistemi
50	73	CCTV Kamera Sistemlerinde İşletilen İstasyonlar

TABLOLAR		
TABLO NO	SAYFA NO	AÇIKLAMA
51	76	Satın Alma Bilgileri
52	77	Sıfır Atık Kapsamında Toplanan Atık Bilgileri
53	78	2023 Yılı Yalın Yönetim Kazanımları
54	81	Basın ve Halkla İlişkiler Bilgilendirme Çalışmaları
55	85	İç Kontrol Eylem Planı Gerçekleştirme Tablosu
56	94	2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tablosu
57	94	2023 Mali Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu
58	95	2023 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tablosu
59	95	Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
60	98-100	BUSKİ Genel Müdürlüğü 31.12.2023 tarihli Bilançosu
61	160-179	Performans Sonuçları Tablosu
62	180	Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu

GRAFİKLER		
GRAFİK NO	SAYFA NO	AÇIKLAMA
1	36	Kadro Durumuna Göre Oranları
2	36	Yaş Grubuna Göre Personel Oranları
3	36	Cinsiyete Göre Personel Oranları
4	37	Çalışma Süresine Göre Personel Oranları
5	37	Öğrenim Durumuna Göre Personel Oranları
6	39	Doğancı ve Nilüfer Barajları 2023 Yılı Aylık Doluluk Oranları
7	63	İlçe Bazında Su Tahakkuk Miktarı Oranları
8	64	İlçe Bazında Su Gelirleri Tahakkuk Tutarı Oranları
9	65	İlçe Bazında Su Gelirleri Tahsilat Tutarı Oranları

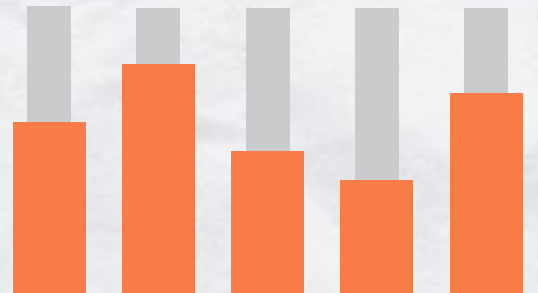

BUSKİ

GENEL BAKIŞ



Bursa Nüfusu

3.21 milyon kişi



Toplam Hizmet Alanı

10.819 km²



Abone Sayısı

1.517.562 adet




Su Depo Sayısı

944 adet




İçmesuyu Arıtma
Tesisleri Sayısı

39 adet



Atıksu Arıtma
Tesisleri Sayısı

129 adet



Dere Islahı

50 km



Dere Temizliği

496 km

**Derin Kuyular**

847 adet

**İçmesuyu
Hattı Uzunluğu**

11.966 km

**Yağmursuyu
Hattı Uzunluğu**

1.951 km

**Kanalizasyon
Hattı Uzunluğu**

5.820 km

**Sulama Tesisi**

324 adet

Sulama Havuzu

63 adet

Gölet

50 adet

**SCADA Sistemindeki
Tesis Sayısı**

971 adet

**Yenilenebilir
Enerji Tesis Sayısı**

8 adet



ULUCAMI

1.GENEL BİLGİLER

MİSYON
VİZYON
İLKELER

YETKİ
GÖREV VE
SORUMLULUKLAR

İDAREYE
İLİŞKİN
BİLGİLER





MİSYON

Bursa Halkı' nın:

- İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlanması,
- Kullanılmış su ile yağmur sularının uzaklaştırılması,
- Su havzalarının korunması,
- Tarımsal sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama suyu temin edilmesi, kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.



VİZYON

Su Şehri Bursa' nın:

- İçmesuyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,
- Çevre ve halkı ile bütünleşmiş,
- Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktır.



İLKELER

- Kalite Yönetim Sistemi'nin gereklerinin sürekli iyileştirilmesi,
- Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi,
- Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,
- Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda alt yapı (içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması,
- Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
- Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek tüm tehditlerden korunması,
- Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanmasıdır.

B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR**B.1. Kanunlarla Verilen**

BUSKİ Genel Müdürlüğü; 20.11.1981 tarihli ve 2560 Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenen değişik geçici 10. Madde ve Bakanlar Kurulunun 08.09.1989 tarih 89/14524 sayılı kararı ile; Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur.

Yetki, görev ve sorumlulukları belirleyen kanunlar;

Tablo 1 - Kanunlarla Verilen Yetki Görev ve Sorumluluklar

NO	SAYI	KANUNLAR
1	167	Yeraltı Suları Hakkında Kanun
2	237	Taşıt Kanunu
3	506	Sosyal Sigortalar Kanunu
4	657	Devlet Memurları Kanunu
5	831	Sular Hakkında Kanun
6	992	Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyo- loji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu
7	1053	Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
8	1380	Su Ürünleri Kanunu
9	1593	Umumi Hıfzısıhha Kanunu
10	2004	İcra ve İflas Kanunu
11	2429	Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
12	2464	Belediye Gelirleri Kanunu
13	2560	İSKİ Kanunu
14	2634	Turizmi Teşvik Kanunu
15	2863	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
16	2872	Çevre Kanunu
17	2918	Karayolları Trafik Kanunu
18	2942	Kamulaştırma Kanunu
19	2981	İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Ka- nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
20	3071	Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
21	3152	İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu İle İl Yatırım Ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
22	3194	İmar Kanunu
23	3213	Maden Kanunu
24	3516	Ölçüler ve Ayar Kanunu
25	3628	Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
26	4483	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
27	4562	Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
28	4650	Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
29	4688	Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
30	4734	Kamu İhale Kanunu
31	4735	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
32	4736	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
33	4857	İş Kanunu
34	4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
35	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
36	5070	Elektronik İmza Kanunu
37	5176	Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
38	5188	Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
39	5216	Büyükşehir Belediyesi Kanunu

NO	SAYI	KANUNLAR
40	5237	Türk Ceza Kanunu
41	5302	İl Özel İdaresi Kanunu
42	5393	Belediye Kanunu
43	5434	Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
44	5442	İl İdaresi Kanunu
45	5510	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
46	5779	İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
47	5999	Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
48	6098	Türk Borçlar Kanunu
49	6102	Türk Ticaret Kanunu
50	6107	İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
51	6136	Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
52	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
53	6200	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun
54	6245	Harcırah Kanunu
55	6325	Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
56	6306	Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
57	6331	İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
58	6360	On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
59	6502	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
60	6698	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
61	7155	Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun
62	7201	Tebliğat Kanunu
63	7315	Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
64	7420	Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
65	7421	Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
66	7440	Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun



B.2. Yönetmelik ve Yönergeler

BUSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri, yasalarla genel çerçevesi çizilmiş olmakla beraber, faaliyet alanı ile ilgili çıkarılmış yönetmelik ve yönergeler de işleyişini devam ettirmektedir.

Bu yönetmelik ve yönergeler;

Tablo 2 - Yönetmelikler ile Verilen Yetki, Görev ve Sorumluluklar

NO	YÖNETMELİKLER	
1	BUSKİ Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik	(21.09.2017 tarih ve 2539 sayılı G.K.K.)
2	BUSKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik	(17.10.1990 tarih ve 2-11 sayılı G.K.K.)
3	BUSKİ İhale Yönetmeliği	(27.09.2017 tarih ve 3036 sayılı G.K.K.)
4	BUSKİ Gelir Tarifeleri Yönetmeliği ve Yönergesi	(24.12.2004 tarih ve 32 sayılı G.K.K.)
5	BUSKİ Atık Su Deşarj Yönetmeliği	(22.11.2018 tarih ve 2695 sayılı G.K.K.)
6	BUSKİ İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik	(18.07.2019 tarih ve 1003 sayılı G.K.K.)
7	BUSKİ Harita Bilgi ve Belgeleri Yönetmeliği	(24.12.2004 tarih ve 32 sayılı G.K.K.)
8	BUSKİ Disiplin Amirleri Yönetmeliği	(16.02.2017 tarih ve 254 sayılı G.K.K.)
9	BUSKİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği	(24.02.1992 tarih ve 15-7 sayılı G.K.K.)
10	BUSKİ Aday Memur Yetiştirme Yönetmeliği	(24.02.1992 tarih ve 15-8 sayılı G.K.K.)
11	BUSKİ Kütüphane Yönetmeliği	(24.02.1992 tarih ve 15-10 sayılı G.K.K.)
12	BUSKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği	(11.02.2016 tarih ve 296 sayılı G.K.K.)
13	BUSKİ 1.Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği	(28.05.2018 tarih ve 61 sayılı G.K.K.)
14	İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği	(28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı R.G.)
15	Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği	(29.07.2022 tarih ve 26939 Sayılı R.G.)
16	Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	(14.03.2005 tarih ve 25687 Sayılı R.G.)
17	Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik	(03.04.2007 tarih ve 31907 Sayılı R.G.)
18	Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği	(31.12.2004 tarih ve 25687 Sayılı R.G.)
19	Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği	(17.05.2005 tarih ve 25818 Sayılı R.G.)
20	Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik	(22.03.2007 tarih ve 26470 Sayılı R.G.)
21	Madencilik Faaliyetleri İzni Yönetmeliği	(21.06.2005 tarih ve 25852 Sayılı R.G.)
22	Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği	(24.07.1994 tarih ve 22000 Sayılı R.G.)
23	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	(23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı R.G.)
24	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	(27.05.2016 tarih ve 29724 sayılı R.G.)
25	Kamu Konutları Yönetmeliği	(23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı R.G.)
26	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliği	(17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı R.G.)
27	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar	(31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı R.G.)
28	Kamu İdaresinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	(26.02.2018 tarih ve 30344 Sayılı R.G.)
29	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik	(02.10.2006 tarih ve 26307 Sayılı R.G.)
30	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik	(10.10.2006 tarih ve 26315 Sayılı R.G.)
31	Taşınır Mal Yönetmeliği	(18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı R.G.)
32	Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	(19.10.2006 tarih ve 26324 Sayılı R.G.)
33	Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları,Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik	(13.08.1983 tarih ve 18134 Sayılı R.G.)
34	Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği	(27.05.2018 tarih ve 30433 Sayılı R.G.)
35	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlarının Kaydına İlişkin Yönetmelik	(02.10.2006 tarih ve 26307 Sayılı R.G.)
36	Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	(10.06.2020 tarih ve 31151 Sayılı R.G.)
37	Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik	(07.07.1993 tarih ve 21630 Sayılı R.G.)

Tablo 3 - Yönergeler ile Verilen Yetki, Görev ve Sorumluluklar

NO	YÖNERGELER
1	BUSKİ Arşiv Yönergesi
2	BUSKİ İç Denetim Yönergesi
3	BUSKİ Genel Evrak Yönergesi
4	BUSKİ Tarifeler Yönergesi
5	BUSKİ Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi
6	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
7	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
8	Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönergesi
9	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönergesi
10	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
11	Coğrafi Bilgi Sistemleri Yönergesi
12	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
13	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
14	Gölet ve Sulama Tesisleri Yönergesi
15	Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
16	İcra Birimi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi
17	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
18	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Yönergesi
19	İç Kontrol Sistemi Yönergesi
20	İmza Yetkileri Yönergesi
21	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
22	İşletme Tabipliği Görev ve Çalışma Yönergesi
23	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
24	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
25	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
26	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönergesi
27	Mali İşlemler Süreç Akış Yönergesi
28	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
29	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
30	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
31	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi
32	Yalın Yönetim Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönergesi
33	Taşıt Kullanım Yönergesi



C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER**C.1. Fiziksel Yapı
a. Hizmet Binaları**

Ana hizmet binası Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarında yer alan Genel Müdürlüğümüz 23 adet Merkez Hizmet Binaları ve 21 adet İlçe Hizmet Binaları ile birlikte hizmet vermektedir. Ayrıca abonelerimizin tahsilat, abonelik vb. işlemlerinin yerinde hizmet anlayışı ile yapabilmesi adına 24 adet Tahsilat Şubemiz bulunmaktadır.

**Tablo 4 - Merkez Hizmet Binaları
(Acemler Kampüsü)**

1	Ana Hizmet Binası
2	Başkanlık Binası
3	İşletmeler Hizmet Binası
4	Sayaç Servisi Hizmet Binası
5	Elektrik Makine İkmal D.B. ve Scada Hizmet Binası
6	Kapalı Saha Ambarı
7	Açık Saha Ambarı
8	İş Sağlığı ve Güvenliği Binası
9	Kapalı Araç Parkı
10	Arşiv Binası
11	Konteyner Ek Hizmet Binaları
12	Güvenlik Binası
13	Atölye Binası
14	Basın, Açma- Kapama- G. Evrak
15	Kurum Arşiv Binası
16	Bilgi İşlem Servisi - Scada ve Haberleşme Sistemleri Atölye Binası
17	Bilgi İşlem Sistem Binası
18	A Blok Hizmet Binası
19	B Blok Hizmet Binası
20	Konferans Salonu Binası
21	Ayniyat Saymanlığı Binası
22	Şoför Odası Binası
23	Kaynak Atölyesi ve Sayaç Deposu Binası

Tablo 5 - İlçe Hizmet Binaları

1	Gemlik Şube Müdürlüğü Binası
2	Gemlik Taşocakları İşletmesi Binası
3	Mudanya Şube Müdürlüğü Binası
4	Kestel Şube Müdürlüğü Binası
5	Gürsu Şube Müdürlüğü Binası
6	Görükle Şube Müdürlüğü Binası
7	İnegöl Şube Müdürlüğü Binası
8	Abone İşleri Hizmet Binası
9	Osmangazi Şube Hizmet Binası
10	Setbaşı Tahsilat Şube Binası
11	İznik Şube Müdürlüğü Binası
12	M.Kemalpaşa Şube Müdürlüğü Binası
13	Karacabey Şube Müdürlüğü Binası
14	Yenişehir Şube Müdürlüğü Binası
15	Orhangazi Şube Müdürlüğü Binası
16	Orhaneli Şube Müdürlüğü Binası
17	Nilüfer Şube Müdürlüğü Binası
18	Yıldırım Şube Hizmet Binası
19	Büyükorhan Şube Hizmet Binası
20	Keles Şube Müdürlüğü Binası
21	Harmancık Şube Müdürlüğü Binası




b. Tahsilat Şubeleri

Tablo 6 - Tahsilat Şubeleri

1	Merkez Tahsilat Şubesi	9	Kestel Tahsilat Şubesi	17	Keles Tahsilat Şubesi
2	Yıldırım Tahsilat Şubesi	10	Gürsu Tahsilat Şubesi	18	Harmancık Tahsilat Şubesi
3	Osmangazi Tahsilat Şubesi	11	İnegöl Tahsilat Şubesi	19	Orhaneli Tahsilat Şubesi
4	Demirtaş Tahsilat Şubesi	12	Gemlik Tahsilat Şubesi	20	M.Kemalpaşa Tahsilat Şubesi
5	Setbaşı Tahsilat Şubesi	13	Mudanya Tahsilat Şubesi	21	Karacabey Tahsilat Şubesi
6	Nilüfer Tahsilat Şubesi	14	Mudanya Sahil Tahsilat Şubesi	22	Orhangazi Tahsilat Şubesi
7	Emek Tahsilat Şubesi	15	Mudanya-Güzelyalı Tahsilat Şubesi	23	Yenişehir Tahsilat Şubesi
8	Görükle Tahsilat Şubesi	16	Büyükorhan Tahsilat Şubesi	24	İznik Tahsilat Şubesi

c. Sosyal Tesisler

Kurumumuza ait 4 adet sosyal tesisimiz fiziki kaynaklarımız arasında yer almaktadır.



d. Terfi Tesisleri

Genel Müdürlüğümüz suyun kaynağından musluklara ulaşmasına kadar her aşamada içmesuyu terfi istasyonu kurmuştur. Toplamda 100 adet Tesis istasyonu ve 265 adet Pompa Ünite tesisleri bulunan kurumumuz çeşitli kapasitelerdeki pompa istasyonları ile su akış kotunun yetersiz olduğu alanlarda kurularak suyu şehrin her noktasına ulaştırmasında çalışmalarına devam etmektedir.

Tablo 7 - İlçe Bazında Terfi Tesisleri

İlçe	Tesis Sayısı (adet)	Pompa Ünite Sayısı (adet)	İlçe	Tesis Sayısı (adet)	Pompa Ünite Sayısı (adet)
Osmangazi	22	50	Orhangazi	6	16
Yıldırım	9	28	Kestel	6	15
Nilüfer	13	38	Yenişehir	7	15
İnegöl	13	33	İznik	1	2
Gemlik	6	17	Orhaneli	3	7
M.Kemalpaşa	1	4	Keles	0	0
Mudanya	7	26	Büyükorhan	1	2
Gürsu	2	6	Harmancık	1	1
Karacabey	2	5	Toplam	100	265

e. Kuyular

Genel Müdürlüğümüzün olası bir susuzluk sorunu ile karşılaşmamak için 2023 yıl sonu itibariyle 847 adet kuyuları bulunmaktadır.

Tablo 8 - İlçe Bazında Kuyular

İlçe	Adet	İlçe	Adet
Osmangazi	119	Orhangazi	31
Yıldırım	56	Kestel	5
Nilüfer	51	Yenişehir	62
İnegöl	87	İznik	55
Gemlik	45	Orhaneli	46
Mustafakemalpaşa	76	Keles	37
Mudanya	42	Büyükorhan	53
Gürsu	2	Harmancık	26
Karacabey	54	Toplam	847



f. Araç ve İş Makinesi Parkı

Genel Müdürlüğümüze ait araçlar ile kiralık araç sayı bilgileri ilçe ve araç cinsi bazında aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir

Tablo 9 - İlçe Bazında Kurum ve Kiralık Araç, İş Makinesi Listesi

İlçeler	Kurum Araç ve İş Makinesi Sayısı (adet)	Kiralık Araç ve İş Makinesi Sayısı (adet)	Toplam Araç ve İş Makinesi Sayısı (adet)
Osmangazi	194	216	410
Yıldırım			
Nilüfer			
İnegöl	29	19	48
Gemlik	13	12	25
Mustafakemalpaşa	20	17	37
Mudanya	10	11	21
Gürsu	5	6	11
Karacabey	20	12	32
Orhangazi	10	8	18
Kestel	7	7	14
Yenişehir	14	10	24
İznik	15	10	25
Orhaneli	10	10	20
Keles	5	6	11
Büyükorhan	6	8	14
Harmancık	6	5	11
Toplam	364	357	721



Kamyonet
(4x2) - (4x4)

38 Adet **179 Adet**
217 Adet

● Kurum Aracı
● Kiralık Araç



Damperli
Kamyon

72 Adet **9 Adet**
81 Adet

● Kurum Aracı
● Kiralık Araç



İş Makinaları

88 Adet **12 Adet**
100 Adet

● Kurum Aracı
● Kiralık Araç



Panelvan
(Kapalı Kasa)

12 Adet
12 Adet

● Kurum Aracı
● Kiralık Araç



Muhtelif
Makina

150 Adet **8 Adet**
158 Adet

● Kurum Aracı
● Kiralık Araç



Toplu Taşıma
Araçları

3 Adet **1 Adet**
4 Adet

● Kurum Aracı
● Kiralık Araç




Binek Grubu

1 Adet **148 Adet**
149 Adet

● Kurum Aracı
● Kiralık Araç



BİR DAMLA SU BİR DAMLA UMUTTUR



C.2. Teşkilat Yapısı

a. Karar Alma Organları

GENEL KURUL

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Genel Kuruludur.

YÖNETİM KURULU

Başkan

Alınur AKTAŞ

Üyeler

Güngör GÜLENÇ

Mehmet KOZ

İsmail YILMAZ

Devrim İZGİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Müdür, bir Genel Müdür Yard. ve dışarıdan atanan üç üyeden oluşmaktadır.

DENETÇİLER

Ali ZEYBEK

Murat AVINÇ

Genel Kurulca seçilen iki denetçiden oluşmaktadır. BUSKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.

Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.

Denetçiler BUSKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasadışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur.

Ayrıca Genel Kurul'un Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur.

GENEL MÜDÜR

Güngör GÜLENÇ

BUSKİ Genel Müdürü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanır. Genel Müdür Yardımcıları'nın hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. An-


cak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.


Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı kademe birimlerinden teşekkül eder ve BUSKİ'nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.

Daire Başkanları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve Hukuki Müşaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulu'nun kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile; müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile; BUSKİ'nin diğer personelleri Genel Müdür tarafından atanır.

Genel Müdür'ün birinci derecede tezkiye amiri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, ikinci derece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'dır.

Organizasyon Yapısı

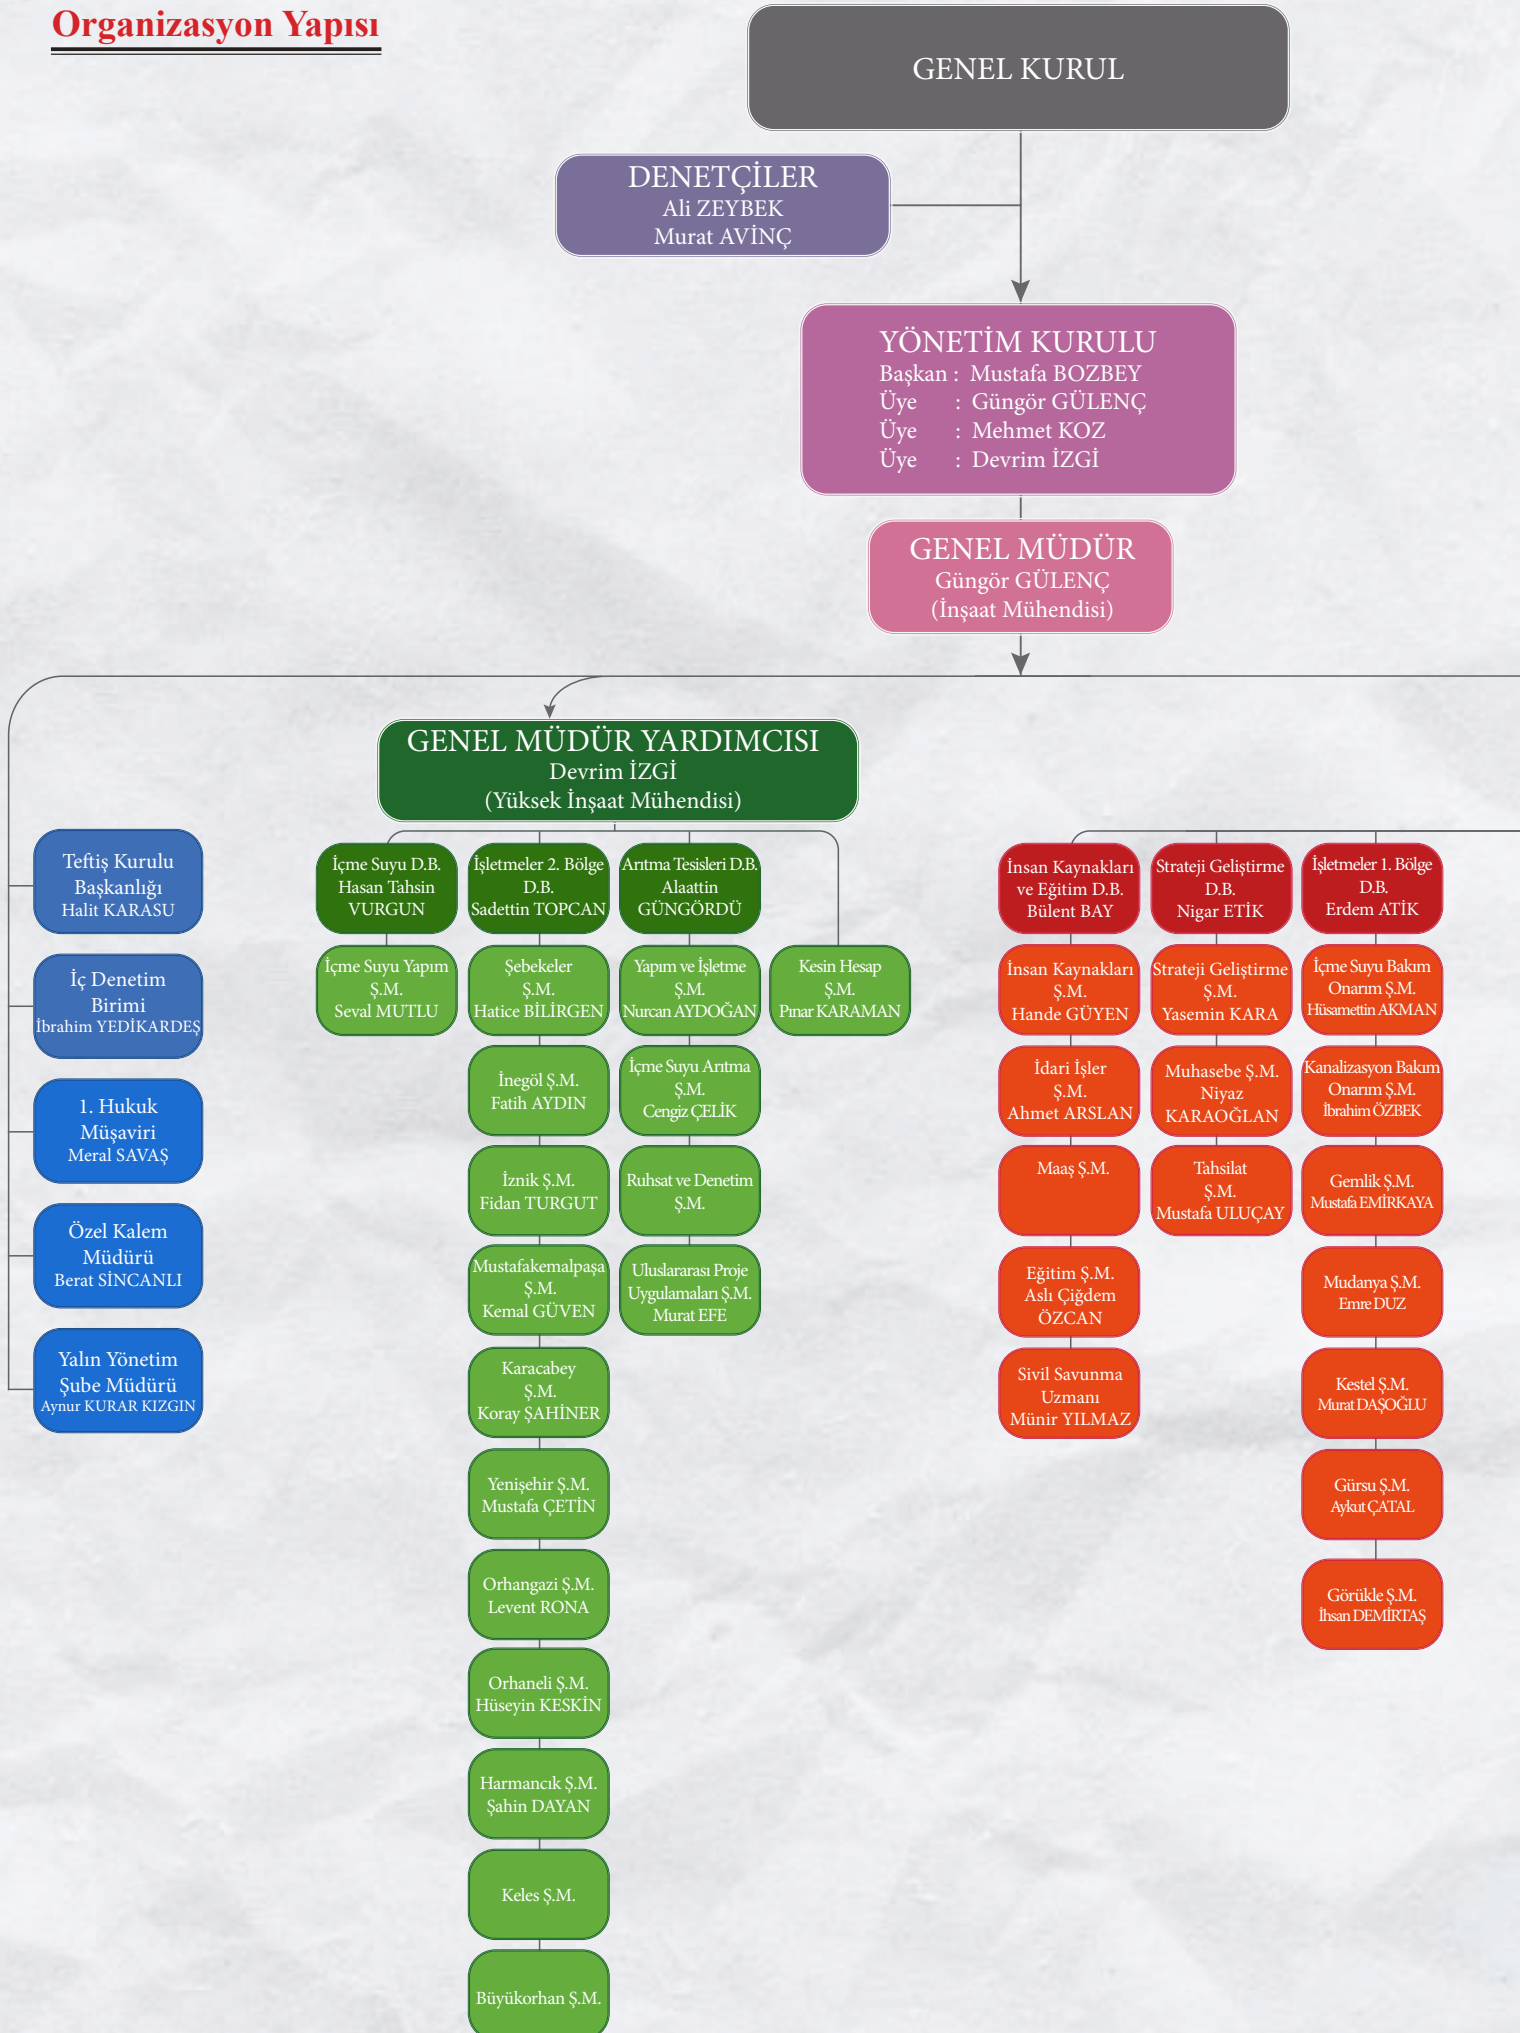


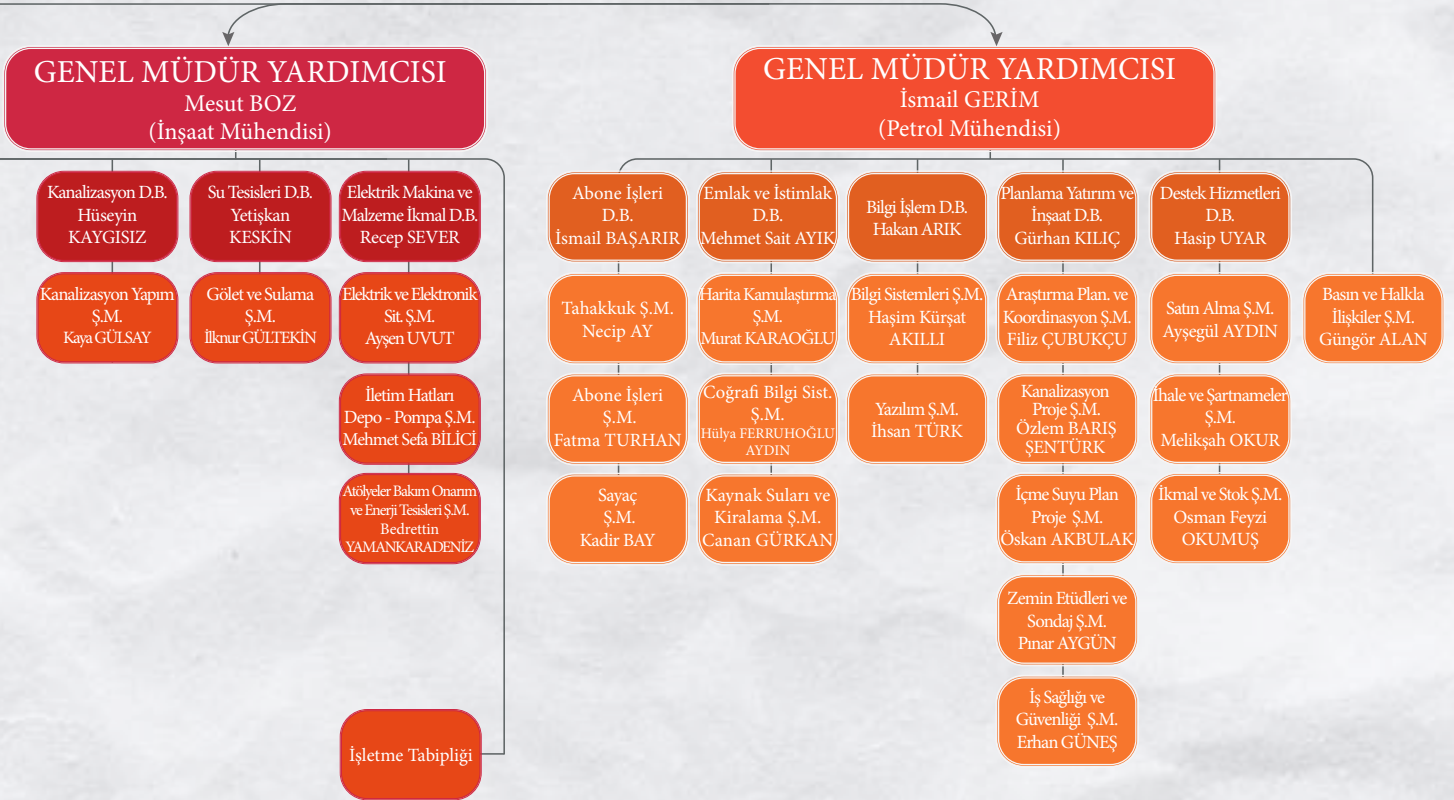

C.3. Teknoloji ve Biliřim Altyapısı

a. Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri

Kurumumuzda Biliřim Sistemleri kurumsal amaç ve hedeflere varmak için bilgi ve iletiřim teknolojilerinin kullanımını ve kurumun uçtan uca dijital dönüşümünü sağlamaktadır. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüzde ařağıdaki tabloda yer alan yazılım, donanım ve bilgi sistemleri ilgili faaliyetlerimizde kullanılmaktadır.



Tablo 10 - Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri

Bilgi İşlem Modülü
Arıza-Takip Talep Modülü
Arşiv Modülü
İnsan Kaynakları Modülü
Bütçe ve Muhasebe Modülü
Taşınır Modülü
Proje Yönetim Modülü
Araç Puantaj Takip Modülü
Arıtma Modülü
185 İş Emri Yönetim Modülü
Ulakbel Whatsapp, Chatbot ve IVR
Tesis Takip Modülü
Stratejik Plan Performans Modülü
VGS Veri Giriş Sistemi Modülü
Taşınmaz Takip Modülü
Sivil Savunma Malzeme Stok Takip Modülü
Yazılım Lisans Yönetimi
İş Takip Modülü
Online Endeks Okuma Uygulaması
Online Açma-Kapama Uygulaması
Online Sayaç Arıza Yönetimi Uygulaması
BUSKİ Biz Kurumsal Mobil Uygulaması Projesi
BUSKİ Mobil Uygulaması Projesi
PDKS Yazılımı İşletimi ve Entegrasyonu
Online Eğitim Portalı Projesi
EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönetiminin Sağlanması (İçişleri Bakanlığı yetkisinde)
CAD Yazılımları Güncellenmesi (NetCAD, AutoCAD, Microstation)
FKM (Felaket Kurtarma Merkezi)
Otomatik Ödeme Vezneleri Bakım ve Destek Hizmeti
Bilgi Güvenliği Tümlşik Güvenlik Yönetimi Sistemi İşletimi
Bilgi Sistemleri İş Sürekliliği Sağlama Hizmetleri
Bilgi Sistemleri Veri Tabanı Yönetim Sistemi Hizmeti
Kurumsal Network (Ağ) Altyapısı Yönetimi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkiki
Bilgi Sistemleri Donanım Takibi Sistemi (RFID Etiketleme ve kontrolü)
Ödeme Kuruluşları Entegrasyonu
6698 Sayılı KVKK'nun Kurumda Uygulanması ve Takibinin Yapılması Hizmetleri
Banka Ödeme Sistemi Entegrasyonu
EVEP Enerji Verimliliği Platformu Entegrasyonu
Harcama İştirak Payları Modülü
WİFİ Hizmetleri Yönetimi (Halka açık)
Varlık Yönetimi ve Entegre Yönetimi Sistemleri
a-VYS Abone Bilgi ve Yönetim Sistemi
b-Vys 185 Arıza Bilgi Yönetim Sistemi
Araç Talep ve Görevlendirme
İç Kontrol Veri Giriş Modülü
Mobil Cihaz Yönetimi (SOTİ MDM)
Abone Yönetim Sistemi, BUSKİ Bilgi Sistemi (BBS) ve Online Şube EK Geliştirme Taleplerinin Karşlanması Hizmetleri
Su Ayak İzi Projesi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO) Bilgi Güvenliği Denetim Sistemi Tetkik Çalışmaları
Ağ Altyapı Tümlşik Güvenlik Sistemleri Güncellemesi Projesi
Buski Bilgi ve Scada Sistemleri Güncellemesi Projesi
Uzaktan İnteraktif Fatura Tahsilatı ve Ön Ödemeli Sayaçlar için Kontör Yükleme Sistemi Projesi

b. Coğrafi Bilgi Sistemi

b.1. Abone Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Abone Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kapsamında 1.517.562 adet abonenin 1.418.614 adetinin bulunduğu bina mekansal olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda 2023 yılında 47.580 adet abonenin veri tabanında bina ilişkisi kurulmuştur.

ACBS kapsamında toplamda 434.345 adet binanın konumu netleşmiş olup 13.947 adet bina üzerinde 2023 yılında güncelleme işlemi yapılmıştır.

Tablo 11 - 2023 Yılında Yapılan Güncelleme

	7 Merkez İlçe	10 İlçe (6360)	Toplam (Ad.)
Abone Sayısı	32.082	15.498	47.580
Bina Sayısı	5.568	8.379	13.947

b.2. CBS Projelerinin Geliştirilmesi ve Teknik Destek

a. Web Adresi Üzerinden Cbs Verilerinin Görüntüleme ve Sorgulanması İşi


BUSKIGIS CBS veri tabanında yer alan bütün coğrafi veriler diğer kurumlardan alınan verilerin bilgisayar ve tablet ile <https://cbs.buski.gov.tr> web adresi üzerinden görüntülenmesi ve sorgulanabilmesi için Postgresql veritabanı üzerinde çalışan WEB CBS yazılımı satın alınmış ve kurulumları tamamlanmıştır. Bu kapsamda kuruma ait ve dış kurumlardan alınan konumsal veriler programa aktararak kullanıma açılmıştır. Genel Müdürlüğümüzde programa ait tanıtım ve eğitim toplantısı gerçekleştirilmiş olup personelin kullanımı sağlanmıştır. Halen kurum bünyesinde 173 personelin kullanıcıları tanımlanmış olup, tablet ile BUSKİ network ağına bağlanılarak araziden konumsal verilere ulaşılması sağlanmıştır.

b. İçmesuyu İmalatları ve Yardımcı Tesislerinin Veri Tabanına Aktarılması İle İlgili Programın Yenilenmesi

Kurumumuz bünyesinde imalatları yapılan içmesuyu hatları ve yardımcı tesislerinin BUSKIGIS CBS veri tabanına aktarımı için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı işbirliği ile yeni program yazılmıştır. Program BUSKİ BBS modülleri kapsamında çalışacak olup, verilerin CAD ortamında oluşmasını sağlayarak “DGN Oluşturma” bölümü tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Yazılıma ait test çalışmaları tamamlanmış olup, yatırımcı birim, yüklenici vs çoklu platform üzerinden veri girişi ile devreye alınması program dahilinde yapılacaktır.


c. Qgis Programı Üzerinde Abone Bina Bulma Yazılımı Yapılması

Kurumumuza ait çeşitli birimlerde hale hazırda geomeia programı üzerinde çalışan “Abone Bina Bulma” programının QGIS programında çalışması için yeni modül yazılmış olup, lisansız programların kullanılması arttırılmıştır.

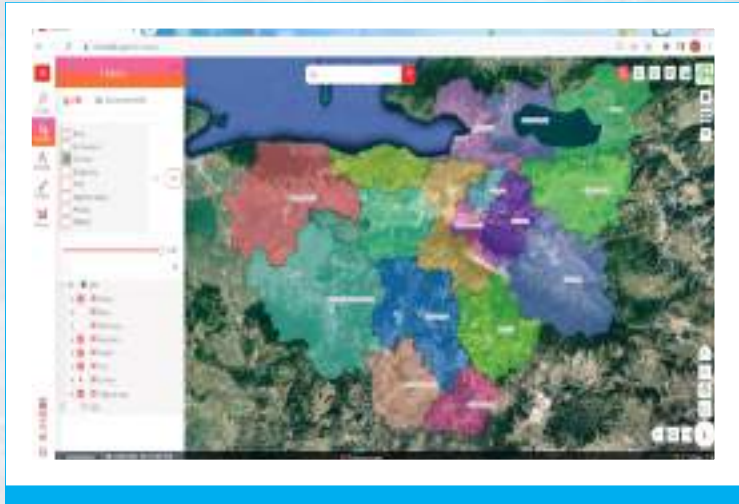

c. Büro, Makine ve Cihazlar

Kurumumuzun 2023 yılı itibariyle kullandığı büro, makine ve teçhizatlar aşağıda özetlenmiştir.



d. BUSKİ Harita Bilgi ve Belgeleri Arşivi (HABBA)

2023 yılında aşağıda tabloda sunulan toplam 787 adet satış işlem yapılmıştır.

Tablo 12 - Buski Harita Bilgi ve Belgeleri Arşivi (Habba)


Ürün Adı	Miktar
1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Halihazır Harita	636
BUSAGA Hizmeti	148
C1, C2, C3 Noktası	3




C.4. İnsan Kaynakları

Tablo 13 -Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı


Personel Türü	Kişi
Memur	584
İşçi	86
İdare Şirketi (Binted)	1.880
Toplam	2.550

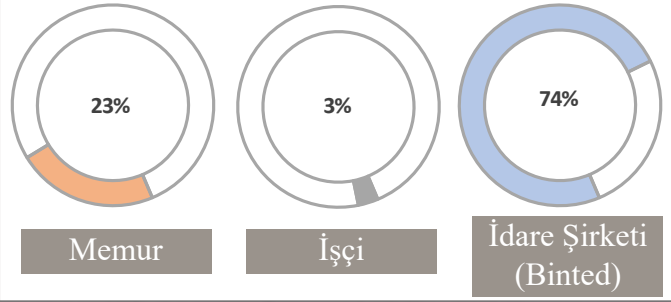Grafik 1 - Kadro Durumuna Göre Oranları**Tablo 14 - Yaş Grubuna Göre Personel Sayısı**

Personel Türü	18-40	41-60+	Toplam
Memur	208	376	584
İşçi	11	75	86
İdare Şirketi (Binted)	1.184	696	1.880
Toplam	1.403	1.147	2.550

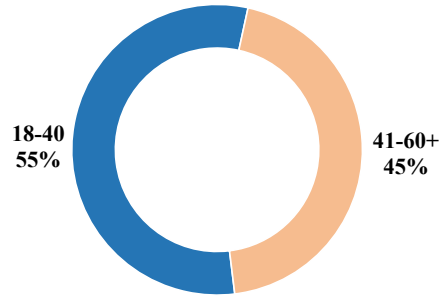Grafik 2 - Yaş Grubuna Göre Personel Oranları**Tablo 15 - Cinsiyete Göre Personel Sayısı**


Personel Türü	Kadın	Erkek	Toplam
Memur	148	436	584
İşçi	13	73	86
İdare Şirketi (Binted)	240	1.640	1.880
Toplam	401	2.149	2.550

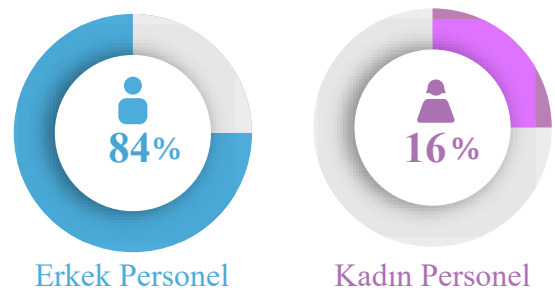Grafik 3 - Cinsiyete Göre Personel Oranları

Tablo 16 - Çalışma Süresine Göre Personel Sayısı

Personel Türü	0-10	11-20	21-30	30+	Toplam
Memur	241	77	222	44	584
İşçi	0	48	37	1	86
İdare Şirketi (Binted)	1.501	339	39	1	1.880
Toplam	1.742	464	298	46	2.550


Grafik 4 - Çalışma Süresine Göre Personel Oranları

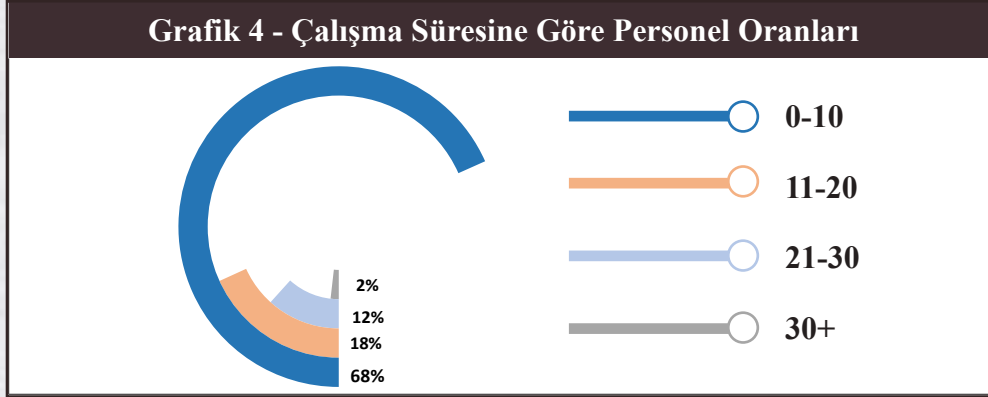

Tablo 17 - Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayısı

Personel Türü	Lise ve altı	Ön Lisans	Lisans	Y.Lisans ve Dr.	Toplam
Memur	60	50	416	58	584
İşçi	64	5	17	0	86
İdare Şirketi (Binted)	1.322	321	225	12	1.880
Toplam	1.446	376	658	70	2.550

Grafik 5 - Öğrenim Durumlarına Göre Personel Oranları

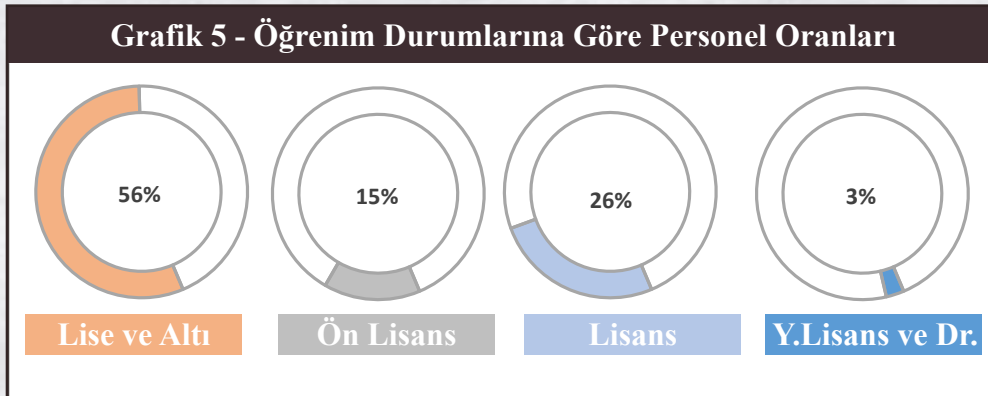



Doğancı Barajı



Nilüfer Barajı

C.5. Sunulan Hizmetler


a. İçmesuyu Hizmetleri

a.1. İçmesuyu Kaynakları

Tablo 18 - Barajlar

Su Kaynakları	Doğancı (Selahattin Saygı) Barajı	Nilüfer Barajı
Yeri	Orhaneli Karayolu	Keles Karayolu
Hizmet Giriş Yılı	1985	2007
Kuruluş Amacı	İçmesuyu Temini ve Akış Regülasyonu	İçmesuyu Temini ve Akış Regülasyonu
Kapasitesi (Kullanılabilir Hacim)	32.611.001 m ³	33.895.000 m ³

Grafik 6 - Doğancı ve Nilüfer Barajları 2023 Yılı Aylık Doluluk Oranları (%)

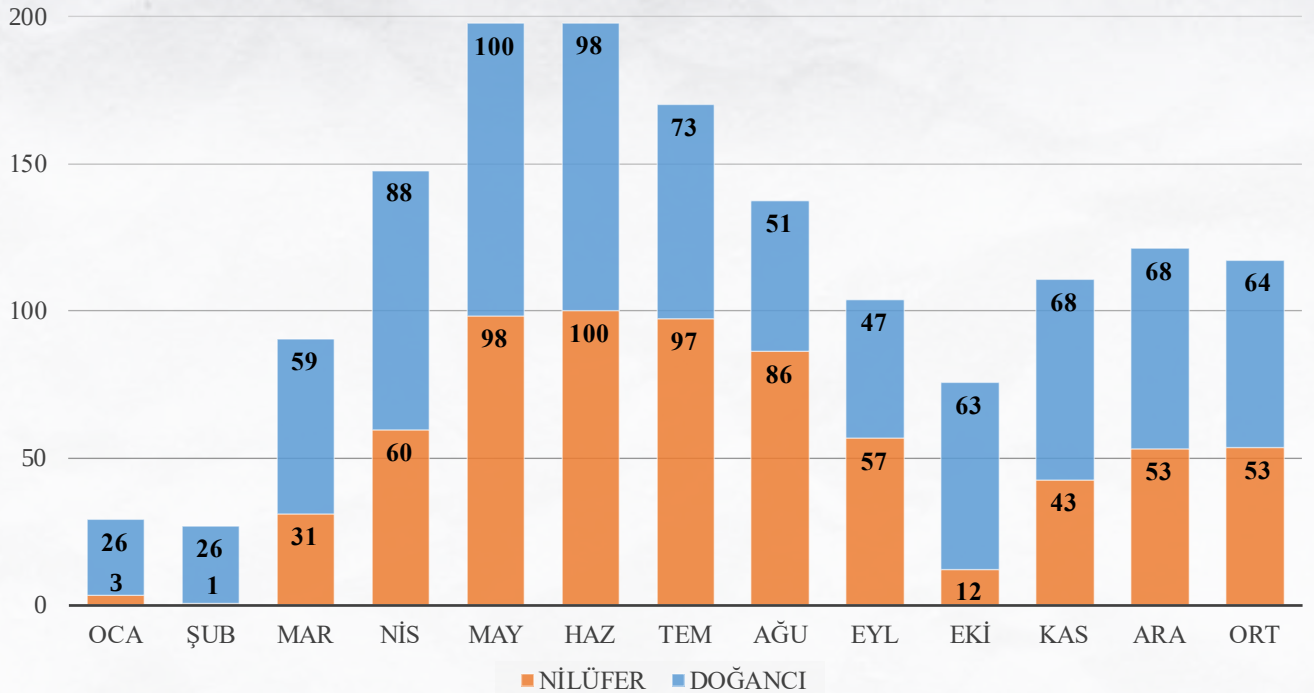

Tablo 19 - İlçe Bazında İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Sıra No	İlçesi	Tesis Adı	Yıllık Arıtılan Su (m³/yıl)
1	Osmangazi	Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesis	108.563.347
2	Gemlik	Haydariye (Nacaklı) İçmesuyu Arıtma Tesis	3.083.038
3	Mustafakemalpaşa	Akarca İçmesuyu Arıtma Tesis	3.565.838
4	Mustafakemalpaşa	Çan Deresi İçmesuyu Arıtma Tesis	4.596.393
5	Osmangazi	Kuştepe İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	27.820
6	Osmangazi	Abdalmurad İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	30.045
7	Gemlik	Narlı Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	67.008
8	Keles	Keles Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	420.746
9	Keles	Belenören İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	45.300
10	Keles	Kıranışıklar İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	6.873
11	İnegöl	Kurşunlu Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	944.696
12	İnegöl	Mezitler1-2 İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	139.855
13	İnegöl	Hamzabey İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	45.786
14	İnegöl	Alanyurt İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	1.502.893
15	İnegöl	Eymir Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	20.285
16	Karacabey	Gölecik İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	1.800.489
17	Karacabey	Merkez İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	4.452.472
18	Karacabey	Dağkadı – Şahmelek İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	335.555
19	Karacabey	Ovahamidiye İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	10.000
20	Karacabey	Gölkıyı İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	32.915
21	Karacabey	Harmanlı Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	39.045
22	Mustafakemalpaşa	Karadere İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	2.061.395
23	Mustafakemalpaşa	Soğukpınar İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	21.335
24	Mustafakemalpaşa	Kömürcükadı-Şapçı İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	251.805
25	Mustafakemalpaşa	Tatkavaklı Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	383.091
26	Mustafakemalpaşa	Karacalar Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	34.020
27	Mustafakemalpaşa	Yenice Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	27.558
28	İznik	Mustafalı Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	33.355
29	İznik	Müşküle Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	31.260
30	Nilüfer	Ürünlü Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	7.871.552
31	Nilüfer	Çınarcık Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	889.560
32	Kestel	Kestel Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	946.080
33	Kestel	Çataltepe Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	35.515
34	Büyükorhan	Merkez İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	169.053
35	Orhaneli	Karınca İçmesuyu Paket Arıtma Tesis	30.200
36	Orhaneli	Sadağı Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	33.630
37	Karacabey	Güngörmez Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	78.824
38	Yıldırım	Vakıf Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	5.759.768
39	Harmancık	Kışmanlar Paket İçmesuyu Arıtma Tesis	27.670
TOPLAM			148.416.070



a.2. İçmesuyu Projeleri

Tablo 20 - İlçe Bazında İçmesuyu Proje Metrajları (km)

İlçeler	İçmesuyu	İlçeler	İçmesuyu
Osmangazi		Orhangazi	
Yıldırım		Kestel	5,10
Nilüfer	32,80	Yenişehir	22,70
İnegöl	22,50	İznik	4,40
Gemlik		Orhaneli	2,30
Mustafakemalpaşa	13,70	Keles	
Mudanya	16,50	Büyükorhan	
Gürsu	1,30	Harmancık	
Karacabey	16,90	TOPLAM	138,20



a.3. İçmesuyu İmalatları

Tablo 21 - İlçe Bazında İçmesuyu İmalatı (km)

İlçeler	Şebeke	İsale Hattı	Pınar Kaynağı	Toplam
Osmangazi	9,77			9,77
Yıldırım	8,65	1,28		9,93
Nilüfer	16,18	0,13		16,32
İnegöl	180,69	22,29	26,14	229,12
Gemlik	1,51	4,46		5,97
M.Kemalpaşa	162,40	30,78	5,90	199,08
Mudanya	7,21	18,85		26,05
Gürsu	10,52			10,52
Karacabey	88,60	20,00		108,60
Orhangazi	13,00			13,00
Kestel	4,18	4,06		8,24
Yenişehir	32,70	0,53	4,14	37,37
İznik	5,56	5,30		10,86
Orhaneli	19,00			19,00
Keles	29,00		11,82	40,82
Büyükorhan	13,00			13,00
Harmancık	13,00	5,26	2,21	20,47
TOPLAM	614,97	112,94	50,21	778,12



a.4. Depolar

Genel Müdürlüğümüz 2023 yılında 28 adet depo yapılarak toplam su depo sayısını 944' ya çıkarmıştır

Tablo 22 - 2023 Yılı Yapımı Tamamlanan Depolar

Sıra No	Tesis Adı	Kapasite (m ³)	Sıra No	Tesis Adı	Kapasite (m ³)
1	Aydoğdu İçme Suyu Deposu	50	15	Karaköy İçme Suyu Deposu	75
2	Beypınar İçme Suyu Deposu	50	16	Çeki İçme Suyu Deposu	25
3	Eğerce İçme Suyu Deposu	50	17	Örencik İçme Suyu Deposu	50
4	Akdere İçme Suyu Deposu	50	18	Bayındır İçme Suyu Deposu	50
5	Hayriye İçme Suyu Deposu	75	19	Sarnıç İçme Suyu Deposu	75
6	Eğerce İçme Suyu Deposu	25	20	Düğüncüler İçme Suyu Deposu	75
7	Yeniyörük İçme Suyu Deposu	75	21	Gülbahçe İçme Suyu Deposu	300
8	Sarıyer İçme Suyu Deposu	50	22	Akalan İçme Suyu Deposu	300
9	Kirazlı İçme Suyu Deposu	50	23	Altıntaş İçme Suyu Deposu	500
10	Gelemiş İçme Suyu Deposu	50	24	Dündar İçme Suyu Deposu	300
11	Kıranişıklar İçme Suyu Deposu	25	25	Davutlar İçme Suyu Deposu	75
12	Durak İçme Suyu Deposu	25	26	Harmandemirci İçme Suyu Deposu	50
13	Karaardıç İçme Suyu Deposu	25	27	Cihanköy İçme Suyu Deposu	25
14	Dorak İçme Suyu Deposu	50	28	Güven İçme Suyu Deposu	50



a.5. İçmesuyu Laboratuvar Faaliyetleri

Kurumumuz içmesuyu laboratuvarlarında 211 parametre ile toplam 545.766 adet analiz yapmıştır.



Tablo 23 - İçmesuyu Laboratuvar Faaliyetleri

İçmesuyu Laboratuvar Faaliyetleri	Adet
Ağır Metal Kontrol	226
Bakteriyolojik Tekrar	444
Denetim İzleme (İşletme)	9.114
Denetim İzleme (Kaynak)	8.170
Denetim İzleme (Şebeke)	199.931
Denetim İzleme (Yüzeysel)	164.748
Havuz Bakteriyolojik Kontrol	96
Denetim İzleme (Yeraltı Suyu)	1.674
Kimyasal Kontrol	50.791
Kimyasal Kontrol (Mikro)	1.601
Kimyasal	471
Kontrol İzleme	100.067
Kontrol (İşletme)	3.936
Analiz İstek	4.497
TOPLAM	545.766

a.6. Katodik Koruma Faaliyetleri

Tablo 24 - İlçe Bazında Katodik Koruma Yapılan Çelik Boru Hattı Uzunluğu (km)

İlçeler	Hat Uzunluğu
Osmangazi	408
Yıldırım	
Nilüfer	
İnegöl	50
Gemlik	45
M.Kemalpaşa	117
Mudanya	54
Gürsu	37
Karacabey	9
Orhangazi	23
Kestel	35
Yenişehir	46
İznik	5
Orhaneli	
Keles	
Büyükorhan	
Harmancık	
TOPLAM	829



a.7. İçmesuyu Arıza Tamir Çalışmaları**Tablo 25 - İlçe Bazında İçmesuyu Arıza İhbarları (adet)**

İlçeler	Adet
Osmangazi	14.393
Yıldırım	8.344
Nilüfer	4.472
İnegöl	2.046
Gemlik	4.919
M.Kemalpaşa	502
Mudanya	4.570
Gürsu	899
Karacabey	138
Orhangazi	2.658
Kestel	1.781
Yenişehir	1.158
İznik	172
Orhaneli	1.050
Keles	111
Büyükorhan	813
Harmancık	459
TOPLAM	48.485

a.8. İçmesuyu Evsel Bağlantı Çalışmaları**Tablo 26 - İlçe Bazında İçmesuyu Evsel Bağlantı Çalışmaları (adet)**

İlçeler	Adet
Osmangazi	812
Yıldırım	688
Nilüfer	711
İnegöl	3.479
Gemlik	280
M.Kemalpaşa	223
Mudanya	123
Gürsu	124
Karacabey	130
Orhangazi	207
Kestel	119
Yenişehir	150
İznik	145
Orhaneli	101
Keles	71
Büyükorhan	98
Harmancık	132
TOPLAM	7.593



a.9. Tarımsal Sulamaya Yönelik Gölet ve Sulama Hizmetleri

Tablo 27 - İlçe Bazında Gölet, Sulama Havuzu ve Tesisleri (adet ve alanları)

İlçeler	Gölet		Sulama Havuzu Adet	Sulama Tesisleri		
	İnşaatı Tamamlanan (adet)	İnşaatı Devam Eden (adet)		İnşaatı Devam Eden (adet)	Tamamlanan İnşaat (adet)	Toplam Uzunluk (m)
Osmangazi			2		1	
Yıldırım						
Nilüfer			1		1	1.378
İnegöl		1	1	1	5	24.063
Gemlik		1				
M.Kemalpaşa	1				1	13.148
Mudanya			2		1	
Gürsu						
Karacabey				1		5.978
Orhangazi						
Kestel	1				2	278
Yenişehir				1	1	3.300
İznik		1	1	1	1	8.709
Orhaneli	1	1		1	2	8.666
Keles		1			2	3.333
Büyükorhan						
Harmancık				1	2	5.235
GENEL TOPLAM	3	5	7	6	19	74.088

Orhaneli - Topuk Göleti



İznik - Aydınlar Göleti



a.10. SCADA Sistemi (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama)

SCADA veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemidir. SCADA sistemi ile bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden, yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlanabilmektedir. Yeni eklenecek

olan uzak istasyonların saha ekipmanlarının testleri, donanımsal ve yazılımsal yapılarının kontrolleri ve HMI ekranlarında görüntülenecek olan istasyon tasarımları test panoları üzerinde BUSKİ SCADA personeli tarafından yapıldıktan sonra saha ortamında entegre edilmektedir.

**Tablo 28 - 2023 Yılında SCADA Kapsamında İşletmeye Alınan İstasyonlar**

Tesis Adı	2022 Yıl Sonu Tesis Sayısı	2023 Yılında Eklenen Tesis Sayısı	2023 Yıl Sonu Tesis Sayısı
İçme Suyu Depoları	206	62	268
Pompa İstasyonları	64	11	75
Kuyular	293	35	328
Altbölge Debi Ölçüm İstasyonları	194	9	203
Toplu Su Satışı Debi Ölçüm İstasyonları	10	0	10
Kaynak Suları Debi Ölçüm İstasyonları	33	-1	32
Yer Altı Suyu Debi Ölçüm İstasyonları	6	1	7
Baraj Seviye Ölçüm İstasyonları	2	2	4
Şebeke Vana Kontrol İstasyonları	16	2	18
İçme Suyu Arıtma Tesisi Ölçüm Noktaları	3	0	3
Diğer Ölçüm Kontrol İstasyonları	21	2	23
TOPLAM	848	123	971

BUSKİ SUDAKİ KAYIP KAÇAKLA MÜCADELEDE TÜRKİYE 1.'Sİ



Hava fotoğraflarından
CBS Haritaları üretildi.



Mevcut Altyapılar tespit
edilerek CBS Haritalara yüklendi



257 Alt Bölgeden oluşan
Bursa İçmesuyu Projeleri hazırlandı



Alt bölgelere
Tek Noktadan Su Girişi



İçmesuyu Şebeke
Rehabilitasyonu ve
Yapılan İmalatların
CBS Haritalarına
Yükleneşine
başlandı



Debitmetreler
takıldı




Endekslerinin
Aynı Anda Okunmasına
başlandı



Scada Sistemi kuruldu



Kaçak Arama
ekipleri kuruldu



Kullanım Ömrü 10 Yılı Tamamlamış
sayaçların ücretsiz değişimine başlandı



Site Sayacı
uygulamasına
geçildi (%3 katkı
sağlandı)



Okullara Uzaktan
Okumalı Sayaçlar
takıldı



BURSA'YA 2060 YILINA KADAR SUSUZLUK YAŞATMAYACAK



ÇINARCIK SUYU İÇİN ÇALIŞMA,9 KOLDAN BAŞLADI



İklim değışikliğı ve kuraklıkla mücadele konusunda altyapının yenilenmesinden mevcut kaynakların korunmasından, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına kadar önemli projeleri hayata geçiren Genel Müdürlüğümüz suyunun kente getirilmesi için fiziki çalışmaları, yüklenici 9 firma ile sözleşme imzalanmasıyla resmen başlamış oldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) sağlanan 150 milyon Euro'lık krediyle hayata geçirilecek proje kapsamında, 68 kilometre isale hattı, 3 adet su deposu ve günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşa edilecek. 2060 yılına kadar kente susuzluk sorunu yaşatmayacak proje, 9 ayrı yüklenici ile tamamlanacak.



SU KAPASİTESİ YÜZDE 60 ARTACAK

Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi kapsamında inşaat çalışmaları tamamlandığında il merkezimize sağlanan su miktarı yüzde 60 oranında artacak. İlimizde hâlihazırda yıllık 240 milyon metreküplük içme suyu kapasitesi Çınarcık projesinin tamamlanması ile şehrimizin su kapasitesi 385 milyon metreküpe çıkacak. Projenin geç Ekim 2025'te tamamlanması hedefleniyor.



b. Atıksu Hizmetleri**b.1. Atıksu, Yağmursuyu ve Dere Islahı Proje Hizmetleri****Tablo 29 - İlçe Bazında Atıksu, Yağmursuyu ve Dere Islahı Proje Metrajları (km)**

İlçeler	Atıksu	Yağmursuyu	Dere Islahı	Toplam
Osmangazi	11,51	15,55	0,55	27,61
Yıldırım	1,65	1,35	0,46	3,46
Nilüfer	3,64	7,47	4,20	15,31
İnegöl	51,81	21,06	2,86	75,73
Gemlik	1,32	1,17		2,49
M.Kemalpaşa	49,92	13,18		63,10
Mudanya				
Gürsu				
Karacabey				
Orhangazi	2,13			2,13
Kestel				
Yenişehir	5,95	3,40		9,35
İznik	17,01			17,01
Orhaneli	0,36			0,36
Keles				
Büyükorhan	1,93			1,93
Harmancık				
TOPLAM	147,23	63,18	8,07	218,48



b.2. Yağmursuyu ve Kanalizasyon İmalatları

Tablo 30 - İlçe Bazında Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İmalatı (km)

İlçeler	Kanalizasyon Şebeke İmalatı	Yağmursuyu Şebeke İmalatı	Toplam
Osmangazi	14,24	7,91	22,15
Yıldırım	9,47	7,37	16,84
Nilüfer	23,10	5,51	28,61
İnegöl	10,81	1,34	12,15
Gemlik	2,36	3,16	5,52
M.Kemalpaşa	34,75	13,51	48,26
Mudanya	10,03	0,77	10,80
Gürsu	1,12	1,28	2,40
Karacabey	18,02	10,84	28,86
Orhangazi	14,10	4,30	18,40
Kestel	1,00	0,16	1,16
Yenişehir	9,57		9,57
İznik	8,91	0,92	9,83
Orhaneli	7,83		7,83
Keles	2,88		2,88
Büyükorhan	2,57		2,57
Harmancık	4,49		4,49
Deprem Bölgesi Yatırımları	17,29		17,29
TOPLAM	192,54	57,07	249,61



b.3. Dere Temizliği Çalışmaları

Genel Müdürlüğümüz 2023 yılında 42 km Dere Temizliği çalışması gerçekleştirilmiştir.

Nilüfer Çayı



ÖNCESİ



SONRASI

Ayvalı Dere



ÖNCESİ



SONRASI

Hüdavendigâr



ÖNCESİ



SONRASI

b.4. Dere Islahı Çalışmaları

Genel Müdürlüğümüz 2023 yılında Akçaköy, Balıklıdere, Ovaakça (Dürdane), Samanlı (Cenup Kanalı) ve Gökdere’de 6,5 km Dere Islahı çalışması gerçekleştirmiştir.

Gökdere



Balıklı Dere



b.5. Atıksu Arıtma Faaliyetleri

Tablo 31 - Atıksu Arıtma Çeşitleri ve Arıtma Değerleri

Atıksu Arıtma Tesis Çeşitleri	Arıtılan Su (m ³ /yıl)	Oran (%)	Adet
Bölgesel Büyük Atıksu Arıtma Tesisleri	114.222.418	76	15
İnegöl OSB Atıksu Arıtma Tesis	24.375.000	16	
Yeşilçevre Atıksu Arıtma Tesis	7.300.000	5	
Paket Atıksu Arıtma Tesisleri	2.355.710	2	52
Doğal Atıksu Arıtma Tesisleri	1.929.850	1	62
TOPLAM	150.182.978	100	129

Tablo 32 - İlçe Bazında Bölgesel Büyük Atıksu Arıtma Tesisleri

Sıra No	İlçesi	Tesis Adı	Yıllık Atıksu (m ³ /yıl)
1	Osmangazi	Doğu Atıksu Arıtma Tesis	57.172.698
2	Nilüfer	Batı Atıksu Arıtma Tesis	24.728.590
3	Gemlik	Gemlik Atıksu Arıtma Tesis	6.614.274
4	Gemlik	Kumla Atıksu Arıtma Tesis	1.683.000
5	Gemlik	Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesis	1.617.932
6	Harmancık	Harmancık Atıksu Arıtma Tesis	248.077
7	İznik	İznik Atıksu Arıtma Tesis	1.374.340
8	Mudanya	Mudanya Atıksu Arıtma Tesis	5.671.716
9	Mudanya	Nilüfer Atıksu Arıtma Tesis	4.197.500
10	Mustafakemalpaşa	Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesis	1.350.514
11	Mustafakemalpaşa	Çeltikçi Atıksu Arıtma Tesis	79.942
12	Nilüfer	Akçalar Atıksu Arıtma Tesis	1.619.448
13	Orhaneli	Orhaneli Atıksu Arıtma Tesis	286.645
14	Orhangazi	Orhangazi Atıksu Arıtma Tesis	5.139.130
15	Yenişehir	Yenişehir Atıksu Arıtma Tesis	2.438.612
		TOPLAM	114.222.418

Mudanya Atıksu Arıtma Tesis



Akçalar AAT



Doğu Atıksu Arıtma Tesis



Tablo 33 - İlçe Bazında Paket Atıksu Arıtma Tesisleri

Sıra No	İlçesi	Tesis Adı	Yıllık Atıksu (m ³ /yıl)
1	Osmangazi	Küçük Deliller Paket Atıksu Arıtma Tesis	131.035
2	Osmangazi	Bağlı Paket Atıksu Arıtma Tesis	36.500
3	Osmangazi	Kirazlı Paket Atıksu Arıtma Tesis	36.500
4	Osmangazi	Çaybaşı Paket Atıksu Arıtma Tesis	36.500
5	Osmangazi	Dağakça Paket Atıksu Arıtma Tesis	43.800
6	Osmangazi	Seferiışıklar Paket Atıksu Arıtma Tesis	36.500
7	Osmangazi	Güneybudaklar Paket Atıksu Arıtma Tesis	36.500
8	Osmangazi	Soğukpınar Paket Atıksu Arıtma Tesis	36.500
9	Osmangazi	Güneybayır Paket Atıksu Arıtma Tesis	36.500
10	Gemlik	Narlı Paket Atıksu Arıtma Tesis	364.270
11	Gemlik	Hamidiye Paket Atıksu Arıtma Tesis	13.505
12	Gürsu	Adaköy Paket Atıksu Arıtma Tesis	36.500
13	Harmancık	Karaca Paket Atıksu Arıtma Tesis	36.500
14	İnegöl	Yeniyörük Paket Atıksu Arıtma Tesis	36.500
15	İnegöl	Alanyurt Paket Atıksu Arıtma Tesis	43.800
16	İnegöl	Çitli Paket Atıksu Arıtma Tesis	21.900
17	İnegöl	Kulaca Paket Atıksu Arıtma Tesis 2	43.800
18	İznik	Boyalıca Paket Atıksu Arıtma Tesis	91.250
19	İznik	Göllüce Paket Atıksu Arıtma Tesis 1	43.800
20	İznik	Göllüce Paket Atıksu Arıtma Tesis 2	43.800
21	İznik	Müşküle Paket Atıksu Arıtma Tesis 2	43.800
22	İznik	Müşküle Paket Atıksu Arıtma Tesis 1	21.900
23	İznik	Drazali Paket Atıksu Arıtma Tesis	26.280
24	İznik	Çiçekli Paket Atıksu Arıtma Tesis	21.900
25	İznik	Orhaniye Paket Atıksu Arıtma Tesis 1	26.280
26	İznik	Orhaniye Paket Atıksu Arıtma Tesis 2	21.170
27	İznik	Elbeyli Paket Atıksu Arıtma Tesis	146.000
28	Karacabey	Boğaz Paket Atıksu Arıtma Tesis	43.800
29	Karacabey	Şahinköy Paket Atıksu Arıtma Tesis	36.500
30	Karacabey	Ovaesemen 1 Paket Atıksu Arıtma Tesis	36.135
31	Karacabey	Ovaesemen 2 Paket Atıksu Arıtma Tesis	36.135
32	Karacabey	Ovahamidiye Paket Atıksu Arıtma Tesis	26.280
33	Karacabey	Ekinli Paket Atıksu Arıtma Tesis	27.375
34	Karacabey	Kurşunlu Paket Atıksu Arıtma Tesis	36.500
35	Karacabey	Atatürk Kültür Parkı Paket Atıksu Arıtma Tesis	13.140
36	Keles	Kozbudaklar Paket Atıksu Arıtma Tesis	54.750
37	Keles	Davutlar Paket Atıksu Arıtma Tesis	43.800
38	Keles	Baraklı Paket Atıksu Arıtma Tesis	43.800

Sıra No	İlçesi	Tesis Adı	Yıllık Atıksu (m ³ /yıl)
39	Keles	Kemaliye Paket Atıksu Arıtma Tesisi	21.900
40	Keles	Pınarcık Paket Atıksu Arıtma Tesisi	43.800
41	Mudanya	Çayönü Paket Atıksu Arıtma Tesisi	36.500
42	Mudanya	Eğerce Paket Atıksu Arıtma Tesisi	22.630
43	Mustafakemalpaşa	Tümbüldek Paket Atıksu Arıtma Tesisi	3.650
44	Mustafakemalpaşa	Tatkavaklı Paket Atıksu Arıtma Tesisi	98.550
45	Orhangazi	Paşapınar Paket Atıksu Arıtma Tesisi	26.280
46	Orhangazi	Dutluca Paket Atıksu Arıtma Tesisi	26.280
47	Orhangazi	Gölyaka Paket Atıksu Arıtma Tesisi	26.280
48	Orhangazi	Heceler Paket Atıksu Arıtma Tesisi 1-2	21.900
49	Orhangazi	Ortaköy Paket Atıksu Arıtma Tesisi 1 Ve T.P.İ	21.900
50	Orhangazi	Ortaköy Paket Atıksu Arıtma Tesisi .2 Ve T.P.İ	21.900
51	Yenişehir	Çelebi Paket Atıksu Arıtma Tesisi	36.500
52	Yenişehir	Barçın Paket Atıksu Arıtma Tesisi	36.135
TOPLAM			2.355.710



Tablo 34 - İlçe Bazında Doğal Atıksu Arıtma Tesisleri

Sıra No	İlçesi	Tesis Adı	Yıllık Atıksu (m ³ /yıl)
1	Osmangazi	Hüseyin Alan Doğal Atıksu Arıtma Tesis	21.815
2	Büyükorhan	Pınar Doğal Atıksu Arıtma Tesis	39.410
3	Büyükorhan	Yenice Doğal Atıksu Arıtma Tesis	65.105
4	Büyükorhan	Düğüncüler Doğal Atıksu Arıtma Tesis	21.815
5	Harmancık	Hopandanişment 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	10.910
6	Harmancık	Hopandanişment 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	10.910
7	Harmancık	Gülözü Doğal Atıksu Arıtma Tesis	19.710
8	İnegöl	Alibeyköy Doğal Atıksu Arıtma Tesis	65.615
9	İnegöl	Deydinler Doğal Atıksu Arıtma Tesis	65.615
10	İnegöl	Gündüzlü Doğal Atıksu Arıtma Tesis	65.615
11	İnegöl	Hasanpaşa Doğal Atıksu Arıtma Tesis	30.660
12	İnegöl	İskaniye Doğal Atıksu Arıtma Tesis	21.860
13	İznik	Kaynarca Doğal Atıksu Arıtma Tesis	56.905
14	İznik	Sansarak Doğal Atıksu Arıtma Tesis	32.805
15	İznik	Aydınlı Doğal Atıksu Arıtma Tesis	28.605
16	İznik	Derbent 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	26.205
17	İznik	Derbent 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	21.805
18	Karacabey	Yeni Karaağaç Doğal Atıksu Arıtma Tesis	65.510
19	Karacabey	Bayramdere 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	65.655
20	Karacabey	Bayramdere 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	43.755
21	Karacabey	Bayramdere 3 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	32.805
22	Karacabey	Karakoca 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	48.110
23	Karacabey	Karakoca 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	48.110
24	Karacabey	Seyran Doğal Atıksu Arıtma Tesis	43.760
25	Karacabey	Harmanlı 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	43.760
26	Karacabey	Harmanlı 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	21.860
27	Karacabey	Taşpınar Doğal Atıksu Arıtma Tesis	17.510
28	Karacabey	Eski Karaağaç Doğal Atıksu Arıtma Tesis	15.315
29	Karacabey	Orhaniye Doğal Atıksu Arıtma Tesis	13.110
30	Karacabey	Hürriyet 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	10.910
31	Karacabey	Hürriyet 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	10.910
32	Karacabey	Okçular 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	10.910
33	Karacabey	Okçular 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	10.910
34	Karacabey	Çamlıca Doğal Atıksu Arıtma Tesis	21.810
35	Karacabey	Gölkıy Doğal Atıksu Arıtma Tesis	13.110
36	Mudanya	Esence Doğal Atıksu Arıtma Tesis	43.710
37	Mudanya	Söğütpınar 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	21.810
38	Mudanya	Söğütpınar 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesis	32.810
39	Mudanya	Çamlık Doğal Atıksu Arıtma Tesis	21.810
40	Mustafakemalpaşa	Adaköy Doğal Atıksu Arıtma Tesis	32.810
41	Mustafakemalpaşa	Demireli Doğal Atıksu Arıtma Tesis	32.810
42	Mustafakemalpaşa	İncilipınar Doğal Atıksu Arıtma Tesis	32.810
43	Mustafakemalpaşa	Gündoğdu Doğal Atıksu Arıtma Tesis	19.710
44	Mustafakemalpaşa	Çamlıca Doğal Atıksu Arıtma Tesis	17.510
45	Mustafakemalpaşa	Ocaklı Doğal Atıksu Arıtma Tesis	65.610
46	Mustafakemalpaşa	Hamidiye Doğal Atıksu Arıtma Tesis	15.310

Sıra No	İlçesi	Tesis Adı	Yıllık Atıksu (m ³ /yıl)
47	Mustafakemalpaşa	Akçapınar Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	13.110
48	Mustafakemalpaşa	İncealipınar Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	21.760
49	Orhaneli	Çivili 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	13.110
50	Orhaneli	Çivili 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	4.310
51	Orhangazi	Üreğil Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	10.910
52	Orhangazi	Akharem Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	65.510
53	Orhangazi	Keramet Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	43.760
54	Orhangazi	Gürle Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	45.105
55	Yenişehir	Söylemiş 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	32.810
56	Yenişehir	Söylemiş 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	43.710
57	Yenişehir	Selimiye Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	21.810
58	Yenişehir	İncirli Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	32.810
59	Yenişehir	Karacaali Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	29.710
60	Yenişehir	Demirboğa Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	26.260
61	Yenişehir	Fethiye Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	23.410
62	Yenişehir	Menteşe Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	21.860
TOPLAM			1.929.850

Batı Atıksu Arıtma Tesisi



Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi



b.6. Foseptik Çalışmaları



Genel Müdürlüğümüz 2023 yılı içerisinde toplam 23 adet foseptik çalışmalarını tamamlamıştır.

b.7. Atıksu Laboratuvar Hizmetleri

Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Laboratuvarında 211 Parametre, Atıksu Laboratuvarında 87 Parametre ve 1 numune alma işlemi ile Akreditasyon Belgesini yenileyerek toplamda 299 adet kapsamda hizmet vermektedir. 2023 yılında toplam 44.969 adet atıksu analizi yapılmıştır.

Tablo 35 - Atıksu Deşarj İzni Ruhsatı İşlemleri

İşletmelerden Alınan Numune Sayısı	1.318
Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Onaylanan İşletme Sayısı	50
Yeni İşletme Sayısı	495
Kapanan İşletme Sayısı	30
Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Yenilenen İşletme Sayısı	16



b.8. Çamur Bertarafı

Bursa’ımızda Temmuz 2017 itibariyle işletmesine başlanan Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Edilen Tesisimiz çamurun yerinde en az çevresel etki oluşturarak ve tüm çevresel sınırlamaları karşılayacak şekilde bertaraf edildiği örnek bir tesistir.

Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Edilen Tesis kapsamında, 2023 yılında toplam 88.235 ton çamur bertarafı gerçekleştirilmiş ve 11.325.570 kwh elektrik enerjisi üretilmiştir.



b.9. Kanal Arıza Tamir Çalışmaları

Tablo 36 - İlçe Bazında Kanal Arıza İhbarları (adet)

İlçeler	Kanal Arıza Talepleri
Osmangazi	2.471
Yıldırım	2.017
Nilüfer	774
İnegöl	232
Gemlik	100
M.Kemalpaşa	433
Mudanya	147
Gürsu	102
Karacabey	152
Orhangazi	60
Kestel	179
Yenişehir	20
İznik	582
Orhaneli	207
Keles	106
Büyükorhan	260
Harmancık	105
TOPLAM	7.947

b.10. Kanal Evsel Bağlantı Çalışmaları

Tablo 37 - İlçe Bazında Kanalizasyon Evsel Bağlantı Çalışmaları (adet)

İlçeler	Kanal Evsel Bağlantı
Osmangazi	1.668
Yıldırım	522
Nilüfer	999
İnegöl	3.416
Gemlik	196
M.Kemalpaşa	78
Mudanya	46
Gürsu	95
Karacabey	117
Orhangazi	99
Kestel	76
Yenişehir	167
İznik	107
Orhaneli	101
Keles	13
Büyükorhan	98
Harmancık	23
TOPLAM	7.821

c. Abonelik İşlemleri

c.1. Abone Sayıları

Tablo 38 - İlçe Bazında Abone Sayıları

İlçeler	Mekanik Sayaç	EKS	GPRS	Mekanik (EKS)	LORA	Debimetre	Toplam
Osmangazi	381.112	17.054	350	697	700	15	399.928
Yıldırım	254.091	8.895	218	262	2	15	263.483
Nilüfer	164.405	26.521	144	618	1.658	15	193.361
İnegöl	96.296	23.820	118	7		1	120.242
Gemlik	151.048	2.359	58	30	1	2	153.498
M.Kemalpaşa	46.493	11.501	50	232	1	3	58.280
Mudanya	69.616	4.985	31	43		3	74.678
Gürsu	30.585	4.789	37	134			35.545
Karacabey	40.186	14.619	59	149		1	55.014
Orhangazi	38.898	1.988	62	28		6	40.982
Kestel	32.041	1.855	39	59	1	2	33.997
Yenişehir	26.421	1.962	33	3		2	28.421
İznik	19.071	4.548	31	17	1		23.668
Orhaneli	14.388		30				14.418
Keles	9.146		11			1	9.158
Büyükorhan	8.200		10				8.210
Harmancık	4.671		8				4.679
Genel Toplam	1.386.668	124.896	1.289	2.279	2.364	66	1.517.562

Lora : Lora modüllü uzaktan okumalı sayaçlar

Debimetre : Yüksek tüketimli atıksu sayaçlar

GPRS : Uzaktan okumalı sayaçlar

EKS : Elektronik kartlı sayaçlar



Tablo 39 - Türlerine Göre Abone Sayıları


Abone Türü	Kişi	Abone Türü	Kişi
Mesken	1.343.253	Atıksu Aboneliği	3.044
İşyeri-Sanayi	139.612	Resmi Okul - Özel Okul	1.806
İnşaat	12.573	Cami	1.238
Site ve Apartman	10.018	Umuma Açık Yerler	751
Resmi Daire	5.258	Toplu Su Satışı	9
TOPLAM		1.517.562	

c.2. Su Tahakkuk Miktarları

Tablo 40 - İlçe Bazında Su Tahakkuk Miktarları


İlçeler	Sarfiyat Toplam (m ³)	İlçeler	Sarfiyat Toplam (m ³)
Osmangazi	45.681.642	Orhangazi	4.925.400
Yıldırım	30.727.952	Kestel	4.352.707
Nilüfer	28.029.619	Yenişehir	3.506.094
İnegöl	23.162.802	İznik	2.282.750
Gemlik	6.985.774	Orhaneli	1.038.566
M.Kemalpaşa	5.640.447	Keles	568.447
Mudanya	7.606.323	Büyükorhan	421.368
Gürsu	4.154.395	Harmancık	311.077
Karacabey	4.625.756	TOPLAM	174.021.119

Grafik 7 - İlçe Bazında Su Tahakkuk Miktarı Oranları (%)

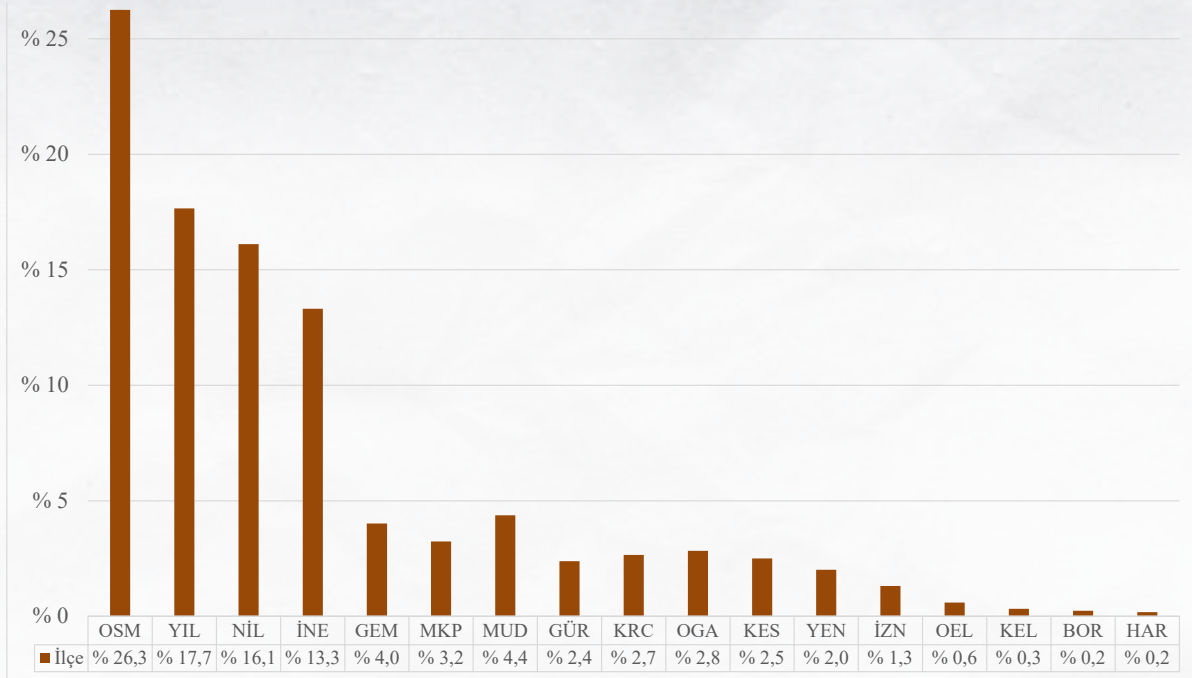

c.3. Su Gelirleri Tahakkuk Tutarı**Tablo 41 - İlçe Bazında Su Gelirleri Tahakkuk Tutarı (TL)**

İlçeler	Net Tahakkuk	İlçeler	Net Tahakkuk
Osmangazi	977.246.298,74	Orhangazi	90.113.169,13
Yıldırım	639.426.134,37	Kestel	180.280.046,03
Nilüfer	891.714.289,49	Yenişehir	61.208.099,89
İnegöl	331.197.346,23	İznik	43.826.770,64
Gemlik	149.362.732,45	Orhaneli	13.442.465,17
M.Kemalpaşa	105.497.779,28	Keles	6.420.116,85
Mudanya	141.959.728,43	Büyükorhan	5.010.551,13
Gürsu	81.127.541,45	Harmancık	4.098.370,82
Karacabey	89.072.185,83		
Toplam			3.811.003.625,93
Su gelirleri dışında elde edilen tahakkuk gelirlerimizin tutarıdır.(İller bankasından alınan paylar, Atıksu Arıtma tesisleri teşvik geliri, Çamur Yakma ve Enerji geliri vb. gelir kalemlerinden oluşmaktadır.)			1.010.668.136,11
Genel Toplam			4.821.671.762,04

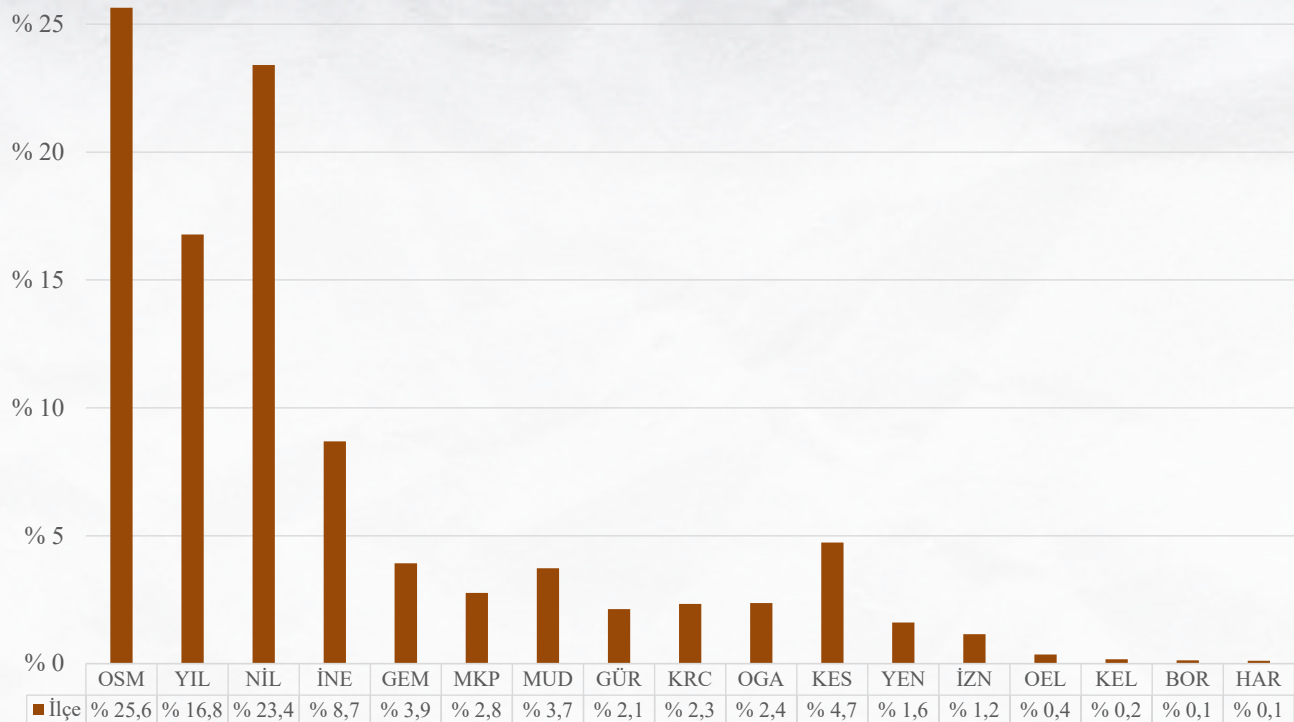
Grafik 8- İlçe Bazında Su Gelirleri Tahakkuk Tutarı Oranları (%)

c.4. Su Gelirleri Tahsilat Tutarı

Tablo 42 - İlçe Bazında Su Gelirleri Tahsilat Tutarı (TL)

İlçeler	Net Tahsilat	İlçeler	Net Tahsilat
Osmangazi	935.764.883,10	Orhangazi	82.870.213,18
Yıldırım	610.371.223,37	Kestel	170.199.156,41
Nilüfer	862.994.439,92	Yenişehir	56.349.531,24
İnegöl	306.624.083,90	İznik	40.933.080,39
Gemlik	142.760.489,37	Orhaneli	12.255.373,34
M.Kemalpaşa	100.804.052,54	Keles	5.816.991,34
Mudanya	132.858.549,27	Büyükorhan	4.691.027,44
Gürsu	77.508.335,74	Harmancık	3.813.644,67
Karacabey	84.443.037,74		
Toplam			3.631.058.112,95
Su gelirleri dışında elde edilen tahakkuk gelirlerimizin tutarıdır.(İller bankasından alınan paylar, Atıksu Arıtma tesisleri teşvik geliri, Çamur Yakma ve Enerji geliri vb. gelir kalemlerinden oluşmaktadır.)			1.010.661.406,11
Genel Toplam			4.641.719.519,06

Grafik 9- İlçe Bazında Su Gelirleri Tahsilat Tutarı Oranları (%)

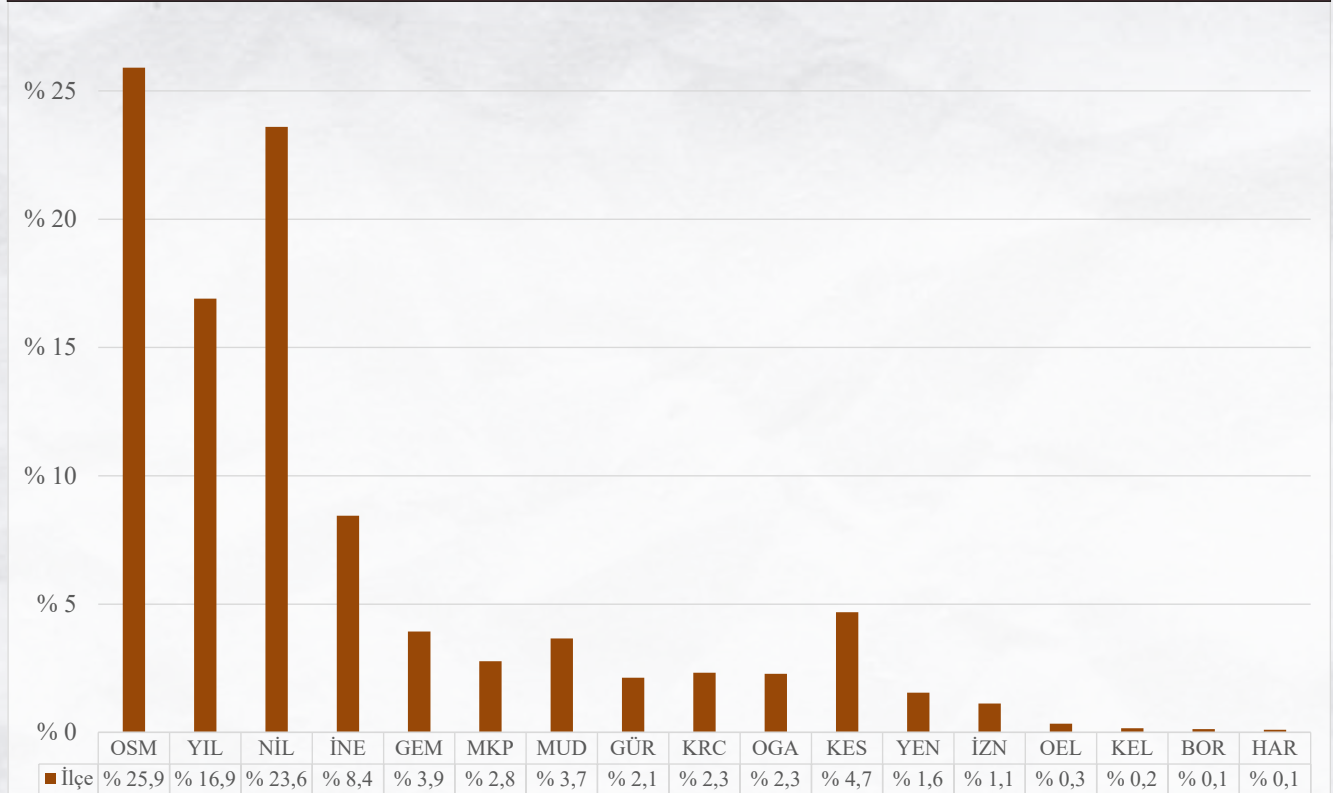

c.5. Tahsilat Kanalları

FATURA ÖDEME NOKTALARI

BUSKİ Tahsilat Şubeleri

Buski Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, 17 ilçemizde bulunan 24 tahsilat şubesinde su faturası tahsilatı, E.K.S. dolum tahsilatı ve harcamalara katılma payı tahsilatları ile alacak takip taksitlendirme ve icra işlemleri yapılmaktadır.

BUSKİMATİK

Buski merkez ve ilçelerinde konuşlandırılan 83 adet buskimatik cihazlarımız da debit ve kredi kartı ile su faturası tahsilatı, E.K.S. dolum yüklemesi ve harcamalara katılma payı tahsilatı yapılmaktadır. Ayrıca, 25 adet Buskimatik cihazlarımızda ise nakit tahsilat da yapılmaktadır.

İnternet Veznesi

www.buski.gov.tr adresinde su faturası tahsilatı, harcamalara katılma payı vb. tahsilatlar yapılmaktadır.

Mobil Uygulama

Cep telefonlarının uygulama menüsünden E-BUSKİ mobil şube uygulaması indirilerek, su faturası tahsilatı ile harcamalara katılma payı vb. tahsilatlar yapılmaktadır.

Bankalar

İdaremiz ile tahsilat sözleşmesi imzalamış 23 banka aracılığıyla ücretsiz su faturası tahsilatları yapılmaktadır. Anlaşmalı bankalarda;

- Gişe tahsilatı (Halk Bankası Hariç),
- Otomatik ödeme tahsilatı,
- İnternet şubesi tahsilatı,
- ATM tahsilatı,
- Telefon bankacılığı tahsilatı yapılmaktadır.

Bankalar tarafından yapılan bu tahsilat hizmetleri ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

Anlaşmalı Bankalar

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Denizbank, QNB Finansbank, Aktifbank, Kuveyt Türk Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, İng Bank, Albaraka Türk, Şekerbank, Alternatif Bank, HSBC Bank, Fiba Bankası, Vakıf Katılım Bankası, ICBC Turkey Bank, Odeabank, Emlak Katılım Bankası

Anlaşmalı Ödeme Kuruluşları:

- Gişe tahsilatı (Halk Bankası hariç),
- Otomatik ödeme tahsilatı,
- İnternet şubesi tahsilatı,
- ATM tahsilatı,
- Telefon bankacılığı tahsilatı yapılmaktadır.


Bankalar tarafından yapılan bu tahsilat hizmetleri ücretsizdir.

Ödeme Kuruluşları

- **Faturamatik** : 275 bayisinde su faturası tahsilatı ve harcamalara katılma payı tahsilatı yapılmaktadır. 23 bayisinde E.K.S. dolum yüklemesi yapılmaktadır.
- **N-Kolay** : 634 bayisinde su faturası tahsilatı yapmaktadır. 18 bayisinde E.K.S. dolum yüklemesi yapılmaktadır.
- **Pratik İşlem**: 257 bayisinde su faturası tahsilatı yapmaktadır. E.K.S. dolum yüklemesine yönelik sistemsel çalışmalar devam etmektedir.
- **Faturakom**: 66 bayisinde su faturası tahsilatı yapmaktadır. 5 bayisinde E.K.S. dolum yüklemesi yapılmaktadır.
- **Türk Telekom**: 158 bayisinde su faturası tahsilatı yapmaktadır.
- **Turkcell**: 174 bayisinde su faturası tahsilatı yapmaktadır.
- 1.715 PTT ve ödeme kuruluşu noktalarında yapılan tahsilatlar için hizmet bedeli alınmaktadır.

PTT

112 PTT şubesinde su faturası ile harcamalara katılma payı tahsilatı yapılmaktadır. PTT şubelerinden yapılan tahsilatlar için hizmet bedeli alınmaktadır.



c.6. e-Devlet Hizmetleri

e-Devlet üzerinden BUSKİ'ye erişen vatandaşlarımız; "Abone Bilgileri Sorgulama, Fatura Bilgileri Sorgulama, Aboneliğe Bağlı Arıza Başvurusu vb." toplamda 12 adet hizmetimize kolayca ulaşabilmektedir.



c.7. E-BUSKİ Web Hizmetleri

Abonelerimiz fiziki hizmet noktalarına gitmeden ve mesai saatlerine bağlı kalmaksızın internetten ve mobil platformlardan hizmet veren "e-BUSKİ" uygulaması ile birçok hizmet alabilmektedir.

- Yeni Abonelik İşlemleri
- Abonelik Bilgi Değişikliği
- Abonelik İsim Değişikliği
- Abonelik Tür Değişikliği
- Abonelik Sonlandırma
- Fatura Ödeme
- Sayaç Arıza İtiraz İşlemleri
- Makbuz ve İhbarnameler
- Endeks Beyan
- BUSAGA
- Bilgi Edinme
- Öneri ve Şikayet



c.8. Buskimatikler

BUSKİ merkez ve ilçelerinde konuşlandırılan 83 adet Buskimatik cihazlarımızda debit (banka kartı) ve kredi kartı ile su faturası tahsilatı, E.K.S. dolum yüklemesi ve harcamalara katılma payı tahsilatı yapılmaktadır.

Ayrıca, 25 adet Buskimatik cihazlarımızda ise nakit tahsilat da yapılmaktadır.



c.9. E-BUSKİ Mobil Uygulama

Güncel yazılım altyapısı ve modern ara yüze kullanılarak geliştirilen Mobil BUSKİ Yazılımı, kullanıcıların Bursa ili genelindeki baraj doluluk oranları görüntüleyebileceği, aboneliğine ait başvurular yapılabileceği ve yaptığı başvuruları takip edebileceği, borç sorgulaması ve 3D güvenli ödeme yapılabileceği, makbuz ve fatura dökümlerini alabileceği, ödeme noktaları, kesintiler ve su analiz bilgilerini görüntüleyebileceği, şikayet ve öneri taleplerinde bulunabileceği uygulamalar gibi birçok alanda abonelerine hizmet vermektedir. Android ve IOS işletim sistemi kullanan tüm mobil cihazlarda kullanılabilir.



d. Destek ve Denetim Hizmetleri

d.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak; hizmet anlayışı ile yalın ve proaktif iş güvenliği yaklaşımını kullanarak, sorumluluğu dahilindeki tüm insan kaynaklarını yürürlükteki mevzuata uygun olarak, iş kazalarından yaralanmalardan ve meslek hastalıklarından korumayı hedefler.

Bu amaçla;

- İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
- Sürekli iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
- İş Sağlığı ve Güvenliği hedefleri ve performansını sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir sıfır iş kazasına ulaşabilmeyi,
- Tehlikeleri ortadan kaldırarak, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı hedefleyen bir proaktif yapıya sahiptir.

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini alan Türkiye'nin İLK Su ve Kanalizasyon İdaresi olan BUSKİ; ISO 45001

normu gerekliliklerine cevap veren İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin başarısı tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın güvenlik bilincine sahip olmasından geçer. Bu bağlamda politikamız ilgili taraflar ve tüm çalışanlarımızca anlaşılması ve uygulanması için gerekli bilgilendirmelerin yapılması tüm çalışanlarımız tarafından taahhüt edilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarımız kapsamında; BUSKİ ve BİNTED personelinden toplam 1.240 kişi iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almıştır. 2.946 iş ekipmanının periyodik kontrol çalışmaları yapılmıştır. BUSKİ ve BİNTED uzmanları tarafından toplam 99 kez yapılan saha gözetim ve denetim çalışmaları yapılmış olup BUSKİ bünyesinde toplam 3 İşgünü kayıplı 3 iş kazası, BİNTED bünyesinde ise toplam 225 işgünü kayıplı 47 iş kazası vakası meydana gelmiştir. 2023 yılında yürütülen sağlık taramalarında ise BUSKİ ve BİNTED toplamında 1.185 çalışan katılım sağlamıştır.



Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları İnşaat Kazalarını Önleme Birliği (ISSA) ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız arasında 15.02.2023 tarihinde "İyi Niyet Protokolü" imzalanmış, bu kapsamda "Hedef Sıfır İş Kazası Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı" düzenlenmiştir.

d.2. Asfalt Yama ve Kaplama Çalışmaları

Tablo 43 - İlçe Bazında Yapılan Asfalt Yama, Asfalt Kaplama ve Sathi Kaplama Çalışmaları


İlçeler	Asfalt Yama (Ton)	Asfalt Kaplama (Ton)	Sathi Kaplama (m ²)
Osmangazi	23.807	7.548	5.425
Yıldırım	13.824	4.947	
Nilüfer	12.566	2.946	
İnegöl	34.446	8.397	108.350
Gemlik	2.004	332	21.407
M.Kemalpaşa	4.609	16.770	101.805
Mudanya	3.498	299	85.460
Gürsu	2.169		13.373
Karacabey	7.689	20.167	
Orhangazi	1.634	9.989	9.574
Kestel	2.308	3.012	
Yenişehir	1.612	1.196	34.791
İznik	222		31.446
Orhaneli	51		20.572
Keles	909		18.638
Büyükorhan	149	107	16.359
Harmancık			
Ara Toplam	111.497	75.710	
Genel Toplam	187.207		467.200



d.3. Kamulaştırma Faaliyetleri


Tablo 44 - İlçe Bazında Kamulaştırılan Alan (m²)

İlçeler	Atıksu	İçmesuyu	Sulama	Yağmursuyu	Toplam
Osmangazi					
Yıldırım					
Nilüfer	402,91	21.744,29			22.147,20
İnegöl	286,99	30.652,80	15.738,86		46.678,65
Gemlik	2.640,43		617,93	916,47	4.174,83
M.Kemalpaşa	9.453,56	10.688,75			20.142,31
Mudanya			44,68		44,68
Gürsu	360,25	711,91	4.336,00		5.408,16
Karacabey	7.226,55	5.262,58			12.489,13
Orhangazi	4.450,63	3.142,03			7.592,66
Kestel					
Yenişehir	21.976,77	21.043,72	1.950,78		44.971,27
İznik	8.120,29	1.725,16			9.845,45
Orhaneli		7.423,20	11.160,00		18.583,20
Keles	693,00				693,00
Büyükorhan		1.571,38			1.571,38
Harmancık	799,33				799,33
TOPLAM	56.410,71	103.965,82	33.848,25	916,47	195.141,25

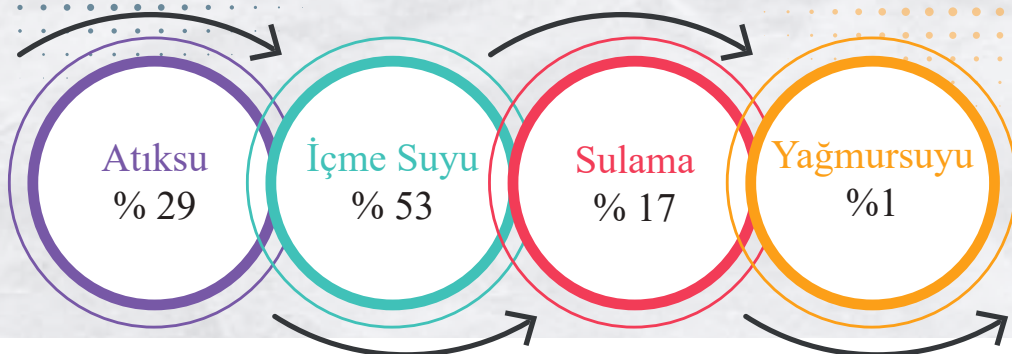

Tablo 45 - İlçe Bazında Tahsis, Tescil , İrtifak Alanları ve Sayıları

İlçeler	Tahsis Alınan Alanlar (m ²)	Tahsis Sayısı	Tescil Sayısı	İrtifak Alanları (m ²)	İrtifak Sayısı
Osmangazi	113.277	7			
Yıldırım					
Nilüfer			92	70	3
İnegöl	51.001	6	19		
Gemlik	7.163	2	4		
M.Kemalpaşa	52.704	6	2		
Mudanya				552	2
Gürsu			1		
Karacabey	28.314	6	1		
Orhangazi			4		
Kestel				172	1
Yenişehir			5		
İznik	1.726	1	3		
Orhaneli	8.340	2	3		
Keles	8.826	1	1		
Büyükorhan			7	1.168	3
Harmancık			1		
TOPLAM	271.351	31	143	1.962	9

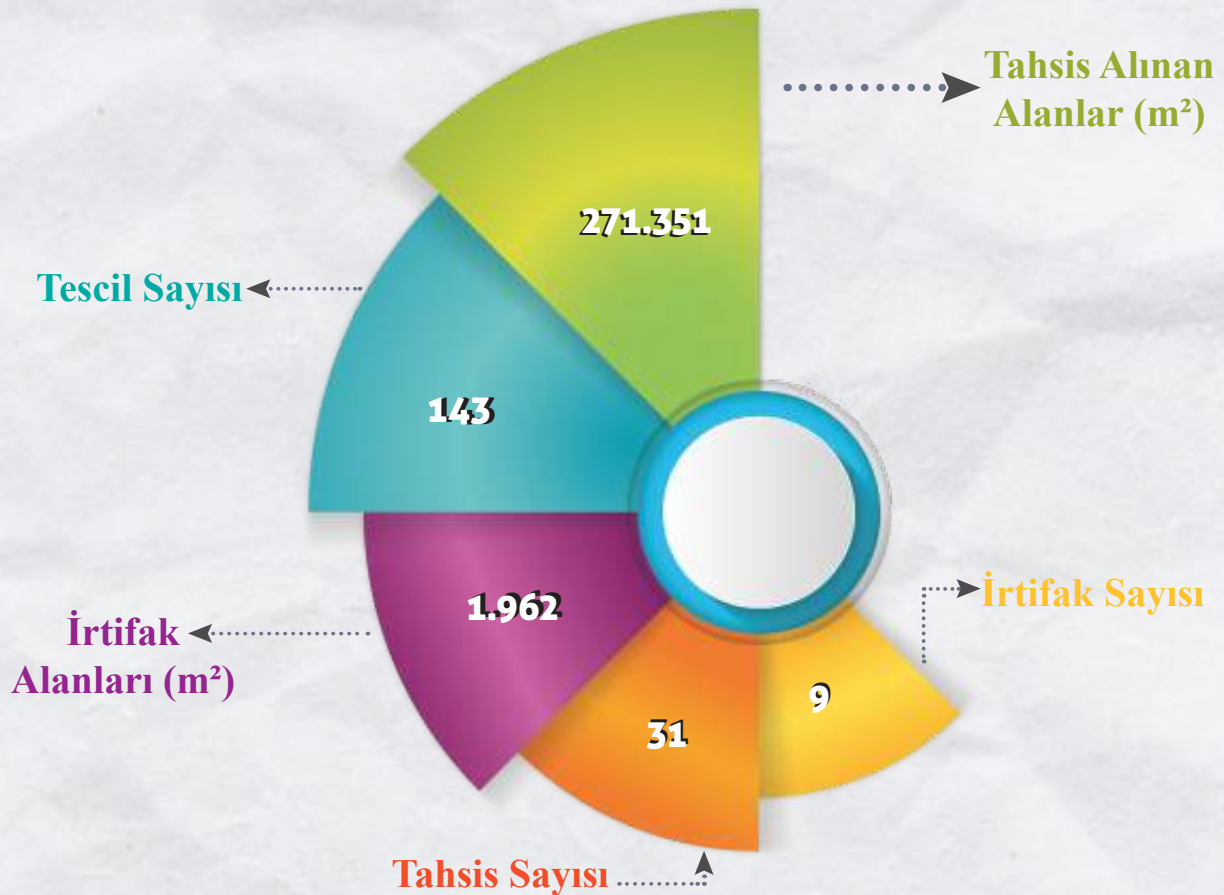

d.4. Enerji Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Genel Müdürlüğümüz kamu yararına yürütmekte olduğu faaliyetleri ve hizmetleri sırasında kurumun enerji performansını ve enerji yönetim sistemini sürekli iyileştirmek amacıyla enerji politikaları geliştirmektedir. Doğancı Barajı'ndan Dobruca Arıtma Tesisleri'ne kadar olan hatta yer alan D0, D13 ve D12 su depolarında hizmete aldığı HES santralleri, Türkiye'ye örnek olmuştur. Kurumumuz, kente Doğancı Barajı'ndan su getiren ana isale hatları içerisinde akan suyun gücünden faydalanarak elektrik enerjisi üretmek su depoları üzerinde santraller kurmuştur.

Tablo 46 - 2023 Yılı Elektrik Enerjisi Tüketimi

Birim Adı	Tüketilen Elektrik (kWh/Yıl)	Elektrik Sarfıyatı Tutarı (TL)
Elektrik Tüketimi	143.182.091	481.833.164



Tablo 47 - Güneş Enerjisi Sistemi (GES)

GES	Toplam (kWh)
Batı Arıtma GES Tesisi	161.318
D46 GES Tesisi	202.580
Doğu Arıtma GES Tesisi	36.898
D12-2 GES Tesisi	296.159
TOPLAM	696.955



Tablo 48 - Hidroelektrik Santral Sistemi (HES)

HES	Toplam (kWh)
DO HES Tesisi	2.325.100
D13 HES Tesisi	8.264.057
D12 HES Tesisi	3.007.700
TOPLAM	13.596.857



Tablo 49 - Çamur Yakma Sistemi

Akışkan Yataklı Tesis	Toplam (kWh)
Çamur Yakma Tesisi	11.325.570
TOPLAM	11.325.570

d.5 Koruma, Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri

CCTV Kamera Sistemi, BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait su depolarına, pompa istasyonlarına, BUSKİ kampüs çevresine, Batı Arıtma Açık Ambar Kampüs alanına ve Doğancı Barajı çevresinde güvenlik ve denetim amaçlı kapalı devre kamera kayıt ve kontrol sistemi kurulması işidir. Kablosuz geniş bant haberleşme sistemi kamera görüntülerini yüksek hızla uzak mesafelere kablosuz olarak transferini sağlayacaktır. Bu haberleşme sistemi görüntü ve veri aktarımı konusunda Bilgi Teknolojileri Kurumu mevzuatlarında yer alan ve Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından onayı alınan 5470-5725 Mhz frekansında çalışan noktadan noktaya ve noktadan çok noktaya haberleşme sistemi kurulmuştur. Bu haberleşme alt yapısında BUSKİ ile haberleşen istasyon sayısı 142 adettir. 142 nokta ile BUSKİ Genel Müdürlüğü arasındaki haberleşme, bu noktaların BUSKİ'yi gördükleri noktalar ile direkt, görmedikleri noktalar ile de aralarında aktarma noktaları kurularak sağlanmaktadır

Tablo 50 - CCTV Kamera Sistemlerinde İşletilen İstasyonlar

Sıra No	Tesis Adı	Tesis Adedi	Kamera Adedi
1	İçmesuyu Depoları	74	236
2	İçmesuyu Terfi İstasyonları	40	128
3	Baraj	1	10
4	Arıtma Tesisi	7	81
5	BUSKİ Merkez Kampüs	1	89
6	Atık Su Arıtma ve Terfi İstasyonları	3	114
7	Çamur Yakma	1	11
8	HES	3	5
9	Haberleşme Toplama ve Aktarma Noktaları	8	4
10	Şantiye Alanları	4	32
	TOPLAM	142	710

Genel Müdürlüğümüz Güvenlik Şefliğinde görev yapan 189 personelimizin, atış poligonunda yıllık tabanca atış eğitimleri yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan su depoları, pompa istasyonları, Nilüfer ve Doğancı Barajı ile derin su kuyuları 3 adet araçlı kontrol ekibimizce, 365 gün 24 saat esasına göre akıllı kalem tur kontrol sistemi ile kontrol edilmiş ve güvenliği sağlanmıştır. Doğancı Barajı ve Nilüfer Barajı etrafında mobil araç ile 24 saat esasına göre denetim sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzde yıl içinde yapılan tüm ihalelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan birimlere ait Koruma Planları güncellenerek, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca onaylanmıştır.

Deprem Tatbikatı



d.6. Denetim İşlemleri

Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığı mevzuat çerçevesinde teftiş inceleme ve soruşturmalar kapsamında teftiş, inceleme ve soruşturmalar sırasında ortaya çıkan eksiklikleri ve/veya Genel Müdürlüğümüz birimlerinin sunduğu hizmetlerin daha etkin verimli ve sürdürülebilir olması yönündeki tespitlerini ve bu konularda yapılması gerekenleri ilgili birimlere ileterek iyi örneklerin yaygınlaşması ve kötü örneklerin ayıklanmasını sağlayarak, İdarenin stratejik hedeflerine ve istenilen hizmet ve insan kalitesine ulaşması yolunda çalışmalarına devam etmektedir.



Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2023 yılında 14 adet inceleme, 1 adet soruşturma ve 1 adet cevaplı teftiş raporu düzenlenmiştir.


d.7. Hukuk İşlemleri



Genel Müdürlüğümüz 1.Hukuk Müşavirliğince 1.913 adet ilamsız takip yapılmıştır. Bunların 385 adedi kurumumuzca 1.528 adedi ise kurumumuz özel avukatlarınca gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında toplam 428 adet dava ikame edilmiştir. 2023 yılında kurumumuz ve özel avukatlarımızca açılmış olan icra takiplerinden muhtelif tarihlerde muhasebe kayıtlarına göre 13.104.402,00 TL tahsil edilmiş ve idaremiz hesabına yatırılmıştır.

d.8. Proje Kontrol ve Aplikasyon Servisi Faaliyetleri

İdaremiz Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılında da proje kontrol ve aplikasyon faaliyetlerine devam etmektedir.

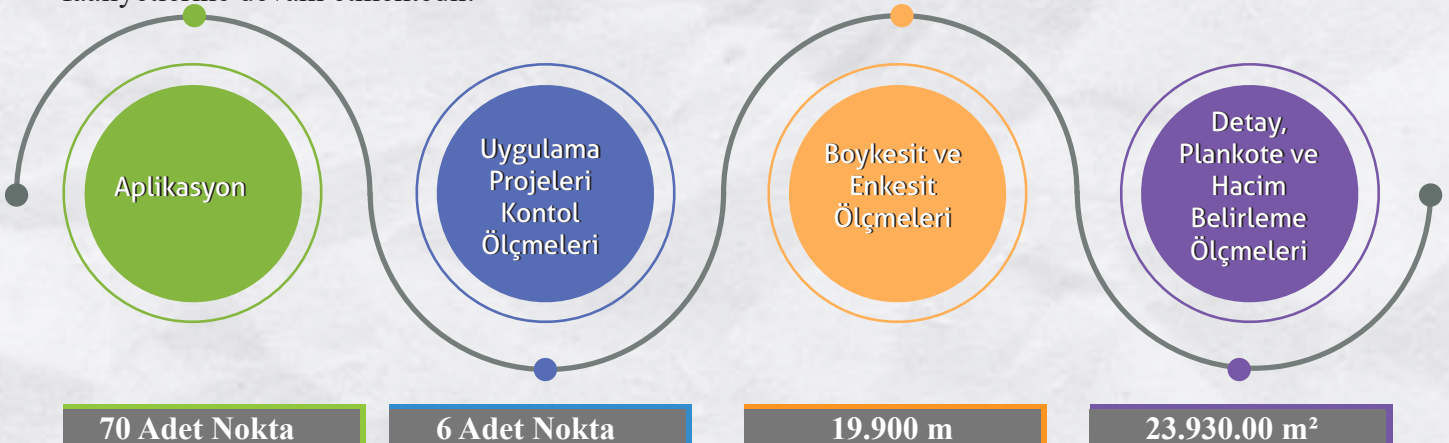

d.9. Eğitim Faaliyetleri

Kurumumuz Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında 2 Mayıs - 9 Haziran 2023 tarihleri arasında 52 hizmet noktasında 2023 yılı Gözetim Tetkiki gerçekleştirilmiştir. 130 adet bulgu tespit edilmiş, tetkik raporları ilgili birimlere gönderilmiş ve alınan aksiyonlarla 80 adet bulgu kapatılmıştır.

22-23 Haziran 2023 tarihleri arasında 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen 5 kişilik denetim ekibi ile dış denetim gerçekleştirilmiştir.



Genel Müdürlüğümüzde görev ve yeni başlayan 293 personel ve stajyer öğrenciye toplamda 1.013 saat kurumumuzun tarihçesi, misyonu, vizyonu ve kalite politikası, temel değerleri, prensipleri ve etik kuralları, kurumda uygulanan kalite standartları, kurumun organizasyon yapısı, birimlerin iş ve işlemleri, birim yöneticileri ve sorumluluklarının belirtildiği “Oryantasyon Eğitimi”, görev yapacağı birimlerde işe uyum sağlamaları amacıyla birimlerin belirlediği usta eğitici personeller tarafından en az 16 en fazla 720 saat olmak üzere kişi başı ortalama 94 saat, toplamda 25.568 saat “Unvan Bazlı Oryantasyon Eğitimleri” verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 2.895 personele Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı ve Türkiye Belediyeler Birliği kanalı ile 44 farklı konu başlığında uzaktan eğitim, 3.355 personele 33 farklı konu başlığında yüz yüze eğitim, 54 personele Servis Görevlisi Eğitimi teorik ve uygulamalı eğitim 31 personele Kalite Yönetim Sistemi Uzmanı Yetiştirme Programı Eğitimi verilmiştir. Ayrıca Kurumumuzun hizmet verdiği engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için hizmet masasında görev yapan 78 personele İşaret Dili Eğitimi verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliği ile yürüttüğü “Su Damlalarının Peşinde” projesi ve bireysel talepler karşılığında 61 anaokulunda 11.920 öğrenci, 167 ilkokulda 71.033 öğrenci, 8 ortaokulda 3.257 öğrenciye ve 3 lisede 647 öğrenci olmak üzere toplamda 239 okulda 86.857 öğrenciye “Su Bilinci ve Su Tasarrufu” konuları hakkında farkındalık eğitimleri verilmiş olup eğitim sonunda her öğrenciye boyama ve tasarruf kitabı verilmiştir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Acemler Kampüste Su Şenliği düzenlenmiştir.

d.10. Kesin Hesap Faaliyetleri

2023 Yılında Kesin Hesap Şube Müdürlüğünce 68 adet Kesin Hesap 1.324 adet hakediş toplamda 1.392 adet inceleme yapılmıştır.

d.11. Teşvik ve Satın Alma Faaliyetleri


- Teşvik Uygulama Sonuçları

Genel Müdürlüğümüz yatırımların kullanılacak makine ve ekipmanların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınması konusunda çalışmalar yapmaktadır.

2023 yılına ait Yerli Ürün Teşvik kapsamındaki toplam proje bedeli 577.695.732,21 TL olup KDV muafiyetinden yararlanılan teşvik tutarı

114.542.554,20 TL olarak gerçekleşmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çevre Kanununun 29. maddesi uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin teşvik tedbirlerinden faydalanılmasında uygulanacak usul ve esaslara dair Yönetmelik kapsamında Atıksu Arıtma Tesislerine yönelik olarak 81.209.485,94 TL enerji teşviğinden yararlanılmıştır.

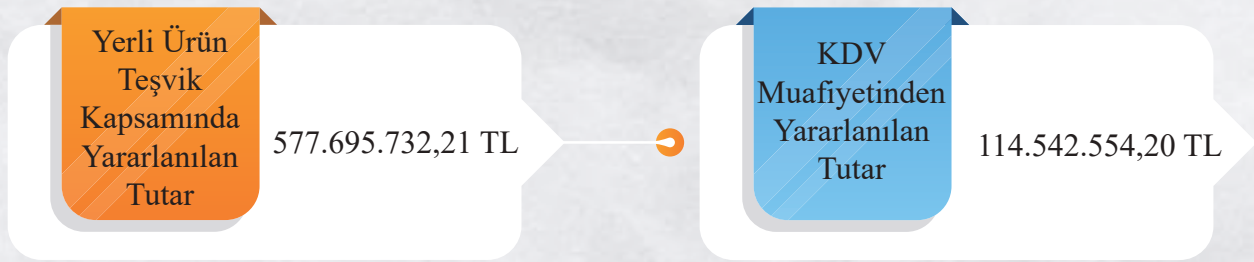

- Satın Alma Faaliyetleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurumumuzun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2023 yılında işlemlerini yürüttüğü ihale bilgileri ve ihale limitleri altında kalan ihtiyaçları karşıladığı doğrudan temin bilgileri aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır. Ayrıca tüm ihalelerimiz www.buski.gov.tr adresinde canlı olarak yayınlanmaktadır.



Tablo 51 - Satın Alma Bilgileri

Alım Türü	İhale Bilgileri	Doğrudan Temin Bilgileri
	Sözleşme Bedeli	Sözleşme Bedeli
Mal Alım İhaleleri	332.753.537,86	106.571.459,94
Hizmet Alımı İhaleleri	644.291.153,71	24.492.765,79
Yapım İşleri İhaleleri	1.126.201.393,81	33.623.731,46
Toplam	2.103.246.085,38	164.687.957,19



d.12. Altyapı Veri Güncelleme ve Kontrol Servisi Faaliyetleri

- İçmesuyu ve Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Konum Ölçmeleri

Değişik paket projeler adı altında ihale edilen ve yapım kontrollüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı, İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı ve İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığınca yapılan işlerden, Yüklenici firmalar tarafından imalatı gerçekleştirilmiş olan toplam 6.3 km'lik atıksu ve yağmursuyu imalatının konum kontrol ölçmeleri gerçekleştirilmiş ve BUSKİ Bilgi Sistemine eklenmesi için sayısal grafik veri dosyaları oluşturularak, ilgili Coğrafi Bilgi İşlem Servislerine ve bilgisayar kullanıcılarının yararlanmasına sunulmuştur.

- Enerji Nakil Hatları Konum Ölçmeleri

Değişik paket projeler adı altında ihale edilen ve yapım kontrollüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığınca yapılan işlerden, Yüklenici firmalar tarafından imalatı gerçekleştirilmiş olan toplam 3.6 km'lik enerji nakil hattı

imalatının konum kontrol ölçmeleri gerçekleştirilmiş ve BUSKİ Bilgi Sistemine eklenmesi için sayısal grafik veri dosyaları oluşturularak, ilgili Coğrafi Bilgi İşlem Servislerine ve bilgisayar kullanıcılarının yararlanmasına sunulmuştur.

d.13. Sıfır Atık Faaliyetleri

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde israfın önlenmesi ve enerji tasarrufunun sağlanmasına katkı sağlamak amacı ile "Sıfır Atık Projesi" yürütülmektedir. Bu kapsamda kurum yerleşkelerinde ambalaj, organik, geri dönüşemeyen atıklar türlerine göre geri dönüştürülmek üzere toplanmaktadır.

Tablo 52 - Sıfır Atık Kapsamında Toplanan Atık Bilgileri

Atık Türü		Ağırlık (Kg)
Ambalaj Atıklar	Kağıt	10.292
	Cam, Metal, Plastik Vb.	9.395
Organik Atıklar		1.223
Geri Dönüşemeyen Atıklar		3.288
TOPLAM		24.198



d.14. Yalın Yönetim Faaliyetleri

Genel Müdürlüğümüzde Yalın Yönetim Şube Müdürlüğü, kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirmeler yaparak daha iyi sonuçların elde edilmesine ilişkin Yalın Kurum Kültürünün oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

2023 yılında Genel Müdürlüğümüz’de gerçekleştirilmesi planlanan 83 adet proje konusunun 66 tanesi sonuca ulaşmıştır. 12 adet yalın uygulama projelerinden toplam 312.327.485 TL kazanç elde edilmiş, 108 adet A3 projesi çalışması ise devam etmektedir.



Tablo 53 - 2023 Yılı Yalın Yönetim Kazanımları

Sıra No	Tamamlanan Projeler	Proje Bedeli
1	5S ve 3M çalışmalarından elde edilen operasyonel kazanımlar	10.529.800,00
2	Personel verimlilik çalışması (Norm Kadro Analizi)	188.754.624,00
3	Depo ve stok yönetimi çalışması kazanımları	2.754.121,44
4	Doküman ve arşiv yönetimi	895.110,00
5	Su faturalarının ebatlarının küçültülmesi ve dijital faturalandırılma sistemine geçiş	3.019.434,00
6	Elektrik tüketiminin üretilen enerjisiyle mahsuplaşılması	20.069.000,00
7	Karapınar yeraltı geri beslemesi sayesinde kaynak sularındaki artışın sisteme dahil edilmesi	39.983.911,00
8	Rüzgar ölçüm kulelerinin mikrodalga haberleşme ve CCTV sistem altyapısında kullanılması	1.999.200,00
9	Enerji verimliliği kapsamında bina ve tesislerde yapılan dönüşüm çalışmaları	13.561.998,84
10	Muhtelif alt bölge istasyonları ve içme suyu depolarına güneş paneli takılması	11.357.800,00
11	Lastik hava basınç kontrolleri yapılarak yakıt ve işletme maliyetinden tasarruf sağlanması	15.110.486,30
12	Vactor üst yapı aktarımı yapılması	4.292.000,00
	Toplam Elde Edilen Kazanım	312.327.485,58

d.15. Kültürel - Sosyal ve Dayanışma Faaliyetleri

Genel Müdürlüğümüz Dünya Su Günü, Kermes, Büyük Çocuk Şenliği, Science Expo , Üniversitene Hoşgeldin Şöleni gibi sosyal faaliyetlere katılım sağlamıştır. Su damlalarının peşinde programı kapsamında Genel Müdürlüğümüzde resim sergisi açılmış, çocuklara yönelik su tasarrufu bilinci yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca personelin motivasyonunu arttırmak amacıyla çeşitli spor turnuvaları düzenlenmiştir.



d.16. Basın - Yayın Faaliyetleri

Genel Müdürlüğümüzün kamuoyunu bilgilendirmek adına yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden bilgi paylaşımında bulunmaya devam etmektedir.



Üçer aylık periyotlarla yayınlanan “Su ve Şehir Bursa” isimli derginin yayınına devam edilmiş olup, www.buski.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.



Tablo 54 - Basın ve Halkla İlişkiler Bilgilendirme Çalışmaları

Basın ve Halkla İlişkiler Bilgilendirme Çalışmaları	Adet
Kurumumuzun internet sitesinde yayınlanan haber sayısı	101
Yerel medyada yer alan haber sayısı	86
Basında, Kurumumuza ait yer alan yazı, haber, öneri ve eleştiriye verilen cevap sayısı	5
Kurumumuzun uygulamaya aldığı programlı su kesintisi postu yapımı	150
Kurumumuz sosyal medya ve diğer mecralarında kullanımı için yapılan video sayısı	110
Kurumumuz tarafından çıkarılan 'Su ve Şehir BURSA' dergisi yapımı	4
Kurumumuz sosyal medya hesaplarından yayınlanan görsel materyal üretimi	161
Görsel ve yazılı medya materyali üretimi	371
Kurumumuz şubelerinde yapılan cephe sağıklaştırması	6
Kurumumuzun uygulamaya aldığı programlı su kesintisi yapımı	150
Kurumumuz tarafından cevaplanan CİMER Başvuru sayısı	2.845
Kurumumuz tarafından cevaplanan Bilgi Edinme Başvuru sayısı	64
Valilik Açık Kapı Projesi kapsamında gelen başvuru sayısı	28
Kurumumuza gelen Şikayet Öneri ve Katkı sayısı (Ş.Ö.K.)	26.655
Büyükşehir Belediyesi ve Valilik Koord. cevaplandırılan Muhtarlık başvuru sayısı	332
Çağrı Merkezimize gelen çağrı sayısı	801.135



d.17. Stratejik Yönetim Hizmetleri

Stratejik Yönetim, geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşabilmesi için yapılması gereken işlemlerin tespit edilmesine imkan sağlayan bir yönetim tekniğidir.

FAALİYET RAPORU

Genel Müdürlüğümüz 2023 yılı içerisinde Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu doğrultusunda 2022 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış, onaylanmasının ardından kamuoyunun aydınlatılması adına www.buski.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.



PERFORMANS PROGRAMI

Genel Müdürlüğümüzün 2020-2024 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda uygulanması gereken faaliyet ve göstergeler ile mali kaynak ihtiyaçlarının yer aldığı 2024 Yılı Performans Programı hazırlanmış, onaylanmasının ardından kamuoyunun aydınlatılması adına www.buski.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.



PERFORMANS ESASLI BÜTÇE

BUSKİ Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Performans Esaslı Bütçesi 16/11/2023 tarih, 2023/2 esas no 75 sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup 05/12/2023 tarih, 2023/2 esas no 78 sayılı karar ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Genel Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.



STRATEJİK PLAN

Belediyeler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberi'nin İzleme ve Değerlendirme başlığı altında amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla her 3 ayda bir Stratejik Plan İzleme Raporu ve yıl sonunda ise stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edildiği Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlanmakta olup, birim yöneticilerimiz ile durum toplantıları yapılmaktadır.



100

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI

kutlu olsun



29 Ekim 1923

C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemleri

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır.

5018 sayılı kanun kapsamında kurumumuzda İç kontrol sistemi kurulmuş olup, uygulama yönünden; Mali işlemler süreç akış yönergesi, Etik Kurallar ile ilgili eğitim semineri, görev

ve çalışma yönergeleri, BUSKİ teşkilat yönetmeliği, görev dağılım şemaları, kurum içi kalite tetkikleri ve gözden geçirme toplantısı çalışmaları, imza yetkileri yönergesi, BUSKİ bilgi sistemi, hassas görev prosedürleri, çalışma kontrol prosedürleri, görev teslim raporu ve performans değerlendirme raporu çalışmaları bitirilmiş olup, tüm süreçler tamamlanmıştır.

İç kontrol sisteminin kurulması ve iç kontrol çalışmaları yalnızca üst yönetimin sorumluluğu olmayıp tüm personelin görevinin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Bu anlayıştan hareketle tüm çalışanlarımız iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesi

ve benimsenmesinde etkin rol almış ve kurum çalışmaları bu yaklaşımla yürütülmüştür.

Genel Müdürlüğümüzde ilk İç Kontrol Eylem Planı 2014 yılında hazırlanmış ve 2015 yılında uygulanmaya başlanmıştır. BUSKİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2'şer yıllık olarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

İç Kontrol Sistemini kurumumuzda daha etkin hale getirmek amacı ile İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Yönergesi hazırlanmış ayrıca BUSKİ Bilgi Sistemi'ne İç Kontrol Modülü entegre edilmiştir.

İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ VE STANDARTLARI



Genel Müdürlüğümüz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'nın 2023 yıl sonu itibarı ile eylemlerinin gerçekleştirme durumunu gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

Tablo 55 - İç Kontrol Eylem Planı Gerçekleştirme Tablosu	
Standartlar	Gerçekleşme Oran (%)
Kontrol Ortamı Standartları	
Etik Değerler ve Dürüstlük	100
Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler	100
Personelin Yeterliliği ve Performansı	100
Yetki Devri	100
Risk Değerlendirme Standartları	
Planlama ve Programlama	100
Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi	100
Kontrol Faaliyetleri Standartları	
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri	100
Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi	100
Görevler Ayrılığı	100
Hiyerarşik Kontroller	100
Faaliyetlerin Sürekliliği	100
Bilgi Sistemleri Kontrolleri	100
Bilgi ve İletişim Standartları	
Bilgi ve İletişim	100
Raporlama	100
Kayıt ve Dosyalama Sistemi	100
Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi	100
İzleme Standartları	
İç Kontrolün Değerlendirilmesi	100
İç Denetim	100





KOZA HAN



2.AMAÇ VE HEDEFLER



TEMEL
POLİTİKALAR VE
ÖNCELİKLER


İDARENİN STRATEJİK
PLANINDA YER ALAN
AMAÇ ve HEDEFLER

A

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Kalite Belgelerimiz

BUSKİ Genel Müdürlüğü Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen kalite yönetim sistemleri sertifikalandırılmasında 30 Büyükşehir'e bağlı su ve kanalizasyon idareleri arasında 8 kalite belgesiyle Türkiye'de en fazla kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan Su ve Kanalizasyon İdaresi olma başarısını göstermiştir.



TS EN ISO 9001:2015
TS EN ISO-IEC 17025
TS EN ISO 14001:2015
TS ISO 45001:2018
TS EN ISO-IEC 27001
TS ISO 10002
TS EN ISO 50001:2018
TS EN ISO 31000:2018

Kalite Yönetim Sistemi (09.07.2002)
İçmesuyu ve Atıksu Laboratuvarları Akreditasyon Sertifikası (19.09.2014)
Çevre Yönetim Sistemi (05.08.2019)
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (08.08.2019)
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (05.11.2019)
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (26.01.2021)
Enerji Yönetim Sistemi (29.01.2021)
Risk Yönetim Sistemi (23.02.2023)

Kalite Belgelerimiz

BUSKİ Genel Müdürlüğü Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen;



TS EN ISO 9001:2015
TS EN ISO 50001:2018

Kalite Yönetim Sistemi
Enerji Yönetim Sistemi

belgelerine sahip **Türkiye'deki ilk**
Su ve Kanalizasyon İdaresidir.



TS EN ISO-IEC 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi

TS EN ISO 31000:2018

Risk Yönetim Sistemi



belgelerine sahip **Bursa'daki ilk** Kamu Kurumudur.



SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ



Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.

- Alternatif su kaynakları geliştirmek.
- Sağlıklı içmesuyu temin etmek.
- Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak.
- Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak.

ÇEVREYE DUYARLI HİZMET

Atık suları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.

- Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.



SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI



Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek.

- Alacak takibini etkin yönetmek.
- Hizmet seviyesini geliştirmek.
- Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak ve elektrik enerjisi üretmek.

YENİLİKÇİ VE GELİŞMEYE AÇIKLIK

Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak.

- Personel çalışma verimliliğini arttırmak.
- Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
- Su kültürü ve bilincini oluşturmak.





TELEFERİK

3.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

MALİ
BİLGİLER

PERFORMANS
BİLGİLERİ

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER


A MALİ BİLGİLER

A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları
2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri

Tablo 56 - 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tablosu

Gelir Bütçesi	Bütçe		Gerçekleşme	
	Tutar (TL)	Toplam İçindeki Payı (%)	Tutar (TL)	Toplam İçindeki Payı (%)
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.060.000.000,00	80,53	3.634.255.427,16	78,30
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	106.000.000,00	2,79	111.362.188,45	2,40
5 Diğer Gelirler	634.000.000,00	16,68	896.013.253,45	19,30
6 Sermaye Gelirleri			88.650,00	
TOPLAM	3.800.000.000,00	100,00	4.641.719.519,06	100,00

Bütçeye Göre Gerçekleşme Oranları



2023 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri

Tablo 57 - 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu

	Açıklama	Çevre Koruma Hizmetleri	İşkan ve Toplum Refahı Hizmetleri	Toplam
01	Personel Giderleri	31.517.196,02	266.239.709,07	297.756.905,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.558.695,74	30.665.960,48	34.224.656,22
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	472.596.046,96	1.808.782.796,70	2.281.378.843,66
04	Faiz Giderleri		176.700.765,75	176.700.765,75
05	Cari Transferler		42.407.996,63	42.407.996,63
06	Sermaye Giderleri	1.486.140.648,69	2.327.949.364,46	3.814.090.013,15
	TOPLAM	1.993.812.587,41	4.652.746.593,09	6.646.559.180,50

Tablo 58 - 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tablosu

Gider Bütçesi		Bütçe	Ek Ödenek ve Aktarma Sonrası Bütçe		Gerçekleşme		Ger. Oranı (%)
		Tutar (TL)	Tutar (TL)	Toplam İçindeki Payı (%)	Tutar (TL)	Toplam İçindeki Payı (%)	
01	Personel Giderleri	260.000.000,00	298.167.670,76	4,35	297.756.905,09	4,48	100
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000.000,00	34.311.763,34	0,50	34.224.656,22	0,51	100
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.982.000.000,00	2.286.935.063,51	33,39	2.281.378.843,66	34,32	100
04	Faiz Giderleri	177.000.000,00	176.701.431,54	2,58	176.700.765,75	2,66	100
05	Cari Transferler	30.000.000,00	42.467.748,44	0,62	42.407.996,63	0,64	100
06	Sermaye Giderleri	2.971.000.000,00	4.011.416.322,41	58,56	3.814.090.013,15	57,38	95
	<i>Genel Bütçe</i>	<i>623.000.000,00</i>	<i>413.953.841,95</i>	<i>6,04</i>	<i>404.060.911,87</i>	<i>6,08</i>	<i>98</i>
	<i>Mahalli İdareler</i>	<i>1.150.000.000,00</i>	<i>1.840.210.067,36</i>	<i>26,86</i>	<i>1.834.265.644,79</i>	<i>27,60</i>	<i>100</i>
	<i>Dış Proje Kredileri</i>	<i>1.198.000.000,00</i>	<i>1.757.252.413,10</i>	<i>25,65</i>	<i>1.575.763.456,49</i>	<i>23,71</i>	<i>90</i>
09	Yedek Ödenek	190.000.000,00					
TOPLAM		5.650.000.000,00	6.850.000.000,00	100,00	6.646.559.180,50	100,00	97

Açık / Fazla Bütçe Gerçekleşmeleri

Tablo 59 - Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

Finansman Kodu				Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme
01				İÇ BORÇLANMA	794.000.000,00	221.401.341,10
01	09			Diğer Yükümlülükler	794.000.000,00	221.401.341,10
01	09	51		İller Bankasından	459.000.000,00	185.281.345,31
01	09	51	01	Borçlanma	587.000.000,00	342.909.116,87
01	09	51	02	Ödeme	-128.000.000,00	-157.627.771,56
01	09	52		Diğer Bankalardan	335.000.000,00	36.119.995,79
01	09	52	01	Borçlanma	500.000.000,00	40.000.000,00
01	09	52	02	Ödeme	-165.000.000,00	-3.880.004,21
02				DIŞ BORÇLANMA	1.056.000.000,00	1.601.338.033,19
02	09			Diğer Yükümlülükler	1.056.000.000,00	1.601.338.033,19
02	09	51		Yabancı Bankalar	1.056.000.000,00	1.601.338.033,19
02	09	51	01	Borçlanma	1.198.000.000,00	1.764.528.839,44
02	09	51	02	Ödeme	-142.000.000,00	-163.190.806,25
TOPLAM					1.850.000.000,00	1.822.739.374,29

A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri Açıklamaları

Genel Müdürlüğümüz 2023 mali yılı bütçe gelirleri 3.800.000.000,00 TL tahmin edilip, % 122 oranında bir gerçekleşme ile 4.641.719.519,06 TL olmuştur.

Genel Müdürlüğümüzün 2023 yılı bütçe gelir kalemlerini ret ve iadeler düşürüldükten sonra detaylandırılacak olursak,

- Toplam gerçekleşen gelirler içerisinde en büyük pay olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir kaleminin gelir bütçe gerçekleşmesi içindeki payı % 119 dur. % 87'sini su, atıksu, KDV gelirlerinin oluşturduğu Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 3.060.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuş olup, 3.634.255.427,16 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.
- Diğer Gelirler kaleminizde de 896.013.253,45 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. Bu gelir kaleminin toplam gelir bütçe gerçekleşmesi toplam içindeki payı % 19,30'dur.
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için tahmin edilen gelir tutarı 106.000.000,00 Milyon TL olup % 105 gerçekleşme oranı ile 111.362.188,45 Milyon TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.
- 2023 yılında yapılan hurda lastik satışının yer aldığı Sermaye Gelirleri kaleminde ise 88.650,00 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

2023 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri Açıklamaları

Genel Müdürlüğümüz 2023 mali yılı aktarma sonrası gider bütçemiz 6.850.000.000,00 TL olup, % 97'lik bir oranla gerçekleşme sağlanmıştır.

2023 yılı bütçe gider kalemlerini detaylandırılacak olursak,

- Personel Giderleri 297.756.905,09 TL kullanım ile % 100 gerçekleşme oranına ulaşmış olup, Memur, İşçi, Sözleşmeli ve Geçici Personellerden oluşan Personel Giderlerine ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanun ilgili maddesi gereği "Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz." denilmektedir.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemelerinde 34.224.656,22 TL kullanım ile % 100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Bu gider kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı ise % 0,51' dir.
- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde 2.281.378.843,66 TL kullanım ile % 100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Bu gider kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı ise % 34,32 'dir.
- Faiz Giderleri kaleminde 176.700.765,75 TL kullanım ile % 100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Hem yerel hem de yurtdışı kredilerimizin faiz geri ödemelerini içeren Faiz Giderleri toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı ise % 2,66' sını oluşturmaktadır.
- Cari Transferler de 42.407.996,63 TL kullanım ile % 100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Yasal mevzuatlarımız gereği yapılan ödemeleri kapsayan Cari Transferlerimiz toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı ise % 0,64'ünü oluşturmaktadır.
- Sermaye Giderleri kaleminde 3.814.090.013,15 TL kullanım ile % 95 oranında gerçekleşme meydana gelmiştir. % 52' sini kredi kaynakları % 48'ini ise öz kaynaklarımız ile gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızı içeren Sermaye Giderleri toplam bütçe giderlerimiz içinde % 57,38'lik paya sahiptir.

2023 Mali Yılı Finansman Bütçesine ilişkin Açıklamalar

- 2023 yılında İlbank A.Ş.'den 342.909.116,87 TL ve Halkbank'tan 40.000.000,00 Milyon TL kredi kullanımı yapılmıştır. 2023 yılı içerisinde İlbank A.Ş.'ne 157.627.771,56 TL ve Halkbank'a 3.880.004,21 TL anapara geri ödemesi yapılmıştır.
- 2023 yılında sadece İlbank A.Ş. aracılığıyla Avrupa Yatırım Bankası'ndan 986.751.135,69 TL ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)'nden 777.777.703,75 TL kredi kullanılmıştır. 2011 yılında alınan Alman Kalkınma Bankası (KfW) için 2023 yılında 60.957.400,00 TL, 2012 yılında Avrupa Yatırım Bankasından kullanılan (AYB) kredisi için 2023 yılında 89.407.428,91 TL ve Orhangazi İlçesi Kanalizasyon, AAT ve Yağmursuyu Projesi kapsamında alınan Japon Kalkınma Bankası (JICA)'ndan alınan krediler için ise 2023 yılında 12.825.977,34 TL ve toplamda 163.190.806,25 TL anapara geri ödemesi yapılmıştır.

DAMLA DAMLA BİRİKTİR, GELECEĞİ KORU



Tablo 60 -BUSKİ Genel Müdürlüğü 31.12.2023 Tarihli Bilançosu

AKTİF HESAPLAR		2022	2023	PASİF HESAPLAR				2022	2023
1	DÖNEN VARLIKLAR	773.776.501,62	2.068.434.542,45	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			1.259.597.960,50	1.973.204.419,35
10	HAZIR DEĞERLER	57.941.039,22	254.676.110,02	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR			180.865.112,88	259.712.607,39
102	BANKA HESABI	30.318.756,03	145.553.583,85	300	BANKA KREDİLERİ HESABI			130.257.326,38	178.786.664,73
105	DÖVİZ HESABI	0,00	50.111.598,04	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI			50.607.786,50	80.925.942,66
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	9.305.677,76	20.132.538,38	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI			0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARIN-DAN ALACAKLAR HESABI	18.316.605,43	38.878.389,75	31	KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR			71.324.286,28	116.545.000,93
12	FAALİYET ALACAKLARI	341.032.515,92	502.550.365,36	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI			71.324.286,28	116.545.000,93
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	243.993.487,28	408.216.536,95	32	FAALİYET BORÇLARI			343.860.769,68	541.555.942,72
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	84.200.326,55	80.697.435,50	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI			343.860.769,68	541.555.942,72
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.931.432,07	4.729.122,89	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR			360.506.330,52	555.074.729,45
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.907.270,02	8.907.270,02	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			328.225.439,16	509.244.034,97
13	KURUM ALACAKLARI	11.371.702,50	10.724.104,44	333	EMANETLER HESABI			32.280.891,36	45.830.694,48
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	11.371.702,50	10.724.104,44	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			113.153.636,82	264.314.632,35
14	DİĞER ALACAKLAR	138.652,64	1.037.625,05	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI			29.983.098,48	79.760.553,38
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	138.652,64	1.037.625,05	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVEN-LİK KESİNTİLERİ HESABI			917.323,23	0,00
15	STOKLAR	97.427.589,96	565.926.359,12	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI			15.305.175,29	32.891.447,76

AKTİF HESAPLAR					PASİF HESAPLAR				
			2022	2023				2022	2023
	150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	97.427.589,96	565.926.359,12		363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	9.711.811,68	17.804.441,05
16		ÖN ÖDEMELER	6.881.907,14	12.360.106,49		368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	57.236.228,14	133.858.190,16
	162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.077.164,75	11.109.280,02	37		BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	110.004.249,41	125.838.809,01
	165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	804.742,39	1.250.826,47		372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	100.683.230,09	115.389.865,20
19		DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	258.983.094,24	721.159.871,97		379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	9.321.019,32	10.448.943,81
	190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	258.983.094,24	721.159.871,97	38		GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	79.883.574,91	110.162.697,50
2		DURAN VARLIKLAR	5.702.314.477,33	40.222.340.539,90		381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	79.883.574,91	110.162.697,50
22		FAALİYET ALACAKLARI	18.450.403,01	84.989.819,09	39		DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00
	222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.974.714,84	32.580.731,83	4		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.835.069.066,76	6.198.565.796,86
	226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.475.688,17	52.409.087,26	40		UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	1.465.701.541,35	3.311.874.944,73
23		KURUM ALACAKLARI	389.386.264,45	555.792.551,80		400	BANKA KREDİLERİ HESABI	440.768.537,91	614.454.933,71
	239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	389.386.264,45	555.792.551,80		403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.024.933.003,44	2.697.420.011,02
24		MALİ DURAN VARLIKLAR	51.759.077,04	78.653.907,55	41		UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	817.849.820,01	2.060.628.768,84
	240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	19.887.076,99	19.887.076,99		410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	817.849.820,01	2.060.628.768,84
	241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	31.872.000,05	58.766.830,56	43		DİĞER BORÇLAR	7.805.409,91	56.730.236,52
25		MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.242.717.741,43	39.502.830.480,17		430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.805.409,91	7.805.409,91

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR			2022	2023
	250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI		438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00	48.924.826,61
	251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	47		BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	346.221.053,96	453.569.190,00
	252	BİNALAR HESABI		472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	46.687.789,29	97.177.509,75
	253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	299.533.264,67	356.391.680,25
	254	TAŞITLAR HESABI		48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	197.491.241,53	315.762.656,77
	255	DEMİRBAŞLAR HESABI		481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	197.491.241,53	315.762.656,77
	257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	5		ÖZ KAYNAKLAR	2.381.423.951,69	34.119.004.866,14
	258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	50		NET DEĞER	2.229.306.320,12	2.242.184.562,58
	259	YATIRIM AVANSLARI HESABI		500	NET DEĞER HESABI	2.229.306.320,12	2.242.184.562,58
26		MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	57		GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	400.157.836,06	47.859.678.148,08
	260	HAKLAR HESABI		570	GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	400.157.836,06	47.859.678.148,08
	268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	58		GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-134.631.243,21	-14.489.107.898,99
29		DİĞER DURAN VARLIKLAR		580	GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-134.631.243,21	-14.489.107.898,99
	294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	59		DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-113.408.961,28	-1.493.749.945,53
	299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-113.408.961,28	-1.493.749.945,53
AKTİF HESAPLAR TOPLAMI			PASİF HESAPLAR TOPLAMI			6.476.090.978,95	42.290.775.082,35

A.3. Mali Denetim Sonuçları

Mali denetim,

- İç Kontrol Sistemi
- Dış Denetim Sistemi olmak üzere 2 başlık altında özetlenebilmektedir.

- İç Kontrol Sistemi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz’de uygulanan iç kontrol sistemi,


- Harcama birimleri bünyesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında süreç kontrolü şeklinde yapılan ön mali kontrol uygulaması,
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ön mali kontrol uygulaması şeklinde gerçekleştirilmektedir.

- Dış Denetim Sistemi

Kurum dış denetimini yapmakla yetkili Sayıştay Başkanlığı’nın denetim programı çerçevesinde, kurum hesap ve işlemleri Sayıştay Denetçilerince denetlenmektedir.

Bu doğrultuda Sayıştay Başkanlığı’nın 2022 yılı denetimleri sonucunda düzenlenen “Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu” ile “Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kamu İdaresine Bildirilecek Diğer Hususlar” 2023 yılı içerisinde İdaremize gönderilmiştir.

Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Denetim Sonuçları Raporu’nun “Denetim Görüşünün Dayanakları ” bölümünde herhangi bir bulgu olmayıp, “Diğer Bulgular” Bölümünde 21 adet ve “Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Formu” bölümünde ise 1 adet olmak üzere toplam 22 adet bulgu tespit edilmiştir.





İÇMESUYU VE SULAMA HİZMETLERİ YÖNETİMİ

B

PERFORMANS BİLGİLERİ

B.1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri

2021/1 1.Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi

	Sözleşme Bedeli	155.985.000,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık
	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
	İşin Tamamlanma Tarihi	2.01.2024

İşin Kapsamı ve Durumu

Genel Müdürlüğümüzce yapılan altyapı çalışmaları neticesinde bozulan asfalt yolların bitümlü sıcak karışım asfalt betonu veya bitüm emülsiyonlu sathi kaplama yöntemiyle kaplama, onarım, yama yapılması işidir.



2017/2 2.Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İş

	Sözleşme Bedeli	74.304.840,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl
	Gerçekleşme Düzeyi	% 120
	İşin Tamamlanma Tarihi	3.02.2023
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Genel Müdürlüğümüzce yapılan altyapı çalışmaları neticesinde bozulan asfalt yolların bitümlü sıcak karışım asfalt betonu veya bitüm emülsiyonlu sathi kaplama yöntemiyle kaplama, onarım, yama yapılması işidir.

2023/1 Yılı 2.Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İş

	Sözleşme Bedeli	265.495.500,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl
	Gerçekleşme Düzeyi	% 58,05
	İşin Tamamlanma Tarihi	1.06.2025
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Genel Müdürlüğümüzce yapılan altyapı çalışmaları neticesinde bozulan asfalt yolların bitümlü sıcak karışım asfalt betonu veya bitüm emülsiyonlu sathi kaplama yöntemiyle kaplama, onarım, yama yapılması işidir.



2023/2 1.Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	659.960.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles
🏗️	Gerçekleşme Düzeyi	% 0
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	20.06.2026
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Genel Müdürlüğümüzce yapılan altyapı çalışmaları neticesinde bozulan asfalt yolların bitümlü sıcak karışım asfalt betonu veya bitüm emülsiyonlu sathi kaplama yöntemiyle kaplama, onarım, yama yapılması işidir.



2022/2 Muhtelif Dere Korkuluk Bakım - Onarım ve Çeşitli Tel Çit Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	2.613.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Yıldırım, Karacabey
🏗️	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	16.09.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

İlimizdeki muhtelif derelerdeki yıpranmış ve eksik olan korkuluk imalatının yapılması işidir. Çalışmalar tamamlanmıştır.



Özlüce Kapalı Ambar 3,2 Ton Kaldırma Kapasiteli Çift Kirişli Gezer Köprülü Vinç Sistemi Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması Mal Alımı İşi

📄	Sözleşme Bedeli	1.284.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
🏗️	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	2.02.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Genel Müdürlüğümüz ambarında bulunan malzemelerin yatay ve düşey taşıma işlerinin yapılması sürecidir. Çalışmalar tamamlanmıştır.



2022/1 Muhtelif Hizmet Tesislerinin Bakım ve Onarımının Yapılması İşi

	Sözleşme Bedeli	761.016,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Harmancık, Orhangazi, Mustafakemalpaşa
	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
	İşin Tamamlanma Tarihi	28.12.2023
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Genel Müdürlüğümüze bağlı hizmet tesislerinin rehabilite edilmesi işidir. Bakım ve onarım süreci tamamlanmıştır.



Bursa İli Muhtelif İlçelerde İçme Suyu Sondaj Çalışmalarının Yapılması İşi

	Sözleşme Bedeli	4.779.900,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
	Gerçekleşme Düzeyi	% 97,06
	İşin Tamamlanma Tarihi	30.04.2024
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Yeterli yağış alınamaması sebebi ile mevcut kaynaklardaki verimin azalması ve su kalitesi uygun olmayan mahallelerin su ihtiyacının bulunması nedeniyle acil su sondaj kuyuları açılması işidir.

Bursa İli Merkez İlçelerde İçme Suyu Sondaj Çalışmalarının Yapılması İşi

	Sözleşme Bedeli	7.960.984,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer
	Gerçekleşme Düzeyi	% 110,71
	İşin Tamamlanma Tarihi	27.03.2024
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Yeterli yağış alınamaması sebebi ile mevcut kaynaklardaki verimin azalması ve su kalitesi uygun olmayan mahallelerin su ihtiyacının bulunması nedeniyle acil su sondaj kuyuları açılması işidir.



240.000 Adet Soğuk Su Sayacı Montaj İşi

📄	Sözleşme Bedeli	3.912.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 63
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	25.09.2024
🏢	İşin Kapsamı ve Durumu	

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği gereğince periyodik muayene süresi dolan 10 yıllık teknik ömrünü dolduran sayaçların değiştirilmesi işidir.



Ağ Altyapı Tümlşik Güvenlik Sistemleri Alımı İşi

📄	Sözleşme Bedeli	6.480.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	5.09.2023
🏢	İşin Kapsamı ve Durumu	

2 Adet A Tipi Güvenlik Duvarı, 2 Adet B Tipi Güvenlik Duvarı, 1 Adet E-Posta Koruma Sistemi, 1 Adet Kayıt ve Raporlama Sistemi, 1 Adet WEB Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF), 1 Adet Kimlik Yönetimi ve Doğrulama Sistemi, 1 Adet Anahtar Oluşturma Sistemi, 1 Adet Aldatıcı Güvenlik Duvarı Sistemi, 1 Adet Ağ Erişim Kontrol Sistemi, 1 Adet Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi Sistemi alımı işidir.

Buski Bilgi Ve Scada Sistemleri İş Sürekliliği Çözümü Donanım Ve Destek Paketi Alımı İşi

📄	Sözleşme Bedeli	8.837.964,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	3.07.2023
🏢	İşin Kapsamı ve Durumu	

2 Adet Sunucu, 1 Adet Veri Depolama Ünitesi Tip 1, 1 Adet Veri Depolama Ünitesi Tip 2, 2 Adet Veri Depolama Üniteleri Lisans, Garanti ve Destek Paketi, 8 Adet Veri Yolu Bağdaştırıcısı alımı işidir.



Uzaktan İnteraktif Fatura Tahsilatı Ve Ön Ödemeli Sayaçlar İçin Kontör Yükleme Sistemi Alınması İşi

📄	Sözleşme Bedeli	2.520.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, İnegöl, Nilüfer
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	2.10.2023
🏢	İşin Kapsamı ve Durumu	

1 Adet Nakit ve Kredi Kartlı Otomatik Vezne Donanımı, 2 Adet Kredi Kartlı Otomatik Vezne Donanımı, 2 Adet Dış Mekan Kabini A Tipi, 1 Adet Dış Mekan Kabini B Tipi, 1 Adet Otomatik Vezne Yazılımı ve 1 Adet Garanti ve Kurulum Hizmetleri alımı işidir.



68 Adet Otomatik Ödeme Vezneleri Bakımı Ve Arıza Giderimi Hizmet Alımı İşi

📄	Sözleşme Bedeli	623.546,40 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Görükle, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	28.11.2023
🏢	İşin Kapsamı ve Durumu	

68 Adet OÖV cihaz bakımı ve arıza giderimi işidir.

Varlık Yönetimi ve Entegre Yönetim Sistemleri Satın Alınması İşi

📄	Sözleşme Bedeli	8.449.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 47,34
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	30.09.2024
🏢	İşin Kapsamı ve Durumu	

Abonelerin içme suyu sarfıyatı, atık su miktarlarının ve diğer gelir kalemlerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin doğru ve zamanında yapılması, VYS ve EYS yazılımının işletilmesi, 7/24 abone veri tabanı sunucusu bakımı ve yönetimi, yasa ve yönetmeliklerden doğan değişikliklerin yapılması, vatandaşlardan gelen taleplerden iş emri oluşturulması, ekibe yönlendirilmesi ve vatandaşlara bilgi verilmesini kapsamaktadır.



**Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı)
Tamamlama Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	20.587.300,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 0
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	15.12.2024
🏠	İşin Kapsamı ve Durumu	

Fesih olan yapım işinde kazı-dolgunun %80' i tamamlanmıştır. Tamamlama yapım işinde şantiye kurulma aşamasındadır. Brüt depolama hacmi 83.000 m³ tür.

**Harmancık Gedikören Sulama Tesisi Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	3.942.645,60 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Harmancık
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 0
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	12.10.2023
🏠	İşin Kapsamı ve Durumu	

Keson kuyudan elektro pompajla yapılacak olan 225 tonluk sulama havuzuna suyu terfi edip, 3.000 m dağıtım hattıyla tarım arazilerine iletilmesi planlanmaktadır.

**İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı)
Tamamlama Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	8.204.905,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 82,47
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	8.09.2024
🏠	İşin Kapsamı ve Durumu	

Tel çit ve Membran uygulaması tamamlandı. Derivasyon hattı tamiratları, platform ve diğer imalatların tamamlama çalışmaları devam etmektedir.



İnegöl Turgutalp Sulama Tesisi Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	4.884.028,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 82
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	16.06.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

5.858 m dağıtım hattı inşaatı tamamlanmıştır. Su alım yapısı inşaatı süreci devam etmektedir.



İznik Hacıosman Mahallesi Kırkharman Mevkii Sulama Tesisi Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	3.954.830,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İznik
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 60
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	5.12.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Mevcut açık kanal kapalı sisteme çevrilmiştir. 225 tonluk havuz ve 1 adet su alım yapısı inşaatı süreci devam etmektedir.

İznik Kırıntı - Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Tamamlama Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	25.852.245,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İznik
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 0
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	16.11.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Derivasyon tamamlanmak üzere olup, kazı dolgu işlemlerinden sonra membran kaplama yapılması planlanmaktadır.



Karacabey Keşlik Göleti Derivasyon Hattı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	5.824.124,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 78
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	14.06.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

6.385 metre derivasyon hattı tamamlanmış olup su alım yapısı inşaatı devam etmektedir.



Keles Mentеше Sulama Göleti (Membranlı) Tamamlama Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	14.294.070,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Keles
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 0
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	15.12.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Önceden fesih edilen sulama göleti inşaatının tamamlama yapım işi çalışmaları devam etmektedir. Depolama hacmi 97.000 m³ tür.



Mudanya Orhaniye ve Osmangazi Ovaakça Tarımsal İlaçlama Suyu Deposu Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	1.258.330,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya ve Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 50
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	18.03.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Osmangazi Ovaakça tarımsal ilaçlama suyu deposu inşaatı tamamlanmış olup Mudanya Orhaniye Mahallesi'nde çalışmalar devam etmektedir.



Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti Tamamlama Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	21.499.389,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 0
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	7.09.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Derivasyonu tamamlanmış olup, kazı dolgu işlerine başlanması planlanmaktadır.



Orhaneli İkizoluk Yeşiller Sulama Tesisi Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	8.233.234,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 12,44
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	1.09.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Daire Başkanlığımız tarafından 2023 yılında yapımı tamamlanan Orhaneli İkizoluk Yeşiller Sulama Gölünden 35 lt su alınarak tarım arazilerine dağıtılması planlanmaktadır.

Osmangazi İsmetiye Tarımsal İlaçlama Deposu Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	526.812,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 40
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	28.02.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Tarımsal ilaçlama deposu inşaatı devam etmektedir.



Yenişehir Osmaniye Sulama Tesisi Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	8.893.500,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
🏗️	Gerçekleşme Düzeyi	% 27
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	15.09.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

İnşaatı tamamlanan 2 adet sulama havuzuna kuyulardan toplan 2.450 m terfi hattıyla su basılacak olup toplam 12.000 m isale hattıyla ile tarım arazilerine dağıtılması planlanmaktadır.



49 Kalem Orhangazi, İznik, Gemlik İlçeleri Mikro Dalga Haberleşme Sistemi Kurulumu Cctv Malzemesi Alımı İşi

📄	Sözleşme Bedeli	1.214.795,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi, İznik, Gemlik
🏗️	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	29.12.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Depo ve terfi istasyonlarının güvenliğini sağlanması ve SCADA sisteminin merkezden kontrol edilmesi için gerekli olan haberleşme sistemi kurulması ve malzeme alınması işidir.



9 Kalem Jeneratör Alımı

📄	Sözleşme Bedeli	11.746.259,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
🏗️	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	25.07.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Tesislerimizde elektrik kesintisi yaşanması veya arıza meydana gelmesi durumunda hizmetlerimizde aksama olmaması amacıyla jeneratör alınması işidir.



208 Kalem Kablo ve Elektrik Sarf Malzemesi Alımı İşi 1. Kısım

📄	Sözleşme Bedeli	2.742.624,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	29.12.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Yeni devreye alınan pompa ve derin kuyu tesislerimizin panolarında kullanılmak üzere malzeme alınması işidir.



107 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı İşi

📄	Sözleşme Bedeli	2.069.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	16.11.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Hizmetlerin devamını sağlamak adına muhtelif işlerde kullanılmak üzere alınan elektrik malzemelerini kapsamaktadır.

208 Kalem Kablo ve Elektrik Sarf Malzemesi Alımı İşi

📄	Sözleşme Bedeli	2.447.998,50 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	26.09.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Hizmetlerin devamını sağlamak adına muhtelif işlerde kullanılmak üzere alınan elektrik malzemelerini kapsamaktadır.



2022-2023 Yılları Merkez ve İlçeler Katodik Koruma Yapımı

	Sözleşme Bedeli	20.000.000,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
	Gerçekleşme Düzeyi	% 97,87
	İşin Tamamlanma Tarihi	24.02.2024
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Çelik boru hatlarımızın korozyona karşı korunması için yapılan çalışmaları kapsamaktadır.



50 Metre 160/10 Latis Haberleşme Kulesi Temin ve Kurulum İş'i

	Sözleşme Bedeli	1.854.105,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
	İşin Tamamlanma Tarihi	2.11.2023
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Doğal afetlere karşı SCADA ve güvenlik sisteminin zarar görmemesi için yapılan haberleşme kulesi temin ve kurulumu işidir.

Acemler Kampüsü Scada Binası AG Enerji Dönüşümü Montajlı Malzeme Alımı

	Sözleşme Bedeli	891.705,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
	İşin Tamamlanma Tarihi	25.12.2023
	İşin Kapsamı ve Durumu	

OG hattında meydana gelen arızalardan dolayı SCADA binasının elektriğinin sağlanmasında problem yaşanmaması için AG seviyesinden yeni abonelik alınması işidir.



Mikrodalga Haberleşme ve Cctv Malzeme Alımı İşi

📄	Sözleşme Bedeli	3.093.124,50 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	30.12.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Depo ve terfi istasyonlarının güvenliğinin ve SCADA sisteminin merkezden kontrolünün sağlanması için gerekli olan mikrodalga haberleşme ve malzeme alımı işidir.



2023 Yılı 1. Grup Merkez ve İlçeler Enerji Nakil Hattı Yapımı

📄	Sözleşme Bedeli	13.444.016,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	30.12.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Yeni devreye alınacak tesislerimizin elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan enerji nakil hattı işidir.

208 Kalem Kablo ve Elektrik Sarf Malzemesi Alımı İşi 2. Kısım

📄	Sözleşme Bedeli	1.306.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	1.11.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Hizmetlerin devamını sağlamak adına muhtelif işlerde kullanılmak üzere alınan elektrik malzemelerinin alımı işidir.



2023 Yılı Son Kaynak Tedarik Tarifesi Elektrik Enerjisi Alımı

📄	Sözleşme Bedeli	614.277.276,79 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 43,81
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	31.08.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Yasal düzenlemeler gereği 1.000.000 kwh ve üzeri yıllık tüketime sahip aboneler için yapılan alım işidir.

**Buski Su Depoları Pompa İst. ve Diğer Tesislerin Yeşil Alan Bakım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	1.895.750,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 78,28
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	29.12.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Su depoları pompa istasyonları ve diğer tesislerin yeşil alan bakım ve onarım işidir.

**95 Kalem Düşey Milli Çok Kademeli Yerüstü Pompası Ve Motoru Alımı**

📄	Sözleşme Bedeli	7.667.700,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	2.11.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

İçmesuyu ve atıksu terfi istasyonlarında hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla yapılan alım işidir.



9 Kalem Kanal Açma Hortumu Alım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	2.018.956,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	31.10.2023
🏢	İşin Kapsamı ve Durumu	

Sürekli hizmetlerin devamı için gerekli olan kanal açma hortumu satın alımı işidir.



17 Ay Süre İle Muhtelif Kamyon ve İş Makinesi Kiralanması

📄	Sözleşme Bedeli	31.916.140,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 39,52
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	8.10.2024
🏢	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kurumumuz faaliyetlerinde kullanılmak üzere muhtelif kamyon ve iş makinesi kiralınması işidir.

500 Kw GES Tesisi Yapımı

📄	Sözleşme Bedeli	14.599.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 25
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	20.06.2024
🏢	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kurumumuzun enerji ihtiyacının karşılanması için yapılan güneş enerjisi sistemi tesisi işidir.



551 Kalem İçme Suyu ve Atıksu Terfi Tesisleri İle Bakımı Onarımı İşletilmesi Hizmeti Alımı

📄	Sözleşme Bedeli	5.245.002,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 85,75
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	30.12.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

İçmesuyu ve atıksu terfi merkezlerinin onarım, bakım ve işletilmesi hizmeti alımı işidir.

**3 Ay Süre İle Muhtelif Binek Araç, Kamyonet, Minibüs, Kamyon ve İş Makinesi Kiralanması**

📄	Sözleşme Bedeli	14.952.403,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 87,59
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	23.05.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kurumumuz faaliyetlerinde kullanılmak üzere muhtelif binek araç, kamyonet, minibüs, kamyon ve iş makinesi kiralınması işidir.

**17 Ay Süre İle Muhtelif Binek Araç, Kamyonet, Minibüs, Kamyon Kiralanması İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	139.748.679,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 40,78
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	13.10.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kurumumuz faaliyetlerinde kullanılmak üzere muhtelif binek araç, kamyonet, minibüs, kamyon ve iş makinesi kiralınması işidir.



18 Kalem Araç Lastiği Alınması

📄	Sözleşme Bedeli	1.592.929,66 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	31.05.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

İdaremiz hizmetlerinde kullanılan araçların lastik alımı işidir.



Orhangazi Hastane Altı ve Esence Yeni Su Deposuna Vinç Sistemi Temini Ve Montajı

📄	Sözleşme Bedeli	676.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi ve Mudanya
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	29.12.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Su depolarında bakım, onarım ve olası arıza durumlarında iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli olan vinç sistemi temini ve montajı işidir.

2023/5 Orhangazi 75. Yıl Su Deposu Bakım Onarım ve Devreye Alınması İnşaatı Yapım İşİ

📄	Sözleşme Bedeli	1.104.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 110,30
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	12.04.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kayıp kaçağın önüne geçilmesi, yeni açılan yerleşim yerlerinin su ihtiyacının karşılanması amacıyla suyun depolanması işidir.



2022 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri İçmesuyu Eysel Bağlantıları Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	5.071.764,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 112,02
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	22.08.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde yeni su aboneli olmuş kişilerin içmesuyu evsel hattının bağlanması ve su saatlerinin takılması, su şebekesi olmayan cadde ve sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işidir.

**2023 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri İçmesuyu Eysel Bağlantılarının Yapılması İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	6.137.080,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 76,10
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	20.05.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde yeni su aboneli olmuş kişilerin içmesuyu evsel hattının bağlanması ve su saatlerinin takılması, su şebekesi olmayan cadde ve sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işidir.

**Yıldırım İlçesi Zeyniler Mahallesi İçmesuyu Rehabilitasyonu ve Eysel Bağlantı Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	1.393.700,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 109,17
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	20.02.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

İçmesuyu şebeke ve isale hatları ile su depoları imalatları yapılarak arızaların önüne geçilmesi, bakım onarım maliyetlerini düşürülmesi ve su kayıp kaçak oranını en aza indirilmesi amaçlanan yapım işleridir.



2023/2 Muhtelif Su Depoları İnşaatı Yapım İşi (D1 Su Deposu Alanına 1000 m³ ve 500 m³ 2 Adet Depo Yapılması)

📄	Sözleşme Bedeli	18.895.400,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 26,45
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	5.06.2025
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kayıp kaçağın önüne geçilmesi, yeni açılan yerleşim yerlerinin su ihtiyacının karşılanması amacıyla suyun depolanması işidir.



2023/1 Hamamlıkzık Şebeke Rehabilitasyon ve Yeni Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	6.399.000,10 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 26,07
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	6.01.2025
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kayıp kaçağı önleyip, teknik özelliğini yitirmiş mevcut boruları yenileyip arızaların önüne geçerek bakım onarım maliyetlerinin düşürülmesi işidir.

2022/2 Karacabey İlçesi Muhtelif Mahallelerde Beton ve Parke Taşı Tamiratları Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	7.587.500,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 119,98
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	15.02.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Karacabey İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Projesi işi kapsamında içmesuyu hattı döşenen güzergahlarda parkelerin tamiratlarının yapılması işidir.



**2023/2 Muhtelif Köylere Prefabrik Betonarme
Su Deposu Satın Alımı İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	9.392.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 63
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	26.11.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kayıp kaçağın önüne geçilmesi, yeni açılan yerleşim yerlerinin su ihtiyacının karşılanması amacıyla suyun depolanması işidir.

**Muhtelif Mahallerde Kilitli Parke Taşı Yapım
İşi. (İznik Tacir - Müşkülü Mah.)**

📄	Sözleşme Bedeli	3.198.280,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İznik
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 67,09
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	17.11.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

İznik - Tacir mahallesinde parke taşı tamirâtı, içmesuyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve tamirat yapılması işidir.

**2022/1 Karacabey - Mustafakemalpaşa İlçeleri
Muhtelif Kırsal Mahallelerde Foseptik İnşaatı
Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	4.182.500,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa ve Karacabey
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 44,03
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	1.01.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri muhtelif mahallelerinde foseptik inşaatı yapım işidir.



2023/2 Muhtelif Mahallelerde Bordür ve Parke Taşı Tamiratları Yapım İşi

	Sözleşme Bedeli	15.408.500,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
	Gerçekleşme Düzeyi	% 120
	İşin Tamamlanma Tarihi	14.09.2024
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif ilçelerde İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Projesi işi kapsamında içmesuyu hattı döşenen güzergahlarda parkelerin tamiratlarının yapılması işidir.



2023/3 Mustafakemalpaşa ve Karacabey İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Bordür ve Parke taşı Tamiratları Yapım İşi

	Sözleşme Bedeli	23.420.150,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa ve Karacabey
	Gerçekleşme Düzeyi	% 45,67
	İşin Tamamlanma Tarihi	24.11.2024
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Mustafakemalpaşa ve Karacabey İlçelerinde İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Projesi işi kapsamında içmesuyu hattı döşenen güzergahlarda parkelerin tamiratlarının yapılması işidir.



2022/2 Muhtelif Köy Depo İnşaatı İşi

	Sözleşme Bedeli	12.947.375,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
	Gerçekleşme Düzeyi	% 70,61
	İşin Tamamlanma Tarihi	7.07.2024
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kayıp kaçağın önüne geçebilmek, yeni yerleşim yerlerinin açılması, suyun depolanması işidir.



2022/2 Muh. Mah. İçm. Şbk. Reh. ve Yeni Şeb. ve İsale Hattı İnş. İşi (Karacabey İlçesi Sanayi Bölgesi)

📄	Sözleşme Bedeli	3.500.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 66,26
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	29.05.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kayıp kaçağı önleyip, teknik özelliğini yitirmiş mevcut boruları yenileyip arızaların önüne geçerek bakım onarım maliyetlerinin düşürülmesi işidir.

**2022/1 Muh. Mah. İçm. İsale Hattı İnş. İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	17.188.671,50 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 39,42
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	22.08.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kayıp kaçağı önleyip, teknik özelliğini yitirmiş mevcut boruları yenileyip arızaların önüne geçerek bakım onarım maliyetlerinin düşürülmesi işidir.

**2022/1 Muh. Mah. İçm. Şbk. Reh. ve Yeni Şeb. ve İsale Hattı İnş. İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	9.389.985,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 75,38
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	1.08.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kayıp kaçağı önleyip, teknik özelliğini yitirmiş mevcut boruları yenileyip arızaların önüne geçerek bakım onarım maliyetlerinin düşürülmesi işidir.



2022/1 Pınar Kaynakları İnş. İşi

📄	Sözleşme Bedeli	5.683.445,25 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 34,90
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	28.07.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

İçmesuyu kaynaklarındaki suyun içmesuyu depolarına taşınıp şebekeye verilmesi işidir.



2022/1 Muhtelif Abone Talepleri İçmesuyu Şebeke Hattı İşi (Dökümcüler Sitesi)

📄	Sözleşme Bedeli	3.728.334,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 5,95
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	13.09.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Yeni imara açılmış yerleşim bölgelerinde BUSKİ aboneilerine su temin edilmesi işidir.

2022/1 Muhtelif Su Depoları İnş. İşi

📄	Sözleşme Bedeli	9.120.584,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 76,45
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	6.10.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kayıp kaçağın önüne geçebilmek, yeni yerleşim yerlerinin açılması, suyun depolanması işidir.



2022/1 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi

📄	Sözleşme Bedeli	9.452.212,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 21,85
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	25.06.2024
🏠	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kayıp kaçağın önüne geçilmesi, yeni açılan yerleşim yerlerinin su ihtiyacının karşılanması amacıyla suyun depolanması işidir.



2022/3 Kestel - Çataltepe Su Deposu İnşaatı ve Depo Bağlantıları Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	16.543.999,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Kestel
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 75,63
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	8.08.2024
🏠	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kayıp kaçağın önüne geçebilmek, yeni yerleşim yerlerinin açılması, suyun depolanması işidir.



2023/1 Muhtelif Abone Talepleri İçme Suyu Şebeke İşi

📄	Sözleşme Bedeli	12.488.032,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer, Mudanya, Gemlik
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 35,31
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	20.09.2024
🏠	İşin Kapsamı ve Durumu	

Yeni imara açılmış yerleşim bölgelerinde BUSKİ abonelerine su sağlanması işidir.



2023/2 Muhtelif Abone Talepleri İçme Suyu Şebeke İşİ

📄	Sözleşme Bedeli	12.765.719,55 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Yıldırım, Kestel, Gürsu
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 43,41
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	14.10.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Yeni imara açılmış yerleşim bölgelerinde BUSKİ abonele-
rine su temin edilmesi işidir.



İnegöl 2. Kademe İçmesuyu İletim Hatları (Su Depoları) İnşaatı Yapım İşİ

📄	Sözleşme Bedeli	21.382.931,44 EUR
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 51,45
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	4.06.2025
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

İçmesuyu şebeke ve isale hatları ile su depoları imalatları yapılarak arızaların önüne geçilmesi, bakım onarım maliyetlerini düşürülmesi ve su kayıp kaçak oranını en aza indirilmesi amaçlanan yapım işleridir.

İnegöl 2. Kademe İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşİ

📄	Sözleşme Bedeli	13.952.725,05 EUR
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 18,06
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	12.04.2025
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

İçmesuyu şebeke ve isale hatları ile su depoları imalatları yapılarak arızaların önüne geçilmesi, bakım onarım maliyetlerini düşürülmesi ve su kayıp kaçak oranını en aza indirilmesi amaçlanan yapım işleridir.



İnegöl (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi

📄	Sözleşme Bedeli	14.215.302,00 USD
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 87,85
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	24.08.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

İçmesuyu şebeke ve isale hatları ile su depoları imalatları yapılarak arızaların önüne geçilmesi, bakım onarım maliyetlerini düşürülmesi ve su kayıp kaçak oranını en aza indirilmesi amaçlanan yapım işleridir.



Karacabey (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi

📄	Sözleşme Bedeli	3.877.699,41 USD
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 81,38
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	31.10.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

İçmesuyu şebeke ve isale hatları ile su depoları imalatları yapılarak arızaların önüne geçilmesi, bakım onarım maliyetlerini düşürülmesi ve su kayıp kaçak oranını en aza indirilmesi amaçlanan yapım işleridir.



Mustafakemalpaşa (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi

📄	Sözleşme Bedeli	6.975.000,00 EUR
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 63,20
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	11.05.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

İçmesuyu şebeke ve isale hatları ile su depoları imalatları yapılarak arızaların önüne geçilmesi, bakım onarım maliyetlerini düşürülmesi ve su kayıp kaçak oranını en aza indirilmesi amaçlanan yapım işleridir.



2022/1 İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallerde Acil Eysel Bağlantı ve Ana Hat İlaveleri Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	4.049.993,10 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 88,23
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	28.07.2023
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde içmesuyu ve kanalizasyon çalışmaları yapılması işidir.



2022/1 İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallelerde Acil Eysel Bağlantı ve Ana Hat İlaveleri Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	2.564.359,75 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 96,43
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	9.02.2023
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde içmesuyu ve kanalizasyon çalışmaları yapılması işidir.



2023/3 İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallelerde Acil Eysel Bağlantı ve Ana Hat İlaveleri Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	9.276.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 105,39
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	26.07.2024
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

Yeni abone başvurularının evsel bağlantılarının yapılması ve altyapı bulunmayan yeni açılmış sokaklarda içme suyu ve kanalizasyon ana hatlarının yapılması işidir.



BUSKİ İnegöl Şube Müdürlüğü Prefabrik Şantiye Binası Montajlı Mal Alım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	2.150.125.00 TL
🏢	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 98
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	29.04.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

BUSKİ İnegöl Şube Müdürlüğü prefabrik şantiye binası yapılması işidir.



2023/1 İnegöl Muhtelif Mahallelerde Parça Parke Taşı Tamirâtı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	1.698.500,00 TL
🏢	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 94,55
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	15.02.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

İnegöl ilçesi parke tadilat ve yapım işlerini kapsamaktadır.

2023/2 Karacabey - Mustafakemalpaşa İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Yeni ve Parça Parke Tamirâtı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	10.928.750,00 TL
🏢	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 79,63
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	01.08.2025
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri muhtelif mahallelerinde parke tamirâtı işidir.



2023/2 Mustafakemalpaşa - Karacabey İlçeleri Kaptaj - Su Alma Yapıları İşi

📄	Sözleşme Bedeli	1.940.400,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 46,82
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	28.09.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri kaptaj - su alma yapıları yapımı işidir.



Bursa İli Muhtelif Mahallelerde Parke Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	2.233.265,21 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 79,31
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	8.02.2025
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde altyapı çalışmaları sırasında bozulan parke yolların kaplama imalatları tamamlanmıştır.

2022/2 Mustafakemalpaşa - Karacabey İlçeleri Kaptaj - Su Alma Yapıları İşi

📄	Sözleşme Bedeli	1.182.500,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa ve Karacabey
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 96,26
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	23.09.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri kaptaj - su alma yapısının yapılması işidir.





ATIKSU HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ

Çınarcık İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	44.869.000,00 EUR
🏢	Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Mudanya
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 0
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	3.05.2026
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kayapa Mahallesi'ne yapılacak olan 300.000 m³/gün kapasiteli tesis ile Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel ve Mudanya ilçeleri ve ilimizde kayıtlı endüstri parkları dahil olmak üzere tüketicilere 2050 yılı ve sonrasında kapsayacak şekilde sürdürülebilir ve yüksek standartlarda içme suyu sağlanması amaçlanmaktadır.



Orhaneli Atıksu Arıtma Tesisinin Kapasitesinin Arttırılması ve Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Yapıları ve Ön Arıtma Ünitelerinin Rehabilitasyonu Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	15.518.030,00 EUR
🏢	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi ve Orhaneli
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 49,09
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	22.10.2024
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

Doğu AAT ön arıtma ünitesi 240.000 m³/gün kap. olup yapılacak olan reh. sonrasında ön arıtma ünitesi 800.000 m³/gün kap. ulaşacaktır. Orhaneli AAT 1.000 m³/gün kapasiteli olup kap. artışıyla 4.400 m³/gün' e çıkacak ve AB standartlarında ileri biyolojik kentsel arıtma sonucunda arıtılmış atıksular Ultraviyole dezenfeksiyondan sonra Orhaneli Çayı' na verilecektir.

Yeniköy (Karacabey) Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı, Orhangazi ve İznik Atıksu Arıtma Tesisleri Kapasite Artışı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	24.980.056,56 EUR
🏢	Çalışma Yapılan İlçe	İznik, Orhangazi, Karacabey
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 46,31
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	22.08.2024
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

Yeniköy AAT 4.400 m³/gün kap. olması planlanmaktadır. Orhangazi AAT 17.000 m³/gün kap. olup artışla 51.000 m³/gün kap. ulaşacak, İznik AAT 9.000 m³/gün kap. olup revizyon ile nihai kap. 24.000 m³/gün' e çıkacaktır. AB standartlarında ileri biyo. kentsel arıtma sonucunda arıtılmış atıksular Ultraviyole dez. sonra deşarj edilmektedir.



**2023 Osmangazi İlçesi 1.Bölge Kanalizasyon
Hatları ve Eysel Bağlantıları Yapım Onarım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	4.366.666,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 79,46
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	3.08.2023
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Osmangazi ilçesinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda, tıkanmış yenilenmesi gereken kanalizasyon evsel hatları, onarımı gereken kanalizasyon hattı şebekelerinin onarımının yapılması işidir.

**2023 Osmangazi İlçesi 2.Bölge Kanalizasyon
Hatları ve Eysel Bağlantıları Yapım Onarım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	3.242.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 47,70
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	7.08.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Osmangazi ilçesinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda, tıkanmış yenilenmesi gereken kanalizasyon evsel hatları, onarımı gereken kanalizasyon hattı şebekelerinin onarımının yapılması işidir.

**2021 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Hatları ve Eysel
Bağlantıları Yapım Onarım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	3.243.610,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 118,10
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	24.11.2023
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Osmangazi ilçesinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda, tıkanmış yenilenmesi gereken kanalizasyon evsel hatları, onarımı gereken kanalizasyon hattı şebekelerinin onarımının yapılması işidir.



BUSKİ İçmesuyu - Atıksu Arıtma Tesisleri ve Çamur Yakma Tesisi İşletme ve Bakımı Hizmetleri Alım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	408.861.955,94 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Tüm İlçeler
🏗️	Gerçekleşme Düzeyi	% 43,46
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	30.09.2024
🏠	İşin Kapsamı ve Durumu	

Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan İAT, Paket İAT, çamur yakma tesisi, AAT, Paket AAT, Doğal AAT ve Atıksu Terfi Merkezinin işletme ve bakım işlerinin yapılması işidir.



Uludağ Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	80.265.088,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
🏗️	Gerçekleşme Düzeyi	% 7,94
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	18.05.2025
🏠	İşin Kapsamı ve Durumu	

2.240 m³/gün kapasiteli İleri Biyolojik Arıtma Prosesine sahip atıksu arıtma tesisinde, membran bioreaktör teknolojisi ile Uludağ Oteller Bölgesi 1. ve 2. Bölge, Kızılay Kamp Alanı, Çobankaya, Sarıalan, Kadiyayla Bölgeleri kaynaklı olarak atık suyun arıtılması sağlanacaktır. Yapım işi çalışmalarına başlanılmıştır.

Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	43.496.003,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Büyükorhan
🏗️	Gerçekleşme Düzeyi	% 37
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	13.11.2024
🏠	İşin Kapsamı ve Durumu	

2.074 m³/gün kapasiteli İleri Biyolojik Arıtma Prosesine sahip atıksu arıtma tesisi ile, Büyükorhan ilçemiz, Susurluk Havzası kapsamında yer aldığından, bölgedeki atıksuların toplanarak atıksu arıtma tesisi ile alıcı ortama deşarjının kontrollü bir şekilde yapılması ile Büyükorhan Barajı, Sadağı Kanyonu, Orhaneli Çayı ve Çınarcık Barajı su kalitesinde iyileşme sağlanması planlanmaktadır.



**Muhtelif Tesislerde Çamur Susuzlaştırma Üniteleri
Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	34.890.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer, Yenişehir, Mudanya
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 100
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	31.12.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Nilüfer, Yenişehir ve Batı atıksu arıtma tesislerinden çıkacak atık çamurun susuzlaştırılması ve bertaraf maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmış olup iş tamamlanmıştır.

**2021 Harmancık - Keles İlçeleri Altyapı İnşaatı
Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	2.989.049,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Harmancık ve Keles
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 49,34
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	10.06.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde içmesuyu ve kanalizasyon çalışmaları yapılması işidir.

**Mustafakemalpaşa Şapçı - Kömürcükadı Paket
İçmesuyu Arıtma Tesisleri Revizyon Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	9.600.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 0
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	15.08.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	


Mustafakemalpaşa ilçesi Şapçı Mahallesi'nde bulunan mevcut paket içmesuyu arıtma tesisine durultucu ünitesi yapılması ile bulanıklık gideriminin sağlanması amaçlanmaktadır.



Mustafakemalpaşa Terfi Merkezi Yapım İşi

	Sözleşme Bedeli	54.930.378,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
	Gerçekleşme Düzeyi	% 0
	İşin Tamamlanma Tarihi	11.04.2025
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş, Tatkavaklı ve Fevzide mahallelerine yapılacak betonarme terfi merkezleri ile toplanan atıksuların MKP Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesi sağlanacaktır.

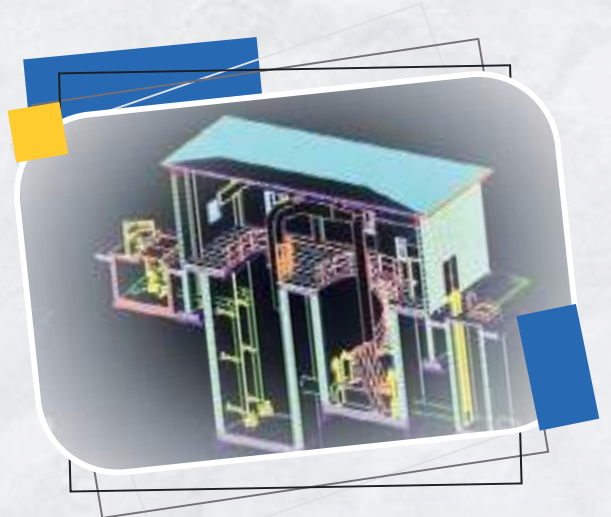

Osmangazi, Demirtaş Paket İçmesuyu Arıtma Tesisinin Yapım İşi

	Sözleşme Bedeli	81.870.000,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
	Gerçekleşme Düzeyi	% 56
	İşin Tamamlanma Tarihi	10.04.2024
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Osmangazi İlçesi Doğanevler ve İsmetiye bölgelerinde açılmış olan derin su kuyularından çıkan suların kalitesinin artırılması için 600 lt./sn. kapasiteli Osmangazi Demirtaş İçmesuyu Arıtma Tesisinin yapımı amaçlanmıştır.

Keles Atıksu Arıtma Tesisinin Yapım İşi

	Sözleşme Bedeli	64.985.000,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Keles
	Gerçekleşme Düzeyi	% 39,25
	İşin Tamamlanma Tarihi	21.03.2024
	İşin Kapsamı ve Durumu	

1.843 m³/gün kapasiteli İleri Biyolojik Arıtma Prosesine sahip atıksu arıtma tesisi ile, Keles İlçe merkezinde halihazırda arıtma yapılmadan alıcı ortama verilen atıksuların toplanması kapsamında kanalizasyon hattının yapılması inşaatı tamamlanmış olup toplanan atıksuların arıtılması sağlanacaktır.



2021 İnegöl - Yenişehir İlçeleri Alt Yapı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	5.145.979,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl ve Yenişehir
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 95,65
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	28.06.2023
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Mevcut hatların yetersiz olması ve arıza çıkarması, yeni yerleşim yerlerinin imara açılmasından dolayı yapılan alt-yapı inşaatı yapım işidir.



2021 İzmit - Orhangazi İlçeleri Altyapı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	4.234.737,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İzmit ve Orhangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 119,39
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	16.10.2023
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

İçmesuyu ve kanalizasyon çalışması mevcut hatların yetersiz olması ve arıza çıkarması, yeni yerleşim yerlerinin imara açılmasından dolayı yapılan altyapı inşaatı yapım işidir.



2021 Mustafakemalpaşa - Karacabey İlçeleri Altyapı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	4.644.431,24 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa ve Karacabey
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 118,95
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	9.06.2023
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Mevcut hatların yetersiz olması ve arıza çıkarması, yeni yerleşim yerlerinin imara açılmasından dolayı yapılan alt-yapı inşaatı işidir.



2021 Orhaneli - Büyükorhan İlçeleri Altyapı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	3.143.090,45 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli ve Büyükorhan
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 96,20
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	4.06.2023
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Orhaneli - Osmaniye mahallesinde içmesuyu çalışması kapsamında yapılması işidir.



2022/2 Büyükorhan Orhaneli İlçeleri Muhtelif Kırsal Mahallerde Foseptik İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	5.862.505,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Büyükorhan ve Orhaneli
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 55,84
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	30.11.2023
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Büyükorhan ve Orhaneli ilçeleri muhtelif kırsal mahallelerde foseptik inşaatı yapımı işidir.

2022/1 Büyükorhan İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	3.319.776,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Büyükorhan
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 95,41
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	3.07.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde içmesuyu ve kanalizasyon çalışmaları yapılması işidir.



2022/8 Orhaneli İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	3.999.450,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 43,24
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	30.05.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Orhaneli ilçesi Osmaniye - Çatak mahallesinde içmesuyu ve kanalizasyon çalışmaları yapım işidir.



2022/10 Yenişehir İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	5.543.800,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 72,47
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	26.05.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde içmesuyu ve kanalizasyon çalışmalarının yapılması işidir.

2022/4 İznik İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	9.777.498,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İznik ve Orhangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 32,72
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	5.02.2025
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde içmesuyu ve kanalizasyon çalışmalarının yapılması işidir.



2022/3 İnegöl İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	6.048.500,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 21,03
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	1.06.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde içmesuyu ve kanalizasyon çalışmalarının yapılması işidir.



2022/6 Keles İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	4.143.201,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Keles
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 14,36
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	30.06.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde içmesuyu ve kanalizasyon çalışmalarının yapılması işidir.

2022/7 Mustafakemalpaşa İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	4.908.247,80 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 45,71
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	19.06.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmalarının yapılması işidir.



Mustafakemalpaşa İlçesi Ormankadı - Kumkadı Mahalleleri Altyapı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	4.098.984,28 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 119,18
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	16.11.2023
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Mustafakemalpaşa ilçesi Ormankadı ve Kumkadı mahallelerinde kanalizasyon çalışmalarının yapım işidir.



2023/7 İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Ana Hat İlaveleri Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	9.120.095,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 13,93
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	5.12.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Yeni açılmış olan sokaklarda kanalizasyon ana hat ilavelerinin yapılması işidir.



2023/1 İnegöl İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	20.999.899,50 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 11,48
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	20.09.2025
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde içmesuyu ve kanalizasyon çalışmalarının yapılması işidir.



2022/5 İnegöl - Yenişehir İlçeleri Muhtelif Kırsal Mahallelerde Foseptik İnş. Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	3.970.610,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl ve Yenişehir
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 45,01
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	13.09.2024
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

İnegöl ve Yenişehir ilçeleri muhtelif mahallelerde foseptik inşaatı yapım işidir.



2022/5 Karacabey İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	4.804.921,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 89,68
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	12.12.2024
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

Mevcut hatların yetersiz olması ve arıza çıkarması, yeni yerleşim yerlerinin imara açılmasından dolayı yapılan altyapı inşaatı yapım işidir.

2023 Mustafakemalpaşa Ormankadı Kumkadı Mahalleleri Kanalizasyon Ve Atıksu Terfi Hattı İşi

📄	Sözleşme Bedeli	22.951.321,76 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 10,64
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	30.08.2025
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

Mevcut hatların yetersiz olması ve arıza çıkarması, yeni yerleşim yerlerinin imara açılmasından dolayı yapılan altyapı inşaatı yapım işidir.



2023 Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçelerinde Yağmursuyu İzgaralarının Temizlenmesi İşi

📄	Sözleşme Bedeli	1.819.440,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 50,89
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	19.08.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklardaki kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi işidir.



2021 Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçelerinde Yağmursuyu Hatları Ve İzgaraları Yapım Onarım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	1.414.414,14 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 119,07
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	13.04.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda biriken yağış sularını yağmursuyu ızgarası yaparak problemleri giderme işlemlerinin yapılması işidir.

2021 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım Bakım Onarım İnşaatı İşi

📄	Sözleşme Bedeli	3.376.764,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 104,32
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	4.05.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Osmangazi ilçesinde kanalizasyon ve yağmursuyu ana hatların yenilenmesi ve/veya ana hat olmayan cadde ve sokaklara yeni hat yapılması işidir.



2023 Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçelerinde Yağmursuyu Hatları ve İzgaraları Yapım Onarım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	3.923.900,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 19,59
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	22.10.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda biriken yağış sularını yağmursuyu ızgarası yaparak problemleri giderme işlemlerinin yapılması işidir.



2022 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım Bakım Onarım İnşaatı İşi

📄	Sözleşme Bedeli	5.717.195,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 83,16
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	3.06.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Osmangazi ilçesinde kanalizasyon ve yağmursuyu ana hatların yenilenmesi ve/veya ana hat olmayan cadde ve sokaklara yeni hat yapılması işidir.

2022 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Yapım Onarım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	1.791.345,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 118,50
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	29.03.2023
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Nilüfer ilçesinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda, tıkanmış yenilenmesi gereken kanalizasyon evsel hatları, onarımı gereken kanalizasyon hattı şebekelerinin onarımının yapılması ayrıca su biriken cadde ve sokaklarda yağmursuyu ızgarası yaparak problemleri giderme işlemlerinin yapılması işidir.



2023 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi

	Sözleşme Bedeli	5.283.840,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
	Gerçekleşme Düzeyi	% 99,11
	İşin Tamamlanma Tarihi	7.10.2024
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde Nilüfer ilçesinde kanalizasyon ve yağmursuyu ana hat yapımı işidir. İşin kapsamı; mevcut hatların yenilenmesi ve/veya ana hat olmayan cadde ve sokaklara yeni hat yapılması şeklindedir.



2022 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi

	Sözleşme Bedeli	1.951.000,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
	Gerçekleşme Düzeyi	% 118,17
	İşin Tamamlanma Tarihi	12.12.2023
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde Nilüfer ilçesinde kanalizasyon ve yağmursuyu ana hat yapımı işidir. İşin kapsamı; mevcut hatların yenilenmesi ve/veya ana hat olmayan cadde ve sokaklara yeni hat yapılması şeklindedir.



2023 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Yapım Onarım İşi

	Sözleşme Bedeli	3.138.011,50 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
	Gerçekleşme Düzeyi	% 93,33
	İşin Tamamlanma Tarihi	6.03.2024
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Nilüfer ilçesinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda, tıkanmış yenilenmesi gereken kanalizasyon evsel hatları, onarımı gereken kanalizasyon hattı şebekelerin onarımının yapılması ayrıca su biriken cadde ve sokaklarda yağmursuyu ızgarası yaparak problemleri giderme işidir.



2022 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	5.083.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 114,26
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	21.09.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde Yıldırım ilçesinde kanalizasyon ve yağmursuyu ana hat yapım işidir. İşin kapsamı; mevcut hatların yenilenmesi ve/veya ana hat olmayan cadde ve sokaklara yeni hat yapılması işidir.



2023/2 Mustafakemalpaşa Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı İşi

📄	Sözleşme Bedeli	14.641.880,80 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 21,46
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	24.07.2025
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde içmesuyu ve kanalizasyon çalışmalarının yapılması işidir.

2023 Yıldırım, Gürsu, Kestel İlçeleri Acil Kanal Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	8.870.450,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım, Kestel, Gürsu
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 82,56
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	19.08.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde Yıldırım, Kestel ve Gürsu ilçelerinde kanalizasyon ve yağmursuyu ana hat yapım işidir. İşin kapsamı; mevcut hatların yenilenmesi ve/veya ana hat olmayan cadde ve sokaklara yeni hat yapılması işidir.



2023 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Yapım Onarım İşi

	Sözleşme Bedeli	2.942.000,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
	Gerçekleşme Düzeyi	% 107,87
	İşin Tamamlanma Tarihi	28.02.2024
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Yıldırım ilçesinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda, tıkanmış yenilenmesi gereken kanalizasyon evsel hatları, onarımı yapılarak problemleri giderme işlemlerinin yapılması işidir.



2022 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Hatları ve Eysel Bağlantıları Yapım Onarım İşi

	Sözleşme Bedeli	3.243.610,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
	Gerçekleşme Düzeyi	% 99,36
	İşin Tamamlanma Tarihi	24.11.2023
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Osmangazi ilçesinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda, tıkanmış yenilenmesi gereken kanalizasyon evsel hatları, onarımı gereken kanalizasyon hattı şebekelerin onarımının yapılması işidir.



2022 Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçelerinde Yağmursuyu Hatları ve Izgaraları Yapım Onarım İşi

	Sözleşme Bedeli	2.432.000,00 TL
	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer
	Gerçekleşme Düzeyi	% 113,91
	İşin Tamamlanma Tarihi	1.01.2024
	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa ili Yıldırım ilçesinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda, tıkanmış yenilenmesi gereken kanalizasyon evsel hatları, onarımı yapılarak problemleri giderme işlemlerinin yapılması işidir.



2022 Bursa Merkez İlçelerinde Bulunan Muayene Bacası/ Izgara Kapaklarının Yükseltilmesi/Alçaltılması Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	1.474.110,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 116,60
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	3.07.2023
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde bulunan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki muhtelif cadde ve sokaklarda bulunan kanalizasyon, yağmursuyu bacası kapakları ve yağmursuyu ızgaralarının yükseltme ya da alçaltma yapılarak yol kotuna getirilmesi işidir.



2023 Bursa Merkez İlçelerinde Bulunan Muayene Bacası/Izgara Kapaklarının Yükseltilmesi/Alçaltılması Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	3.978.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 26,23
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	1.10.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde bulunan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki muhtelif cadde ve sokaklarda bulunan kanalizasyon, yağmursuyu bacası kapakları ve yağmursuyu ızgaralarının yükseltme ya da alçaltma yapılarak yol kotuna getirilmesi işidir.

2022 Yılı Mudanya İlçesi Muhtelif Mah. Altyapı Bakım Onarım ve Yapım İnşaatı İşi

📄	Sözleşme Bedeli	2.999.649,33 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 85,24
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	9.05.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kanalizasyon ve yağmursuyu hatları imalatı yapımı işidir.



**2023 Yılı Gemlik İlçesi Muhtelif Mah. Altyapı
Bakım Onarım ve Yapım İnşaatı İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	6.658.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 58,98
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	13.07.2024
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

Gemlik ilçesi sınırları içerisindeki muhtelif mahallerde ihtiyaç duyulan Ø 300 mmlik ECBB kanalizasyon hattı ve Ø 400 mmlik ECBB yağmursuyu hattı döşenmesi, kanal evsel bağlantılarının ve yağmursuyu ızgaralarının yapılması işidir.

**Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve
Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	5.568.250,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 84,06
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	24.06.2023
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

Fidyekızık Deresi güneyinde tersip bendi imalatı yapılmış olup muhtelif mahallelerde özelliğini yitirmiş ve talep edilen kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imatları yapılması işidir.

**Mustafakemalpaşa İlçesi Küçük Sanayi Sitesi
Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	11.459.695,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 101,31
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	16.07.2024
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imatları yapımı işidir.



Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	2.992.320,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 98,64
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	31.03.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde özelliğini yitirmiş ve talep edilen kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatlarının yapımı işidir.



Osmangazi İlçesi Atıksu Kolektörleri İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	8.134.975,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Nilüfer, Mudanya
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 105,24
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	30.04.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Kolektör hattı bağlantıları çalışmaları devam etmek- te olup, atıksuların arıtma tesisine gitmesi sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olup çalışmalar de- vam etmektedir.

Mudanya İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	3.841.150,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 119,39
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	30.06.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde özelliğini yitirmiş ve talep edilen kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatlarının yapımı işidir.



**İnegöl İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu
İnşaatı Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	5.548.400,00 TL
👷	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 118,09
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	14.05.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde özelliğini yitirmiş ve talep edilen kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatlarının yapımı işidir.

**Gemlik İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu
İnşaatı Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	2.943.535,00 TL
👷	Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 119
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	29.01.2023
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatları yapımı işidir.

**Osmangazi İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon
ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	7.971.525,00 TL
👷	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 110,92
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	20.03.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatları yapımı işidir.



Mudanya İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	7.475.457,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 104,22
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	3.07.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.



Yıldırım İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	10.362.300,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 97,38
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	5.04.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.

Orhangazi İlçesi Yeniköy ve Çakırlı Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	17.732.750,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 90,57
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	28.07.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.



İznik İlçesi Çakırca Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	6.643.140,00 TL
👷	Çalışma Yapılan İlçe	İznik
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 87,96
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	15.08.2024
🏠	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.

**Nilüfer İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	13.217.187,50 TL
👷	Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 119,52
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	6.08.2024
🏠	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.

**Mudanya İlçesi Altinkum Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi**

📄	Sözleşme Bedeli	549.945,00 TL
👷	Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 113,85
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	16.10.2023
🏠	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.



Yıldırım İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	18.982.700,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 49,85
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	24.01.2025
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.



Nilüfer İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	16.483.890,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 70,53
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	14.05.2025
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.

Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	19.741.700,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 90,16
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	10.09.2025
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.



Osmangazi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	13.790.325,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 119,66
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	17.04.2025
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.



Gemlik İlçesi Cihatlı Deresi Bakım Onarım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	1.300.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 115,83
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	12.06.2025
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Söz konusu derenin ıslahı yapılarak, sel taşkınları ve çevre güvenliği sağlanması amaçlanmaktadır.

Gemlik İlçesi Muhtelif Yerlerde Yatay Delgi Yapılması İşi

📄	Sözleşme Bedeli	17.511.223,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 30,73
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	4.10.2025
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.



Osmangazi İlçesi Alemdar - Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Deplase İşi

📄	Sözleşme Bedeli	1.543.626,05 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 108,03
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	19.06.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.



Osmangazi İlçesi Akçaköy Deresi Dere Islahı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	20.666.461,60 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 98,36
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	30.08.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Söz konusu dere ıslah projesine göre yapılarak, sel taşkınları ve çevre güvenliği sağlanması amaçlanmaktadır.

Osmangazi İlçesi Dürdane (Ovaakça) Deresi Dere Islahı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	20.642.000,00 TL
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 88,80
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	4.09.2024
🚚	İşin Kapsamı ve Durumu	

Söz konusu dere ıslah projesine göre yapılarak, sel taşkınları ve çevre güvenliği sağlanması amaçlanmaktadır.



Yıldırım İlçesi Balıklı Dere Islahı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	20.879.250,00 TL
🏢	Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 80,64
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	30.08.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Söz konusu dere ıslah projesine göre yapılarak, sel taşkınları ve çevre güvenliği sağlanması amaçlanmaktadır.



Bursa İli Yıldırım İlçesi Cenup Dere Islahı Km. 4600.00-6930.00 Yapım İşi Protokol (Yıldırım Belediyesi & BUSKİ Genel Müdürlüğü)

📄	Sözleşme Bedeli	47.770.000,00 TL
🏢	Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 97,63
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	6.05.2024
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Söz konusu dere ıslah projesine göre yapılarak, sel taşkınları ve çevre güvenliği sağlanması amaçlanmaktadır.

Deliçay Islahı Kısmi Revizyon Yapım İşi Protokol (Yıldırım Belediyesi & BUSKİ Genel Müdürlüğü)

📄	Sözleşme Bedeli	48.480.000,00 TL
🏢	Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 5,41
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	7.01.2025
🚧	İşin Kapsamı ve Durumu	

Söz konusu dere ıslah projesine göre yapılarak, sel taşkınları ve çevre güvenliği sağlanması amaçlanmaktadır.



Karacabey İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	5.671.786,84 USD
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 99,20
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	3.01.2024
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.



Mustafakemalpaşa İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	8.507.554,00 USD
👤	Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 84,26
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	26.02.2024
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.

İnegöl İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

📄	Sözleşme Bedeli	5.635.131,24 EUR
👤	Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
📊	Gerçekleşme Düzeyi	% 2,89
📅	İşin Tamamlanma Tarihi	12.04.2025
🏗️	İşin Kapsamı ve Durumu	

Muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu projesi imalatlarının yapımı işidir.



B.2 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi**B.2.1. Alt Program Hedef ve Göstergeleri ile İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirmeler****Tablo 61 - Performans Sonuçları Tablosu**

STRATEJİK ALAN 1:	SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ
STRATEJİK AMAÇ 1.1.:	Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.1:	Alternatif su kaynakları geliştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1.1: İnşaatı tamamlanan pınar kaynakları uzunluğu (Km)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	50	50,21	% 100	İçmesuyu D.B.
AÇIKLAMA	Yapılacak pınar kaynağı uzunluğunu ölçen göstergedir. Sağlıklı içmesuyu kapsamında pınar kaynağı proje çalışmalarımız hedeflenen değere ulaşmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1.2: İçmesuyu sondaj kuyusu adedi (Adet)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	44	% 220	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
AÇIKLAMA	Yeterli yağış alınamaması sebebiyle mevcut kaynaklardaki verimin azalması ve su ihtiyacının bulunması nedeniyle hedeflenen değerin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1.3: İş programına uyum oranı - Tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	100	100	% 100	Su Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	17 ilçede tarımsal sulama sondaj kuyusu açılması için ihale edilen işlerin iş programlarına hangi oranda uyulduğunu ölçen göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1.4: Tarımsal sulama sondaj kuyusu adedi (Adet)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	5	3	% 60	Su Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	17 ilçede açılacak tarımsal sulama sondaj kuyusu sayısını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1.5: Tarımsal sulama göleti inşaatı sayısı (Adet)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	2	3	% 150	Su Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak gölet inşaatını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1.6: Tarımsal sulama göleti proje sayısı (Adet)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	"Gerçekleşme Yüzdesi "	
	3	5	% 167	Su Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak gölet projelerini içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1.7: Tarımsal sulama tesis uzunluğu (Km)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	25	74,08	% 296	Su Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak sulama tesisi inşaatını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1.8: Tarımsal sulama tesisi proje sayısı (Adet)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	7	16	% 229	Su Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Tarımsal arazilerin sulama ihtiyacı için yapılacak sulama tesisi projelerini içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

STRATEJİK HEDEF 1.1.2:	Sağlıklı içmesuyu temin etmek
-------------------------------	--------------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.1: İnşaatı tamamlanan içmesuyu şebeke uzunluğu (Km)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	340	614,97	% 181	İçmesuyu D.B.
AÇIKLAMA	Yapılacak içmesuyu şebeke uzunluğunu ölçen göstergedir. Sağlıklı içmesuyu kapsamında hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.2: İnşaatı tamamlanan isale hattı uzunluğu (Km)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	40	112,94	% 282	İçmesuyu D.B.
AÇIKLAMA	17 ilçede yapılacak içmesuyu isale hattı uzunluğunu ölçen göstergedir. Sağlıklı ve kesintisiz su temini amacıyla içmesuyu isale hattı çalışmaları kapsamında çalışmalarımızda hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.3: Yapımı tamamlanan depo adedi (Adet)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	28	28	% 100	İçmesuyu D.B.
AÇIKLAMA	17 ilçede yapılacak içmesuyu depo adedini ölçen göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.4: İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, Kurşunlu) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	100	% 500	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	İçmesuyu Arıtma Tesislerini standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. 2022 yılında hedef tamamlanmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.5: İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (İnegöl, İsaören) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	10	% 50	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	İçmesuyu Arıtma Tesislerini standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.6: İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (Karacabey, Gölecik) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	10	% 50	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	İçmesuyu Arıtma Tesislerini standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.7: İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı ta- mamlanma oranı (Karacabey, Şahmelek) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	100	% 500	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	İçmesuyu Arıtma Tesislerini standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. 2022 yılında hedef tamamlanmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.8: İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey, Güngörmez) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	52	% 260	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	İçmesuyu Arıtma Tesislerini standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.9: İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Karadere) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	10	% 50	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	İçmesuyu Arıtma Tesislerini standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.10: İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Taşpınar) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	10	% 50	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	İçmesuyu Arıtma Tesislerini standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.11: İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı ta- mamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Bostandere) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	10	% 50	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	İçmesuyu Arıtma Tesislerini standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.12: İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) yapımı ta- mamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Yenice) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	100	% 500	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	İçmesuyu Arıtma Tesislerini standartlara ve yönetmeliklere uygun yapıl- masını içeren göstergedir. 2022 yılında hedef tamamlanmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.13: İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa,Karacalar) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	10	% 50	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	İçmesuyu Arıtma Tesislerini standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.14: İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İAT) revizyonu tamamlanma oranı (M. Kemalpaşa, Akarca- lar) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	100	% 500	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	İçmesuyu Arıtma Tesislerini standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasını içeren göstergedir. 2022 yılında hedef tamamlanmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.16: İçmesuyuna ilişkin onaylanan proje metrajı (Km)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	50	138,2	% 276	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
AÇIKLAMA	İl sınırları dahilinde yapılması gereken içmesuyu projelerinin toplam uzunluğunu ölçen göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2.17: İsale hatlarına yapılan katodik koruma metraжі (Km)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	50	55	% 110	Elektrik Mak. Ve Mal. İkmal D.B.
AÇIKLAMA	İçmesuyu isale hattını kapsayacak şekilde yeni katodik koruma sistemlerini kurulmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

STRATEJİK HEDEF 1.1.3:		Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.1: 3 ilçede kayıp su oranını ölçmek (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	19,53	% 102	
AÇIKLAMA	3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

"PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.2: Kayıp su oranı (Mudanya) (%)"	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	25	30,59	% 82	İşletmeler 1. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Mudanya ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

"PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.3: Kayıp su oranı (Gemlik) (%)"	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	29	41,38	% 70	
AÇIKLAMA	İşletmeler 1. Bölge D.B.			
Gemlik ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.				

"PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.4: Kayıp su oranı (Kestel) (%)"	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	27	29,21	% 92	İşletmeler 1. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Kestel ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.5: Kayıp su oranı (Gürsu) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	26	29,49	% 88	İşletmeler 1. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Gürsu ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.6: Kayıp su oranı (İnegöl) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	45	55,68	% 81	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	İnegöl ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.7: Kayıp su oranı (Mustafakemalpaşa) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	50	54,88	% 91	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Mustafakemalpaşa ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.8: Kayıp su oranı (Karacabey) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	35	36,30	% 96	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Karacabey ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.9: Kayıp su oranı (İznik) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	27	34,28	% 79	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	İznik ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.10: Kayıp su oranı (Harmancık) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	35	23,47	% 149	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Harmancık ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.11: Kayıp su oranı (Orhaneli) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	50	17,96	% 278	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Orhaneli ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.12: Kayıp su oranı (Orhangazi) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	40	54,51	% 73	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Orhangazi ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.13: Kayıp su oranı (Keles) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	35	18,52	% 189	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Keles ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.14: Kayıp su oranı (Yenişehir) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	40	54,38	% 74	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Yenişehir ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3.15: Kayıp su oranı (Büyükorhan) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	40	20,40	% 196	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Büyükorhan ilçesinde kayıp su oranının hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

STRATEJİK HEDEF 1.1.4:	Hizmetleri iyileştirip sürekliliğini sağlamak
-------------------------------	--

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.1: Kullanım ömrünü (10 yıl) doldurmuş sayaçların yenilenme oranı (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	96	87,77	% 91	Abone İşleri D.B.
AÇIKLAMA	Her yıl bir önceki yıl sonu itibariyle 10 yılını doldurmuş sayaçların değişimini içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.2: 7 ilçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	95	95	% 100	Emlak ve İstimlak D.B.
AÇIKLAMA	Hedefe 7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu) yapılan tüm abonelerin konumsal yer tespitlerini içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.3: 10 ilçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrol oranı (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Harmancık, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükşehir) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	98	98	% 100	Emlak İstimlak D.B.
AÇIKLAMA	10 ilçede (İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Harmancık, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Yenişehir, Büyükşehir) yapılan tüm abonelerin konumsal yer tespiti yapılan verilerin kontrol göstergesidir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.4: Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı(İnegöl) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	20	% 100	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir .Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.5: Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Kara- cabey) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	20	% 100	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.6: Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Mustafakemalpaşa) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	20	% 100	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.7: Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (İznik) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	20	% 100	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.8: Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Harmancık) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	5	5	% 100	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.9: Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhaneli) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	5	5	% 100	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.10: Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Orhangazi) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	20	% 100	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.11: Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Keles) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	5	5	% 100	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.12: Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Yenişehir) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	20	% 100	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.13: Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (ACBS) projesi kapsamında konumsal yer tespit oranı (Büyükorhan) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	5	5	% 100	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Mevcut aboneliklerin konumsal yer tespitlerinin hesaplanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4.14: Scada sistemine dahil edilen tesis adedi (Adet)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	104	% 520	Elektrik Mak. Ve Mal. İkmal D.B.
AÇIKLAMA	Scada sistemine dahil içmesuyu tesislerine yenilerinin ilavesini içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

STRATEJİK ALAN 2:	ÇEVREYE DUYARLI HİZMET
STRATEJİK AMAÇ 2.2.:	Atık suları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek.
STRATEJİK HEDEF 2.2.1:	Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1.1: Yapımı tamamlanan yağmursuyu hattı inşaatı uzunluğu (Km)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	52	57,07	% 111	
AÇIKLAMA	17 ilçede yapılacak yağmursuyu hattı uzunluğunu ölçen göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1.2: Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslahına ilişkin, onaylanan proje metrajı (Km)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	40	218,48	% 546	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
AÇIKLAMA	Gelen talepler doğrultusunda ek maliyet oluşturmada birim personeline projeler hazırlanarak hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1.3: Yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı inşaatı uzunluğu (Km)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	121	175,25	% 145	
AÇIKLAMA	Yoğun altyapı talebi, mevcut hatların yenilenmesi ihtiyacı ve yerleşim alanları açılması nedeni ile kanalizasyon hattı ihtiyacı doğmuş olup hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme meydana gelmiştir.			

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1.4: İslah edilen dere uzunluğu (Km)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	1	6,5	% 650	Kanalizasyon D.B.
AÇIKLAMA	Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeni ile meydana gelen bölgesel ve yoğun yağışlar nedeniyle hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme meydana gelmiştir.			

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1.8: Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Karacabey) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	0	% 0	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Finansman değerlendirilmesi sürecinde ihale hazırlıkları yapılmakta olup hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1.9: Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Yeniköy) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	20	60	% 300	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi yıllık hedefine ulaşılmıştır. Yapım işi kapsamında çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1.10: Temizliği yapılan dere uzunluğu (Km)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	10	41,63	% 416	İşletmeler 1. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	Yoğun talepler nedeniyle hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme meydana gelmiştir.			

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1.11: Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Orhangazi,İznik) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	40	57	% 143	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Atıksu Arıtma Tesisi yıllık hedefine ulaşılmıştır. Yapım işi kapsamında çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1.12: Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) yapımı tamamlanma oranı (Uludağ) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	40	12	% 30	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Uludağ Atıksu Arıtma Tesisi yapımını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

STRATEJİK ALAN 3:	SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI
STRATEJİK AMAÇ 3.3.	Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek.
STRATEJİK HEDEF 3.3.1.	Alacak takibini etkin yönetmek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1.1: Son ödeme tarihi geçmiş alacak takip süreci başlatılmış olup hukuki süreç başlatılmamış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı (%)	2023			Sorumlu Birim
	Tahmin	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi (%)	
	82	82	% 100	
AÇIKLAMA	Tahsilatın arttırılmasına yönelik göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1.2: 7 ilçede sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Tahmin	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi (%)	
	87	76,08	% 87	
AÇIKLAMA	7 ilçedeki (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) abonelerin borcundan dolayı sayaçtan kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1.3: Su sayacı okunmayan abonelerin sayaç sayı- larının azaltılması (%)	2023			Sorumlu Birim
	Tahmin	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi (%)	
	2	3,39	% 59	
AÇIKLAMA	Çeşitli sebeplerle su sayacı okunamayan abonelerimizin su sayaçlarının okunma oranını ölçen göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1.4: Son ödeme tarihi geçmiş hukuki süreci başlatılmış alacakların tahsilatının yapılması (%)	2023			Sorumlu Birim
	Tahmin	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi (%)	
	10	21,84	% 218	
AÇIKLAMA	Alacak takibin etkin yönetimi için başlatılan hukuki süreç sonucunda su ve atıksu alacaklarının performans kapsamında tahsilatı gerçekleştirilmiştir.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1.5: Su ve atıksu alacaklarının hukuki sürecinin başlatılması (Gün)	2023			Sorumlu Birim
	Tahmin	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi (%)	
	10	5	% 200	
AÇIKLAMA	Alacak takibin etkin şekilde yönetilmesi adına hukuki süreç en kısa sürede başlatılmış olup hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1.6: 7 ilçede şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Tahmin	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi (%)	
	100	100	% 100	İşletmeler 1. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	7 ilçedeki (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) abonelerin borcundan dolayı şebekeden kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1.7: 10 ilçede sayaçtan su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Tahmin	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi (%)	
	96	82,67	% 86	
AÇIKLAMA	İşletmeler 2. Bölge D.B.			
	10 ilçedeki (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) abonelerin borcundan dolayı sayaçtan kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1.8: 10 ilçede şebekeden su kesim işlemi yapılma oranı (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) (%)	2023			Sorumlu Birim
	Tahmin	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi (%)	
	96	52,10	% 54	İşletmeler 2. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	10 ilçedeki (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) abonelerin borcundan dolayı şebekeden kesme işlemi yapılan son ödeme tarihi geçmiş ve kesim tebligatı yapılmış su ve atıksu alacaklarının süresi içinde ödenmeyen kısmına ilişkin kesim işlemlerini içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

STRATEJİK HEDEF 3.3.2.		Hizmet seviyesini geliştirmek		
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.1: 3 ilçede ortalama sayaç takma günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (Gün)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	2	2,22	% 90	
AÇIKLAMA	3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.2: 4 ilçede ortalama sayaç takma günü (Görsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) (Gün)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	2	2	% 100	İşletmeler 1. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	4 ilçede (Görsu, Kestel Gemlik Mudanya) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.3: 10 ilçede ortalama sayaç takma günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Ye- nişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) (Gün)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	2	2	% 100	İşletmeler 2. Bölge D.B
AÇIKLAMA	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhan- eli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) kat abonelerinin sayaçlarının takılmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.4: 3 ilçede keşif tamamlama günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) (Gün)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	2	1	% 200	Abone İşleri D.B.
AÇIKLAMA	3 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) Abonelik müracatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.5: 4 ilçede keşif tamamlama günü (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu) (Gün)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	1,5	1,5	% 100	İşletmeler 1. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	4 İlçede (Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu) Abonelik müracaatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.6: 10 ilçede keşif tamamlama günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) (Gün)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	2	2	% 100	İşletmeler 2. Bölge D.B
AÇIKLAMA	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) Abonelik müracaatından itibaren yapılacak keşif işlemlerinin gününü içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.7: 7 ilçede ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) (Gün)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	3	3	% 100	
AÇIKLAMA	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.8: 10 ilçede ortalama içmesuyu evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) (Gün)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	3	8	% 38	
AÇIKLAMA	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) içmesuyu evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.9: 7 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) (Gün)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	3	3	% 100	
AÇIKLAMA	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) kanalizasyon evsel bağlantılarının yapılması çalışmalarını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.10: 10 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl) (Gün)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	3	7	% 43	
AÇIKLAMA	10 ilçede ortalama kanalizasyon evsel bağlantı yapılması çalışmalarını içeren göstergedir. (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmancık, İnegöl). Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.11: 7 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) (Saat)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	26	54,38	% 48	
AÇIKLAMA	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) içmesuyu arızalarına gelen ihbarla müdahale süresini içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.12: 10 ilçede içmesuyu ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) (Saat)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	26	39	% 67	İşletmeler 2. Bölge D.B
AÇIKLAMA	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) içmesuyu arızalarına gelen ihbarla müdahale süreni içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.13: 7 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) (Saat)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	28	78,11	% 36	İşletmeler 1. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) kanalizasyon arızalarına gelen ihbarla müdahale süresini içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.14: 10 ilçede kanalizasyon ihbarlarına müdahale süresi (Orhangazi, M. Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) (Saat)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	28	42	% 67	
AÇIKLAMA	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) kanalizasyon arızalarına gelen ihbarla müdahale süresini içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.15: 7 ilçede ortalama abonelik için içmesuyu şebekesi döşenmesi günü (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) (Gün)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	4	6,08	% 66	İşletmeler 1. Bölge D.B.
AÇIKLAMA	7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya) içmesuyu şebeke yapılması çalışmalarını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.16: 10 ilçede ortalama şebeke bağlantı günü (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) (Gün)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	4	18	% 22	İşletmeler 2. Bölge D.B
AÇIKLAMA	10 ilçede (Orhangazi, M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl) İçmesuyu şebeke yapılması çalışmalarını içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.17: Yenilenecek ve ilave edilecek araç (iş maki- nesi vb.) adedi (Adet)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	4	33	% 825	Elektrik Mak. Ve Mal. İkmal D.B.
AÇIKLAMA	Piyasadan kiralama yoluyla tedarik edilen motosiklet ihtiyacı, satın alma yoluyla karşılandığından hedef değerin oldukça üzerine çıkmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.18: Yatırım teşvik taleplerinin zamanında karşılanma oranı (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	100	100	% 100	Destek Hizmetleri D.B.
AÇIKLAMA	Yatırım teşvik talep başvurularından 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılanların oranını ölçen göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.19: Tedarik süresine uyum oranı (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	% 94	100	% 106	Destek Hizmetleri D.B.
AÇIKLAMA	Satın alma taleplerinin 10 iş günü içerisinde karşılanmasını ölçen göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2.20: 185 çağrı merkezine gelen çağrılara 20 saniyede cevap verme oranı (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	% 87	75	% 86	Basın ve Halkla İlişkiler Ş.M.
AÇIKLAMA	Gelen çağrıların ilk 20 saniyede karşılanma performansını ölçen göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

STRATEJİK HEDEF 3.3.3.	Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu sağlamak elektrik enerjisi üretmek			
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.3.1: Elektrik enerjisinin HES ile karşılanan miktarını arttırmak (kW)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	710	0	% 0	Elektrik Mak. Ve Mal. İkmal D.B.
AÇIKLAMA	Mevcut kurulu güce ilave yeni HES tesislerimiz inşa edilmesini içeren göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.3.2: Elektrik enerjisinin GES ile karşılanan miktarını arttırmak (kW)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	500	500	% 100	Elektrik Mak. Ve Mal. İkmal D.B.
AÇIKLAMA	Mevcut kurulu güce ilave yeni GES tesislerimiz inşa edilmesini içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

STRATEJİK ALAN 4:	YENİLİKÇİ VE GELİŞMEYE AÇIKLIK
STRATEJİK AMAÇ 4.4	Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak.
STRATEJİK HEDEF 4.4.1	Personel çalışma verimliliğini arttırmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1.1: Personel başına ortalama eğitim saati (Saat)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	7	17,74	% 253	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.
AÇIKLAMA	Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eği- tim süresini içeren göstergedir. Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimlerin verilmesi eğitim saatimizi olumlu etkilemiş olup ilave maliyet oluşmadan 2023 yılı hizmet içi eğitimlerimiz başarılı bir şekilde sağlanmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1.2: İdare norm kadro çalışması kapsamında statü ve unvan bazlı çalışan sayısı belirlenen birim adedi (Adet)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	9	9	% 100	
AÇIKLAMA	Tüm kurum faaliyetlerinin incelenerek norm kadro standartları doğrultusunda çalışan sayısını belirlenmesini içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1.3: Su kültürü ve bilinci konusunda bilgilendirilen öğrenci sayısı (Kişi)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	4.200	86.857	% 2068	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.
AÇIKLAMA	Su kültürü ve bilincinin oluşturulması amacıyla okullarda yapılacak bilgilendirme çalışmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

STRATEJİK HEDEF 4.4.2	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.2.2: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı- nın izleme ve sürdürülebilirliği yaygınlaştırıl- ması oranı (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	100	100	% 100	Strateji Geliştirme D.B.
AÇIKLAMA	Yürürlükte olan iç kontrol sisteminin etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek çalışmaların göstergesidir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.2.3: Yatırım bütçesinin dönemsel izlenmesi (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	100	95	% 95	Strateji Geliştirme D.B.
AÇIKLAMA	Yatırım bütçe kalemlerine uygun olarak giderlerin gerçekleşme performansını ölçen göstergedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.2.5: Abonelerin eksik sicil bilgilerinin tamamlan- ma oranı (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	25	83	% 333	Abone İşleri D.B.
AÇIKLAMA	Sicil bilgisi eksik olanların tamamlanmasını içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.2.6: Emlak Bilgi Sisteminin, Taşınmaz Bilgi Siste- mine dönüştürülme oranı (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	15	15	% 100	Emlak İstimlak D.B.
AÇIKLAMA	Kuruma ait mevcut bütün taşınmazları Taşınmaz Bilgi Sistemine dönüştürülmesini içeren göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.2.7: İnsansız vezne otomasyonuna geçilen tahsilat şubesi sayısı (Adet)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	6	6	% 100	Bilgi İşlem D.B.
AÇIKLAMA	İnsansız vezne otomasyonuna geçilen tahsilat şube sayısını içeren göster- gedir. 5 yıllık hedef tamamlanmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.2.9: İş sağlığı ve güvenliği eğitimi süresi (Saat)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	16	16	% 100	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
AÇIKLAMA	Yıl içerisinde gerçekleştirilen iş güvenliği eğitim sürelerini ölçen göster- gedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.2.10: Periyodik sağlık taramalarının yapılması, kişisel koruyucu donanımların dağıtılması, işe özgü eğitimlerin aldırılması, iş ekipmanı muayenelerinin yaptırılması, ortam ölçüm çalışmalarının yaptırılması ve saha gözetimlerinin yapılması oranı (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	100	100	% 100	
AÇIKLAMA	Hedef değere ulaşılmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.2.11: Hizmet binası adedi (M.Kemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, Orhaneli) (Adet)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	1	0	% 0	
AÇIKLAMA	Hedefe yönelik çalışmalar devam etmektedir.			

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.2.12: Yeni ambar hizmet tesisi tamamlanma oranı (%)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	30	100	% 333	
AÇIKLAMA	Kullanılan malzemelerin her türlü dış etkenden korunabilmesi için yapılacak ambar hizmet tesisi sürecini içeren göstergedir. 2022 yılında hizmet tesisi inşaatı tamamlanmıştır.			

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.2.13: Kamera ile izlenen tesis sayısı (Adet)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	13	13	% 100	
AÇIKLAMA	Hedef değere ulaşılmıştır.			

STRATEJİK HEDEF 4.4.3.	Su kültürü ve bilincini oluşturmak
-------------------------------	---

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.3.1: Görsel ve yazılı medya malzeme sayısı (Adet)	2023			Sorumlu Birim
	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Yüzdesi	
	7	371	% 5300	
AÇIKLAMA	Suyun önemini vurgulayan, uygulanabilecek tasarruf tedbirleri hakkında bilgi veren ve doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması yönünde bir davranış kazanmayı hedefleyen tanıtım çalışmalarını ölçen göstergedir. Hedef değere ulaşılmıştır.			

B.2.2. Performans Denetim Sonuçları

Performans değerlemesi, kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen devam eden ve tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflerin ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla detaylı bir incelemeyle sonucunda elde edilen çıktı ile sonuçların değerlendirilmesidir.

Genel Müdürlüğümüz 2020-2024 Stratejik Planında belirlemiş olduğu alan, amaç, hedef ve performans göstergeleri doğrultusunda hazırlanan performans gerçekleştirmelerine 2023 Faaliyet Raporunda yer vermiş bulunmaktadır. Performans Sonuçları Tablomuzda;

- 4 Alan,
- 4 Amaç,
- 11 Hedef ve
- 106 Adet Performans Göstergeleri Stratejik Plan uygulamasının 3 er aylık dönemlerde sistematik olarak takip edilmesi ve uygulanması ile izlenmiştir.

Performans Göstergelerinde hedeflenen değer ve gerçekleşme durumuna yer verilmiş ve harcama birimi ile ilişkilendirilmiş olup, ayrıca hedefte meydana gelen sapmaların nedenlerine açıklama kısmında değinilmiştir.

B.3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları

Kurumumuz 2020-2024 Stratejik Planında 4 alan, 4 amaç, 11 hedef ve 117 adet performans göstergesi mevcuttur. 2023 yılında hedefi olan 106 adet performans göstergesi Performans Sonuçları Tablosunda yer almaktadır. Stratejik Planda yer alan performans göstergelerimizi hedefe etkisi ile değerlendirdiğimizde aşağıdaki performans yüzdelerine ulaşmış bulunmaktayız.

Tablo 62 - Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu

Amaç No	Amaçlarımız	Performans (%)
1.	Sağlıklı su temini sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz aktarımını yapmak	91
2.	Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve yağmur sonrası yaşanan sorunları bertaraf etmek	81
3.	Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak finansal kaynakları yönetmek	82
4.	Riskleri etkin yöneterek yenilikçi ve gelişime açık lider kurum olmak	97
TOPLAM PERFORMANS		88

B.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Performans esaslı bütçeleme sisteminde, performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanma aşamasında ve performans bilgisine dayalı karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere performans bilgisinin elde edilmesi, analizi, değerlendirilmesi ve raporlanması büyük önem taşımaktadır.

Genel Müdürlüğümüz öncelikle 2024 Yılı Performans Programını hazırlamış ve performans göstergelerinin 2022 gerçekleştirmeleri, 2023 yılı tahmini gerçekleştirmelerine yer vermiştir. 2024 yılında hedefi olan performans göstergeleri hizmet ihtiyacı kapsamında değerlendirilerek bütçe ihtiyaçları belirlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün 2020-2024 Stratejik Planının uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla 2023 yılında hedefi olan 106 adet performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Öncelikle amaç ve hedeflere uygun faaliyet ve göstergeler belirlenirken, ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.

Performans göstergelerinin sorumlu birimlerden alınabilmesi adına BUSKİ Bilgi Sistemi (BBS) programı altında Performans Programı İzleme Yazılımı geliştirilmiştir. Kurumumuzda her birimden ve rilerin takibi, derlenmesi ve programa girilmesi amacıyla asıl ve yedek olmak üzere “performans görev- lileri” belirlenmiş ve görevlendirilen personellere konuya ilişkin eğitimler verilmiştir.

Belediyeler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberinde İzleme ve Değerlendirme kapsamı doğrultusunda her 3 ayda bir tüm performans göstergeleri gerçekleşme ve açıklamalarıyla birlikte ilgili birimlerden istenerek izlenmiş ve belirli dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin bilgisine sunulmuştur. Yılsonunda ise değerlendirme raporu hazırlanarak performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilmiştir.

Göstergelerin niteliğine göre yapılan periyodik değerlendirmeler sayesinde stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşmak için bulunduğumuz noktanın yeterliliği kontrol edilmiş, hedefin gerisinde kalınan göstergeler tespit edilerek, hedeflerin yakalanması için toplantılar yapılmış ve harcama birimlerine bilgilendirme raporları sunulmuştur.

[illegible]



İZNİK GÖLÜ

4.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

| ÜSTÜNLÜKLER

| ZAYIFLIKLAR

| DEĞERLENDİRME

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A ÜSTÜNLÜKLER

GÜÇLÜ YÖNLER

- Özel bir kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip köklü bir kurum olması,
- Dünyada tanınır konumda ve Türkiye’ de benzer kamu kurum ve kuruluşlara öncülük edecek nitelikte olması,
- Büyük ölçekli yatırımcı bir kuruluş olması nedeniyle profesyonel hizmet verme gücüne sahip olması,
- Türkiyede ilk alınan kalite belgeleri ile toplamda 8 adet kalite belgelerimiz ile TSE onaylı kaliteli su kurumu olması
- Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan kurum olması
- Yatırım ihtiyacının karşılanmasında kredibilitesinin yüksek olması,
- Abonelere yönelik sanal ortamdaki çözüm ve uygulamalarının gelişmişliği,
- Tahsilat noktalarının çokluğu ve bölgesel dağılımının dengeli olması,
- Kayıp su oranlarında Türkiye de diğer su kurumlarına göre en başarılı kurum olması ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödüllendirilmesi,
- Uludağdan beslenen Nilüfer, Doğançık ile Çınarcık gibi 3 adet büyük barajının olması,
- Tahsilat oranının yüksek olması,
- İleri teknolojiye sahip içmesuyu ve atık su arıtma tesislerinin varlığı,
- İçmesuyu ve atıksu yönetiminin SCADA sistemi üzerinden yapılabilmesi
- Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve kısa sürede kurum ile uyumlaştırılması,
- Laboratuvarlarımızın yüksek teknolojiye sahip ve akredite edilmiş olması,
- Yenilenebilir enerji (Çamur yakma, GES, HES) tesislerine sahip olması,
- Personel memnuniyeti kapsamında personel taleplerine önem verilmesi.
- Altyapı ve Üstyapı tesislerimizin Coğrafi Bilgi Sistemine entegre edilmesi.
- İş makine parkının olması ve verimli kullanılması,
- Kurumun sahip olduğu güçlü, nitelikli ve deneyimli personel yapısının olması,
- Yalın Yönetim Sistemi ile kaynakların etkili ve verimli kullanılıyor olması,
- Kanalizasyon ve atıksu sistemlerinin ayrı sistemde yapılması



FIRSATLAR

- Su kaynaklarına ulaşma ve kullanma imkânına sahip olunması,
- Su ve atık su konusunda yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip üniversitelerin araştırma kurumlarının varlığı,
- Tedarikçi kullanımı açısından güçlü özel sektörün olması,
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik yönetim anlayış ile yönetilmesi
- Yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki gelişmeler,
- Teknoloji imkânlarının artması,
- Personelin gelişen teknolojiye kısa sürede uyum sağlaması,
- Halkın su tasarrufu bilincinin giderek artması,
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde alternatif yöntemlerin geliştirilmesi
- Su kapasitemizi % 60 oranında arttıracak Çınarcık İçmesuyu Projesinin hızla devam etmesi
- Gölbaşı Barajının planlama aşamasında olması.



B ZAYIFLIKLAR

ZAYIF YÖNLER

- 6360 Sayılı Kanun ile devrolan yerleşim alanlarının altyapı talebinin yüksek olması,
- Çeşitli mevzuat düzenlemeleri ile kurum gelirlerine yönelik kısıtlayıcı hükümler,
- İmar Planı çalışmalarında dere yataklarının dikkate alınmaması,
- Yapı Kayıt Belgeleri ile kurumumuza yapılan abonelik taleplerinin fazla olması,
- Doğayı ve çevreyi korumak için zorunlu tedbirler kapsamında arıtma ve teknolojik yeniliklerin getirdiği yatırım ve işletme maliyetlerinin yüksek olması,



TEHDİTLER

- Bursa' nın sürekli göç almasına bağlı olarak nüfusun hızla artması,
- İçmesuyu kaynaklarının bulunduğu arazilerdeki mülkiyet sorunu nedeniyle kamulaştırma bedellerinin giderek yükselmesi ve havzaların korunmasına yönelik kamulaştırma ve kamulaştırmaz el atma mahiyetli davaların ciddi boyutlara ulaşması,
- Baraj havzası civarında yapılan yapılaşmalar,
- Bursa' da doğal afet risklerinin varlığı (1. Dereceden deprem bölgesi olması),
- OSB dışında oluşan sanayi kuruluşlarının çevre kirliliğini arttırması ve su kaynaklarına etkisi,
- Küresel iklim değişiklikleri ve beraberinde getirdiği kuraklık sorununun varlığı,
- Kaçak yapıların varlığı,
- Bilgi güvenliğimize yönelik tehditlerin artması.



C DEĞERLENDİRME

- Ülke genelinde su kayıplarının azaltılmasına yönelik bilgi ve tecrübenin paylaşılması konusunda iş birliği yapılması amacıyla, yerel yönetimler arasında “Belediye Su Kardeşliği” protokolleri imzalandı. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz Kahramanmaraş ve Yozgat illerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
- Genel Müdürlüğümüz içme suyu kayıp kaçak oranını %20 seviyelerine düşürerek Türkiye’de ilk sıraya yerleşmiş bu kapsamda “Suda verimlilik ödülü” almaya hak kazanmıştır.
- Sağlıklı bir kentin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği gerçeğinden hareketle Genel Müdürlüğümüz 17 ilçenin tamamında alt yapı yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir.
- Tümdünyada iklimdeğişikliklerine bağlı olarak yaşanan sorunlardan Bursa’nın asgaridüzeyde etkilenmesi için Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli önlemler alınmıştır.
- Vatandaşların kesintisiz ve daha temiz içme suyuna kavuşması amacıyla arıtma tesisleri çalışmalarına devam edilmektedir.
- Genel Müdürlüğümüz TS EN ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanarak sahip olduğu kalite belgelerini 8’e çıkarmıştır.
- Son yıllarda teknolojiye yapılan yatırımlarla, hizmet kalitesini daha da yükselten Genel Müdürlüğümüz, 83 adet Buskimatik ile abonelerimizin 7 gün 24 saat kolayca işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamaktadır.
- Genel Müdürlüğümüz gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin kalitesini ve çalışma standartlarını yükseltmek için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerine büyük önem vermekte bu kapsamda görüşmelerine hız kesmeden devam etmektedir.
- Su tasarrufuna her fırsatta önem veren ve kağıt faturalar için her yıl 17,5 ton kağıt harcayan kurumumuz abonelerinin SMS faturaya geçiş sağlaması için çalışmalarına devam etmektedir.
- Bursa Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülen 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporu, 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu ile Aralık ayı Meclis Toplantısında 2024 Performans Esaslı Bütçe ile 2024 Performans Programımız onaylanmış olup, kamuoyunun aydınlatılması adına www.buski.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.
- Sahip olduğu kalite yönetim belgeleri, akreditasyon ve parametre sayıları, son teknolojik imkanlar ile donatılmış uluslararası geçerliliği olan içme suyu ve atıksu laboratuvarları ile alanında örnek alınan bir kurum olmayı başaran BUSKİ, kurumsal kapasiteyi daha üst noktalara taşımak için gerçekleştirdiği eğitim etkinlikleriyle de adından söz ettirmektedir.
- e-Buski uygulaması ile’ uzaktan abonelik işlemlerini başlatan Genel Müdürlüğümüz, Android ve iOS mobil cihazlar üzerinden BUSKİ Mobil uygulaması ile abonelerimizin işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmelerini sağlamıştır.

- Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde su bilinci ve kültürünü oluşturmak için BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte planlanan "Su Damlalarının Peşinde Projesi" öğrencilerden yoğun ilgi görmekte ve eğitimlerine devam etmektedir.
- Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Afet Eğitim Simülasyon Merkezinde kurum personellerimize çeşitli uygulamaları eğitimler verilmiştir.
- Küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak ani yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketleri son yıllarda dünya genelinde önemli bir sorun haline gelirken kurumumuz Bursa derelerinde olası taşkınların önüne geçmek için dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmalarına ara vermeden devam etmiştir.
- Kırsal kalkınmanın sağlanması ve kent merkezine göçün önlenmesi hedefiyle tarımsal yatırımları hız kesmeden sürdüren Genel Müdürlüğümüz tarımda güçlü bir altyapı oluşturmaya devam etmektedir.
- Su ayak izi üretimde harcanan suyun sadece miktarını belirtmekle kalmayan, aynı zamanda türünü ve nerede / ne amaçla harcandığını da gösteren bir göstergedir. Genel Müdürlüğümüz web sayfasında (www.buski.gov.tr).Abonelerimizin su ayak izlerini hesaplayabileceği modül açılmıştır.
- Kurumumuz kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarına başlamış ve ilçe bazında yapılan asfalt yama, asfalt kaplama ve sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Kamu kurumu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle altyapıdan çevre yatırımlarına kadar birçok alanda projelerini sürdüren Genel Müdürlüğümüz, periyodik olarak mazgal ve ızgara temizlikleri gerçekleştirilerek şehre daha temiz altyapı hizmeti sunmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüz tarım potansiyeli yüksek olan bölgelere kazandırdığı sulama göletleri ile çiftçilerimizin sulama ihtiyacını karşılamakta hem ürün kalitesinin hem de verimliliğin artırılmasına katkı sağlamaktadır.
- Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilde yıkıma neden olan depremin haberi alınır alınmaz, deprem bölgesine hareket eden Genel Müdürlüğümüz tüm imkanlarını seferber ederek şehirlerin altyapısının tekrar ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaları yürütmektedir.
- Genel Müdürlüğümüz İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında Bursa'nın susuzluk sorununu 2060 yılına kadar ortadan kaldırmak amacıyla Çınarcık İçme Suyu Projesi çalışmalarını yürütmektedir. İnşaat çalışmaları tamamlandığında il merkezimize sağlanan su miktarı yüzde 60 oranında artmış olacak.



TOPHANE



5.ÖNERİ VE TEDBİRLER



| ÖNERİ VE TEDBİRLER


ÖNERİ VE TEDBİRLER

A ÖNERİ VE TEDBİRLER

Genel Müdürlüğümüz;

- Şehrimizde su kullanma bilincine ve iklim değişikliği kaynaklı ani yağışlar veya uzun kuraklıklara dair bilinçlendirici faaliyetlere,
- 17 ilçede Abone Coğrafi Bilgi Sistemi ve Alt Bölge Projesi kapsamında tüm verilerin sisteme aktarılmasına,
- Enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin kullanım oranının arttırılmasına yönelik çalışmalara,
- Uluslararası platformlarda Ar-Ge , İSG ve İnovasyon alanındaki gelişmelerin takip edilmesine, sempozyum ve çalıştaylara katılım sağlanmasına,
- Master plan çalışmasının güncellenmesi,
- Ulusal ve uluslararası kuruluşlardaki hibe ve destek programlarından maksimum seviyede takip edilmesi,
- Yağmursuyu ve arıtılmış su geri kazanımının etkin bir şekilde hedeflenen çalışmaların yapılmasına,
- İçmesuyu havzalarının korunması için kamulaştırma ve denetimlerin arttırılması çalışmalarına devam edecektir.


Daha az su, daha çok yaşam



**TASARRUF
ETMELİSİN**







6.EKLER

EK 1- ÜST YÖNETİCİNİN
İÇ KONTROL
GÜVENCE BEYANI

EK 2 - MALİ HİZMETLER
BİRİM YÖNETİCİSİNİN
GÜVENCE BEYANI

EK 3 - HARCAMA
BİRİMLERİNİN İÇ KONTROL
GÜVENCE BEYANI

ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi bütçesinin; kalkınma planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans programı ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlandığını ve uygulandığını, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını beyan ederim.

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesine, varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı korunmasına ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, yönetim bilgi sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve değerlendirme raporlarına, harcama yetkilileri ile malî hizmetler birim yöneticisi tarafından sunulan güvence beyanlarına ve denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (Bursa - 2024)


Güngör GÜLENC
BUSKİ Genel Müdürü

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

İç kontrol sisteminin Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve rehberlik hizmeti verildiğini, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ve diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğumu bildiririm.

Bu Raporun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Bursa - 2024)



Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları, denetim raporları ile benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgilere dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (Bursa – 2024)

Halit KARASU
Teftiş Kurulu Başkanı (V.)

Alhattin GÜNGÖRDÜ
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Erden ATİK
İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanı

Gürkan YAMAN
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Hasan Tahir URGUN
İçerme Dairesi Başkanı

İsmail BASARIR
Abone İşleri Dairesi Başkanı

Nigar ETİK
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Sadettin TOPCAN
İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanı

Günçer ALAN
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü

Meral Sayın
1. Hukuk Müşaviri

Bülent BAY
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

Gürhan KILIÇ
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı

Hasip UYAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Hüseyin KAYGISIZ
Kamulaştırma Dairesi Başkanı

Mehmet Salt AYIK
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı

Recep SEVER
Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı

Yetişkin KESKİN
Su Tesisleri Dairesi Başkanı

Aynur KURBANIZGIN
Yalın Yönetim Şube Müdürü



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 evenly spaced lines across the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 25 evenly spaced lines across the page.



www.buski.gov.tr

