







*Vatanını en çok seven,
görevini en iyi yapandır.*

K. Atatürk

Şehirler
insanla,
insanlar
suyla
hayat
bulur.



Başkanın Sunuşu.....	002
Üst Yönetici Sunuşu.....	003
I. GENEL BİLGİLER	
A. Misyon - Vizyon, Kalite Politikamız ve Temel Değerler.....	006
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	010
B.1 - Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar.....	010
B.2 - Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar.....	011
C. İdareye İlişkin Bilgiler.....	012
C.1 - Fiziksel Yapı.....	012
a. Hizmet Binaları ve Tesisler.....	012
b. Arıtma Tesisleri.....	013
c. Tahsilat Şubeleri.....	019
d. Sosyal Tesisler.....	019
e. Araç ve İş Makinesi Parkı.....	020
f. Pompa İstasyonları - Su Depoları - Kuyular.....	021
C.2 - Örgüt Yapısı.....	023
a. Karar Alma Organları	023
b. Organizasyon Şeması.....	024
C.3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	026
a. Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri.....	026
b. Büro Makine ve Cihazları İle Harita, Plan ve Projeler.....	034
C.4 - İnsan Kaynakları.....	036
C.5 - Sunulan Hizmetler	042
a. İçme Suyu Hizmetleri.....	042
a.1 - İçme Suyu Kaynakları.....	042
a.2 - Abonelik İşlemleri.....	050
a.3 - İçme Suyu İmalatları.....	056
b. Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hizmetleri.....	060
c. Çevre Koruma ve Arıtma Hizmetleri.....	062
d. Kamulaştırma Faaliyetleri.....	064
e. Asfalt Yama ve Kaplama Çalışmaları.....	066
f. Bakım Onarım Çalışmaları.....	067
g. Arıza ve Tamir Çalışmaları.....	071
h. Proje Hizmetleri.....	072
ı. Tarımsal Sulamaya Yönelik Gölet ve Sulama Hizmetleri.....	074
j. Doğal Kaynak Suyu Hizmetleri.....	075
k. Scada.....	075
l. Güneş Enerjisi Sistemi.....	076
m. Dış Kredi Finansman İşlemleri.....	077
n. Diğer Hizmetler	079
C.6 - Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	079
II. AMAÇ ve HEDEFLER	
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri.....	082
B. Temel Politika ve Öncelikler.....	087
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	
A. Mali Bilgiler.....	091
A.1 - Bütçe Uygulama Sonuçları.....	091
A.2 - Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....	092
A.3 - Mali Denetim Sonuçları.....	096
B. Performans Bilgileri.....	097
B.1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	097
B.2 - Performans Sonuçları Tablosu ve Değerlendirilmesi.....	142
IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	
A. Üstünlükler.....	158
B. Zayıflıklar.....	158
C. Değerlendirme.....	159
EKLER	
İç Kontrol Güvence Beyanı.....	160
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı.....	161



Recep ALTEPE
Büyükşehir Belediye Başkanı

**Bursa, bütün özelliklerinin yanında, bir "su şehri"dir.
Medeniyetimizin suya verdiği değerin hemen bütün yansımaları,
Bursa'da görülmektedir.**

Değerli Hemşehrilerim,

Yarınların Bursa'sının daha yaşanabilir olması için sosyal, kültürel ve fiziki yatırımları, bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Bütün doğal güzelliklerin bünyesinde toplandığı, tarihi mirası yoğun, kültürel geçmişi kadim bir şehirde yaşıyoruz.

Bursa, bütün özelliklerinin yanında, bir "su şehri"dir. Medeniyetimizin suya verdiği değerin hemen bütün yansımaları, Bursa'da görülmektedir.

Bugün Bursa, yer altı ve yer üstü kaynakları ile zengin bir potansiyele sahiptir.

Aynı zamanda Bursa, çeşmeden akan sularının içilebilirliği kanıtlanmış nadir şehirlerden biridir. Yerel yönetimler olarak bizlerin asli görevlerinden biri de içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları gibi altyapı çalışmalarının kamu yararı doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamaktır.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, Bursa'nın içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarını karşılamak için doğru ve yerinde stratejilerle su yönetimi konusunda üzerine düşen sorumlulukları büyük bir başarıyla yerine getirmektedir.

Özellikle 2009'dan bu yana devam eden çalışmalar, Bursa'nın altyapı ağını baştan aşağıya yenileyen bir süreci de beraberinde getirdi.

Bu dönemde yapılan çalışmalara bakıldığında, altyapıya verdiğimiz önem ortaya çıkacaktır. İçme suyundan yağmursuyu ve kanalizasyona, su depolarından atık sulara, derelerden kuyulara kadar birçok açıdan suyu kontrol ediyoruz.

Yeni içme suyu hatları ile var olanların rehabilitasyonu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yenilenmesi, derelerin ıslahı ve temizliği ile çevre yatırımları, "sağlıklı şehir Bursa" hedefinde önemli kazanımlar sağladı.

Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde emanet edilmesi ile yaşanılmasından mutlu olunan şehir mirasına ulaşılabilmesi, çevre yatırımlarıyla mümkün. Yaşadığımız dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldığımız düşüncesiyle, bizden sonraki nesillere her yönüyle yaşanılabilir şehir bırakabilmek en büyük hedefimiz.

İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
Genel Müdür



Altyapı sorunlarına kesin ve kalıcı çözümler oluşturabilmek için sahada bulunduğumuz çalışmalarla adeta ilçelerimizin altyapı röntgenini çektik.

Değerli Genel Kurul Üyeleri,

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini ile "Sağlıklı Kent Bursa" hedefinde gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmalarıyla, Bursalılara hizmetin en iyisini sunmanın gayretindeyiz.

Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi, su kültürü ve bilincinin oluşturulması amacıyla su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalara büyük önem vermekteyiz. Su ve kanalizasyon idarelerinin başarı kriterlerinden biri de sudaki kayıp kaçakla mücadelede sergilenen performanstır.

İçme suyu hatlarında gerçekleştirdiğimiz rehabilitasyon, bakım, yenileme ve kaçak su kullanımına karşı başlattığımız mücadele ile sudaki kayıp kaçak oranını, Avrupa ortalaması olan yüzde 22'ler seviyesine geriletme başarısı gösterdik.

Bu kapsamda, mevcut 5.423,6 km' lik içme suyu şebeke hattı, 2014 yılında eklenen 247.2 km ile 5.670,8 km' ye, yine isale hattı 94 km'lik ilaveyle 527,1 km'ye çıkarıldı. Bununla birlikte Bursa'ya, 16 yeni su deposu kazandırıldı.

Yine 3.595,3 kilometreden oluşan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ise 274,6 kilometrelik (dere ıslahı dahil) ilaveyle 3.869,9 kilometreye ulaştı.

77.957.410 metreküp Doğu Arıtma Tesisi, 18.689.782 metreküpü de Batı Arıtma Tesisi'nde olmak üzere toplam 96.647.192 metreküp atık su arıtıldı.

2014'de öngörülen 527,0 milyon TL'lik gelir bütçesi ve 589,5 milyon TL'lik gider bütçesi % 98 oranında gerçekleşti.

Bilindiği üzere, il mülki sınırlarının Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmesiyle, görev ve sorumluluk sahamız, bütün Bursa' yı kapsayacak biçimde yeniden belirlendi.

Altyapı sorunlarına kesin ve kalıcı çözümler oluşturabilmek için sahada bulunduğumuz çalışmalarla adeta ilçelerimizin altyapı röntgenini çektik.

Teknik teçhizatımız, yetişmiş iş gücümüz, bilgi birikimimizle sorumluluk sahamıza giren ilçelerde de altyapı seferberliği başlattık.

Bu vesileyle, 2014 yılı faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



Bursa' da
Su
çeşmeden
içilir...

www.buski.gov.tr



I- GENEL BİLGİLER

- A. Misyon - Vizyon ve Kalite Politikamız
- B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- C. İdareye İlişkin Bilgiler

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon - Vizyon, Kalite Politikamız ve Temel Değerler

Misyon

Sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için;

- İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması,
- İhtiyaç sahiplerine dağıtılması,
- Kullanılmış su ile yağmursularının uzaklaştırılması,
- Su havzalarının korunması,
- Tarımsal sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama suyu temin edilmesi kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.

Vizyon

- İçme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,
- Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,
- Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktadır.

Kalite Politikamız

- Kalite Yönetim Sisteminin gereklerinin sürekli iyileştirilmesi,
- Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi,
- Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,
- Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda altyapı (içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması,
- Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
- Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması.

Temel Değerler

- Çevreye ve insana saygı,
- Gelişime ve değişime açıklık,
- Müşteri memnuniyeti,
- Kalite,
- Etkinlik, verimlilik ve yeterlilik,
- Güvenilirlik,
- Eşitlik ve tarafsızlık,
- Şeffaflık,
- Dürüstlük,
- Adalet,
- Hizmet bilinci, hizmet aşkı,
- Hizmetlerde önderlik ve örneklik,
- Katılımcılık,
- Meslek etiğine bağlılık,
- Halka yakınlık.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B.1- Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar

BUSKİ Genel Müdürlüğü 20/11/1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla değişik geçici 10. madde ve Bakanlar Kurulunun 08/09/1989 tarih 89/14524 sayılı kararı ile; Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur.




- 2560 Sayılı İSKİ Kanunu,
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 167 Sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
- 3213 Sayılı Maden Kanunu,
- 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 6107 Sayılı İller Bankası Kanunu,
- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 5779 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 3194 Sayılı İmar Kanunu,
- 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,
- 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

B.2- Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar

BUSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri, yasalarla genel çerçevesi çizilmiş olmakla beraber, faaliyet alanı ile ilgili çıkarılmış yönetmeliklerle de işleyişini devam ettirmektedir. Bu yönetmelikler;

- BUSKİ Kuruluş ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği,
- Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- 1. Hukuk Müşavirliği Kurulu, Görev ve Yetki Yönetmeliği,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği,
- İhale Yönetmeliği,
- İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği,
- Atık Su Deşarj Yönetmeliği,
- Tarifeler Yönetmeliği,
- Kütüphane Yönetmeliği,
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik,
- Disiplin Yönetmeliği,
- Arşiv Yönetmeliği,
- Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi.

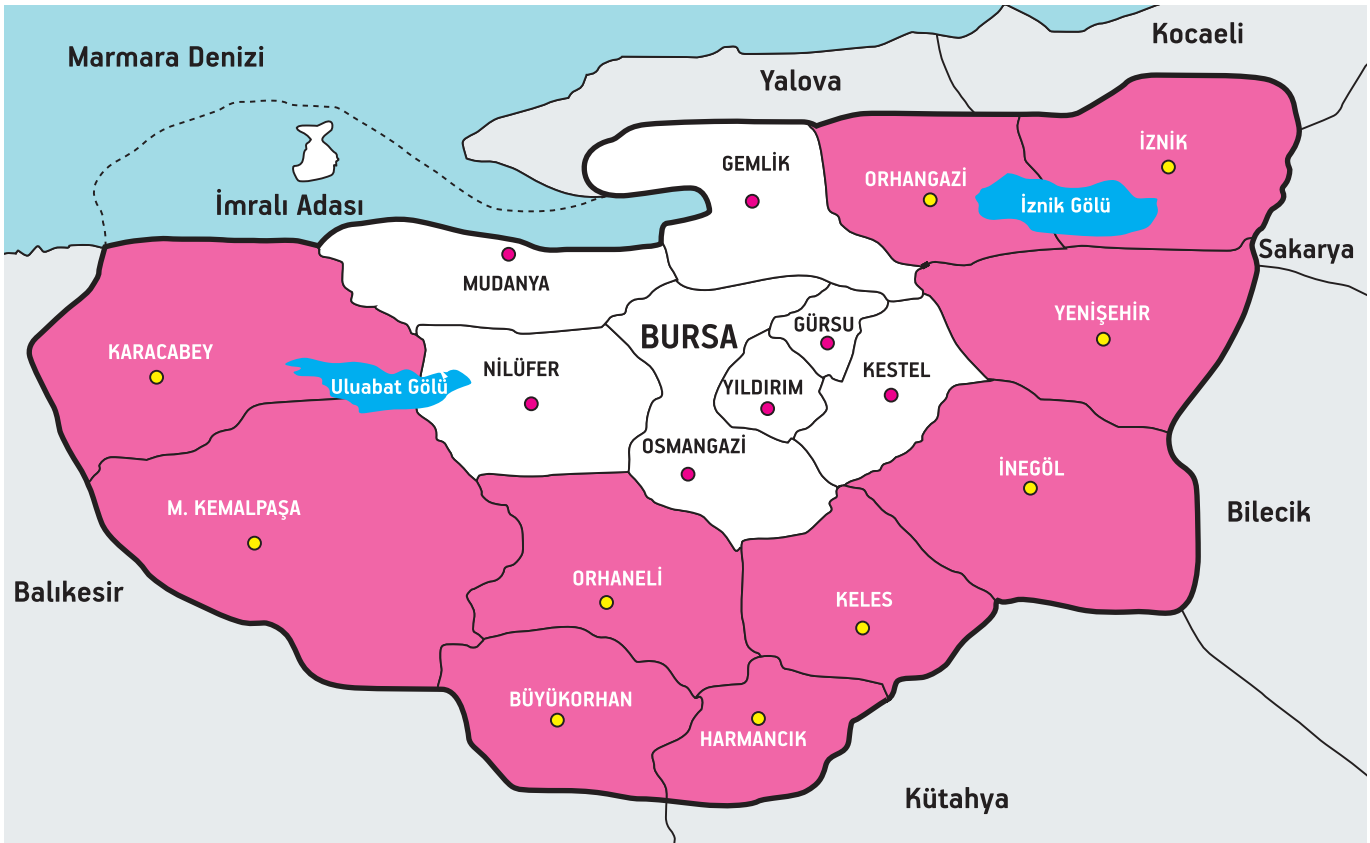

B.B.B. Bağlı İlçe Belediyeleri ve Mücavir Alan Sınırları (6360 Sayılı Kanun Sonrası)

6360 Sayılı Kanun İle İlave Olan İlçeler

6 Aralık 2012 Tarih 28489 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Kanun" un Madde 1.2 gereği büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olmuştur. Genel Müdürlüğümüz hizmet alanı Bursa il

sınırlarına genişlemiş olup, yedi ilçe (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) iken, hizmet alanımıza on ilçe (Orhangazi İznik Yenişehir İnegöl, Keles, Orhanlı, Harmancık, Büyükorhan M. Kemalpaşa, Karacabey) dahil edilerek hizmet alanımız genişlemiştir.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

C.1- Fiziksel Yapı

a - Hizmet Binaları ve Tesisler

Merkez Hizmet Alanı (Acemler Kampüsü)

- Ana Hizmet Binası,
- Abone Hizmet Binası,
- İşletmeler Hizmet Binası,
- Sayaç Servisi Hizmet Binası,
- SCADA Hizmet Binası,
- Açık Saha Ambarı,
- Kapalı Saha Ambarı (4525 m²),
- Atölye Binaları (2256 m²),
- Kapalı ve Açık Araç Parkı, (Kapalı 900 m², açık 2000 m²).
- Arşiv Binası (420 m²).
- Sivil Savunma Uzmanlığı Binası

İlçe Hizmet Binaları

- Gemlik Şube Müdürlüğü Binası,
- Gemlik Taşocakları İşletme Binası,
- Mudanya Şube Müdürlüğü Binası,
- Mudanya Harmanlar İşletme Binası,
- Kestel Şube Müdürlüğü Binası,
- Gürsu Şube Müdürlüğü Binası,
- Görükle Şube Müdürlüğü Binası,
- İnegöl Şube Müdürlüğü Binası,
- İznik Şube Müdürlüğü Binası,
- M. K. Paşa Şube Müdürlüğü Binası,
- Karacabey Şube Müdürlüğü Binası,
- Yenişehir Şube Müdürlüğü Binası,
- Orhangazi Şube Müdürlüğü Binası,
- Orhaneli Şube Müdürlüğü Binası,
- Nilüfer Tahsilat Binası,
- Yıldırım Abonelik ve Tahsilat Hizmet Binası



Ana Hizmet Binası

b - Arıtma Tesisleri

İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin 1. Kademesi 1985 yılında, 2. Kademesi 1994 yılında tamamlanarak devreye alınmış ve Bursa kentinin su ihtiyacını karşılamaya başlamıştır. Tesisin kapasitesi her bir kademede 250.000 m³ olmak üzere Toplam 500.000 m³/gündür.

2014 yılında günlük 249.300 m³/gün, yıl içinde yaklaşık **90.995.000 m³/yıl** su arıtılarak TS266 Sular-İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun hale getirilerek kente verilmiştir.



İçme Suyu (Dobruca) Arıtma Tesisleri

Mustafakemalpaşa Akarca İçmesuyu Arıtma Tesisleri

M.Kemalpaşa Akarca İçmesuyu Arıtma Tesisleri 1985 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 103.68 m³/gündür.

2014 yılının ilk altı ayı günlük 8.915 m³/ay, yıl içinde yaklaşık **3.296.647 m³/yıl** içmesuyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



Mustafakemalpaşa Akarca İçmesuyu Arıtma Tesisleri

İnegöl Alanyurt İçmesuyu Arıtma Tesisleri

İnegöl Alanyurt İçmesuyu Arıtma Tesisleri 2009 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 960 m³/gündür.

2014 yılının son altı ayı günlük 960 m³/gün yıl içerisinde yaklaşık **345.600 m³/yıl** içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



İnegöl Alayunt İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Mustafakemalpaşa Çan Deresi İçmesuyu Arıtma Tesisi

M.Kemalpaşa Çandere İçmesuyu Arıtma Tesisi 2008 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 18.150 m³/ gündür.

2014 yılının ilk altı ayı 17.282 m³/gün yıl içinde yaklaşık **5.857.681 m³/yıl** içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



Mustafakemalpaşa Çan Deresi İçmesuyu Arıtma Tesisi

Büyükorhan İçmesuyu Arıtma Tesisi

Büyükorhan İçmesuyu Arıtma Tesisi 2014 yılı Nisan ayında devreye alınmıştır. Kapasitesi 1.296 m³/gündür.

2014 yılının son altı ayı günlük 953m³/gün yıl içerisinde yaklaşık **236.527 m³/yıl** içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek İlçeye verilmiştir.



Büyükorhan İçmesuyu Arıtma Tesisi

Karacabey İçmesuyu Arıtma Tesisi

Karacabey İçmesuyu Arıtma Tesisi 1999 yılında devreye alınmıştır. 2005 yılında rehabilitasyonu tamamlanmıştır. Kapasitesi 12.096 m³/gündür.

2014 yılının ilk altı ayı 11.876 m³/gün yıl içinde yaklaşık **2.148.696 m³/yıl** içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.



Arıtma Tesisi

Diğer İçmesuyu Arıtma Tesisleri

- Karacabey - Gölecik İçmesuyu Arıtma Tesisi
- Karacabey - Şahmelek İçmesuyu Arıtma Tesisi
- Mustafakemalpaşa - Karadere İçmesuyu Arıtma Tesisi
- İnegöl - Mezitler İçmesuyu Arıtma Tesisi
- İnegöl - İsaören İçmesuyu Arıtma Tesisi

Atık Su Arıtma Tesisleri

Doğu Atık Su Arıtma Tesisleri

Doğu Atık Su Arıtma Tesisleri 2006 yılı Nisan ayında tamamlanarak devreye alınmıştır. 240.000 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2014 yılında günlük 213.582 m³/gün, yıl içinde yaklaşık **77.957.410 m³/yıl** atık su arıtılarak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve A.B. Standartlarına uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir.



Doğu Atık Su Arıtma Tesisleri

Batı (Özlüce) Atık Su Arıtma Tesisleri

Batı Atık Su Arıtma Tesisleri 2006 yılı Nisan ayında tamamlanarak devreye alınmıştır. 87.500 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2014 yılında günlük 51.205 m³/gün, yıl içinde yaklaşık **18.689.782 m³/yıl** atık su arıtılarak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve A.B. standartlarına uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir.



Batı (Özlüce) Atık Su Arıtma Tesisleri

Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesisleri

Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesisleri 2000 yılında yapılmış olup 2003 yılında da genel tamir ve bakımı yapılmıştır. 2010 yılı Temmuz ayında kanalizasyon hatlarının yenilenmesi çalışmaları sırasında eski terfi pompa istasyonları iptal edilmiş ve hatları birleştirilerek yeni yapılan terfi pompa istasyonunda toplanmış, 2011 yılında tesis revize edilmiştir.

2014 yılında günlük 761 m³/gün, yıl içinde yaklaşık **278.000 m³/yıl** atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak denize deşarjı sağlanmıştır.



Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesisleri

Gemlik - Nacaklı İçme Suyu Arıtma Tesisi

Gemlik Nacaklı İçme Suyu Arıtma Tesisi 1998 yılı Haziran ayında devreye alınmış, 2008 yılında rehabilitasyonu tamamlanmıştır. Kapasitesi 11.040 m³/gün 'dür.

2014 yılında günlük 4.435 m³/gün, yıl içinde yaklaşık **1.618.809 m³/yıl** içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek kente verilmiştir.



Gemlik-Nacaklı İçme Suyu Arıtma Tesisi

Mudanya Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisleri

Mudanya Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi 2006 yılında devreye alınmıştır, 25.000 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2014 yılında günlük 12.785 m³/gün, yıl içinde yaklaşık **4.666.464 m³/yıl** atık su arıtılmış ve mevzuata uygun olarak deniz deşarjı sağlanmıştır.



Mudanya Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisleri

Çalı Atık Su Arıtma Tesisi

Çalı Atık Su Arıtma Tesisi 2002 yılında devreye alınmıştır. 2006 yılında rehabilitasyonu tamamlanan tesis 1.000 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2014 yılında günlük 14 m³/gün, yıl içinde yaklaşık **1.673 m³/yıl** atık su arıtılmış ve mevzuata uygun olarak alıcı ortama deşarjı sağlanmıştır. Nisan 2014 itibari ile kapatılmıştır.



Çalı Atık Su Arıtma Tesisi

Kayapa Paket Atık Su Arıtma Tesisi

Kayapa Paket Atık Su Arıtma Tesisi 2007 yılında yapılmış olup 2009 yılında yapılan revizyonlar ile Nilüfer İlçesi Kayapa toplu konut alanından toplanan evsel nitelikli atık suların fiziksel ve biyolojik olarak arıtılmasına hizmet etmektedir. Ortalama 400 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2014 yılında günlük 286 m³/gün, yıl içinde yaklaşık **104.346 m³/yıl** atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak denize deşarjı sağlanmıştır.



Kayapa Paket Atık Su Arıtma Tesisi

Kent Katı Atık Depolama Alanı Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi

Kent Katı Atık Depolama Alanından kaynaklanan süzüntü sularının arıtılması amacıyla inşaa edilen süzüntü suyu arıtma tesisi 2004 yılında devreye alınmıştır. Tesisin kapasitesi 500 m³/gün'dür.

2014 yılında günlük 494 m³/gün, yıl içinde yaklaşık **180.409 m³/yıl** süzüntü suyu arıtılarak Batı Atık Su Arıtma Tesisi' ne iletilmesi sağlanmıştır.



Kent Katı Atık Depolama Alanı Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi

Gemlik Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi

Gemlik Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi 2007 yılında tamamlanarak devreye alınmıştır. Ortalama 27.000 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2014 yılında günlük 19.153 m³/gün, yıl içinde yaklaşık **6.990.868 m³/yıl** atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak derin deniz deşarjı sağlanmıştır.



Gemlik Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi

Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi

Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi 2006 yılında tamamlanmış olup 2011 yılında yapılan revizyonlar ile Nilüfer ilçesi toplu konut alanından toplanan evsel nitelikli atık suların fiziksel ve biyolojik olarak arıtılmasına hizmet etmektedir. Ortalama 1.200 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2014 yılında günlük 1.321 m³/gün, yıl içinde yaklaşık **482.153 m³/yıl** atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak Hasanağa deresine deşarjı sağlanmıştır.



Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi

Karacabey Atık Su Arıtma Tesisi

Karacabey bölgesi atıksularının arıtılması amacıyla İller Bankası tarafından yapılmış olup 1993 yılında işletmeye alınmıştır. Aerobik ve fakültatif lagünlerden oluşan tesis Nisan 2014 tarihinden itibaren kurumumuz tarafından işletilmektedir.

Tesis kapasitesi 8.500 m³/gün' dür.



Karacabey Atık Su Arıtma Tesisi

İnegöl Yenice Atık Su Arıtma Tesisi

İnegöl Yenice bölgesi atıksularının arıtılması amacıyla İller Bankası tarafından yapılmış olup 1994 yılında işletmeye alınmıştır. Biyolojik Arıtma ünitelerine sahip olan tesis Nisan 2014 tarihinden itibaren kurumumuz tarafından işletilmektedir.

Tesis kapasitesi 3.500 m³/gün dür.



İnegöl Yenice Atık Su Arıtma Tesisi

c - Tahsilat Şubeleri

Acemler, İhsaniye, Setbaşı, Gençosman, Eğitim, Gemlik, Mudanya, Görükle, Kestel, Gürsu, Güzelyalı, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Orhangazi, Yenişehir, Orhaneli, Büyükşehir, Keles, Harmanlık tahsilat şubeleri ve merkez vezne, 4 adet yerinde (mobil) tahsilat aracı ve Acemler mobil tahsilat şefliği.



Acemler Tahsilat Şubesi



Mobil Tahsilat Aracı

d - Sosyal Tesisler

Düğün Salonu ve Yemekhane (Buski Kampüsü)

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarına öğle yemeği, personeline ve Bursa halkına cemiyetler için salon olarak hizmet veren düğün salonu ve yemekhane, 2006 yılı Mart ayından itibaren kiralama yöntemi ile hizmetine devam etmektedir. Cemiyetler için 2 adet salon bulunmaktadır. Açık bahçe olarak kullanılan bölüm 700 kişi oturma kapasiteli, kapalı salon olarak kullanılan bölüm ise 500 kişi oturma kapasitelidir.



Düğün Salonu



Yemekhane

Spor Tesisleri (Buski Kampüsü)

Genel Müdürlüğümüz nezdinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü' nün yönetiminde 4 adet tenis kortu mevcuttur. Bunlar 2 adet kapalı, 2 adet açık kort şeklindedir.



Futbol Sahası

Dobruca Lojmanları

Dobruca semtinde 16 adet lojman bulunmaktadır. Kamu konutlarının tahsis şekli, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 3. Maddesine göre yapılmaktadır. Dobrucada bulunan lojmanlar Kamu Konutları Yönetmeliğine göre, görev tahsisli, sıra tahsisli ve hizmet tahsisli olmak üzere 3 şekilde tahsis edilmektedir.

Özel tahsisli lojman bulunmamaktadır. Lojman kira bedelleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü' nün her yıl yayınladığı tebliğe göre hesaplanmaktadır.

Dobruca Sosyal Tesisleri

Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait olup; 15.05.2014 tarihi itibarıyla işletmesi BURFAŞ A.Ş.'ye geçmiştir. 4 katlı kafeterya ve açık-kapalı restaurantı bulunmaktadır.



Dobruca Sosyal Tesisleri



Dobruca Lojmanları



Dobruca Sosyal Tesisleri

e - Araç ve İş Makinesi Parkı

Mevcut Araçlar

İlçe Bazında Araçlar	Adet
Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer	212
Gemlik	6
Mudanya	12
Kestel	4
Görükle	3
Gürsu	4
B. Orhan	-
Harmancık	-
İznik	1
İnegöl	10
Karacabey	5
Keles	-
Mustafakemalpaşa	6
Orhangazi	4
Orhaneli	1
Yenişehir	3
TOPLAM	271

Kiralanın Araçlar

Araç Cinsi	Adet
Binek Oto	105
Kamyonet	48
4x4 Kamyonet	30
Binek Station (12 saatlik)	8
Minibüs (12 saatlik)	5
Şoförsüz Binek	7
Toplam	203



İş Makinesi

f - Pompa İstasyonları - Su Depoları - Kuyular

Pompa İstasyonları

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde;

- 33 adet ana pompa istasyonu 103 ünite,
- 33 adet lokal amaçlı pompa istasyonu 81 ünite,
- 14 adet acil terfi pompa istasyonu 25 ünite,
- 21 adet atık su pompa istasyonu 52 ünite bulunmaktadır.



Pompa İstasyonu

Kuyular

İlçeler	Adet	İlçeler	Adet
Osmangazi	78	Orhangazi	7
Yıldırım	40	M.Kemalpaşa	5
Nilüfer	1	Yenişehir	12
Gemlik	14	İznik	6
Mudanya	2	Orhaneli	2
Gürsu	1	Keles	2
Kestel	-	Büyükorhan	6
İnegöl	29	Harmancık	2
Karacabey	6		
TOPLAM			213



Kuyu

Su Depoları

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde;

- 328.375 m³ kapasiteli 150 adet depo mevcuttur.



Su Deposu İnşaatı



C.2- Örgüt Yapısı

a. Karar Alma Organları

Genel Kurul

Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda BUSKİ Genel Müdürlüğü' nün de Genel Kuruludur.

Denetçiler


İki denetçiden oluşmaktadır.


Yönetim Kurulu


Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Müdür, bir Genel Müdür Yardımcısı ve dışardan atanan en az üç üyeden oluşmaktadır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü

Bir Genel Müdür ve üç Genel Müdür Yardımcısından oluşmaktadır.



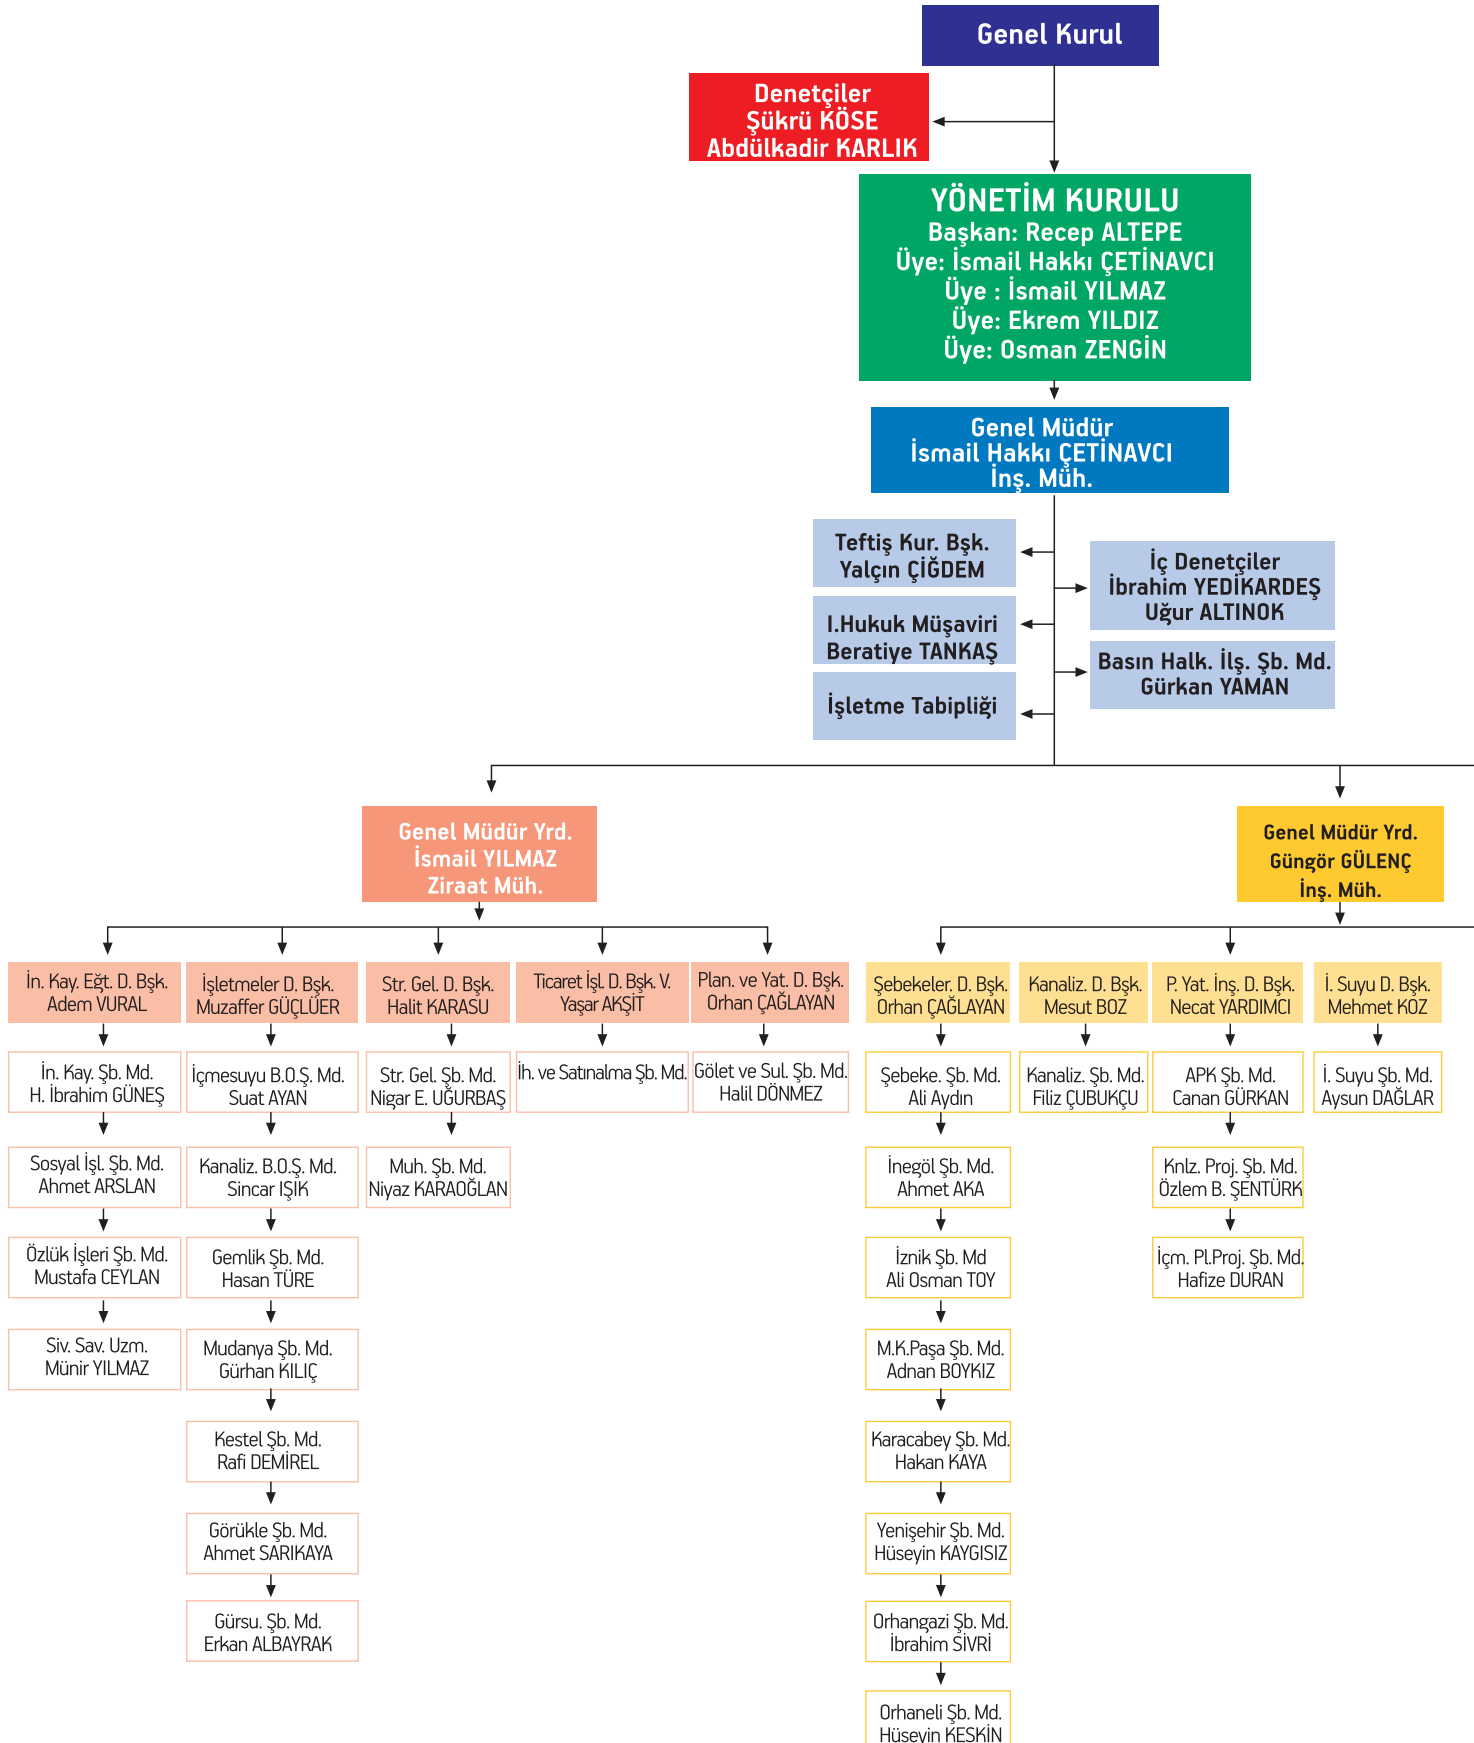



Network (ağ) İzleme ve Takip Ekranı

Ziyaretçi İnternet Hizmetleri


Genel Müdürlüğümüz ziyaretçilerinin internet faaliyetlerinden yararlanabilmeleri için kurum bünyesinde 5651 nolu yasaya uygun olarak internet hizmet portalı hazırlandı.



Ziyaretçi Sayfası Giriş Paneli

BUSKİ Çağrı Merkezi

Vatandaşlarımızın BUSKİ Genel Müdürlüğümüzle ilgili olan her türlü arıza ihbarlarını ve şikayetlerini bildireceği 7/24 kesintisiz ulaşabileceği, bilgi alabileceği merkezimizdir. Vatandaşlarımız Çağrı Merkezimizi arayarak, arıza kayıt numarası oluşturulup vatandaşımızın GSM telefonuna SMS olarak bildirimde bulunmaktadır. Vatandaşımız kendisine iletilen arıza kayıt numarası ile oluşturulan işin sonlanması durumunda da "işleminiz tamamlandı" olarak SMS iletilmektedir.

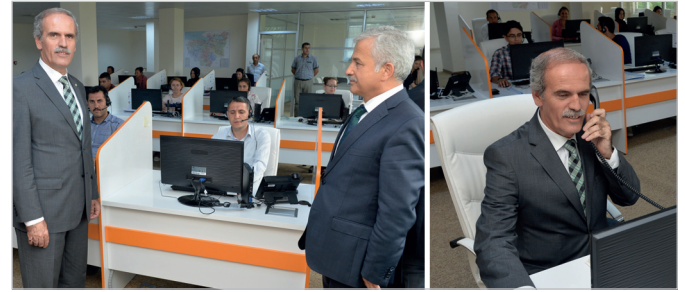

Çağrı Merkezi

Nitelikli Elektronik İmza

Akıllı kart, akıllı kart okuyucu, nitelikli elektronik imza sertifikası ve sürücü yazılımları; kullanıcı bilgisayar sistemlerine yüklenmesi, aktivasyonlarının yapılmasıdır. Uygulama olarak, www.turkiye.gov.tr adlı e-devlet kapısı üzerinden e-imza ile UYAP sistemi, Çevre Bakanlığı e-izin sistemine giriş yapılmasıdır.

Hali hazırda kurumumuzda 89 adet Nitelikli Elektronik İmza Sertifikası (NES) mevcuttur.



e-imza

Araç Takip Sistemi

BUSKİ Araç Takip Sistemi ile aşağıdaki araç grubundaki araçlarını, anlık olarak GPS vasıtasıyla uydudan alınan bilgilere göre takip edebilmektedir.




Bir Hidromek Aracının İzlendiği Harita

BUSKİ İnternet Şubesi Bilgi Sistemi (e-buski)

BUSKİ Aboneleri İnternet şubesine üye olarak borç sorgulama, fatura ödeme, geçmiş dönem faturalarını izleme, isim değişikliği başvurusu, şikayet öneri bildirimini işlemlerini online olarak ve 128 bit SSL güvenliği altında gerçekleştirebilirler.

2014 yılı içinde Buski web sayfası değiştirilmiş olup, abonelerin abonelik işlemleri, arızalar ve su kesintisi bilgilerine daha kolay ulaşmaları sağlanmıştır.



BUSKİ İnternet Şubesi Ekranı

Personel Devam Kontrolü Sistemi

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, Personel devamlılığında; giriş-çıkış verilerinin bilgisayar ortamına direkt aktarılması, bu verilerin işlenip raporlanması veya bordroya dökülmesi işlerinin yapılabilmesi için Personel Devam Kontrol Sistemi yani kısaca PDKS programı kullanılmaktadır. İşe giriş ve çıkış saatlerinin dijital ortamda toplanması, uzaktan personelin ya da personel gruplarının üstleri tarafından birçok noktada (network üzerinden) denetlenmesi.

Sıra No	Sicil No	Adı Soyadı	Giriş Saati	Çıkış Saati
1	10-0977	ÖZLEK ÖZÜLÜ	07:47:49	16:59:14
2	BGM0438	MURAT KAHRAMAN	07:47:24	16:57:19
3	BGM1548	GURUL ERDOĞR	08:01:12	16:59:24
4	BGM1554	FATİH TUNÇER	07:52:02	16:59:39
5	BGM1558	SEÇİN HAMİTOĞLU	07:58:12	16:59:44
6	BGM0287	ÖMER YÜCEL	08:06:54	16:59:51
7	BGM0343	ÖZLEM YÜCEL	08:07:58	16:59:57
8	BGM1393	HALİT BENDÜL	07:50:37	17:01:04
9	BGM0506	SENAY ALKAN	08:02:32	17:01:17
10	BGM1359	AHMET METİN KARA	07:50:39	17:01:19
11	1-1899	SAİT ULUTERE	07:50:47	17:01:56
12	BGM1693	AHMET BALABAN	08:00:04	17:03:11
13	BGM1556	EMRE SEVİM	08:04:49	17:03:12
14	1-1604	ENGİN AKYILDIZ	07:54:01	17:03:29
15	BGM0394	MEHMET SİMŞEK	07:54:20	17:03:41
16	BGM1537	BURAK GÜMÜŞ	08:14:34	17:03:49
17	1-1630	MESUT AYASOY	08:02:29	17:08:09
18	BGM1557	BERK YERİLLİ	07:54:33	17:10:52
19	BGM0746	ERKEM YILMAZ	07:59:37	17:11:39
20	BGM1638	ABDULLAH TAHA ÖZTÜRK	08:13:50	17:11:39

Personel Devam Kontrol Sistemi Ekranı

Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistemi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak BUSKİ İnternet Şubesi üzerinden vatandaşın kuruma gelmesi gerekmeden, bilgilendirmenin e-posta veya posta ile yapılmasını sağlayan kapsamlı bir sistemdir.

Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistem Sayfası

Kurumsal İnternet Sitesi

BUSKİ' nin sunduğu hizmetleri, gerçekleştirdiği faaliyetleri dünyanın her yerinden kolayca ulaşılabilen bir platform olan İnternet üzerinden duyurabilmekte, abone hizmetlerini, tahsilât işlemlerini, abone bilgilendirme hizmetlerini, ihale duyurularını elektronik ortamda internet üzerinden de gerçekleştirmekte, verim ve hizmette kalitenin artışı sağlamaktadır.



Kurumsal İnternet Sitesi Anasayfası

Yerel İnternet (buskinet) Bilgi Sistemi


BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışanların kurum içerisindeki herkese ve her uygulamaya kolayca erişmesini sağlamaktadır. İçerdiği farklı uygulamalarla Arıza Takibi, E-posta takibi, Mevzuat takibi, Stok takibi vb. yapmaya imkân vermektedir.



Yerel İnternet Bilgi Sistemi Ekranı

Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunun alt düzenlemeleri gereği kurumumuz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülen işlemlerin Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe sistemine göre gerçekleştirilmesine imkan veren, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile irtibatlı işler yürüten birimler ile harici entegrasyon aracılığıyla veri alışverişinde bulunan, güncel teknoloji standartlarına uyum sağlaması amacıyla düzenli teknik güncellemeleri temin edilen yazılım sistemidir.



Tahsisat İşlemleri Sayfası

Ambar Otomasyon Bilgi Sistemi

Ambar otomasyon sistemi, kurum ambarında gerçekleştirilebilecek tüm operasyonları etkin ve verimli bir şekilde yönetmekte, operasyonların kâğıtsız, en kısa sürede, en az insan ve makine kaynağı ile hatasız tamamlanmasını sağlamakta, karar vermekte, gerçekleştirilen operasyonları çevrimiçi izlemekte olup gerçekleştirilmiş işlemlerin bilgilerini raporlar halinde sunmak üzere tasarlanmıştır.

Yeni Mal	Ambar	S. Kodu	Adı	Grup	Birim	Durum	Giren	Çıkan	Ara
1	1100736	ABONE SÖZLEŞMESİ	22	ADET	67000	0	0	0	
1	2506328	AKIK AĞIZLI ANAHTAR 12/13	13	ADET	0	0	0	0	
1	2506411	AKIK AĞIZLI ANAHTAR 16-17mm. KISA	13	ADET	0	0	0	0	
1	2506412	AKIK AĞIZLI ANAHTAR 12-13mm. KISA	13	ADET	0	0	0	0	
1	2506413	AKIK AĞIZLI ANAHTAR 14-15mm. KISA	13	ADET	0	0	0	0	
1	2506259	AKIK AĞIZLI ANAHTAR 16x17	13	ADET	0	0	0	0	
1	2506414	AKIK AĞIZLI ANAHTAR 16-17mm. KISA	13	ADET	0	0	0	0	
1	2506415	AKIK AĞIZLI ANAHTAR 16-19mm. KISA	13	ADET	0	0	0	0	
1	2506258	AKIK AĞIZLI ANAHTAR 24x27	13	ADET	0	0	0	0	
1	2506257	AKIK AĞIZLI ANAHTAR 32/36	13	ADET	0	0	0	0	
1	2506256	AKIK AĞIZLI ANAHTAR 36/41	13	ADET	0	0	0	0	
1	2504945	ADAPTOR GİDER 50mm.	1	ADET	51	0	0	0	
4	6009265	ADAPTOR 12V. 1,5 Amper	20	ADET	0	0	0	0	
2	3268933	ADAPTOR 350mm.	2	ADET	0	0	0	0	
3	3268934	ADAPTOR 400mm.	3	ADET	0	0	0	0	
3	3268935	ADAPTOR 500mm.	3	ADET	0	0	0	0	
3	3268936	ADAPTOR 600mm.	3	ADET	0	0	0	0	

Ambar Otomasyon Bilgi Sistemi Ekranı

Ruhsat - Analiz Bilgi Sistemi

Aritma Tesisleri Daire Başkanlığınca kullanılan ruhsat - analiz bilgi sisteminde atık su kalite kontrol ruhsatı sahibi firma bilgileri ve o firmalara ait periyodik atık su analiz değerleri girilmektedir.

GENEL BİLGİLER		FİŞ FİRMA A.Ş.		FİŞ NO 2009		FİŞ TARİHİ 05/05/2009		FİŞ NO 2009	
Firma İsmi		FİŞ FİRMA A.Ş.		FİŞ NO 2009		FİŞ TARİHİ 05/05/2009		FİŞ NO 2009	
Ruhsat Tarih-Sayı-Geç.Süresi		05/05/2009		05/05/2009		05/05/2009		05/05/2009	
Faliyet Adresi		SIRAMELER MAH. AVRUPA KONSEYİ BULVARI		SIRAMELER MAH. AVRUPA KONSEYİ BULVARI		SIRAMELER MAH. AVRUPA KONSEYİ BULVARI		SIRAMELER MAH. AVRUPA KONSEYİ BULVARI	
Talefon Numarası		0202554		0202554		0202554		0202554	
Faliyet Sektörü		Kimya Endüstrisi		Kimya Endüstrisi		Kimya Endüstrisi		Kimya Endüstrisi	
Alış Faliyet Sektörü		Deterjan ve Benzeri Yüzeysel Akıcı Maddelerin Üretimi		Deterjan ve Benzeri Yüzeysel Akıcı Maddelerin Üretimi		Deterjan ve Benzeri Yüzeysel Akıcı Maddelerin Üretimi		Deterjan ve Benzeri Yüzeysel Akıcı Maddelerin Üretimi	
Çalışan Personel Sayısı		10		10		10		10	
Vardiye Sayısı - Saatleri		24		24		24		24	
H.İç-Çal.Gün Sayısı		30		30		30		30	
Üretim Kaps. Mevsimsel değ.		Değişim Yok		Değişim Yok		Değişim Yok		Değişim Yok	
SU TEMİN ŞEKLİ		Abone No		607054		Toplam Debi		200	
Şebeke Suyu		Abone No		607054		Debi (m3/ay)		2000	
Kırsal Suyu		Abone No		607054		Debi (m3/ay)		2000	
Diğer		Abone No		607054		Debi (m3/ay)		2000	
SU KULLANIM YERLERİ		Üretim (Proses)		Debi (m3/ay)		Temassız Soğutma		Debi (m3/ay)	
Üretim (Proses)		Debi (m3/ay)		1200		Temassız Soğutma		Debi (m3/ay)	
Üretim (Proses)		Debi (m3/ay)		1200		Temassız Soğutma		Debi (m3/ay)	

Ruhsat - Analiz Bilgi Sistemi Firma Giriş Ekranı

Arıza Takip Sistemi

Güvenlik Tur Kontrol Sistemi


Güvenlik personellerinin belirli zaman dilimlerinde BUSKİ ve BUSKİ'ye bağlı depolara kurulan güvenlik noktalarının kontrol edilip edilmediğinin bilgisini rapor şeklinde sunan sistemdir.



Güvenlik Tur Kontrol Program Arayüzü

Belediye İnternet Paylaşım Sistemi

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nde hâlihazırda mevcut coğrafi tabanlı bilgi sistemlerinde üretilen verilerin daha geniş kapsamlı ve daha kolay izlenebilmesi / paylaşılabilmesi için internet tabanlı olarak çalışan yöneticilerin, coğrafi bilgi sistem operatörlerinin ilgili dairelerin yetkili kullanıcılarının rahatlıkla erişip kullanabilecekleri ve istenilen sorgulamaları harita üzerinde ilçe, mahalle, bina numarası ile sağlayabileceği bir sistemdir.




Belediyeler Bilgi Paylaşım Sistem Ekranı

Abone Bilgi Sistemi Web Servisi

BUSKİ İnternet Şubemizden halihazırda kullanılan Abone Bilgi Sistemi Web Serisi ile Çevrim-içi tahsilat yapılabilmektedir. Bazı Bankalar halihazırda Dosya Paylaşım(FTP) Sistemini kullanarak Çevrim-dışı tahsilat yapabildiği gibi, bir çok anlaşmalı Banka ve PTT Web servisimizi kullanarak Çevrim-içi tahsilat yapmaktadır. Web servisimizi aktif olarak PTT ve tüm bankalar ile on-line tahsilat işlemlerini gerçekleştirmektedir.


Ayrıca 20 noktada kurulumu yapılan otomatik ödeme noktası devreye alınmıştır. Böylece abonelere daha hızlı ve çeşitli ödeme olanakları sunmaktadır.

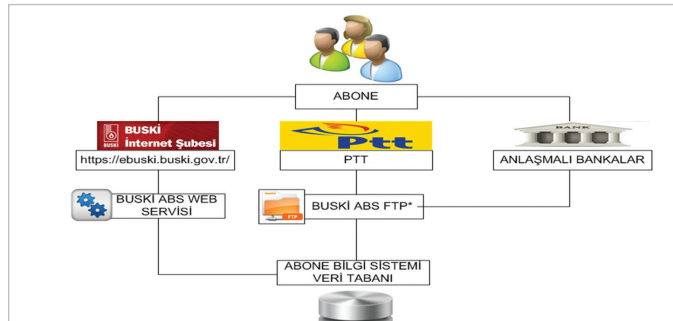

Abone Bilgi Sistem Ekranı

Hasta Takip Sistemi

Çağdaş bir sağlık hizmeti sunmak, sağlık istasyonunda kayıtların düzenli ve kontrollü olarak yürütülmesi amacıyla bir bilgisayar otomasyon programına geçilmesi planlanmıştır. Kurulması öngörülen otomasyon sistemi sayesinde personele sunulan sağlık hizmetlerinin daha iyi ve daha hızlı hale getirilmesi, kaynakların verimli şekilde kullanılması ve kayıpların en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.



Hasta Takip Sistemi Program Arayüzü

Lisanslama Takip Sistemi

Genel Müdürlüğümüz birimlerinde kullanılan Power Map, Water CAD, MicroStation, InRoads, InRoads Survey, GeoMedia paket programların lisans adetleri ve 1 (bir) seneye ait kullanıcı detayları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

ADRES	PROGRAM ADI	TOPL LİSA
BUSKİ Genel Müdürlüğü - Bursa	Bentley Power Map	81
BUSKİ Genel Müdürlüğü - Bursa	Bentley Water CAD	5
BUSKİ Genel Müdürlüğü - Bursa	MicroStation	12
BUSKİ Genel Müdürlüğü - Bursa	InRoads	2
BUSKİ Genel Müdürlüğü - Bursa	InRoads Survey	2

Lisanslama Takip Sistemi Ekranı

Otomatik Ödeme Noktası

Akıllı Vezne Sistemi, gelişmiş teknolojiyle şehir hayatını kolaylaştırmak ve vezne hizmetlerinin 7/24 kesintisiz olarak verilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu sistem BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su faturası ve kartlı sayaçların kartlarına kredi yüklenmesi işleminde kullanılmaktadır. Kredi Kartı ile tahsilat yapabilmek ve makbuz kesme özelliklerine sahiptir.



Otomatik Ödeme Noktası

Scada Sistemi

Yapımı 2008 yılında tamamlanan ve Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya İlçelerindeki bazı tesisleri kapsayan içme suyu dağıtım SCADA sisteminin işletilmesine devam edilmiştir.

Osmangazi ilçesinde Yeni Ovaakça deposu, Nilüfer ilçesinde Görükle mevkiinde D46 su deposu, Mudanya Seçtepe deposu, Depo Çağrısan ve Depo Yeni Ovaakça SCADA kapsamına alınmıştır.

2013 yılında 36 adet içme suyu debimetresi, 9 adet muhtelif depo debimetreleri, Pompa Çağrısan, Depo Tepedevrent, Depo Çepni, Yeni yapılan bademli su deposu (DB3) ve Pompa Seçtepe scadaya dahil edilmiştir.

Ayrıca merkeze yeni bağlanan ilçe, belde ve köylerdeki çeşitli depo pompa otomasyonları yapılarak, depolar ile pompa istasyonları arasına seviye ihbar ve kontrol sistemleri kurularak otomatik ve kesintisiz hizmet sağlanmıştır.



Scada Kontrol Merkezi

Büro Makine ve Cihazları	Bilgisayar	715	Total Station Ölçüm Aleti	14
	Yazıcı	282	Arazi Kot Okuma Aleti	8
	Çizici (plotter)	5	Telsiz	279
	Tarayıcı (A0, A4 Scanner)	86	El Arazi Kot Okuma Aleti	9
	Sunucu Bilgisayar (Server)	28	Dijital Fotoğraf Makinesi	80
	Aktif Cihaz	57	Fax Cihazı	40
	Plan Kopya Makinesi	1	Diz Üstü Bilgisayar	79
	Fotokopi Makinesi	54	El Bilgisayarı	20
	Motorola Tablet	80		
Harita, Plan ve Projeler	1/1000 Ölçekli Halihazır Harita			10.412
	1/1000 Ölçekli Orto Foto			477




C. 4 - İnsan Kaynakları


Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Memur	369	371	499	500	504	513	514	518	523	525	524	525
İşçi	349	343	510	506	502	515	511	506	502	501	500	500
Hizmet Alımı	868	870	900	927	940	942	966	965	975	997	1038	1039
TOPLAM	1586	1584	1909	1933	1946	1970	1991	1989	2000	2023	2062	2064

Aylık Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları (Kişi)




Kadro Durumuna Göre Personelin Dağılımı (%)

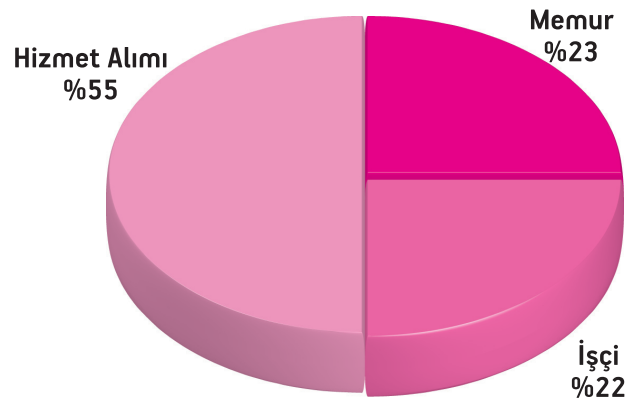


Memur Personel Sayıları (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Kadrolu Memur	366	368	495	496	500	509	510	514	517	519	518	519
Sözleşmeli Memur	3	3	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6
TOPLAM	369	371	499	500	504	513	514	518	523	525	524	525

Aylık Memur Personel Sayıları (Kişi)




Memur Personelin Dağılımı (%)



İşçi Personel Sayıları (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Kadrolu İşçi	346	340	507	503	499	512	508	503	499	498	497	497
Geçici İşçi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOPLAM	349	343	510	506	502	515	511	506	502	501	500	500

Aylık İşçi Personel Sayıları (Kişi)




İşçi Personelin Dağılımı (%)




Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel Sayıları (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Güvenlik Hiz.	67	67	96	99	100	101	101	101	109	109	118	118
Temizlik Hiz.	150	150	150	174	153	157	157	157	159	159	166	167
End. Ok. Hiz.	195	195	195	195	195	195	218	218	218	218	242	242
Teknik Hiz.	456	458	459	459	457	455	455	454	454	476	477	477
Çağrı Mer. Hiz.					35	34	35	35	35	35	35	35
TOPLAM	868	870	900	927	940	942	966	965	975	997	1038	1039

Aylık Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel Sayıları (Kişi)

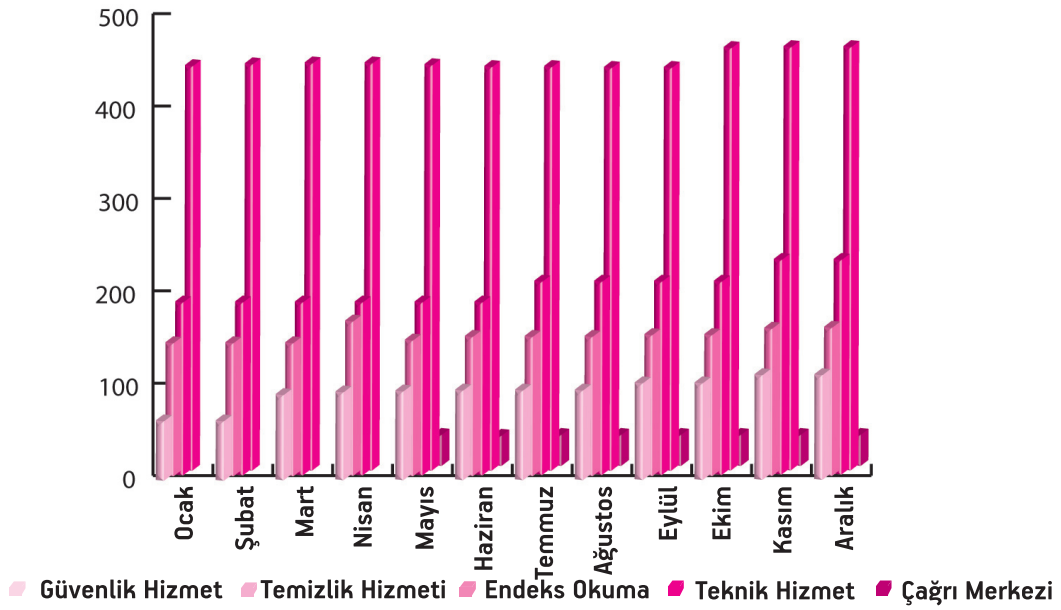


Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personelin Dağılımı




Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları (Kişi)

Yaş Grubu	Memur	İşçi	Toplam
20-30	28	6	34
31-40	149	105	254
41-50	211	318	529
51-60	126	68	194
61 ve üstü	11	3	14
Toplam	525	500	1025


Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları (Kişi)




Yaş Gruplarına Göre Personelin Dağılımı



Yaş Gruplarına Göre Memur Personelin Dağılımı




Yaş Gruplarına Göre İşçi Personelin Dağılımı




Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayıları (Kişi)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
İlköğretim	40	333	373
Lise	141	135	276
Önlisans	100	9	109
Lisans	225	22	247
Yüksek Lisans	15	1	16
Doktora	4	-	4
Toplam	525	500	1025


Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayıları (Kişi)




Öğrenim Durumuna Göre Toplam Personelin Dağılımı



Memur Personelin Dağılımı



İşçi Personelin Dağılımı



C.5 - Sunulan Hizmetler


a- İçme Suyu Hizmetleri

a.1- İçme Suyu Kaynakları

Şehre Verilen Suyun Kaynak Bazında Dağılımı (m³)

	Toplam
İçme Suyu Arıtma Tesisi	90.770.878
Pınar Kaynakları	14.776.606
Kuyular	5.209.151
Toplam	110.756.635

Şehre Verilen Suyun Kaynak Bazında Dağılımı (%)

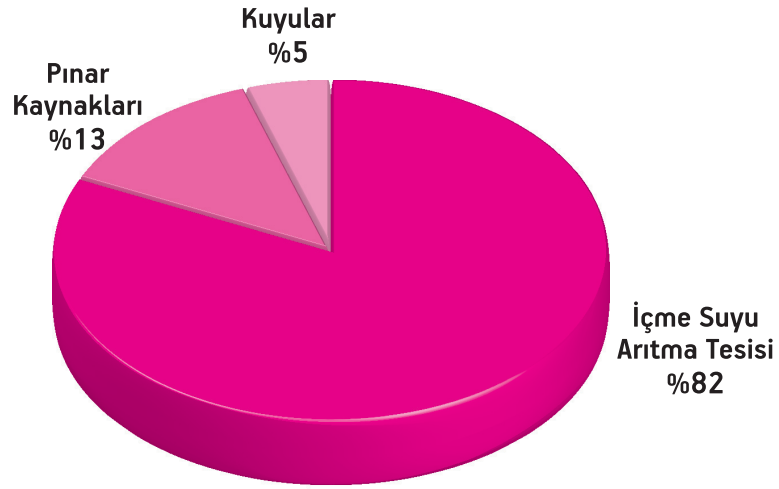

İçme Suyu Arıtma Tesisi


Tesisin Adı	Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi
Yeri	Dobruca Mahallesi
Hizmete Giriş Yılı	Kasım 1985
Kuruluş Amacı	Hizmet Alanındaki Yerleşim Birimlerine Sağlıklı ve Güvenilir İçme Suyunun Sağlanması.
Kapasitesi	500.000 m ³ / gün

Doğancı Barajı

Yeri	Orhaneli Karayolu	
Hizmete Giriş Yılı	1985	
Kuruluş Amacı	İçme Suyu Temini ve Akış Regülasyonu	
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	32.611.001 m ³	
Hizmet Dönemi	40 yıl	
Ortalama Doluluk Oranı	Ocak	%23
	Şubat	%21
	Mart	%24
	Nisan	%32
	Mayıs	%58
	Haziran	%76
	Temmuz	%64
	Ağustos	%51
	Eylül	%52
	Ekim	%64
	Kasım	%57
	Aralık	%69

Not: DSI'nin belirlediği maksimum işletme kotu 330,30 metrenin üzerinde olması durumunda doluluk oranı %100' ün üzerinde olmaktadır.

Doğancı Barajı Aylara Göre Doluluk Oranı (%)

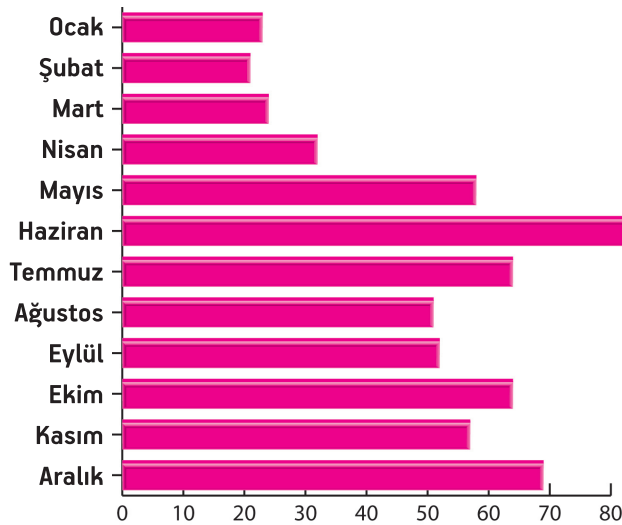


Doğancı Barajı

Nilüfer Barajı

Yeri	Keles Karayolu	
Hizmete Giriş Yılı	2007	
Kuruluş Amacı	İçme Suyu Temini ve Akış Regülasyonu	
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	33.895.000 m ³	
Hizmet Dönemi	40 yıl	
Ortalama Doluluk Oranı	Ocak	%61
	Şubat	%59
	Mart	%62
	Nisan	%65
	Mayıs	%84
	Haziran	%90
	Temmuz	%72
	Ağustos	%70
	Eylül	%55
	Ekim	%40
	Kasım	%46
	Aralık	%73

Not: DSI'nin belirlediği maximum işletme kotu 760,00 metrenin üzerinde olması durumunda doluluk oranı %100'ün üzerinde olmaktadır.


Nilüfer Barajı Aylara Göre Doluluk Oranı (%)

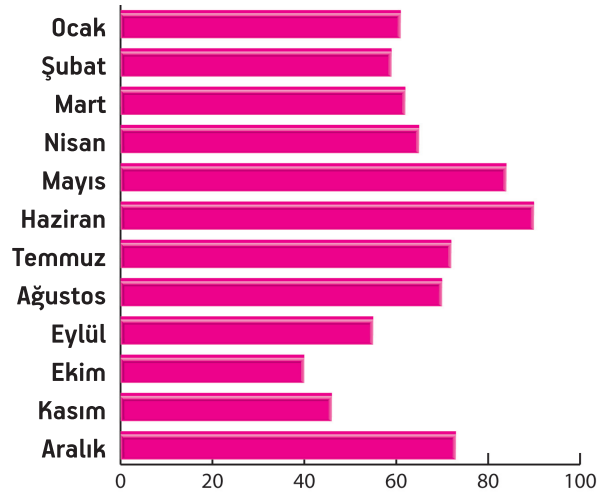


Nilüfer Barajı

Pınar Kaynaklarından Şehre Verilen Su Miktarı

Pınar Kaynakları	m ³	Pınar Kaynakları	m ³
D1	590.842	Kuştepe	3.691
D2	1.261.850	Alaşar	245.109
D3	1.622.770	Abdalmurat	98.525
D25	1.138.491	Tavacı	18.715
D22	1.057.642	Mevlevihane	7.069.737
D23	32.507	C4 - Gürsu	-
D11	182.671	Gürsu - Dışkaya	-
Yeni Çekirge	652.709	Çalı Üretim	29.068
D27- Dokuz Gözler	450.946	Akçalar Sanayi	3.875
Kestel-1. Kd. Üretim	317.458	Mudanya	-
Kestel-1. Kd. Aktaştepe	-		
TOPLAM			14.776.606

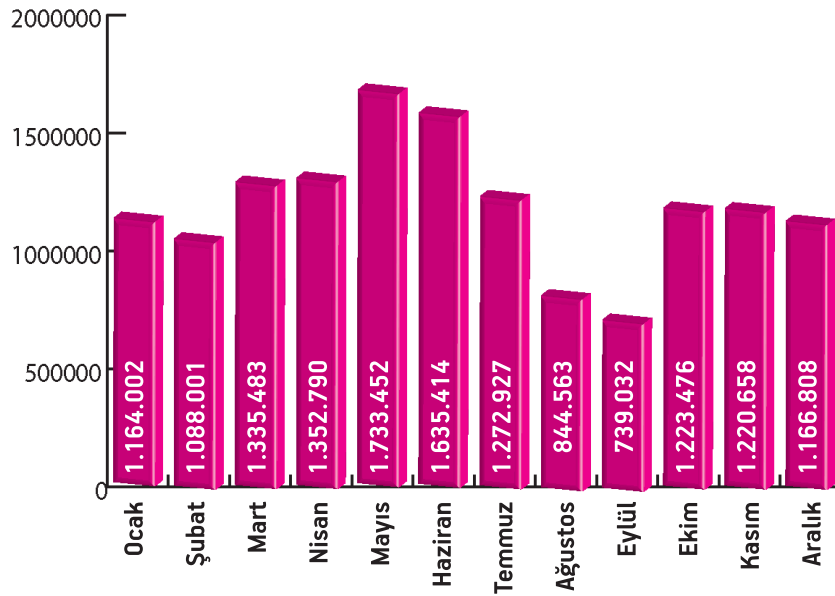Pınar Kaynaklarından Şehre Verilen Su Miktarı (m³)

Pınar Kaynaklarından Şehre Verilen Suyun Dağılımı (%)

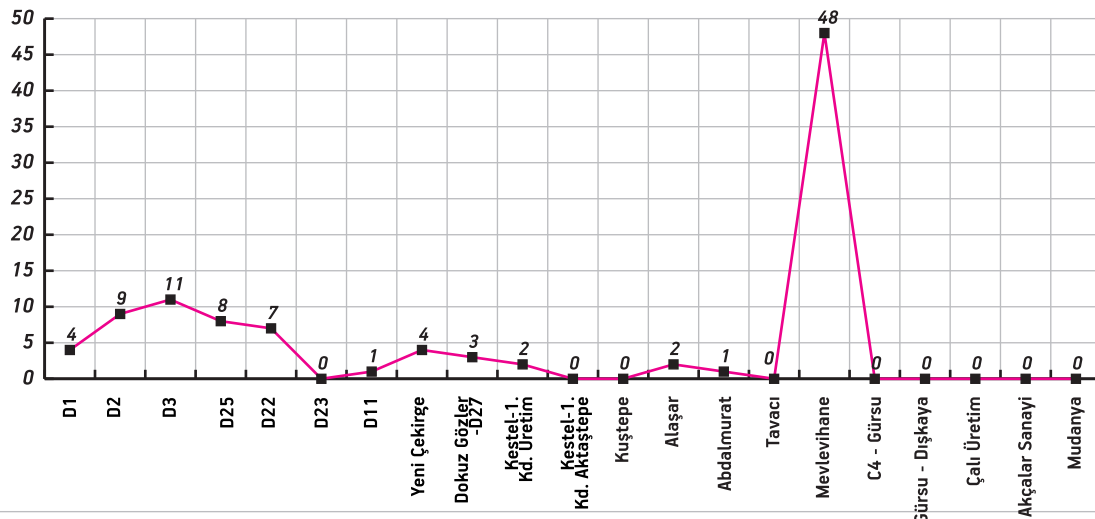

Pınar Kaynaklarından Beslenen Depolar**D1**

Yeri	Piremir Mah.
Kapasitesi (m ³ /gün)	1.619

D2

Yeri	Piremir Mah.
Kapasitesi (m ³ /gün)	3.457

D3

Yeri	Piremir Mah.
Kapasitesi (m ³ /gün)	4.446

D25

Yeri	Gökdere Boğazı
Kapasitesi (m ³ /gün)	3.119

D22

Yeri	Uludağ Yolu
Kapasitesi (m ³ /gün)	2.974

D23

Yeri	Uludağ Yolu
Kapasitesi (m ³ /gün)	89

D11

Yeri	Uludağ Yolu
Kapasitesi (m ³ /gün)	500

Yeni Çekirge

Yeri	Uludağ Yolu
Kapasitesi (m ³ /gün)	1.788

Dokuz Gözler-D27

Yeri	Kestel
Kapasitesi (m ³ /gün)	1.235

Kestel-1.Kd. Üretim

Yeri	Kestel
Kapasitesi (m ³ /gün)	870

Kestel-1.Kd. Aktaştepe

Yeri	Kestel
Kapasitesi (m ³ /gün)	5

Kuştepe

Yeri	Molla Fenari Mh.
Kapasitesi (m ³ /gün)	10

Alaşar

Yeri	Molla Fenari
Kapasitesi (m ³ /gün)	672

Abdalmurat

Yeri	Molla Fenari
Kapasitesi (m ³ /gün)	270

Tavacı

Yeri	Teferrüç Mh.
Kapasitesi (m ³ /gün)	51

Mevlevihane

Yeri	Pınarbaşı Mh.
Kapasitesi (m ³ /gün)	19,369

Çalı Üretim

Yeri	Çalı Mh.
Kapasitesi (m ³ /gün)	80

Akçalar Sanayi

Yeri	Nilüfer
Kapasitesi (m ³ /gün)	11

Kuyular

P1 - P2

Yeri	Acemler
Hizmete Giriş Yılı	1977
Kapasitesi (m ³ /gün)	51.840

P3

Yeri	Yavuz Selim Mah.
Hizmete Giriş Yılı	1977
Kapasitesi (m ³ /gün)	46.660

P8-PY4

Yeri	Hacivat Mah.
Hizmete Giriş Yılı	1997
Kapasitesi (m ³ /gün)	55.330

Acemler

Yeri	Alman Kanalı Kıyısında
Hizmete Giriş Yılı	2007
Kapasitesi (m ³ /gün)	90.000

Köy Kuyuları

Yeri	İsmetiye Köyü
Kapasitesi (m ³ /gün)	720

Osmangazi Sulama Kooperatifi Kuyuları

Yeri	Osmangazi
Kapasitesi (m ³ /gün)	36.720


Çeltik

Yeri	Çeltik
Kapasitesi (m ³ /gün)	41.040


Kuyulardan Şehre Verilen Su Miktarı (m³)

	Toplam
P1-P2	2.663.465
P3	-
P8-PY4	-
Acemler	634.570
Köy Kuyuları	-
OSK	114.048
Çeltik	1.797.068
TOPLAM	5.209.151


Akış (Zon) Şemaları

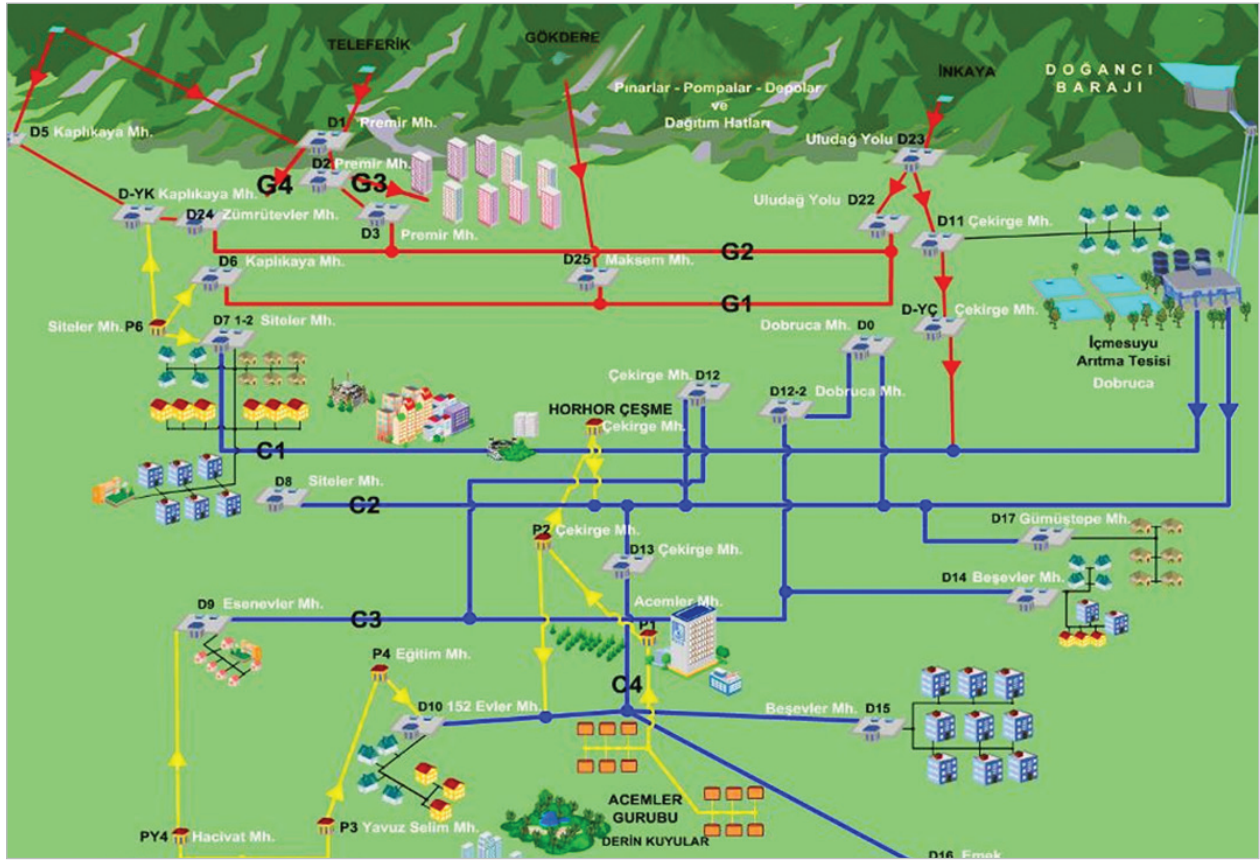


Tüm Zonlar

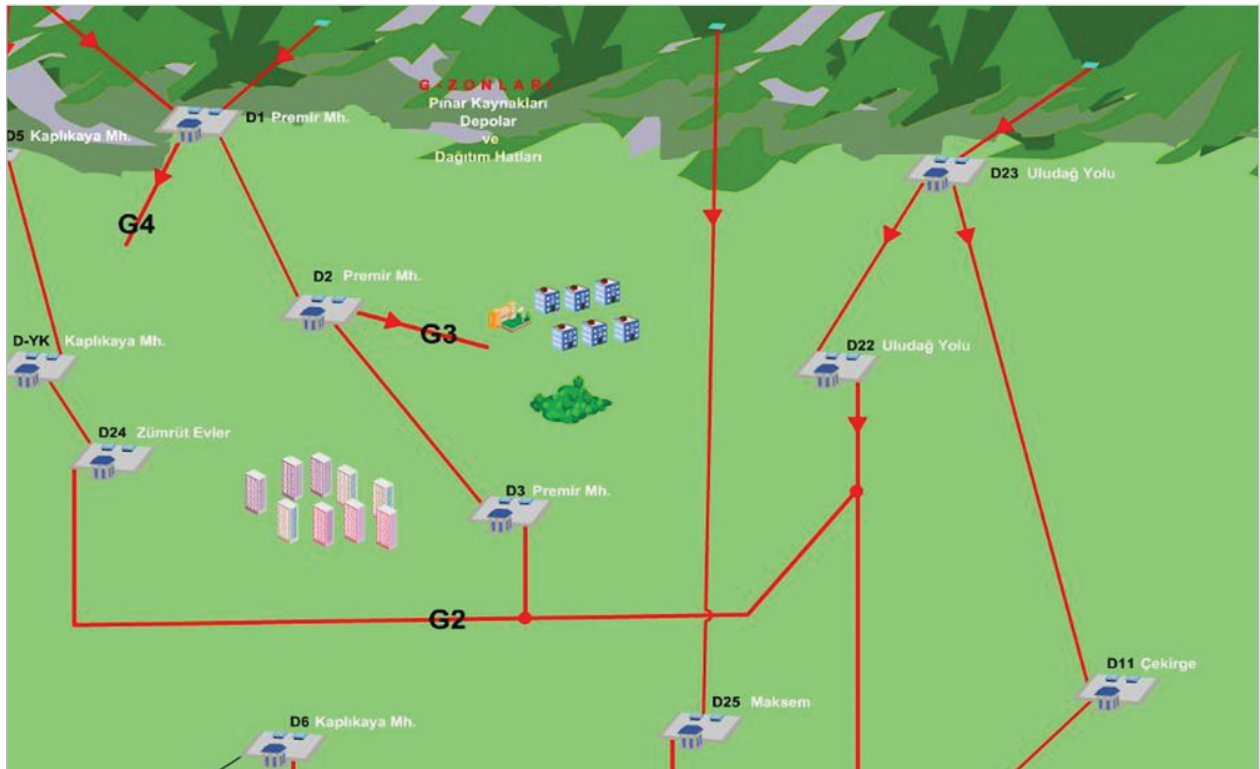

Pınar Kaynakları G - Zonları

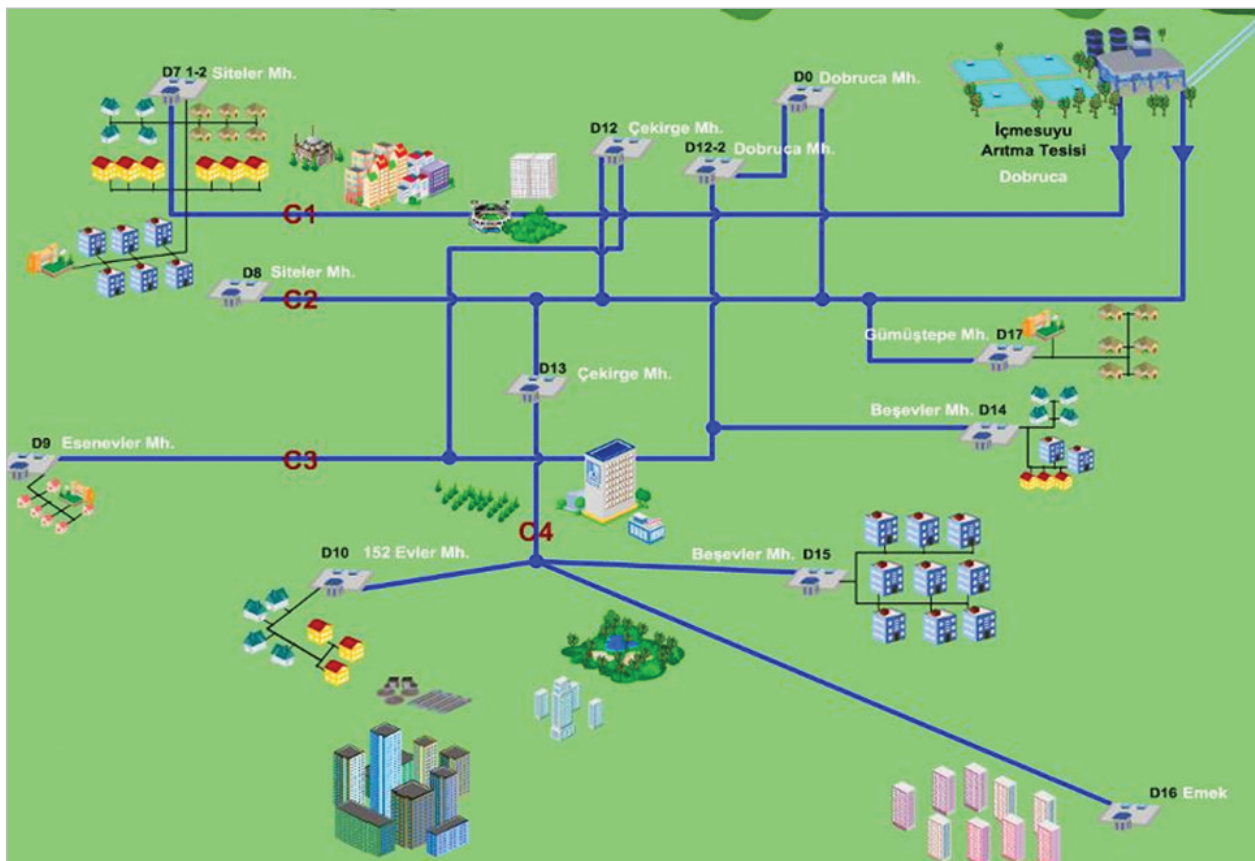

Yerüstü Suyu C - Zonları

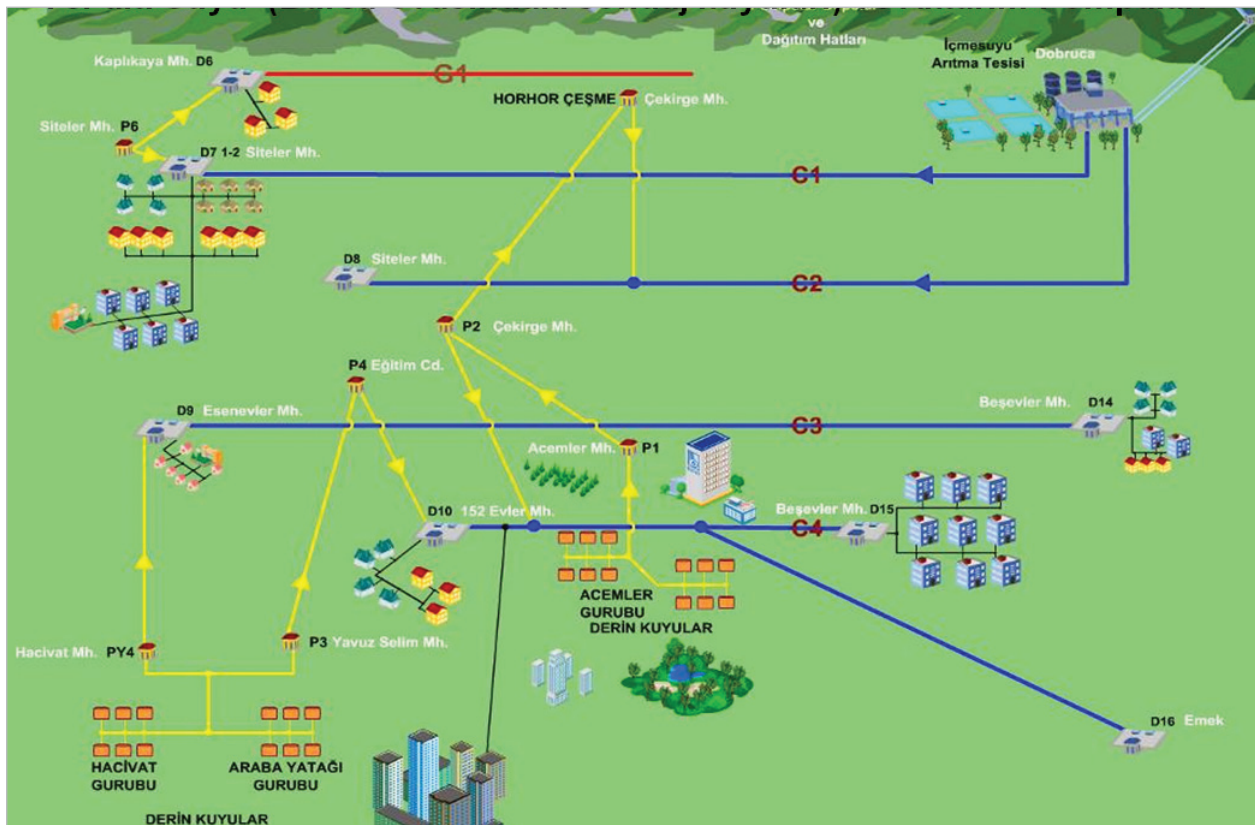


Yeraltı Suyu ve Aktarım Pompaları

a.2 - Abonelik İşlemleri


İlçe Bazında Abone Sayıları

İlçeler	Adet	İlçeler	Adet
OSMANGAZİ	316.717	ORHANGAZİ	29.139
YILDIRIM	209.586	M.KEMALPAŞA	40.787
NİLÜFER	162.471	YENİŞEHİR	21.541
GEMLİK	69.131	İZNİK	13.540
MUDANYA	56.710	ORHANELİ	11.810
GÜRSU	24.544	KELES	1.708
KESTEL	21.766	BÜYÜKORHAN	3.480
İNEGÖL	82.671	HARMANCIK	2.320
KARACABEY	43.905	TOPLUSU	8
TOPLAM			1.111.834

Aylık Abone Sayıları (adet)

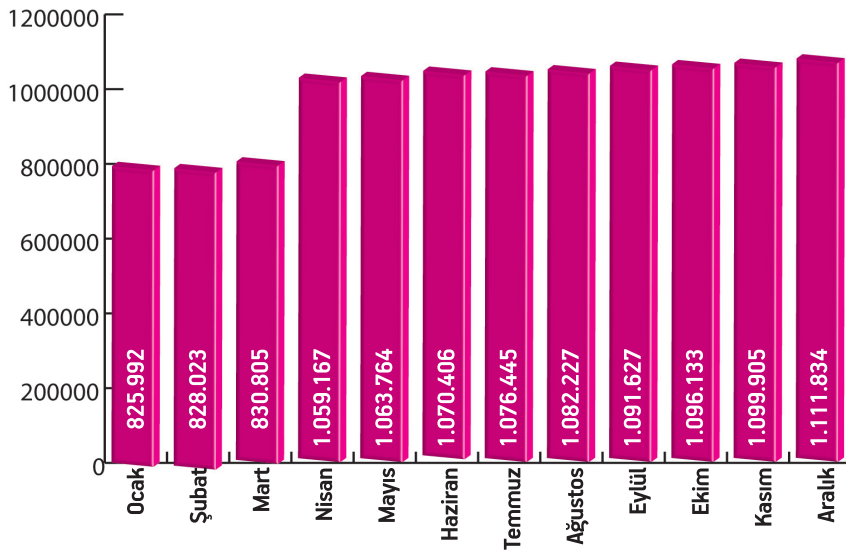


İlçe Bazında Abone Sayılarının Dağılımı

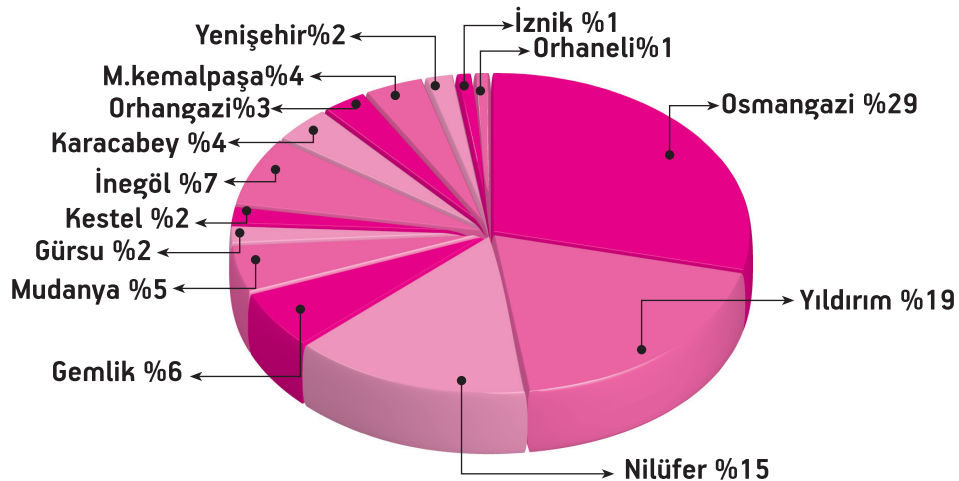


İlçe Bazında Su Tüketim Miktarı

İlçeler	m ³	İlçeler	m ³
OSMANGAZİ	32.932.667	ORHANGAZİ	2.066.733
YILDIRIM	22.387.289	M.KEMALPAŞA	2.471.767
NİLÜFER	19.960.977	YENİŞEHİR	1.601.253
GEMLİK	4.191.159	İZNİK	890.420
MUDANYA	4.062.777	ORHANELİ	294.832
GÜRSU	2.547.587	KELES	146.008
KESTEL	2.033.837	BÜYÜKORHAN	118.486
İNEGÖL	6.293.790	HARMANCIK	109.357
KARACABEY	1.969.944	TOPLUSU	4.970.366
TOPLAM	109.049.249		

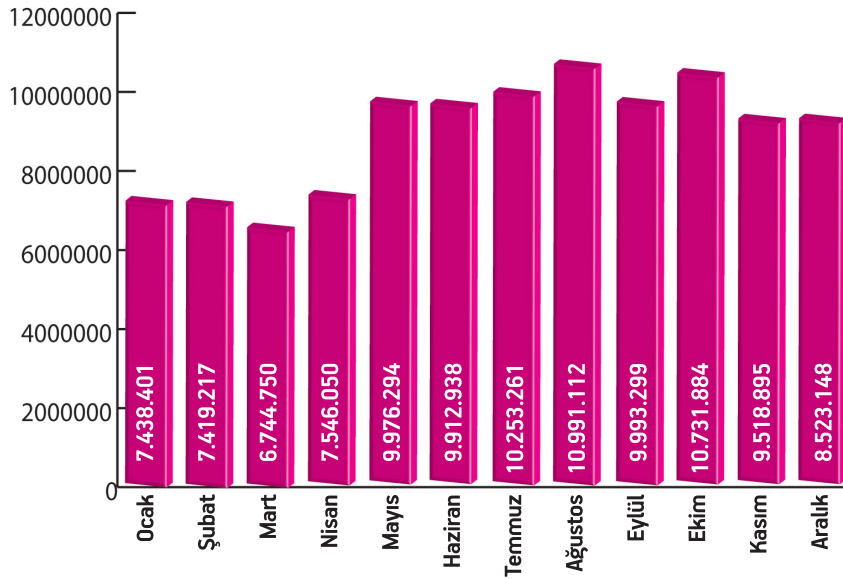Aylık Su Tüketim Miktarı (m³)


İlçe Bazında Su Tüketim Miktarı Dağılımı

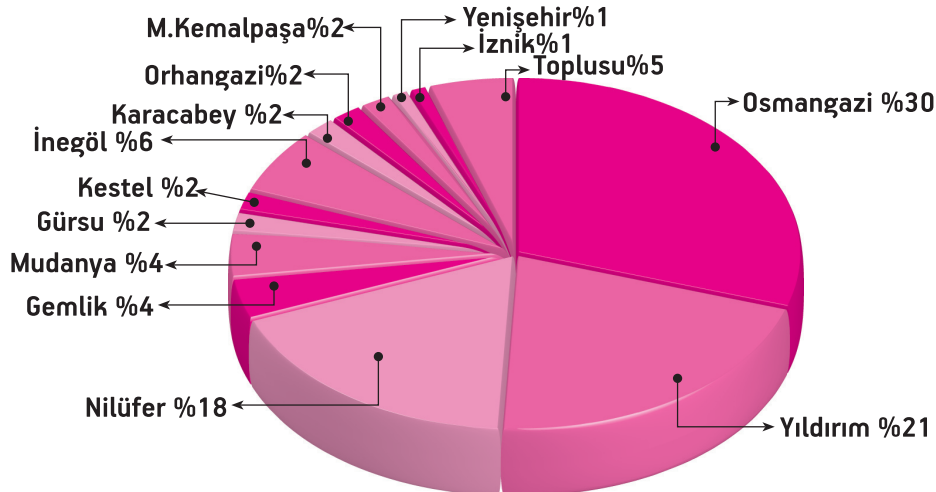


İlçe Bazında Tahakkuk Tutarı (KDV, ÇTV Dahil)

İlçeler	TL	İlçeler	TL
Osmangazi	173.491.178	Orhangazi	5.730.765
Yıldırım	115.813.022	M.Kemalpaşa	5.589.906
Nilüfer	102.971.386	Yenişehir	4.302.681
Gemlik	20.822.328	İznik	1.682.054
Mudanya	19.213.237	Orhaneli	805.645
Gürsu	12.161.608	Keles	344.750
Kestel	10.838.147	Büyükorhan	330.786
İnegöl	17.883.609	Harmancık	237.908
Karacabey	7.350.637	Toplusu	19.153.541
TOPLAM		518.723.188	

Ay Bazında Tahakkuk Tutarı (TL)

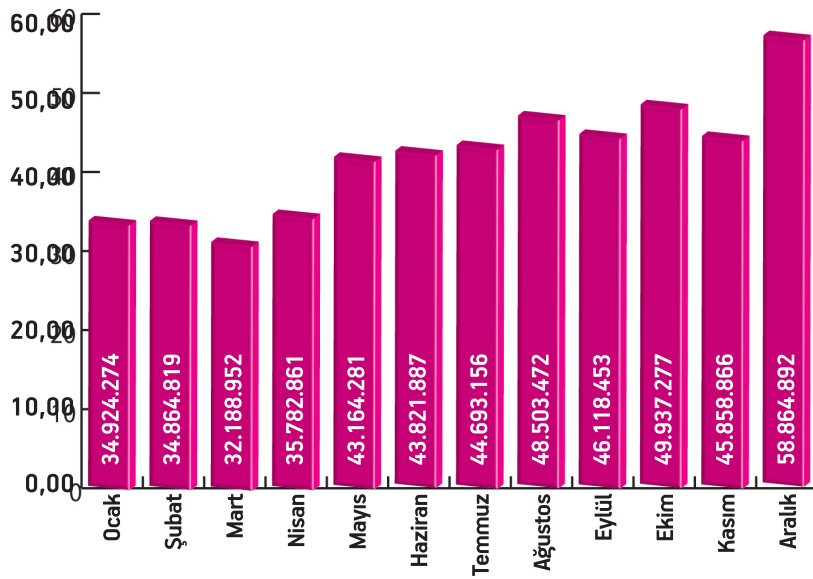


İlçe Bazında Tahakkuk Dağılımı (%)

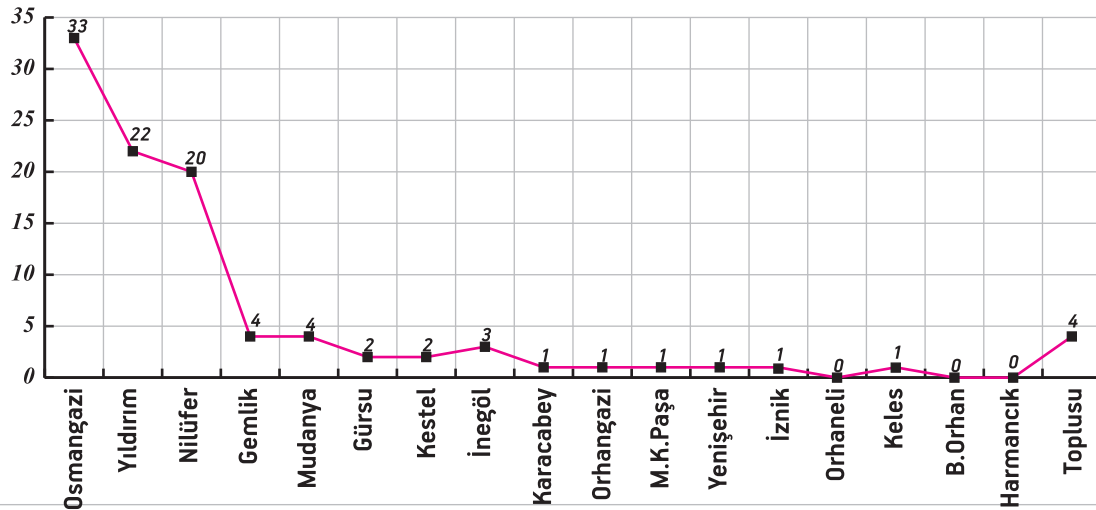


İlçe Bazında Tahsilat Tutarı (KDV , ÇTV Dahil)

İlçeler	TL	İlçeler	TL
Osmangazi	163.736.271	Orhangazi	4.446.336
Yıldırım	108.541.997	M.Kemalpaşa	4.449.045
Nilüfer	94.361.743	Yenişehir	3.388.292
Gemlik	20.058.140	İznik	1.395.900
Mudanya	17.618.885	Orhaneli	655.861
Gürsu	11.164.781	Keles	224.891
Kestel	11.985.508	Büyükorhan	276.862
İnegöl	16.581.286	Harmancık	158.096
Karacabey	6.812.215	Toplusu	18.911.398
TOPLAM			484.767.507

Ay Bazında Tahsilat Tutarı (TL)

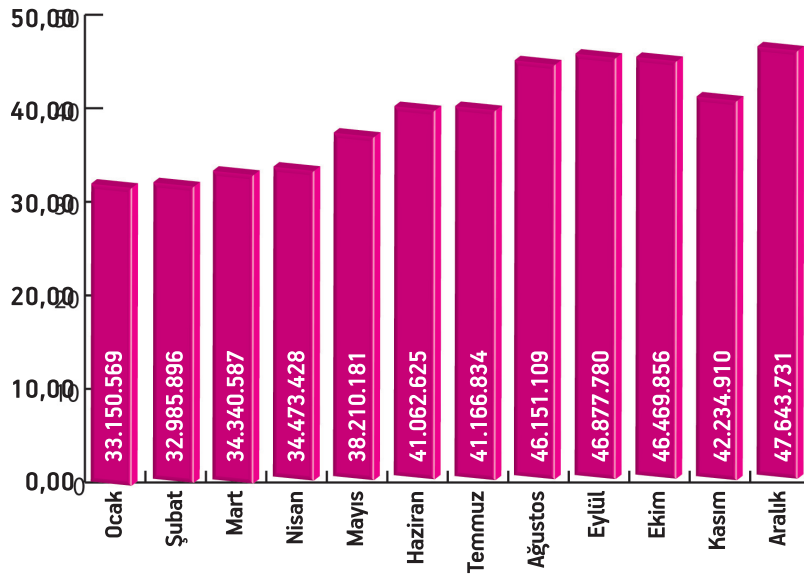


İlçe Bazında Su Tahsilat Dağılımı (%)

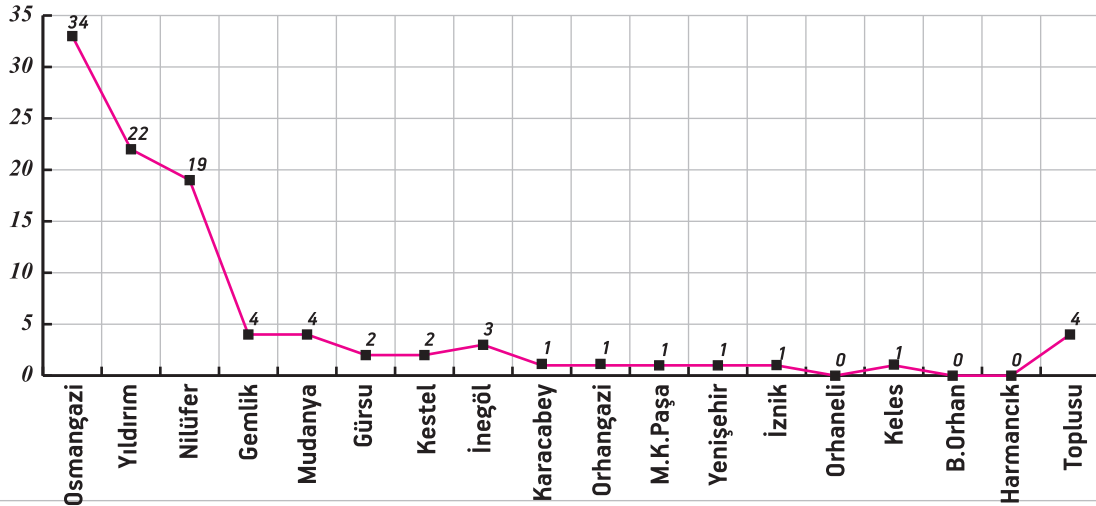

İlçe Bazında Tahakkuk - Tahsilat Durumu

İlçeler	Tahakkuk	Tahsilat	İlçeler	Tahakkuk	Tahsilat
Osmangazi	173.491.178	163.736.271	Orhangazi	5.730.765	4.446.336
Yıldırım	115.813.022	108.541.997	M.Kemalpaşa	5.589.906	4.449.045
Nilüfer	102.971.386	94.361.743	Yenişehir	4.302.681	3.388.292
Gemlik	20.822.328	20.058.140	İznik	1.682.054	1.395.900
Mudanya	19.213.237	17.618.885	Orhaneli	805.645	655.861
Gürsu	12.161.608	11.164.781	Keles	344.750	224.891
Kestel	10.838.147	11.985.508	Büyükorhan	330.786	276.862
İnegöl	17.883.609	16.581.286	Harmancık	237.908	158.096
Karacabey	7.350.637	6.812.215	Toplusu	19.153.541	18.911.398
TOPLAM				518.723.188	484.767.507

İlçe Bazında Ortalama Tahsilat Oranları (%)

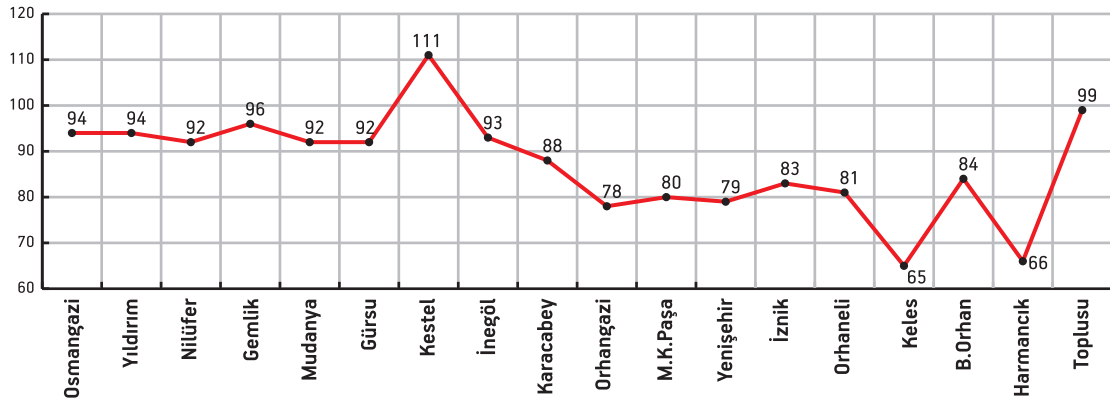

Ortalama Tahsilat Kanalları (%)


BUSKİ Gen. Müd. Tahsilat Şubeleri	37
Bankalar	36
PTT	23
İnternet	3
Mobil	0
Kioks EKS Tahsilat	0
Kioks Tahsilat	1
TOPLAM	100

Üretilen / Tüketilen / Kayıp Su Miktarı


	2014
Üretilen Su Miktarı (milyon m ³)	110,76
Tüketilen Su Miktarı (milyon m ³)	83,44
Kayıp Su Miktarı (milyon m ³)	26,42
Kayıp Su Oranı (%)	23,86

Not: 895,75 bin m³ bedelsiz (bedava) su dahildir.

Aylara Göre Kayıp Su Miktarı (milyon m³)

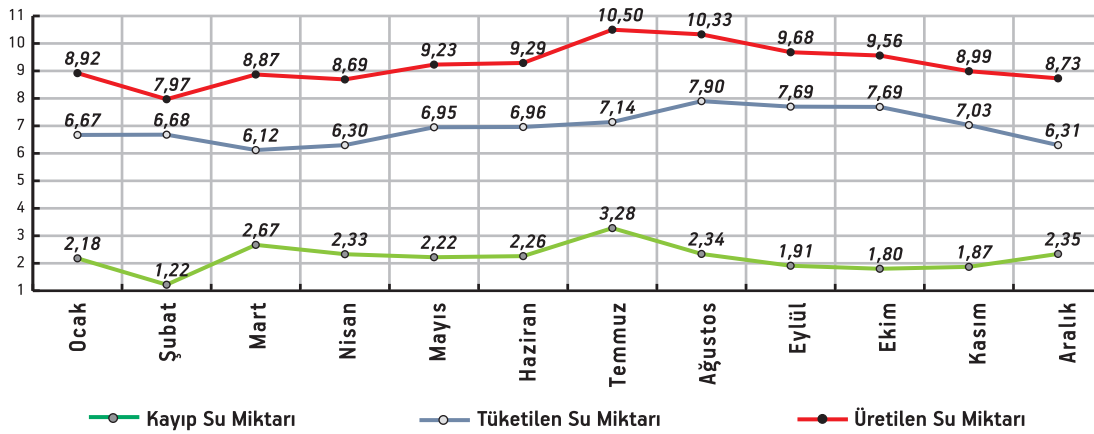

Aylara Göre Kayıp Su Oranları (%)

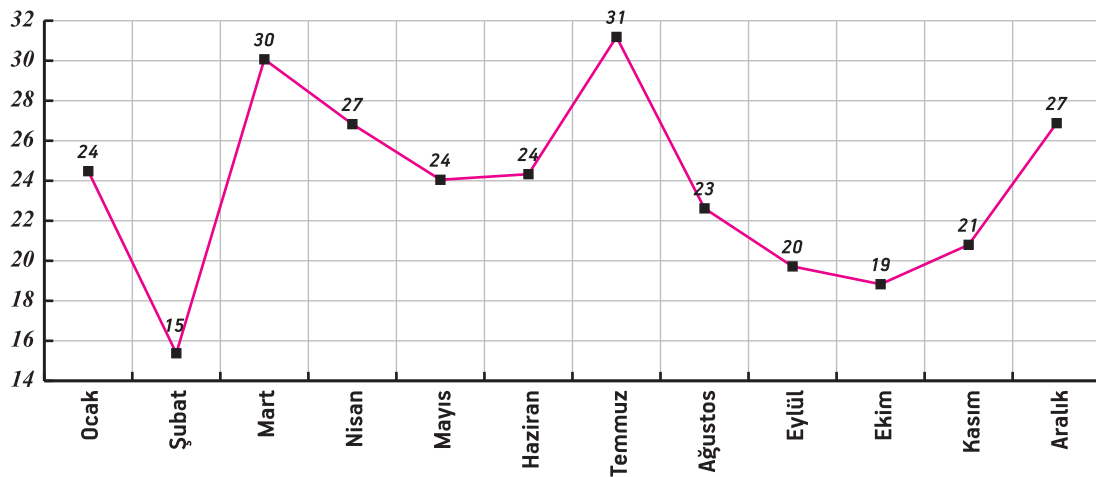


a.3 - İçme Suyu İmalatları


İlçe Bazında İçme Suyu Şebeke İmalatları (km)

İlçeler	Km	İlçeler	Km
Osmangazi	69,45	Büyükorhan	11,80
Yıldırım	10,80	İznik	3,90
Nilüfer	37,85	Orhangazi	0,00
Gemlik	5,60	M.Kemalpaşa	3,50
Mudanya	13,40	Karacabey	10,40
Gürsu	0,00	Orhaneli	1,20
Kestel	51,10	Keles	0,50
İnegöl	16,30	Harmancık	0,00
Yenişehir	11,40		
TOPLAM			247,20

Ay Bazında İçme Suyu Şebeke İmalatları (km)

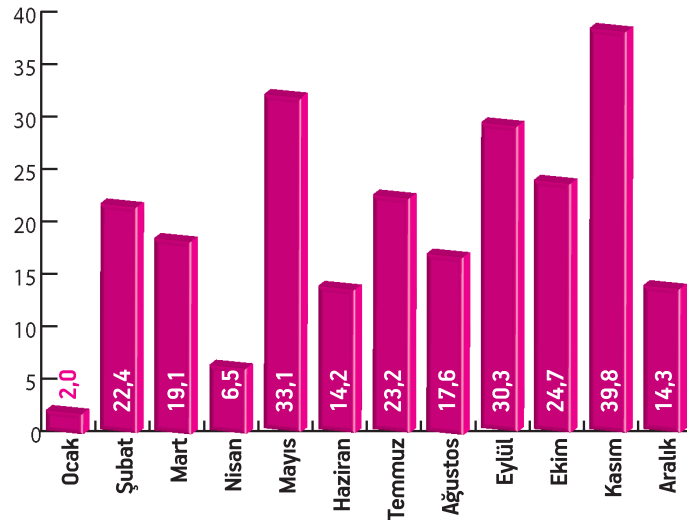


İlçe Bazında İçme Suyu Şebeke İmalat Oranları (%)

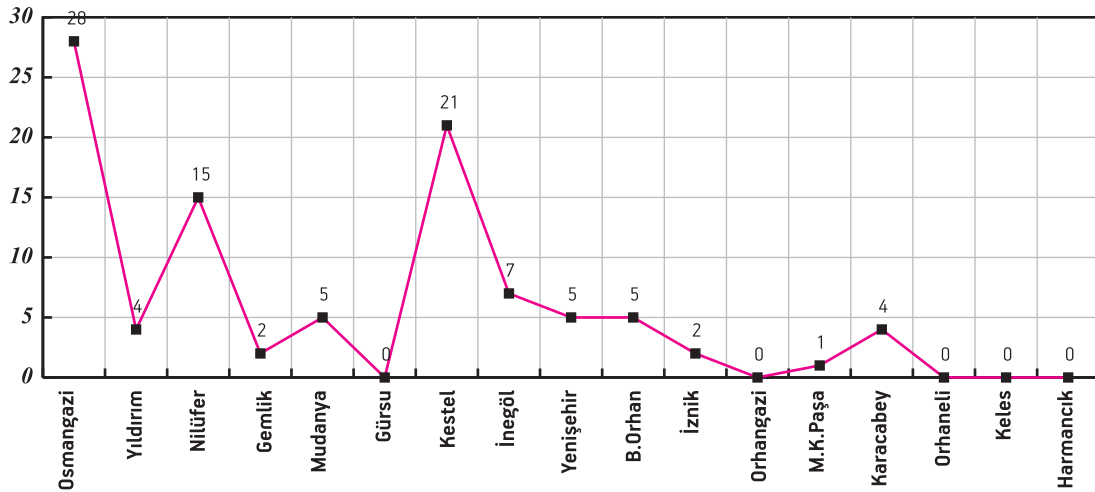


İlçe Bazında İçme Suyu İsale Hattı İmalatları (km)

İlçeler	Km	İlçeler	Km
Osmangazi	16,10	B.Orhan	6,40
Yıldırım	2,60	İznik	8,10
Nilüfer	19,50	Orhangazi	0,00
Gemlik	7,30	M.Kemalpaşa	10,50
Mudanya	6,05	Karacabey	0,00
Gürsu	0,70	Orhaneli	0,00
Kestel	11,40	Keles	0,00
Yenişehir	0,85	Harmancık	0,00
İnegöl	4,50		
Toplam			94,00

İlçe Bazında İçme Suyu İsale Hattı İmalatları (km)

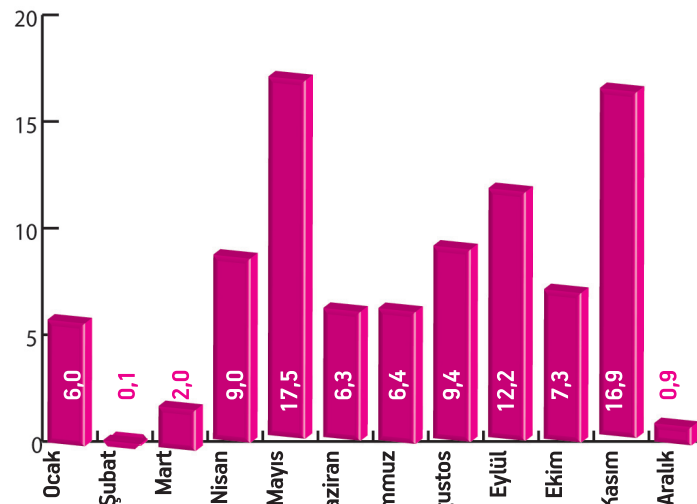


İlçe Bazında İçme Suyu İsale Hattı İmalat Oranları (%)

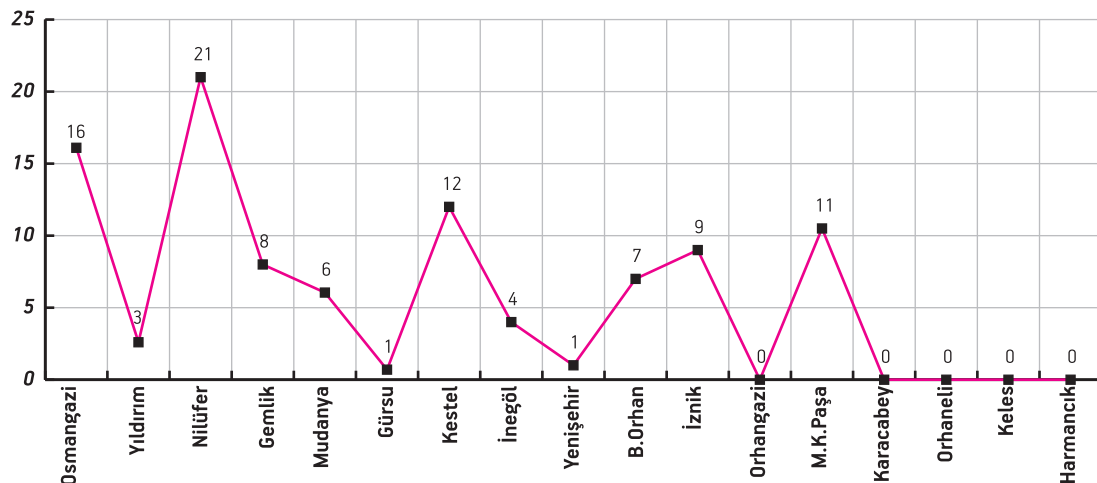


Pınar Kaynakları Islahı (km)

İlçeler	Km	İlçeler	Km
Osmangazi	23,50	B.Orhan	0,00
Yıldırım	0,00	İznik	0,00
Nilüfer	5,20	Orhangazi	0,00
Gemlik	0,00	M.Kemalpaşa	0,00
Mudanya	0,00	Karacabey	0,00
Gürsu	3,30	Orhaneli	0,00
Kestel	32,30	Keles	0,00
Yenişehir	0,00	Harmancık	0,00
İnegöl	0,00		
Toplam	64,30		

Ay Bazında Pınar Kaynakları Islahı (km)

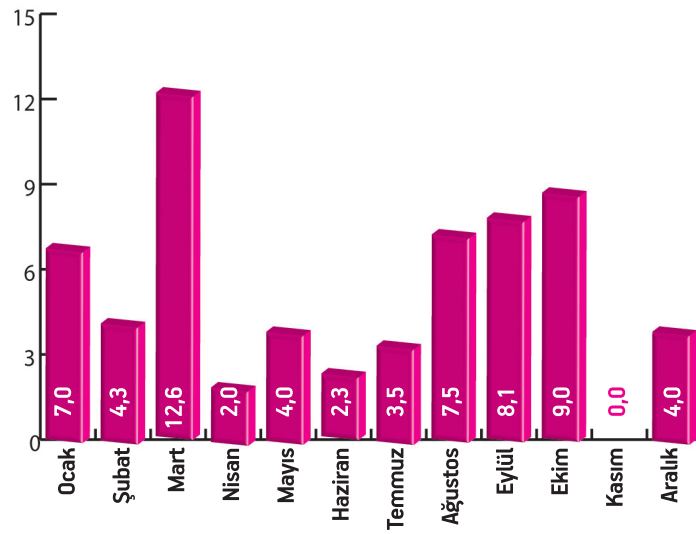



İlçe Bazında Pınar Kaynakları Islahının Dağılımı (%)

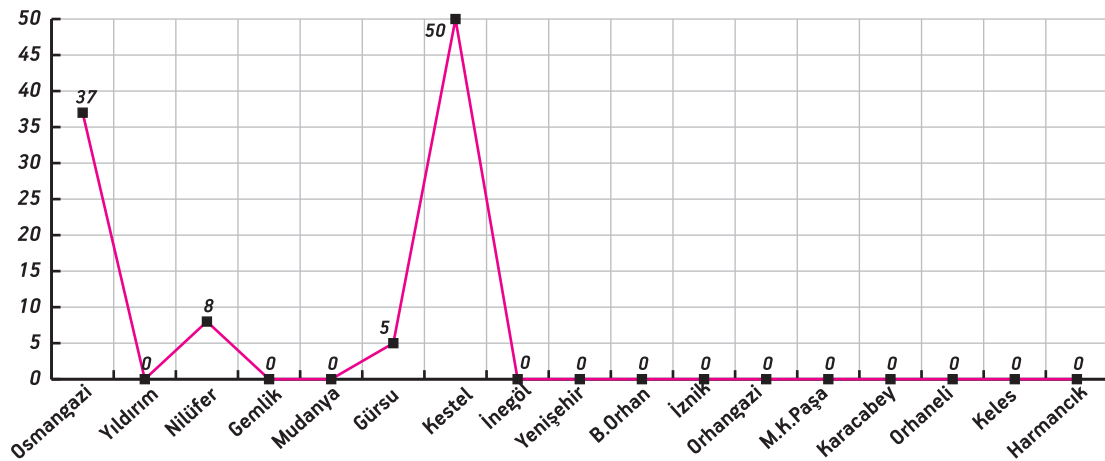

2014 Yılı İlçe Bazında Depolar

İlçeler	Adet	Kapasite (m ³)	İlçeler	Adet	Kapasite (m ³)
Osmangazi	4	1.400	Büyükorhan	0	0
Yıldırım	1	20.000	İznik	0	0
Nilüfer	5	6.500	Orhangazi	0	0
Gemlik	1	200	M.Kemalpaşa	0	0
Mudanya	2	5.200	Karacabey	0	0
Gürsu	0	0	Orhaneli	0	0
Kestel	3	5.500	Keles	0	0
İnegöl	0	0	Harmancık	0	0
Yenişehir	0	0			
Toplam	16	38.800			

İlçe Bazında Depo Adetleri

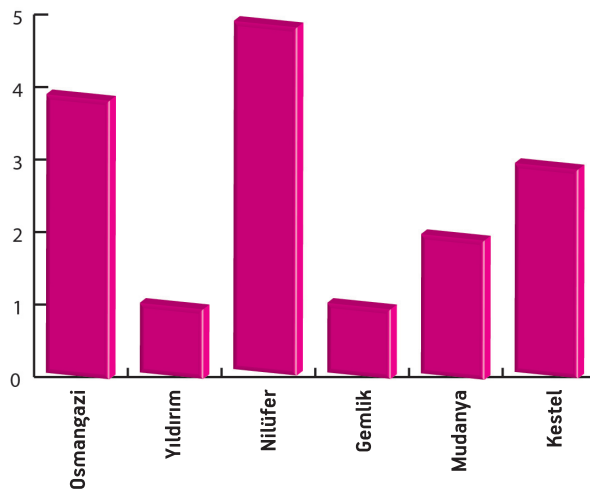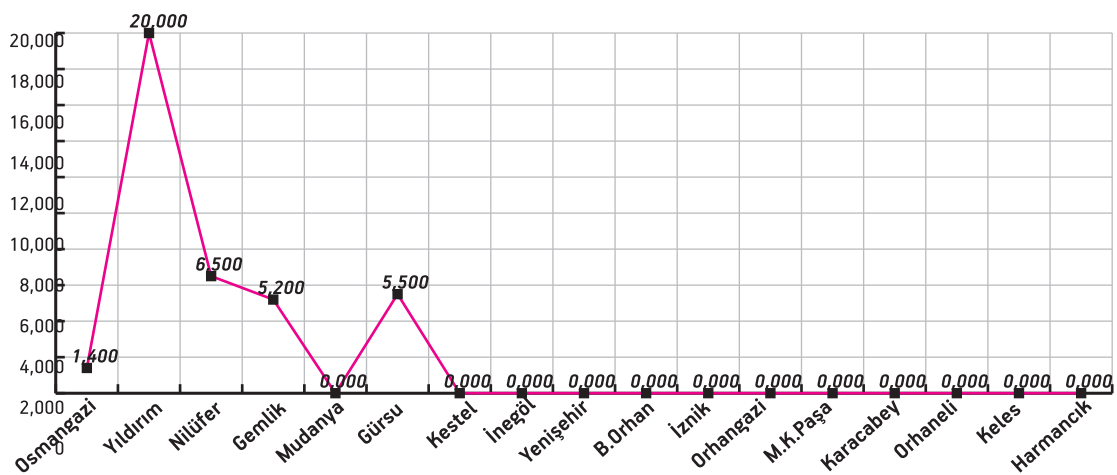
İlçe Bazında Depo Kapasiteleri (m³)

b - Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hizmetleri


Yağmur Suyu Şebeke İmalatları

İlçeler	Toplam (km)	İlçeler	Toplam (km)
Osmangazi	28,6	Büyükorhan	0,0
Yıldırım	4,7	İznik	0,0
Nilüfer	37,8	Orhangazi	1,4
Gemlik	5,5	M.Kemalpaşa	0,0
Mudanya	1,0	Karacabey	0,0
Gürsu	5,7	Orhaneli	0,0
Kestel	7,9	Keles	0,0
İnegöl	0,4	Harmancık	0,0
Yenişehir	0,0		
Toplam		Toplam	93,0

Aylık Yağmur Suyu Şebeke İmalatları (Km)

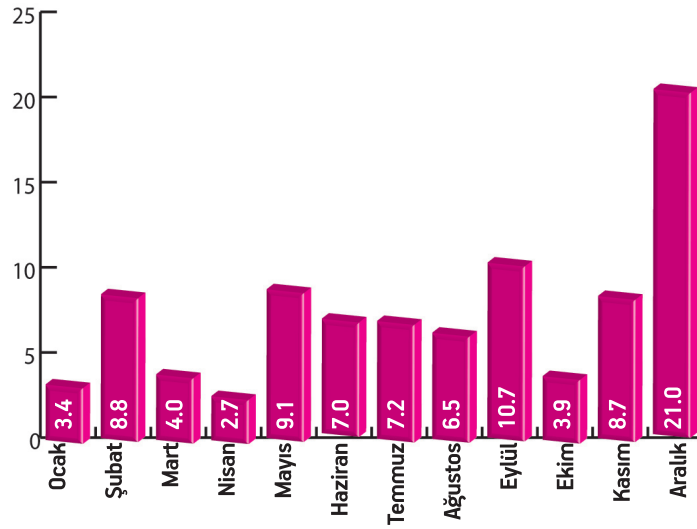


İlçe Bazında Yağmur Suyu İmalat Dağılımı (%)

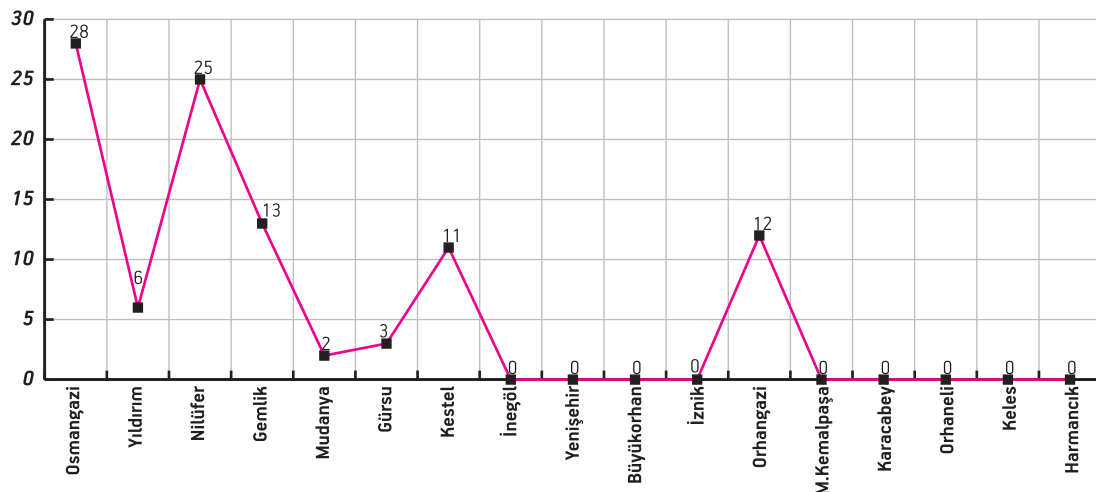


Kanalizasyon Şebeke İmalatları

İlçeler	Toplam (km)	İlçeler	Toplam (km)
Osmangazi	51,4	Büyükorhan	0,0
Yıldırım	11,0	İznik	0,0
Nilüfer	44,6	Orhangazi	21,7
Gemlik	23,2	M.Kemalpaşa	0,0
Mudanya	2,9	Karacabey	0,0
Gürsu	6,2	Orhaneli	0,0
Kestel	20,6	Keles	0,0
İnegöl	0,0	Harmancık	0,0
Yenişehir	0,0		
Toplam			181,6

Aylık Kanalizasyon Şebeke İmalatları (Km)

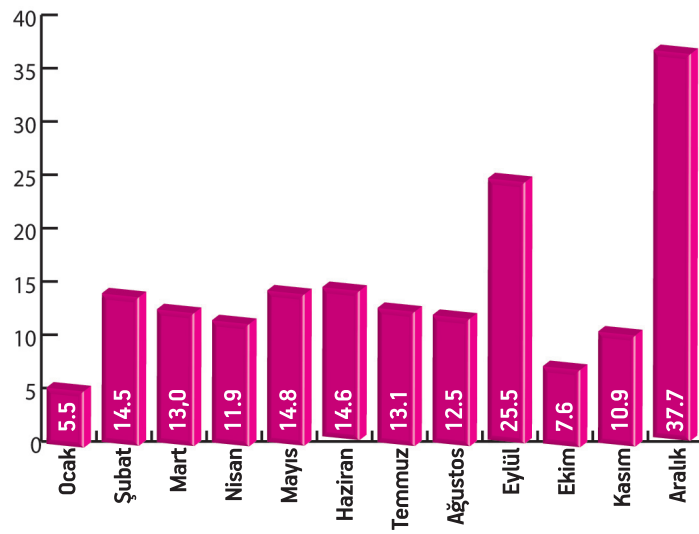

İlçe Bazında Kanalizasyon İmalat Dağılımı (%)

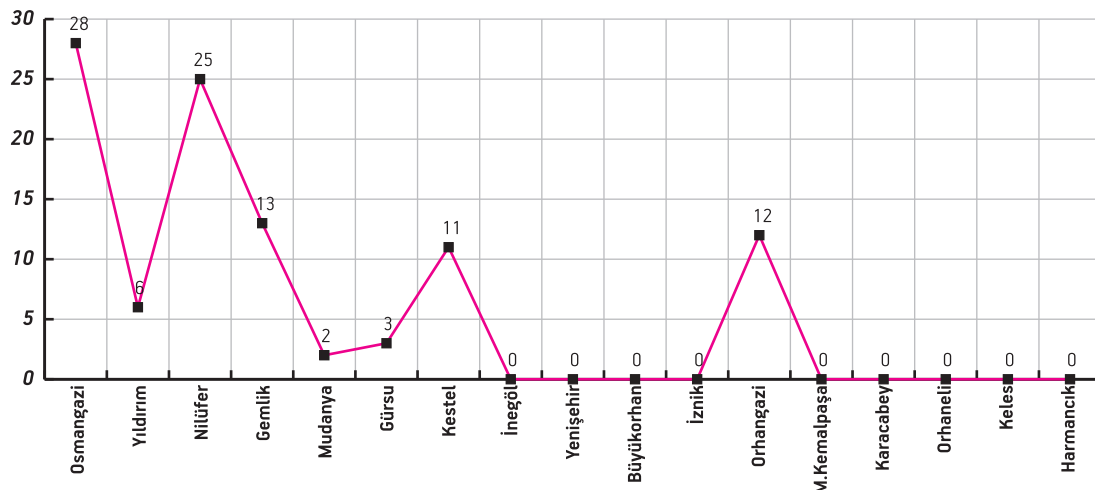

c - Çevre Koruma ve Arıtma Hizmetleri**İçme Suyu Arıtma Tesisi
Kimyasal Madde Sarfiyatları (kg)**

	Kg
Alüminyum Sülfat	934.000
Polielektrolit	4.408
Klor	102.224
Sülfürik Asit	1.060.013
Potasyum Permanganat	0
CFS	0
PAC	2.912

**İçme Suyu Laboratuvarlarında
Yapılan Analiz Sayıları (Adet)**

	Adet	%
Genel (31 parametre)	13.351	67
Ağır Metal (15 parametre)	6.519	33
Toplam (46 parametre)	19.870	100

**Atık Su Laboratuvarında
Yapılan Analiz Sayıları (adet)**

Tür (Parametre)	Adet
Genel (31 parametre)	13.351
Ağır Metal (15 parametre)	6.519
Toplam (46 parametre)	19.870

Atık Su Deşarj İzni Ruhsatı İşlemleri

	Adet
Yeni Tespit Edilen İşyeri	324
Kapanan İşyeri	46
Çev. ve Şeh. İl Müdürlüğüne Devredilen İşyeri	8
Ruhsat Dışı Bırakılan İşyeri	179
Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Alan İşyeri	206
Atıksudan Alınan Kompozit/ Anlık Numune Sayısı	615
Bilgileri Güncellenen İşletme Sayısı	109
Atık Su Kalite Kontrol Ruhsatı Yenilenen İşletme Sayısı	117

Arıtılan Atık Su Debileri (m³/ yıl)

Doğu AAT	Batı AAT	Kent Katı Atık Depolama Alanı	Toplam
77.957.410	18.689.782	180.409*	96.827.601

* Kent Katı Atık depolama alanında arıtılarak kanalizasyona verilen sızıntı suyu Batı AAT' ne gelmektedir.

Çamur Bertarafı

BUSKİ bünyesinde bulunan atıksu arıtma tesislerinden elde edilen çamurun yakılması için Doğu Atıksu Arıtma Tesisi içinde kurulacak olup tesisten aynı zamanda elektrik enerjisi elde edilecek ve bu enerji yakma tesisinin hem kendi ihtiyacını hem de içinde yer alacağı Doğu Atıksu Arıtma tesisinin elektrik ihtiyacının bir bölümünü karşılayacaktır.

Tesis temel olarak 96 ton kuru/katı madde içerikli çamur yakma kapasitesine sahip olacaktır. İlk aşamada BUSKİ arıtma tesislerinden elde edilen 63 ton kuru/katı madde içerikli çamur yakılacak ve toplam 96 ton kuru/katı madde içerikli çamur yakma kapasitesine ileriki dönemlerde ulaşılabilecektir.

Sistemin temel işleyişi çamurun yakılarak ve içerisindeki suyun buharlaştırılarak stabilizasyonu ve hacminin azaltılarak; işlem sırasında ortaya çıkan atık ısıdan yararlanılarak da elektrik üretimi yapılması şeklinde olacaktır. Çamurun tam olarak yanabilmesi için kendine yeterli enerjiye sahip olmadığı durumlarda doğal gaz ile enerji sağlanarak sürekli ve verimli şekilde yanmanın oluşması sağlanacaktır.

Tesisin en önemli özellikleri emisyon kontrolü (baca gazı arıtımı) açısından Türk ve Avrupa standartlarının tamamen karşılanması ve elektrik üreterek katma değer sağlaması olacaktır.



Çamur Bertarafı Sözleşmesinin İmzalanması


d - Kamulaştırma Faaliyetleri

İçme suyu yatırımları için 1.465.348,71 TL, kanalizasyon yatırımları için 549.589,78 TL ve dere ıslahları başta olmak üzere diğer kamulaştırma için 1.310.108,35 TL, bina alım ve kamulaştırma işleri için 226.000,00 TL olmak üzere toplamda 3.371.331,08 TL kamulaştırma bedeli ödenerek 76.582,74 m² alan kamulaştırılmış, Genel Müdürlüğümüz adına tescil edilmiştir. 179.260,05 m² alanın 49 yıllığına tahsisi alınmıştır.


2014 Yılı İlçe Bazında Altyapı Yatırımları İçin Kamulaştırılan Alanlar (m²)

İlçeler	Kanal	İçme Suyu	Bina	Toplam
Gemlik	63.858,09	4.689,64	-	68.547,73
Keles	173,20	-	-	173,20
Mudanya	-	869,57	-	869,57
Nilüfer	1.441,92	4.251,89	-	5.693,81
Osmangazi	-	1.213,45	80,69	1.294,14
Yıldırım	4,29	-	-	4,29
Toplam	65.477,50	11.024,55	80,69	76.582,74

İlçe Bazında Altyapı Yatırımları İçin Kamulaştırılan Alanlar (%)

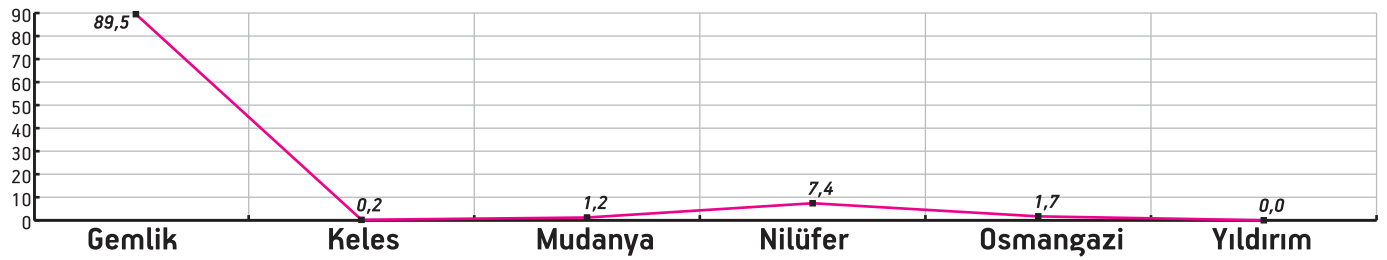


Altyapı Yatırımları İçin Kamulaştırılan Alanlar (%)

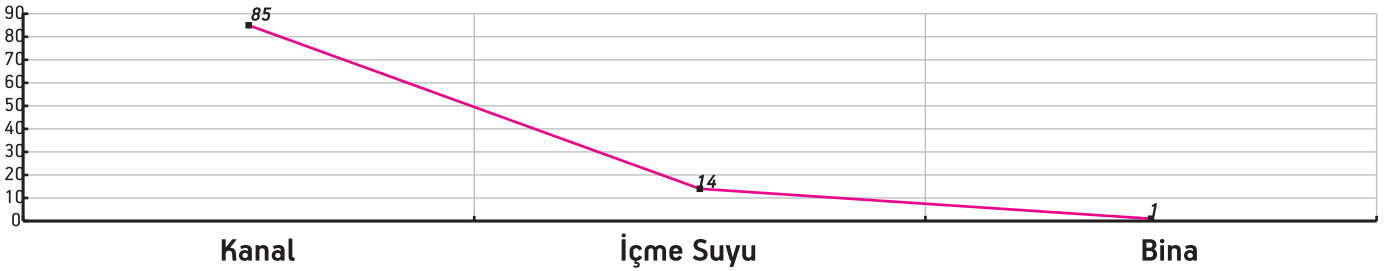


İlçelere Göre Tahsis Alınan Alanlar (%)

İlçeler	m ²
Gemlik	49.496,88
Kestel	58.055,94
Nilüfer	3.798,58
Osmangazi	8.209,82
Yenişehir	57.931,60
Yıldırım	1.767,23
Toplam	179.260,05

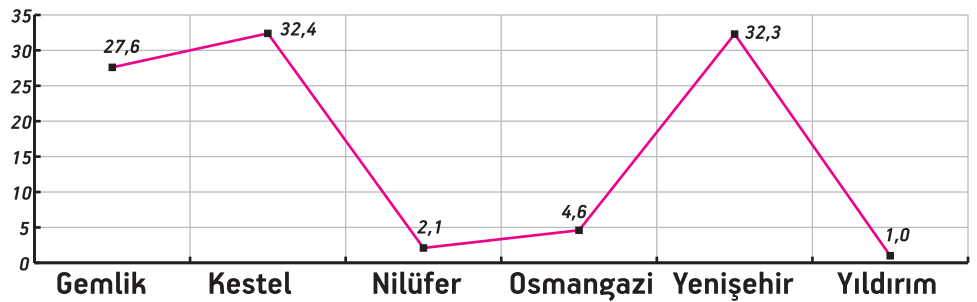


İlçe Bazında Tahsis Alınan Emlak Sayısı (%)

İlçeler	Adet
Gemlik	3
Kestel	3
Nilüfer	2
Osmangazi	2
Yenişehir	1
Yıldırım	2
Toplam	13

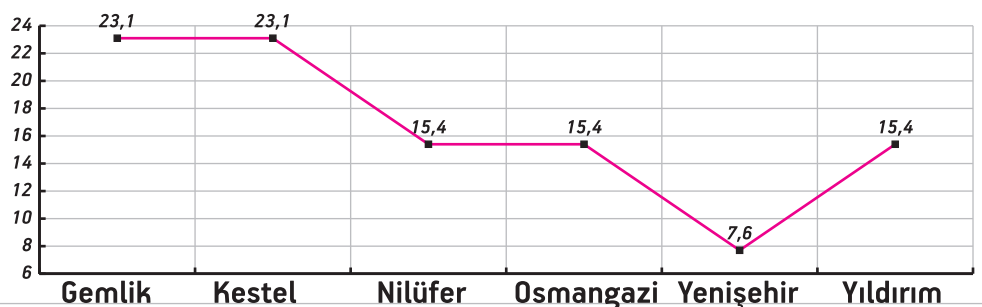

İlçe Bazında Tescil Sayısı (%)

İlçeler	Kanal
Gemlik	21
Kestel	7
Nilüfer	9
Osmangazi	12
Yenişehir	1
Yıldırım	3
Mudanya	1
Toplam	54

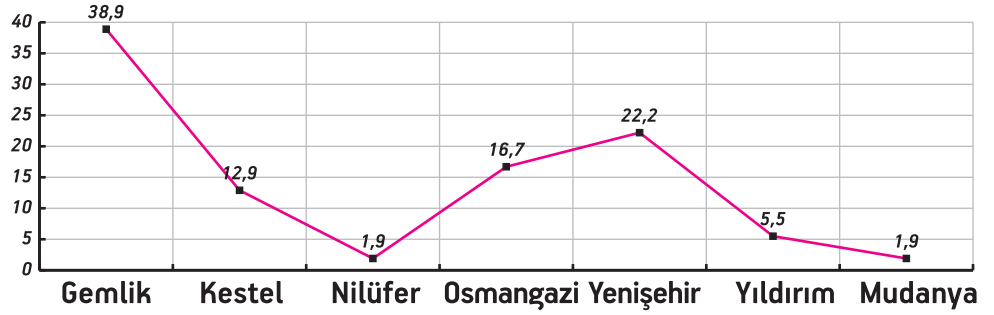

Proje Kontrol ve Aplikasyon Faaliyetleri


Faaliyet Adı	2014
Aplikasyon (adet nokta)	201
Proje Kontrol Ölçmeleri (adet proje)	11
Boykesit ve Enkesit Ölçmeleri (m)	138.519
Detay, Plankote ve Hacim Belirleme Ölçmeleri (m ²)	516.039

Fotogrametrik Harita Üretimi Projesi (M5)

Bursa mülki il sınırını kapsayan yaklaşık 12.000 km² alan içinde 1/1000 ölçekli ortofoto haritalar ile yaklaşık 8.500 km² lik alan içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli vektör haritaların üretimi (M5) projesinin 29.05.2014 tarihinde sözleşme imzalanarak 04.06.2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. M5 proje alanında 1. Etap uçuş alanı yer kontrol noktalarının ve nivelman noktalarının tamamının tesisi tamamlanmıştır. GPS ve Nivelman hesap işlemlerine başlanılarak 2014 Kasım ayı içerisinde 10 bloktan oluşan yaklaşık 900 km² lik 1. Etap uçuş yapılmıştır.

İlçelere Göre İrtifak Alanları (%)

İlçeler	m ²
Kestel	519,98
Nilüfer	449,59
Osmangazi	2.099,46
Toplam	3.069,03

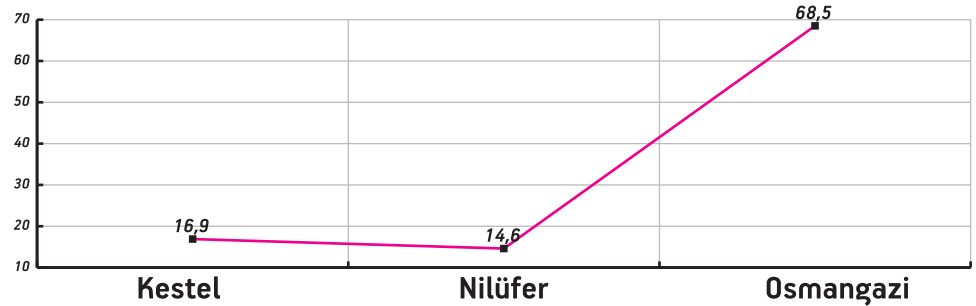

Altyapı Türüne Göre İrtifak Sayısı (%)



İlçeler	Atıksu Hattı	İçmesuyu Hattı	Yağmursuyu Hattı
Kestel	3	-	-
Nilüfer	-	1	3
Osmangazi	1	-	5
Toplam	4	1	8

e - Asfalt Yama ve Kaplama Çalışmaları


İlçe Bazında Yapılan Asfalt Yama ve Kaplama

İlçeler		Ton	İlçeler		Ton
Osmangazi	Asfalt Yama	17.494	Yenişehir	Asfalt Yama	0
	Asfalt Kaplama	50.610		Asfalt Kaplama	0
Yıldırım	Asfalt Yama	14.452	Büyükorhan	Asfalt Yama	0
	Asfalt Kaplama	11.180		Asfalt Kaplama	0
Nilüfer	Asfalt Yama	14.954	İznik	Asfalt Yama	0
	Asfalt Kaplama	30.923		Asfalt Kaplama	0
Mudanya	Asfalt Yama	5.649	Orhangazi	Asfalt Yama	0
	Asfalt Kaplama	11.245		Asfalt Kaplama	0
Kestel	Asfalt Yama	3.398	M.Kemalpaşa	Asfalt Yama	0
	Asfalt Kaplama	29.016		Asfalt Kaplama	0
Gürsu	Asfalt Yama	1.943	Karacabey	Asfalt Yama	220
	Asfalt Kaplama	14.769		Asfalt Kaplama	0
Gemlik	Asfalt Yama	2.315	Orhaneli	Asfalt Yama	0
	Asfalt Kaplama	12.939		Asfalt Kaplama	0
Keles	Asfalt Yama	36	Harmancık	Asfalt Yama	0
	Asfalt Kaplama	1.912		Asfalt Kaplama	0
İnegöl	Asfalt Yama	0			
	Asfalt Kaplama	0			
TOPLAM	Asfalt Yama				60.461
	Asfalt Kaplama				162.594

Aylık Yapılan Asfalt Yama ve Kaplama (ton)

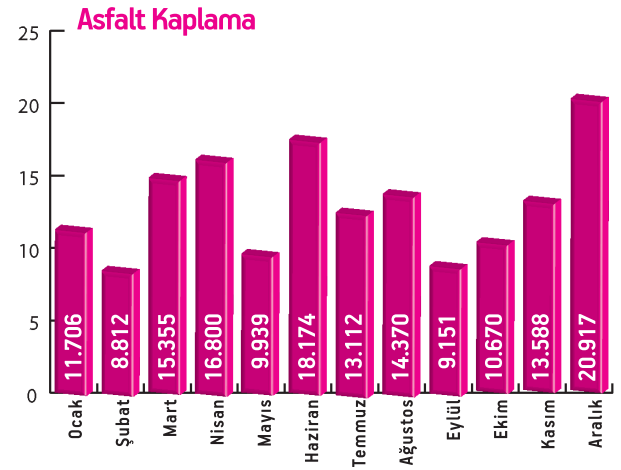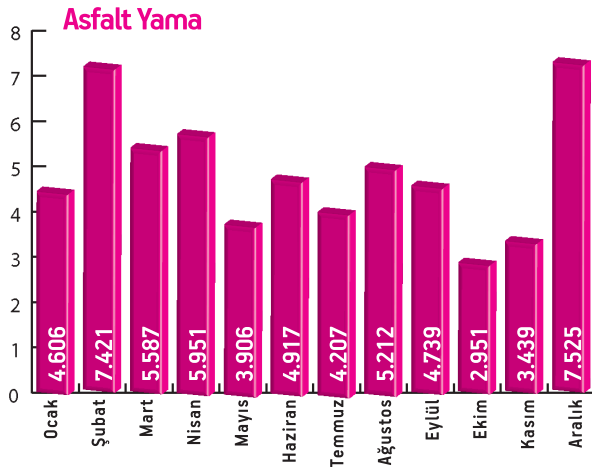

Aylık Yapılan Asfalt Yama ve Kaplama (%)


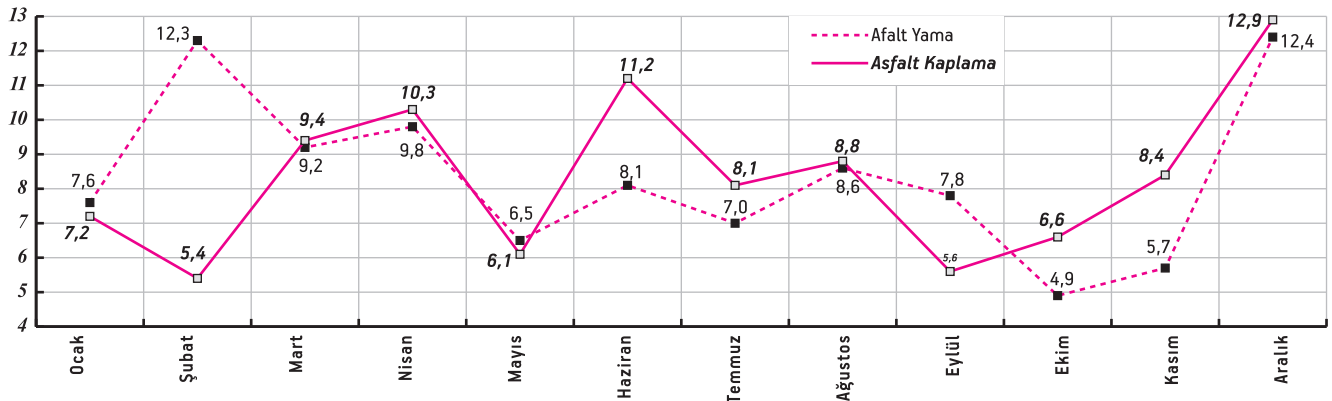


f - Bakım Onarım Çalışmaları


İlçe Bazında Yapılan Bakım - Onarım Çalışmaları (km)

İlçeler	Km	İlçeler	Km
Osmangazi	İçme Suyu 0,48	İznik	İçme Suyu 1,29
	Kanalizasyon 17,34		Kanalizasyon 0,96
Yıldırım	İçme Suyu 0,14	Orhaneli	İçme Suyu 0,27
	Kanalizasyon 12,12		Kanalizasyon 0,05
Nilüfer	İçme Suyu 0,97	Büyükorhan	İçme Suyu 0,00
	Kanalizasyon 18,93		Kanalizasyon 0,02
Mudanya	İçme Suyu 1,87	Keles	İçme Suyu 2,06
	Kanalizasyon 13,47		Kanalizasyon 2,93
Kestel	İçme Suyu 0,75	Orhangazi	İçme Suyu 1,37
	Kanalizasyon 11,25		Kanalizasyon 1,83
Gürsu	İçme Suyu 0,00	Karacabey	İçme Suyu 0,10
	Kanalizasyon 0,00		Kanalizasyon 1,25
Gemlik	İçme Suyu 9,36	M.Kemalpaşa	İçme Suyu 0,86
	Kanalizasyon 15,27		Kanalizasyon 5,91
Yenişehir	İçme Suyu 0,00	Harmancık	İçme Suyu 2,06
	Kanalizasyon 4,28		Kanalizasyon 0,61
İnegöl	İçme Suyu 1,50		
	Kanalizasyon 2,45		
TOPLAM	İçme Suyu		23,08
	Kanalizasyon		108,67

Aylık Bakım - Onarım Çalışmaları (km)

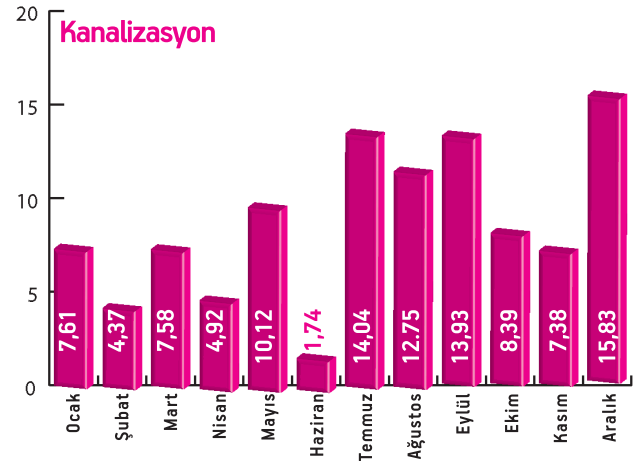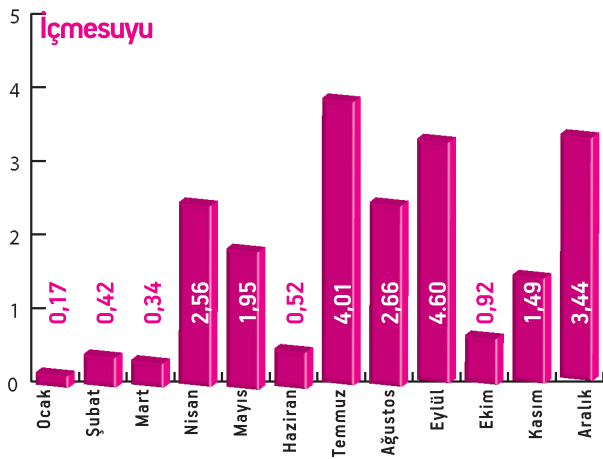


İlçe Bazında Bakım - Onarım Çalışmaları (%)

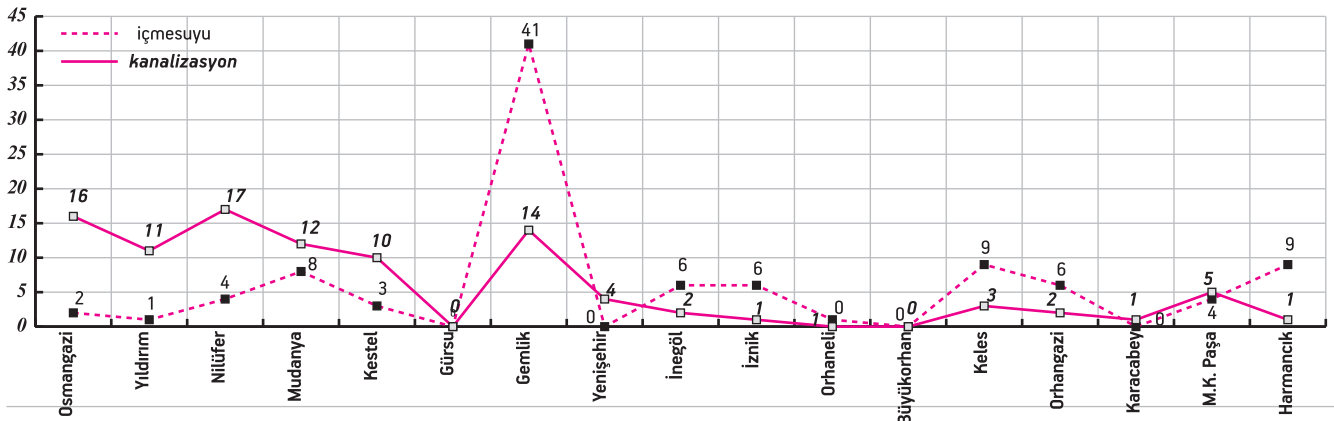


İlçe Bazında Baca Yükseltme Çalışmaları (adet)

İlçeler		Adet	İlçeler		Adet
Osmangazi	Kanal. Baca Yük.	0	İznik	Kanal. Baca Yük.	0
	Izgara Baca Yük.	0		Izgara Baca Yük.	0
Yıldırım	Kanal. Baca Yük.	0	Orhaneli	Kanal. Baca Yük.	0
	Izgara Baca Yük.	55		Izgara Baca Yük.	0
Nilüfer	Kanal. Baca Yük.	0	Büyükorhan	Kanal. Baca Yük.	0
	Izgara Baca Yük.	0		Izgara Baca Yük.	0
Mudanya	Kanal. Baca Yük.	0	Keles	Kanal. Baca Yük.	11
	Izgara Baca Yük.	0		Izgara Baca Yük.	0
Kestel	Kanal. Baca Yük.	0	Orhangazi	Kanal. Baca Yük.	1.759
	Izgara Baca Yük.	0		Izgara Baca Yük.	560
Gürsu	Kanal. Baca Yük.	0	Karacabey	Kanal. Baca Yük.	80
	Izgara Baca Yük.	0		Izgara Baca Yük.	0
Gemlik	Kanal. Baca Yük.	0	M.Kemalpaşa	Kanal. Baca Yük.	62
	Izgara Baca Yük.	0		Izgara Baca Yük.	0
Yenişehir	Kanal. Baca Yük.	11	Harmancık	Kanal. Baca Yük.	0
	Izgara Baca Yük.	0		Izgara Baca Yük.	0
İnegöl	Kanal. Baca Yük.	189			
	Izgara Baca Yük.	261			
TOPLAM	Kanal. Baca Yük.		2.112		
	Izgara Baca Yük.		876		

İlçe Bazında Baca Yükseltme Çalışmaları (adet)

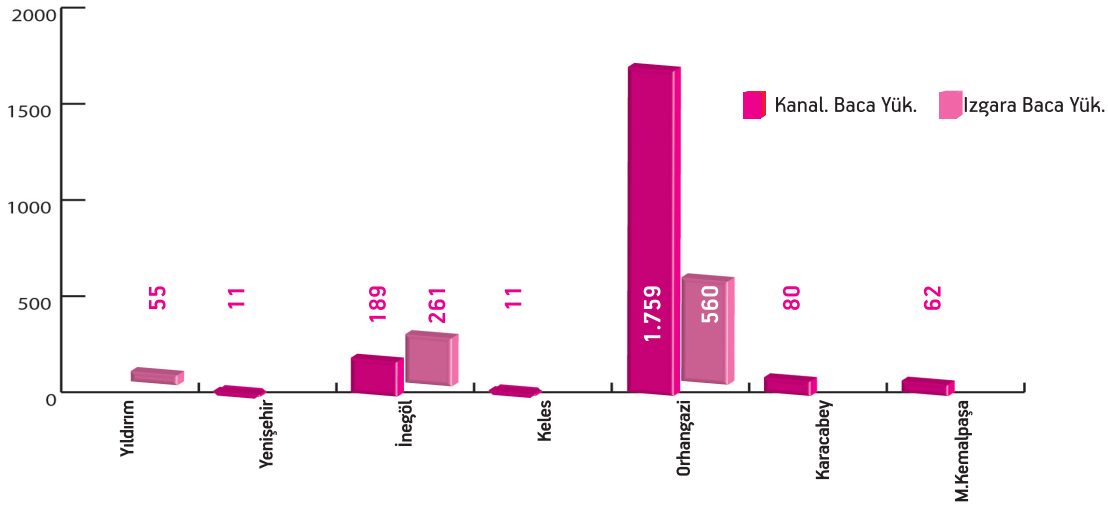


Baca Yükseltme Çalışmalarının Dağılımı (%)

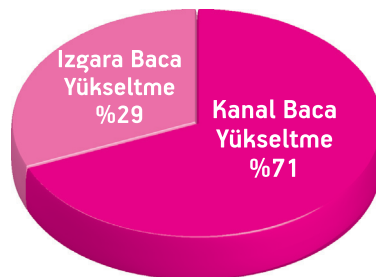


İlçe Bazında Abonelik Çalışmaları (adet)

İlçeler	Adet	İlçeler	Adet
Osmangazi	Yeni Abonelik	İznik	Yeni Abonelik
	Takılan Sayaç		Takılan Sayaç
Yıldırım	Yeni Abonelik	Orhaneli	Yeni Abonelik
	Takılan Sayaç		Takılan Sayaç
Nilüfer	Yeni Abonelik	Büyükorhan	Yeni Abonelik
	Takılan Sayaç		Takılan Sayaç
Mudanya	Yeni Abonelik	Keles	Yeni Abonelik
	Takılan Sayaç		Takılan Sayaç
Kestel	Yeni Abonelik	Orhangazi	Yeni Abonelik
	Takılan Sayaç		Takılan Sayaç
Gürsu	Yeni Abonelik	Karacabey	Yeni Abonelik
	Takılan Sayaç		Takılan Sayaç
Gemlik	Yeni Abonelik	M.Kemalpaşa	Yeni Abonelik
	Takılan Sayaç		Takılan Sayaç
Yenişehir	Yeni Abonelik	Harmancık	Yeni Abonelik
	Takılan Sayaç		Takılan Sayaç
İnegöl	Yeni Abonelik		
	Takılan Sayaç		
TOPLAM	Yeni Abonelik		48.712
	Takılan Sayaç		40.619

İlçe Bazında Abonelik Çalışmaları (adet)

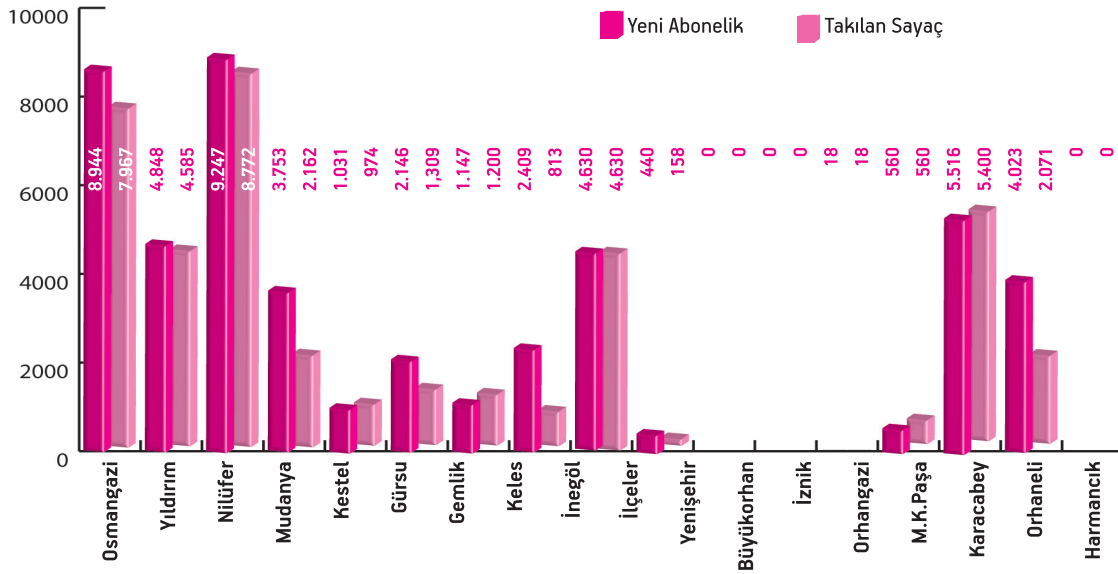


Abonelik Çalışmalarının Dağılımı (%)

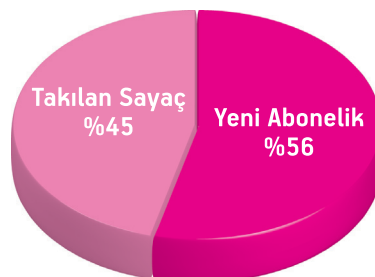


İlçe Bazında İçme Suyu Evsel Bağlantı Çalışmaları

İlçeler	Km	İlçeler	Km
Osmangazi	9,56	Yenişehir	1,20
Yıldırım	5,46	Büyükorhan	0,26
Nilüfer	5,96	İznik	4,22
Mudanya	2,14	Orhangazi	4,97
Kestel	1,03	M.Kemalpaşa	0,22
Gürsu	0,00	Karacabey	3,05
Gemlik	3,56	Orhaneli	0,60
Keles	1,01	Harmancık	1,30
İnegöl	3,90		
TOPLAM			48,44

İlçe Bazında İçme Suyu Evsel Bağlantı Çalışmaları (km)

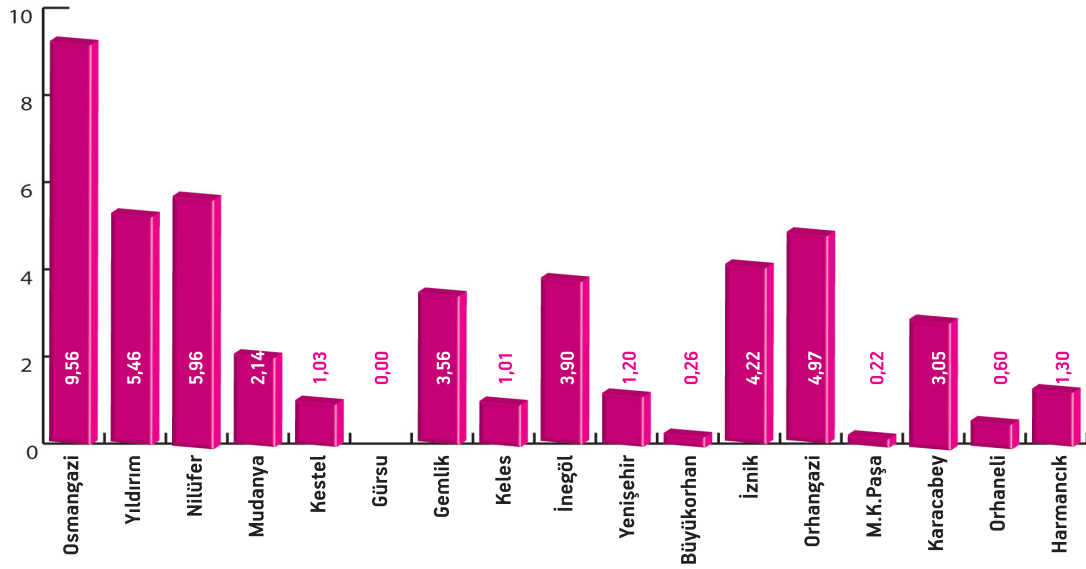

İlçe Bazında İçme Suyu Evsel Bağlantı Çalışmalarının Dağılımı (%)

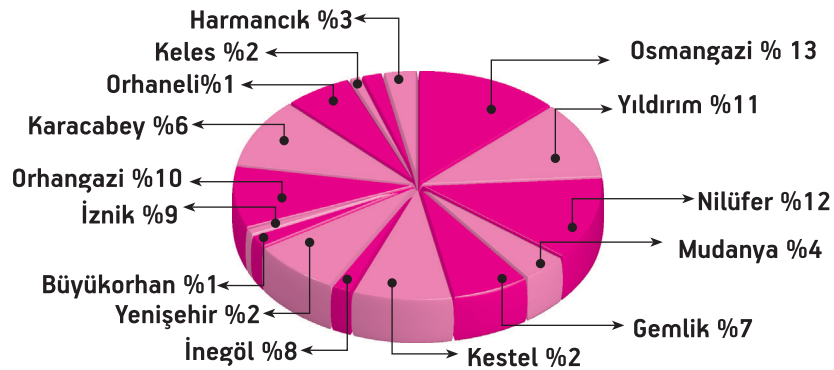


g - Arıza ve Tamir Çalışmaları


İlçe Bazında Arıza Tamir Çalışmaları

İlçeler		Adet	İlçeler	Adet	
Osmangazi	İçme Suyu Arıza	5.083	Yenişehir	İçme Suyu Arıza	1.435
	Kanal Arıza	2.443		Kanal Arıza	255
Yıldırım	İçme Suyu Arıza	2.976	Büyükorhan	İçme Suyu Arıza	177
	Kanal Arıza	1.602		Kanal Arıza	218
Nilüfer	İçme Suyu Arıza	2.020	İznik	İçme Suyu Arıza	440
	Kanal Arıza	654		Kanal Arıza	158
Mudanya	İçme Suyu Arıza	1.443	Orhangazi	İçme Suyu Arıza	1.030
	Kanal Arıza	363		Kanal Arıza	82
Kestel	İçme Suyu Arıza	460	M.Kemalpaşa	İçme Suyu Arıza	5539
	Kanal Arıza	114		Kanal Arıza	66
Gürsu	İçme Suyu Arıza	578	Karacabey	İçme Suyu Arıza	1.008
	Kanal Arıza	147		Kanal Arıza	243
Gemlik	İçme Suyu Arıza	2.115	Orhaneli	İçme Suyu Arıza	100
	Kanal Arıza	604		Kanal Arıza	75
Keles	İçme Suyu Arıza	135	Harmancık	İçme Suyu Arıza	262
	Kanal Arıza	78		Kanal Arıza	158
İnegöl	İçme Suyu Arıza	973			
	Kanal Arıza	471			
TOPLAM	İçme Suyu Arıza				25.684
	Kanal Arıza				7.731

İlçe Bazında Arıza ve Tamir Çalışmaları (adet)

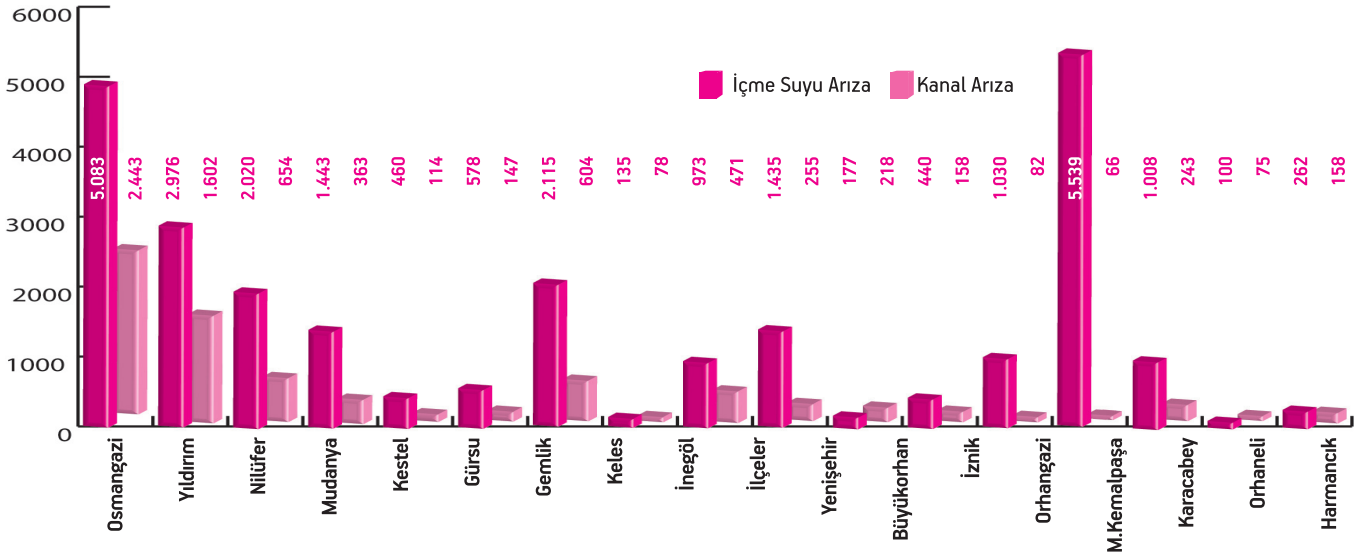

Arıza ve Tamir Çalışmalarının Dağılımı (%)

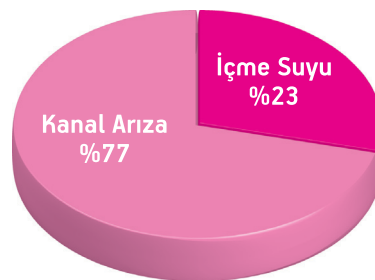


h - Proje Hizmetleri


Onaylanan Proje Metrajları

İlçeler	Km
Osmangazi	22,75
İçmesuyu	7,82
Yağmursuyu	5,54
Atıksu	9,39
Yıldırım	6,88
İçmesuyu	1,88
Yağmursuyu	1,50
Atıksu	3,50
Nilüfer	318,11
İçmesuyu	47,74
Yağmursuyu	30,47
Atıksu	239,90
Mudanya	6,94
İçmesuyu	6,94
Yağmursuyu	0,00
Atıksu	0,00
Kestel	12,30
İçmesuyu	0,00
Yağmursuyu	1,40
Atıksu	10,90
Gürsu	21,06
İçmesuyu	21,06
Yağmursuyu	0,00
Atıksu	0,00
Gemlik	1,17
İçmesuyu	0,00
Yağmursuyu	0,10
Atıksu	1,07
İznik	15,11
İçmesuyu	15,11
Yağmursuyu	0,00
Atıksu	0,00
Orhangazi	2,61
İçmesuyu	2,61
Yağmursuyu	0,00
Atıksu	0,00
TOPLAM	406,93
İçmesuyu	103,16
Yağmursuyu	39,01
Atıksu	264,76

Aylık Onaylanan Projelerin Dağılımı (km)

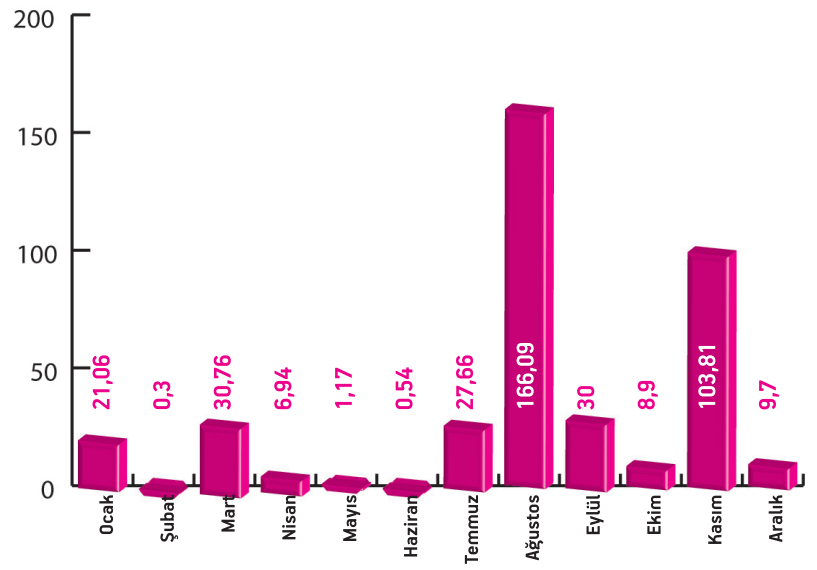


Onaylanan Projelerin Dağılımı

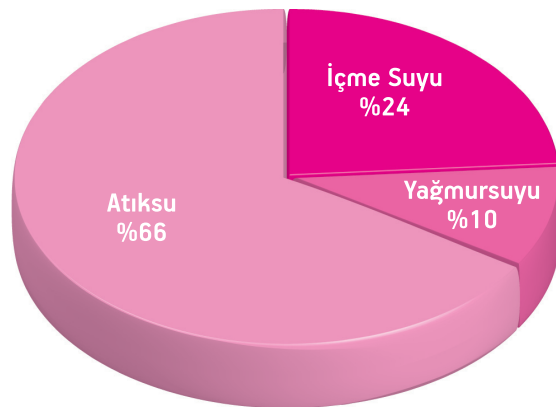


Avan Proje Metrajları (km)

İlçeler	Km
Osmangazi	22,85
İçmesuyu	0,00
Yağmursuyu	3,90
Atıksu	18,95
Yıldırım	17,20
İçmesuyu	0,00
Yağmursuyu	7,70
Atıksu	9,50
Nilüfer	163,46
İçmesuyu	116,39
Yağmursuyu	2,89
Atıksu	44,18
Mudanya	63,07
İçmesuyu	0,00
Yağmursuyu	43,00
Atıksu	20,07
Kestel	12,50
İçmesuyu	0,00
Yağmursuyu	0,00
Atıksu	12,50
Gürsu	0,00
İçmesuyu	0,00
Yağmursuyu	0,00
Atıksu	0,00
Gemlik	12,46
İçmesuyu	0,00
Yağmursuyu	9,46
Atıksu	3,00
Keles	1,00
İçmesuyu	0,00
Yağmursuyu	1,00
Atıksu	0,00
TOPLAM	292,54
İçmesuyu	116,39
Yağmursuyu	67,95
Atıksu	108,20

Aylık Avan Projelerin Dağılımı (%)

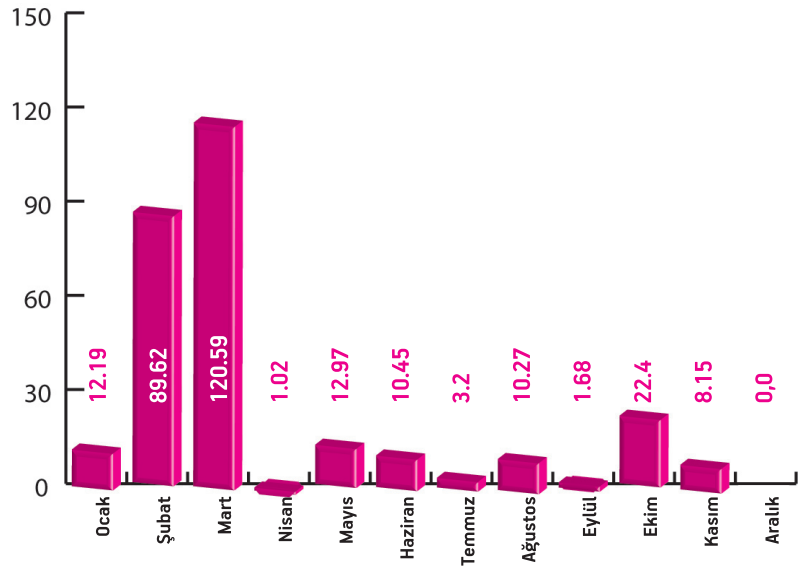

Avan Projelerin Dağılımı

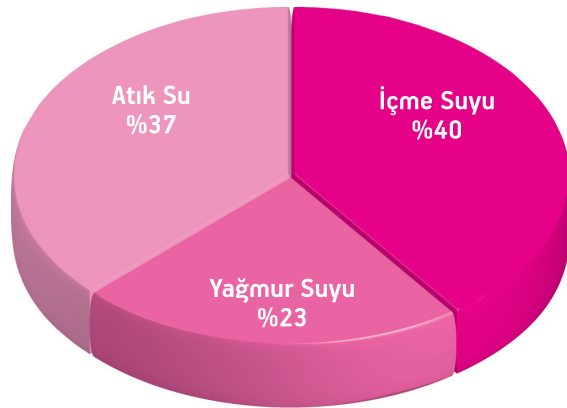


I - Tarımsal Sulamaya Yönelik Gölet ve Sulama Hizmetleri


İlçe Bazında Gölet ve Sulama Tesisleri Adet ve Alanları

İlçeler	YÜS Tesisi		YAS Tesisi		Gölet		Toplam Sulanan Saha (Ha)
	Adet	Ha	Adet	Ha	Adet	Ha	
Nilüfer	3	165,00	2	194,00			359,00
Osmangazi	16	1.215,00			2	679,00	1.894,00
Yıldırım	3	206,00					206,00
Büyükorhan	4	60,00			1	4,90	64,90
Gemlik	15	899,00			1	300,00	1.199,00
Gürsu	1	188,00			1	197,00	385,00
Harmancık	11	312,00			1	266,00	578,00
İnegöl	31	2.773,00	19	3.917,00	2	324,00	7.014,00
İznik	11	1.252,00	2	321,00	3	27,40	1.600,40
Keles	18	699,00	1	6,00	7	345,00	1.050,00
Kestel	11	1.239,00	2	938,00	3	349,40	2.526,40
Karacabey	3	272,00			5	1.658,00	1.930,00
Mudanya	1				4	940,00	940,00
M.kemalpaşa	15	1.531,00	2	380,00	2	210,00	2.121,00
Orhaneli	21	1.086,00			1	53,40	1.139,40
Orhangazi	8	1.104,00			1	31,60	1.135,60
Yenişehir	8	1.121,00			5	888,00	2.009,00
Toplam	180	14.122,00	28	5.756,00	39	6.273,70	26.151,70

Adet Bazında Gölet ve Sulama Hizmetleri

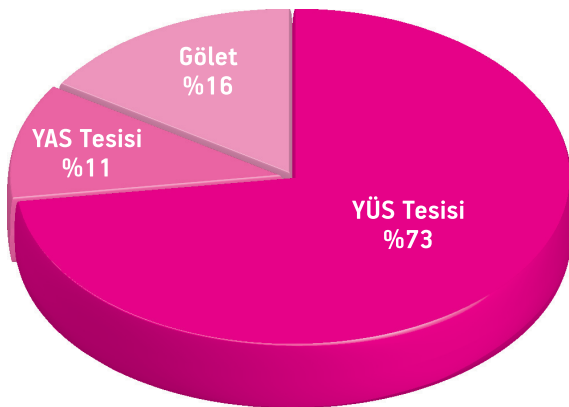

Hektar Bazında Gölet ve Sulama Hizmetleri

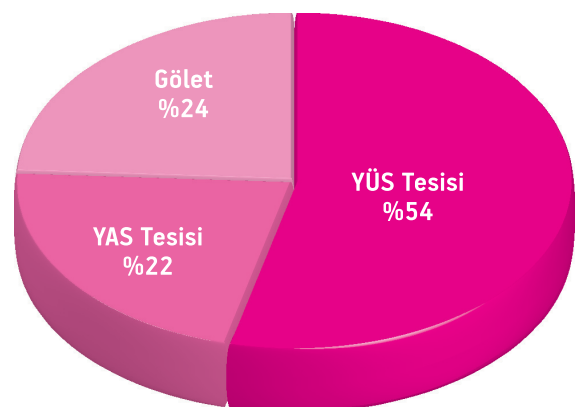

j. Doğal Kaynak Suyu Hizmetleri

31.03.2014 tarihinde tüzel kişiliği sona eren Bursa İl Özel İdaresi' nin kontrolünde bulunan doğal kaynak suları 01.04.2014 tarihi itibarıyla önce Bursa Büyükşehir Belediyesi' ne sonrasında BUSKİ Genel Müdürlüğü' ne geçmiştir.

14 ayrı firmaya ait 29 adet sözleşme bulunmaktadır. Kiralanan 48 adet kaynağın toplam menba debisi $Q=194,09 \text{ lt/sn'}$ dir. Bu toplam debiden kiralamaya esas debi miktarı $Q=80,30 \text{ lt/sn'}$ dir.



Kaynak Suyu




Kaynak Suyu


k. Scada

SCADA Kapsamında İşletilen İstasyonlar


İstasyon	2013 Yıl Sonu	2014 Yılında Eklenen	Toplam
Depolar	38	1	39
Pompalar	12	1	13
Altbölge Deb.	137	9	146
Dağınık Deb.	5	2	7
Kontrol Deb.	20	-	20
Şebeke Vanaları	7	1	8
Su Art. Tes. Arayüzü	1	-	1

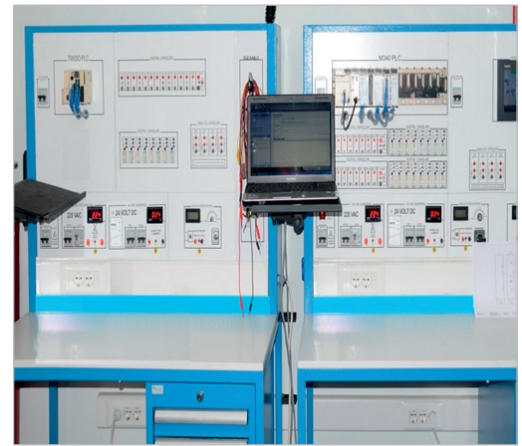

RTU Test Panosu

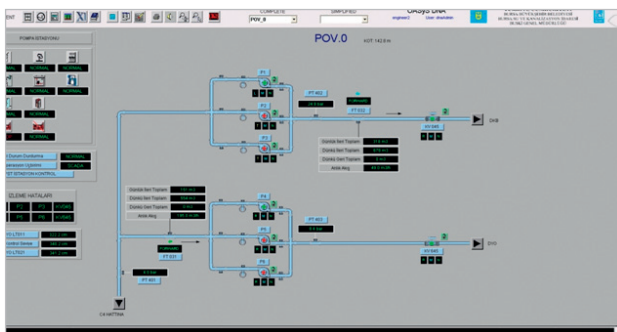

Ovaakça Pompası SCADA Görüntüsü

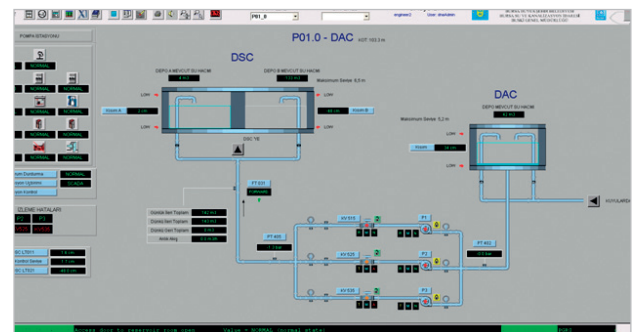

Pompa 1 SCADA Görüntüsü

I. Güneş Enerjisi Sistemi

BUSKİ Genel Müdürlüğü' ne ait 6 adet istasyonun işletilmesi ve arızalarına müdahale edilmesi amacıyla 2014 yılında 6 ayrı noktaya toplamda 200 kWp gücünde güneş enerjisi sistemi kurulmuştur.

Tesislere Göre Kurulu Güçler

Tesis Adı	Tesis Gücü (kWp)	Güneş Paneli (Adet)	İnvertör (Adet)
FETHİYE SPOR TESİSİ	10	40	1
ADALET SPOR TESİSİ	10	40	1
ŞAHİNBAŞOL SPOR TESİSİ	10	40	1
ATICILAR SPOR TESİSİ	30	120	3
VATAN SPOR TESİSİ	10	40	1
BATI ATIKSU ARITMA TESİSİ	130	520	13
TOPLAM GÜÇ	200	800	20



Batı AAT Güneş Enerjisi Sistemi



Batı AAT Güneş Enerjisi Sistemi



Batı AAT Güneş Enerjisi Sistemi

m. Dış Kredi Finansman İşlemleri


Avrupa Yatırım Bankası Kredis (AYB - 1)

İçme suyu, yağmur suyu ve atık su yatırımları ile bu yatırımlar için kullanılan malzemelerin temini için 1993 - 2001 arasında Dünya Bankası'ndan "Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi" kapsamında alınan kredi ile yapılan yatırımların devamı niteliğinde, 05.12.2000 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 2006 yılında kullanımı tamamlanan 80.000.000,00 Avro tutarında AYB' den kredi alınmıştır. Bahsi geçen kredinin geri ödemesi 30 Kasım 2018 tarihinde tamamlanacaktır.

AYB - 1 Geri Ödemesi (milyon avro)

	31.12.2014'e Kadar	31.12.2014 Sonrası	Toplam
Ödenecek	-	29,33	29,33
Ödenen	62,34	-	62,34
Toplam	62,34	29,33	91,7

Avrupa Yatırım Bankası-1 Kredis Geri Ödemesi



Alman Kalkınma Bankası Kredis (KFW)

"Bursa Kanalizasyon III. Merhale Projesi" kapsamında aşağıdaki tabloda detayları verilen Atık Su Arıtma Tesisleri'nin (A.A.T.) finansmanında kullanılmak üzere toplam 30 milyon Avro KFW kredisi alınmak üzere 28.05.2010 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ve Hazine Müsteşarlığı arasında ikraz anlaşması ve aynı tarihte KFW ile kredi anlaşması imzalanmıştır. Kredinin kullanımı Aralık 2011' de başlamış olup, 31.12.2016 tarihinde tamamlanacaktır.

KFW Kredis Kapsamında Planlanan İşler


İŞİN ADI	İŞİN DURUMU	SÖZLEŞME TUTARI
İş Paketi 1 Gemlik, Mudanya, Kurşunlu A.A.T	Ön Yeterlilik alındı	
İş Paketi 2 K.Kumla, Akçalar, Nilüfer,(Badırga) A.A.T	Planlama Aşamasında	
İş Paketi 3 K.Kumla,Kurşunlu D.D.D	Planlama Aşamasında	
Bursa Atıksu Projesi III.Merhale Detaylı Tasarım ve İhale için Müş.Hiz.Proje Yürütücü Kur.İhale ve Sözleşme Yapılması ve Kontrollük Konularında Destek için Müşavirlik İş (KMH-2010/1K)	Söz. Tar. 14.12.2011	3.869.952,14 €

KFW Kredis Geri Ödemesi (avro)

	31.12.2014'e Kadar	31.12.2014* Sonrası	Toplam
Ödenecek	-	932.102,75	932.102,75
Ödenen	34.601,85	-	34.601,85
Toplam	34.601,85	932.102,75	966.704,60

*31.12.2014 sonrası ödenecek faiz toplamı tahmini olup kullanıma göre belirlenecektir.

KFW Kredis Geri Ödemesi Grafiği

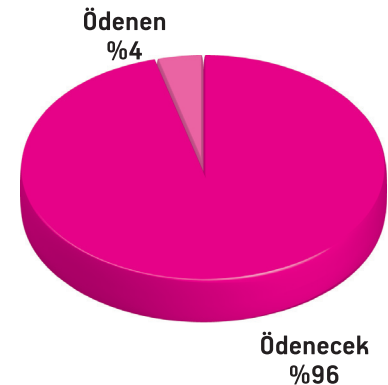


Avrupa Yatırım Bankası Kredisı (AYB - 2)

"Bursa Kanalizasyon III. Merhale Projesi" kapsamında muhtelif kanalizasyon ve içme suyu projeleri ile bu projelerde kullanılacak malzemelerin finanse edilmesi amacıyla toplam 50 milyon Avro tutarında AYB kredisi alınmıştır. 25.11.2010 tarihinde imzalanan Garanti Protokolü ve Kredi Sözleşmesi gereği ilk dilimin kullanımı 2012 yılında başlamıştır. 09.05.2032 tarihinde kredi geri ödemesi tamamlanacaktır.

AYB - 2 Geri Ödemesi (avro)

	31.12.2014'e Kadar	31.12.2014 Sonrası	Toplam
Ödenecek	-	14.146.198,43	14.146.198,43
Ödenen	964.250,00	-	964.250,00
Toplam	964.250,00	14.146.198,43	15.110.448,45

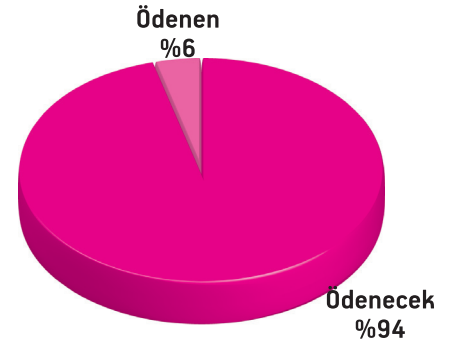AYB-2 Kredisı Geri Ödeme Grafiğı**AYB - 2 Kredisı Kapsamında Planlanan İşler**

Proje Adı	Proje Durumu	
İşin Adı	İşin Durumu	Sözleşme Bedeli
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Uygulamaları		
A3.3.2 Barakfakih ve Panayır Kanalizasyon ve Y.Suyu Kollektörleri Yapım İşı	Söz. Tar. 20.11.2013	33.224.328,38 TL
A3.2 Gemlik Körfezi Y.Suyu Kollektörleri Yapım İşı	Söz. Tar.25.07.2014	54.490.842,55 TL
A3.3.1 Samanlı Kollektörü Yapım İşı	Söz. Tar. 15.08.2011	14.233.834,85 TL
A3.4.1 Batı Nilüfer Y.Suyu Kollektörleri Yapım İşı	Sözleşme Aşamasında	
A3.4.2 Hasanağa Ovaakça Kollektörleri Yapım İşı	İhale Aşamasında	
Müşavirlik Hizmetleri		
Mali Kayıtların Denetimi	Söz. Tar. 12.07.2011	90.000,00 €
Bursa Atıksu Projesi II için Teknik Destek Hizmetleri (KMH-2011/A)	Söz. Tar. 03.05.2012	9.876.166,95 TL

n - Diğer Hizmetler

Kurum İçi Denetim

Teftiş Kurulu Başkanlığı' nca 2014 yılında 1 adet inceleme raporu, 9 adet soruşturma raporu, 5 adet cevaplı teftiş raporu ve 13 adet Valilik Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Hukuk İşlemleri

1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında; 1.239 adet dava, 108 adet icra, 1.926 adet yazışma ve mütalaalarla ilgili olmak üzere toplam 3.273 adet evrak girişi olmuş, 1.152 adet dava, 174 adet icra, 409 adet yazışma ve mütalaalarla ilgili olmak üzere toplam 1.735 adet evrak çıkışı olmuştur.

1.666 adedi kurum avukatları, 3.317 adedi de özel avukatlarca olmak üzere toplam 4.983 adet ilamsız takip yapılmıştır.

110 adet idareye, 177 adet idareden olmak üzere toplam 287 adet dava ikame edilmiştir. 156 adet dava neticelendirilmiş ve işleminden kaldırılmıştır.

Sağlık Hizmetleri

2014 yılı içerisinde 2.680 kişinin hasta kaydı yapılmış, muayenesi sonucu reçete verilmiştir. Gereken hastaların enjeksiyon, pansuman, kulak lavajı, tansiyon takipleri yapılmıştır.

Eğitim Faaliyetleri

2014 yılında 792 kişiye kurum içi, 585 kişiye de kurum dışı eğitim verilmiştir.

Muhtelif meslek liselerinden 51 öğrenciye bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla haftanın 3 günü ücretli olarak, 2014 yılı yaz döneminde de 100 üniversite ve 28 meslek lisesi öğrencisine 20-30 iş günü staj yapması sağlanmıştır.

Kesin Hesap İşlemleri

Kesin Hesap Şube Müdürlüğü'nce 2014 yılında 57 adet kesin hesap, 735 adet hakediş ve 482 adet yeni fiyat analizi incelemesi yapılmıştır.

C.6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

2014 yılı Haziran ayından itibaren Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumun sağlanması amacıyla iç kontrol sistemi oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. İlk olarak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Tüm birimlerden birim müdürleri ve diğer personelden olmak üzere İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Hazırlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 31.12.2014 tarih ve 45953 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile yürürlüğe konulmuştur.


2015 yılında; İç Kontrol Eylem Planıyla planlanan eylemlerin uygulanması çalışmaları yapılacaktır. İç Kontrol Standartları Risk Değerlendirme Bileşeni kapsamında kurumun risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla bütün birimlerde Risk Koordinatörleri, Birim Risk Sorumluları ve Alt Birim Risk Sorumluları oluşturulmuştur. Ayrıca birimlerin oluşturacağı risk eylem planlarının değerlendirilmesi, kurumun risk strateji ve politikalarının belirlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla kurumda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, tüm birim yöneticilerinin üyesi olduğu Risk Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

İç kontrol sistemi çalışmaları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı altında oluşturulan İç Kontrol Şefliği bünyesinde yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüzde uluslararası iç kontrol standartlarına uygun ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan İç Kontrol Standartları Tebliği hükümleriyle çerçevesi belirlenen İç Kontrol Standartlarını esas alan İç Kontrol Sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.



Şehirler
İnsanla,
İnsanlar
Suyla
Hayat Bulur...

www.buski.gov.tr



II AMAÇ ve HEDEFLER

- A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
- B. Temel Politika ve Öncelikler

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Amaç- 1: Mevcut su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilirliğinin sağlamak.

- A1 H1:** Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 95 km. pınar kaynağı ıslahının, 2017 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.
- A1 H2:** Nüfus artışı, hizmet sınırlarının genişlemesi, kuraklık v.b. konular dikkate alınarak 2017 yılı sonuna kadar "su ihtiyacı"nı belirlemek ve karşılanması için çalışmaları yapmak, Çınarcık Barajından su temini için arıtma tesisi ve ana isale hatlarını projelendirmek.



İçme Suyu İnşaatı

Amaç- 2: Alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve geliştirmek.

- A2 H1:** 2014 yılı sonuna kadar İçmesuyu Dolum Tesisi yapmak
- A2 H2:** 2017 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan su kaynaklarının tahsis yetkisinin Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilebilmesi için gerekli yasal işlemleri başlatmak.
- A2 H3:** Su kaynaklarından enerji temin edilmesi için yapılan çalışmaları 2014 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.



Yeraltı Suyu İnşaatı

Amaç- 3:Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.

- A3 H1:** Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde 2012 yılı sonu hedeflenen %23 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar %22'ye düşürmek.
- A3 H2:** Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezleri dışındaki yerlerde (Demirtaş, Ovaakça, Emek, Görükle, Hasanağa, Çalı, Kayapa, Akçalar, Gölyazı, Kurşunlu, Umurbey, Barakfakih, Kumla) 2012 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale gelecek olan kaçak su oranını her yıl % 3 azaltmak.
- A3 H3:** Gemlik ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 50 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 35'e düşürmek.
- A3 H4:** Kestel ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 45 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 30'a düşürmek.
- A3 H5:** Mudanya ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 35 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 30'a düşürmek.
- A3 H6:** Gürsu ilçesinde 2012 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale gelecek olan kaçak su oranını her yıl % 3 azaltmak.
- A3 H7:** 2017 yılı sonuna kadar 104 adet alt bölge sınırlarını kesinleştirmek ve fiziksel olarak izole etmek.
- A3 H8:** 2017 yılı sonuna kadar sınırları kesinleştirilen 104 adet alt bölgeye debiölçer takmak ve ölçülebilir hale getirmek.
- A3 H9:** 2017 yılı sonuna kadar kesinleştirilen 104 adet alt bölge sınırlarının veritabanına girişini sağlamak.

Amaç- 4: İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.

- A4 H1:** Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 500 km şebeke inşaatı yapmak.
- A4 H2:** Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km isale hattı inşaatı yapmak.
- A4 H3:** Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 20 adet depo inşaatı yapmak.
- A4 H4:** Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 80 km şebeke inşaatı yapmak.
- A4 H5:** Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 15 km isale hattı inşaatı yapmak.
- A4 H6:** Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 6 adet depo inşaatı yapmak.
- A4 H7:** Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 100 km şebeke inşaatı yapmak.
- A4 H8:** Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 30 km isale hattı inşaatı yapmak.
- A4 H9:** Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 5 adet depo inşaatı yapmak.
- A4 H10:** Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km şebeke inşaatı yapmak.
- A4 H11:** Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 15 km isale hattı inşaatı yapmak.
- A4 H12:** Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 6 adet depo inşaatı yapmak.
- A4 H13:** Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 70 km şebeke inşaatı yapmak.



İçme Suyu Laboratuvarı



Abone Bağlantısı

- A4 H14:** Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 40 km isale hattı inşaatı yapmak.
- A4 H15:** Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 10 adet depo inşaatı yapmak.
- A4 H16:** 2013 yılı sonuna kadar 500, 1000, 2500, 5000, 10.000, 20.000, 30.000 m3 kapasiteli su depolarının uygulama projelerinin tamamının dört ayrı zemin için hazırlamak.
- A4 H17:** 2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 500 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.

Amaç- 5: İçme suyunun aboneye ulaştırılmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.

- A5 H1:** 2012 yılı sonunda hedeflenen, hizmet sınırlarımız içerisinde, içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresi olan ortalama 34 saati, 2017 yılı sonuna kadar 31 saate düşürmek.
- A5 H2:** Sözleşmesi tamamlanmış ve bağlantı için iş emri ulaşmış abonelerin, su bağlanmasına engel olacak bir durumu olmaması halinde, 2017 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sularını 3 iş günü içinde % 80 'ini bağlamak.
- A5 H3:** Sözleşmesi tamamlanmış ve bağlantı için iş emri ulaşmış abonelerin, su bağlanmasına engel olacak bir durumu olmaması halinde 2017 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin sularını 7 iş günü içinde % 85'ini bağlamak.
- A5 H4:** 2017 yılı sonuna kadar abone olmayan 15 adet köyün abonelik işlemlerini sonuçlandırmak.
- A5 H5:** Her yıl, bir önceki yıl sonu itibariyle, 10 yılını doldurmuş sayaçların %90'ını değiştirmek.
- A5 H6:** 2017 yılı sonuna kadar müracaattan itibaren abonelik sözleşme işlemlerini 2 iş günü içerisinde tamamlamak.
- A5 H7:** 2012 yılı sonu itibariyle % 70 olması hedeflenen günü geçmiş alacakların tahsilat oranını 2017 yılı sonuna kadar % 75'e çıkarmak.

- A5 H8:** Her yıl abone memnuniyeti araştırması yapmak, memnun olunmayan konularda memnuniyetsizlik oranını her yıl en az % 2 oranında azaltmak.
- A5 H9:** Abone bazlı oluşturulan Hizmet Masalarını Genel Müdürlüğümüzün tüm hizmetlerini kapsayacak şekilde 2015 yılı sonuna kadar revize etmek ve tek bir birimde birleştirmek.
- A5 H10:** 2017 yılı sonuna kadar Kestel, Mudanya ve Gürsu'da hizmet binaları yapmak.



Kanalizasyon Hattı Çalışması

Amaç- 6: 2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.

- A6 H1:** Nüfus artışı, hizmet sınırlarının genişlemesi olasılığı, iklim değişikliği etkilerini dikkate alarak 450 km atıksu, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerini 2017 yılı sonuna kadar hazırlamak.
- A6 H2:** 2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 350 km. kanalizasyon hattı döşemek.
- A6 H3:** 2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 200 km. yağmursuyu hattı döşemek.
- A6 H4:** 2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 250 km. kanalizasyon hattı döşemek.

- A6 H5:** 2013-2014 yılları arasında BBB sınırları içinde diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 125 km. yağmursuyu hattı döşemek.
- A6 H6:** 2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içindeki derelerin 15 km.'sini ıslah ederek sel taşkınlarını önlemek.
- A6 H7:** 2013-2014 yılları arasında Samanlı Kolektörü inşaatının % 100' ünü tamamlayarak, Doğu Bölgesinin atık sularını atık su arıtma tesislerine ulaştırmak.
- A6 H8:** 2013-2017 yılları arasında Demirtaş, Ovaakça, Kurşunlu, Mudanya, Nilüferköy, Barakfakih Havzalarındaki atık su hatlarının % 100' ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.
- A6 H9:** 2013-2017 yılları arasında Batı Nilüfer Havzasındaki atık su hatlarının % 100' ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.



Kanal Görüntüleme Çalışmaları

Amaç- 9: Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.

- A9.1:** Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak, memnun olunmayan konularda memnuniyetsizlik oranını her yıl en az % 2 oranında azaltmak.
- A9.2:** 2017 yılı sonuna kadar yıllık eğitim saatini 8 saate çıkartmak.
- A9 H3:** Her yıl emekli olan personel kadar yeni personel temin edilmesi.

- A9 H4:** İçme suyu, atık su, yağmursuyu imalatlarının talep edilen konum kontrolünü takip eden 2 ay içerisinde yapmak.
- A9 H5:** Her yıl yapılan kanal ve yağmursuyu hatlarının tamamını takip eden yıl sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemine veri girişini yapmak.
- A9 H6:** 2013-2017 yılları arasında 104 adet alt bölgede bulunan içme suyu alt yapı bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine veri girişini yapmak.
- A9 H7:** Mülkiyeti BUSKİ adına tescil edilen veya kullanımına tahsis edilen veya tasarrufunda olan taşınmazlar ile BUSKİ lehine kurulan irtifak haklarına ait tüm emlak bilgilerinin emlak bilgi sisteminde güncelliğinin devamını sağlamak.
- A9 H8:** İşletilmekte olan mevcut su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncelliğinin devamını sağlamak.
- A9 H9:** Bakım onarım çalışmaları kapsamında yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin yıllık verilerin o yıl içerisinde tamamının veri tabanına işletimini sağlamak.
- A9 H10:** Coğrafi Bilgi Sistemi veritabanında görünmesi gereken yıl içerisinde yapılan tüm işlemlerin tamamının tasarım ve raporlamalarını yapmak ve yönetimini sağlamak.



Asfalt Yapımı

- A9 H11:** Kitle iletişim araçları ile su bilinci ve kültürünü arttırmak amaçlı Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer sınırları içerisindeki tüm okulları 2017 yılı sonuna kadar bilgilendirmek.

A9 H12: Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 80 adet kuyuyu aktif halde tutmak.

A9 H13: 2014 yılı sonuna kadar Ar-Ge, istatistik birimi ve iç kontrol faaliyetlerini kapsayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya gitmek.

A9 H14: Yeni işe girenlere ilk altı ay içerisinde oryantasyon ve mesleki eğitim vermek.

Amaç- 10: Hizmet sınırlarının genişlemesi ve il sınırına çıkarılması ihtimaline karşın gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak.

A10 H1: Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki mevcut altyapılarının tespiti çalışmasını 2013 yılında başlatmak, 2015 yılı sonuna kadar altyapı varlıklarının tespiti çalışmasını sonuçlandırmak.

A10 H2: Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki mevcut altyapıların tespiti sonrasında, 2016 yılında Genel Müdürlük bünyesinde ilgili tüm dokümanları, programları v.b. güncellemek.

A10 H3: Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda yeni katılacak bölgelerdeki 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritalarının 2017 yılı sonuna kadar tamamının üretimini yapmak.

A10 H4: Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda yeni katılacak bölgeler de dahil olmak üzere hizmetlerimizde eksiklik olmaması amacı ile organizasyonel değişikliği tespit etmek.



Tarihi Çeşme



Sayaç Atölyesi

B- Temel Politika ve Öncelikler

*** Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi,**

İyi yönetim; bütün vatandaşların gerekli bilgiye kolayca ulaşabildiği saydam yönetimi, katılımcılığı, hesap verebilir ve sorumlu biçimde yönlendiren etkin süreç ve yapıları içermektedir.

Yönetim hukuk kuralları içinde kalarak, objektif bilgiye dayalı karar vermekte ve kararlar hukuk yolu ile denetlenmektedir.

Kurumsal gelişim; kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı, bütçelendiği ve raporlandığı konularında sorumlu ve gerektiğinde hesap verebilir bir yönetim anlayışı, serbest bilgi akışının sağlanması ile mümkün olabilmektedir.

*** Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,**

Doğal kaynaklarımızın korunması, atık miktarlarında azalma ve ekonomiye katkı sağlanması, kentimizde yaşayanlara çevre bilinci ve temiz çevre kültürü kazandırılması ile mümkün olacaktır. Su kültürünün ve su tasarrufu bilincinin oluşturulması hedeflerimizdir.

*** Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda altyapı (içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması,**

Kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan yeni yerleşim birimlerinde planlı altyapı hizmeti sunulmakta ve eski yerleşim yerlerinde ise altyapıların rehabilitasyonun sağlanmasına yönelik yenileme projelerine ağırlık verilmektedir.

*** Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,**

Su kaynakları ve çevre ile ilgili konuların, kamuoyu ve hemşerilerimizin gündeminde daha çok yer bulması sağlanmakta ve kent sakinlerinin çevre bilincini artıracak etkinlik ve faaliyetlere öncülük yapılmakta, ağırlık verilmekte ve destek sağlanmaktadır. Her türlü kirliliği oluşmadan önlemek, tüm kirletici parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek.

*** Bilgi teknolojileri takip edilmesi ve kullanımının sağlanması.**

E-buski uygulaması, hizmetlere erişimde etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Bilgi teknolojilerinin kullanımının sağlanması ile esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır.



Su
Sağlıktır,
Ferahlıktır,
Gelecektir,
Temizliktir...



www.buski.gov.tr



III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

B. Performans Bilgileri



185^{Al}BUSKİ!

Arıza ve Şikayetleriniz için,

**7 gün 24 saat
Hizmetinizdeyiz!**

Arıza ve Şikayetleriniz için Ücretsiz Olan 185 Numarasını Telefonunuzdan
Tuşlamanız ve Arzayı Bildirmeniz Yeterlidir. Ekiplerimiz Size En Kısa
Sürede Geri Dönerek Arzanız Hakkında Bilgilendirilecektir.



III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

A.1 - Bütçe Uygulama Sonuçları

BUSKİ Genel Müdürlüğü 01.01.2014 - 31.12.2014 Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu (TL)

BÜTÇE GİDERLERİ			2013	2014	BÜTÇE GELİRLERİ		2013	2014
1	0	Personel Giderleri.	46.040.824,29	55.638.103,98	3	0	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	353.135.374,98
1	1	Memurlar.	15.022.894,08	22.068.862,16	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	352.951.114,99
1	2	Sözleşmeli Personel	1.050.585,46	246.563,67	3	6	Kira Gelirleri	184.259,99
1	3	İşçiler.	29.891.597,15	33.230.296,11	4	0	Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler	8.236.212,89
1	4	Geçici Personel.	75.747,60	92.382,04	4	5	Proje Yardımları	6.389.810,05
2	0	Sosyal Güvenlik Kurum. Dev. Primi Gid.	7.482.918,67	9.764.969,62	5	0	Diğer Gelirler	52.631.242,61
2	1	Memurlar.	2.160.358,60	3.320.269,78	5	1	Faiz Gelirleri	4.394.456,14
2	2	Sözleşmeli Personel	207.127,71	46.638,19	5	2	Kısi ve Kurumlardan Alınan Paylar	45.284.901,37
2	3	İşçiler.	5.115.432,36	6.398.061,65	5	3	Para Cezaları	1.500,00
3	0	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri.	107.354.962,53	152.790.857,66	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.951.885,10
3	1	Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları.	1.025.163,06	987.988,50	6	0	Sermaye Gelirleri	30.089,62
3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları.	19.696.228,30	34.501.987,18	6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	1.009.954,37
3	3	Yolluklar.	208.820,46	285.479,22				
3	4	Görev Giderleri.	6.020.798,45	6.652.441,00	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			
3	5	Hizmet Alımları.	76.903.069,28	105.409.152,27	406.594.989,21			
3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri.	1.072.507,46	660.274,58	2013			
3	7	Menkul Mal,Gayrim. Hak Al. Bak. Ve On. Gid.	2.325.177,98	4.086.782,14	3	0	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	279.672,68
3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri.	103.197,54	206.752,77	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	279.372,15
4	0	Faiz Giderleri.	2.614.401,12	3.803.258,46	3	6	Kira Gelirleri	187,7
4	2	Diğ. İç Borç Faiz Giderleri.		1.174.566,97	5	0	Diğer Gelirler	53.200,66
4	3	Dış Borç Faiz Giderleri		2.628.691,49	5	1	Faiz Gelirleri	3.624,13
5	0	Cari Transferler.	3.897.586,30	4.345.182,75	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	27.437,48
5	1	Görev Zararları.	626.703,80	774.427,70	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	16.064,74
5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap. Transfer		36.489,68	283.296,81			
5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar.	3.267.829,70	3.534.265,37	406.311.692,40			
6	0	Sermaye Giderleri.	249.427.346,37	352.566.729,32	515.536.629,71			
6	1	Mamul Mal Alımları.	12.889.750,60	10.149.703,90				
6	3	Gayri Maddi Hak Alımları.	3.083.278,64	2.196.578,34				
6	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması.	6.458.874,81	3.551.046,84				
6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri.	215.992.077,83	324.866.883,82				
6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri.	3.059.153,89	3.635.990,83				
6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.	7.861.433,60	8.166.525,59				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			416.818.039,28	578.909.101,79	NET BÜTÇE GELİRİ			-10.506.346,88
								-63.372.472,08

A.2 - Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar**BUSKİ Genel Müdürlüğü 01.01.2014- 31.12.2014 Faaliyet Sonuçları Tablosu (TL)**

GİDERLER				2013		2014		GELİRLER				2013		2014	
0	0	0	0	GİDERLER HESABI.	317.912.682,10	423.676.487,48	0	0	0	0	GELİRLER HESABI.	391.760.295,94	538.986.877,53		
1	0	0	0	Personel Giderleri	46.031.346,23	67.631.613,66	3	0	0	0	Teş. ve Mülk. Gel.	323.632.582,33	414.822.524,54		
1	1	0	0	Memurlar.	15.022.894,08	22.068.862,16	3	1	0	0	Mal ve Hiz. Sat. Gel.	323.462.832,21	406.952.974,22		
1	2	0	0	Sözleşmeli Personel	1.050.585,46	246.563,67	3	6	0	0	Kira Gelirleri	169.750,12	7.869.550,32		
1	3	0	0	İşçiler.	29.882.119,09	45.223.805,79	4	0	0	0	Alınan Bağ. ve Yrd. ile Özel Gelirler	798.282,00	10.214.507,20		
1	4	0	0	Geçici Personel.	75.747,60	92.382,04	4	5	0	0	Proje Yardımları		10.214.507,20		
2	0	0	0	Sos. GÜv. Ku. Dev. P. Gid.	7.482.918,67	9.764.969,62	5	0	0	0	Diğer Gelirler	56.937.247,99	89.705.711,72		
2	1	0	0	Memurlar.	2.160.358,60	3.318.341,38	5	1	0	0	Faiz Gelirleri	4.328.362,67	5.870.962,20		
2	2	0	0	Sözleşmeli Personel	207.127,71	46.638,19	5	2	0	0	Kişİ ve Ku. Al. Paylar	45.640.305,58	69.439.703,56		
2	3	0	0	İşçiler.	5.115.432,36	6.399.990,05	5	3	0	0	Para Cezaları		1.500,00		
3	0	0	0	Mal Ve Hizmet Alım Gid.	148.680.138,82	217.473.711,79	5	9	0	0	Diğer Çeşitli Gelirler	6.968.579,74	14.393.545,96		
3	1	0	0	Üretime Yönelik Mal Ve Malz. A.		94.916,56	11	0	0	0	Değ.ve Mik. Değ. Gel.	10.392.183,62	24.244.134,07		
3	2	0	0	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	13.341.473,85	24.055.892,68	11	1	0	0	Döv. Mev. Değ. Olu. Olumlu Kur Farkları	5.696.867,55	17.381.913,33		
3	3	0	0	Yolluklar	208.820,46	285.479,22	11	2	0	0	Kur Değ. Ned. Döv. Cin. Borç Stok. Azal.	4.695.316,07	6.862.220,74		
3	4	0	0	Görev Giderleri	7.644.823,95	16.464.891,75	GELİRLER TOPLAMI							391.760.295,94	538.986.877,53
3	5	0	0	Hizmet Alımları	124.664.202,01	173.561.198,04									
3	6	0	0	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	709.168,43	373.143,87									
3	7	0	0	Menkul Mal,Gayri. Hak Al., Bak. Ve On. Gid.	1.434.206,28	2.448.186,52									
3	8	0	0	Gayrim. Mal Bak. Ve On. Gid.	677.443,84	190.003,15									
4	0	0	0	Faiz Giderleri.	33.249,96	1.206.011,85									
4	2	0	0	Diğer İç Borç Faiz Giderleri.		958.407,16									
4	3	0	0	Dış Borç Faiz Giderleri.	33.249,96	247.604,69									
5	0	0	0	Cari Transferler.	3.897.586,30	34.107.574,70									
5	1	0	0	Görev Zararları.	626.703,80	30.536.819,65									
5	3	0	0	Kar Ama. Güt. K. Yap. Tran.	3.052,80	36.489,68									
5	8	0	0	Gelirlerden Ayrılan Paylar.	3.267.829,70	3.534.265,37									

BUSKİ Genel Müdürlüğü 01.01.2014- 31.12.2014 Faaliyet Sonuçları Tablosu

GİDERLER					2013	2014	2013	2014
11	0	0	0	0	Değ. ve Mlk. Değ. Giderleri	17.242.008,91		
11	1	0	0	0	Döviz Mevc. Değ. Ol. Olumsuz K. F.	4.677.050,65		
11	6	0	0	0	Kur De. Ned. D. Cin. Borç Stok Art.	12.564.958,26		
13	0	0	0	0	Amortisman Giderleri	56.294.258,70		
13	1	0	0	0	Maddi Duran Varl. Amortisman Giderleri	51.735.921,45		
13	2	0	0	0	Mad. Olm. Dur. Varl. Amortisman Giderleri	4.558.337,25		
14	0	0	0	0	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	19.956.338,25		
14	1	0	0	0	Kırtasiye Malzemeleri	1.087.955,84		
14	2	0	0	0	Bes, Gi. A. Mutf. Kull. Tük.Malz.	3.842,18		
14	3	0	0	0	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malz.	260.603,25		
14	4	0	0	0	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	3.597.629,57		
14	5	0	0	0	Temizleme Ekipmanları	450.688,89		
14	6	0	0	0	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	847.696,87		
14	7	0	0	0	Yiyecek	60.402,75		
14	8	0	0	0	İçecek	9.620,00		
14	10	0	0	0	Zirai Maddeler	59.006,00		
14	12	0	0	0	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	4.730.514,36		
14	13	0	0	0	Yedek Parçalar	7.967.894,24		
14	14	0	0	0	Nakli Vastalılar Lastikleri	178.894,21		
14	17	0	0	0	Basınçlı Ekipmanlar	686.793,87		
14	99	0	0	0	Diğer Tüketim Amaçlı Malzeme	14.796,22		
GİDERLER TOPLAMI					317.912.682,10	423.676.487,48	73.847.613,84	115.310.390,05

Buski Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Bilançosu

AKTİF (Varlıklar)	2012	2013	2014
1-0-0...DÖNEN VARLIKLAR.	250.460.225,49.	275.910.957,26.	247.316.599,34
1-10-0...HAZIR DEĞERLER.	32.049.414,05.	31.778.259,29.	21.124.676,89
1-10-102...BANKA HESABI..	4.878.588,53.	4.970.316,08.	8.297.851,33
1-10-104...PROJE ÖZEL HESABI.	170.636,79.	2.057.230,36.	1.987.903,11
1-10-105...DÖVİZ HESABI..	22.578.288,37.	19.239.387,46.	2.579.207,99
1-10-108...DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI.	1.856.627,22.	1.572.780,93.	1.936.837,52
1-10-109...BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACA	2.565.273,14.	3.938.544,46.	6.322.876,94
1-11-0...MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR.	1.700.000,00.	348.000,00.	6.620.000,00
1-11-118...DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKL	1.700.000,00.	348.000,00.	6.620.000,00
1-12-0...FAALİYET ALACAKLARI.	68.680.012,51.	82.141.901,78.	139.265.475,06
1-12-120...GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI..	57.854.815,82.	65.551.935,87.	114.284.154,34
1-12-126...VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	10.825.196,69.	16.589.965,91.	24.981.320,72
1-13-0...KURUM ALACAKLARI.	52.160.092,49.	73.731.836,65.	0,00
1-13-132...KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALA	52.160.092,49.	73.731.836,65.	0,00
1-14-0...DİĞER ALACAKLAR.	22.495.971,57.	13.906.446,31.	1.122.226,60
1-14-140...KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI..	22.495.971,57.	13.906.446,31.	1.122.226,60
1-15-0...STOKLAR.	31.708.467,90.	34.943.314,73.	37.120.090,97
1-15-150...İLK MADDE VE MALZEME HESABI..	31.708.467,90.	34.943.314,73.	37.120.090,97
1-16-0...ÖN ÖDEMELER.	790.217,10.	1.507.376,31.	1.400.952,34
1-16-162...BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER H	0,00.	724.596,31.	1.382.452,34
1-16-165...MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVAN	790.217,10.	782.780,00.	18.500,00
1-19-0...DİĞER DÖNEN VARLIKLAR.	40.876.049,87.	37.553.822,19.	40.663.177,48
1-19-190...DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ H	40.876.049,87.	37.553.822,19.	40.663.177,48
2-0-0...DURAN VARLIKLAR.	1.313.450.891,01.	1.392.683.649,09.	1.585.216.622,08
2-24-0...MALİ DURAN VARLIKLAR.	5.027.805,01.	5.027.805,01.	5.027.805,01
2-24-240...MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SER	5.027.805,01.	5.027.805,01.	5.027.805,01
2-25-0...MADDİ DURAN VARLIKLAR.	1.308.022.461,44.	1.385.349.927,69.	1.578.272.950,94
2-25-250...ARAZİ VE ARSALAR HESABI..	101.097.381,33.	107.348.970,70.	99.485.462,52
2-25-251...YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ H	1.135.743.982,02.	1.278.633.010,45.	1.365.263.913,35
2-25-252...BİNALAR HESABI..	33.222.535,63.	36.369.952,70.	39.037.120,76
2-25-253...TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESA	166.304.639,36.	167.137.974,31.	170.394.936,80
2-25-254...TASİTLAR HESABI..	6.311.974,90.	8.657.374,90.	11.464.785,90
2-25-255...DEMİRBAŞLAR HESABI..	7.157.175,80.	8.631.941,60.	10.682.048,45
2-25-257...BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-338.851.428,73.	-389.140.147,98.	-439.975.804,09
2-25-258...YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HES	197.036.201,13.	167.710.851,01.	318.895.487,25
2-25-259...YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	3.025.000,00
2-26-0...MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR.	400.624,56.	2.305.916,39.	1.915.866,13
2-26-260...HAKLAR HESABI..	10.720.263,84.	14.804.686,99.	18.972.973,98
2-26-268...BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-10.319.639,28.	-12.498.770,60.	-17.057.107,85
AKTİF TOPLAMI	1.563.911.116,50	1.668.594.606,35	1.832.533.221,42


Buski Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Bilançosu

PASİF (Kaynaklar)	2012	2013	2014
3-0-0...KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.	116.348.738,64.	143.307.628,04.	229.068.920,90
3-31-0...KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR.	15.856.675,20.	20.039.541,60.	19.547.754,08
3-31 -310...CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ B....	15.856.675,20.	20.039.541,60.	19.547.754,08
3-32-0...FAALİYET BORÇLARI.	21.888.927^6.	24.661.82127.	36.176.030,68
3-32-320...BÜTÇE EMANETLERİ HESABI..	21.888.927,36.	24.661.821,27.	36.176.030,68
3-33-0...EMANET YABANCI KAYNAKLAR	62.047.849,18.	66.430.994,96.	137.530.417,88
3-33-330...ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	48.466.915,95.	57.322.210,41.	68.657.082,09
3-33-333...EMANETLER HESABI..	13.580.933,23.	9.108.784,55.	68.873.335,79
3-36-0...ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER.	5.971.845,78.	18.678272,06.	13.752.295,87
3-36-360...ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESAB....	2.602.109,83.	2.446.954,74.	3.939.376,20
3-36-361 ...ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİN....	611.805,10.	676.523,25.	961.037,47
3-36-362...FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELE....	2.757.930,85.	15.284.982,57.	8.532.581,35
3-36-363...KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI..	0,00.	269.811,50.	319.300,85
3-37-0...BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI.	8.198.169,56.	10.834.068,55.	19.803.836,18
3-37-372...KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESA....	5.476.187,50.	6.876.440,00.	15.267.808,75
3-37-379...DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLAR....	2.721.982,06.	3.957.628,55.	4.536.027,43
3-38-0...GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE....	2385271,56.	2.662.929,60.	2.258.586,21
3-38-381 ...GİDER TAHAKKUKLARI HESABI..	2.385.271,56.	2.662.929,60.	2.258.586,21
4-0-0...UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.	317.165.658,09.	321.070.986,50.	408.611.444,98
4-40-0...UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR.	0,00.	1.900.051,81.	83.377.058,67
4-40-400...UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0,00.	0,00.	80.903.880,40
4-40-403...KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	0,00.	1.900.051,81.	2.473.178,27
4-41-0...UZUN VADELİ DIŞ MAU BORÇLAR	107.467.415,18.	112.760.370,72.	87.638.290,24
4-41 -410...DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI..	107.467.415,18.	112.760.370,72.	87.638.290,24
4-47-0...BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI.	195.397.37927.	191269.738,30.	222.393.987,17
4-47-472...KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESA....	19.639.173,00.	18.229.442,44.	43.408.400,49
4-47-479...DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLAR....	175.758.206,27.	173.040.295,86.	178.985.586,68
4-48-0...GELECEK YILLARA AİT GELİRLER V....	14.300.863,64.	15.140.825,67.	15.202.108,90
4-48-481 ...GİDER TAHAKKUKLARI HESABI..	14.300.863,64.	15.140.825,67.	15.202.108,90
5-0-0...ÖZ KAYNAKLAR.	1.130.396.719,77.	1.204.215.991,81.	1.194.852.855,54
5-50-0...NET DEĞER	313.821.934,64.	313.821.934,64.	347.158.569,62
5-50-500...NET DEĞER HESABI..	313.821.934,64.	313.821.934,64.	347.158.569,62
5-52-0... YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI.	379252.092,70.	379223.750,90.	379.046.087,93
5-52-522...YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HES....	379.252.092,70.	379.223.750,90.	379.046.087,93
5-57-0...GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET....	314.855.631,79.	437.322.692,43.	353.337.807,94
5-57-570...GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	314.855.631,79.	437.322.692,43.	353.337.807,94
5-59-0...DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI.	122.467.060,64.	73.847.613,84.	115.310.390,05
5-59-590...DÖNEM OLUMLU FALİYET SONUCU.	122.467.060,64.	73.847.613,84.	115.310.390,05
PASİF TOPLAMI	1.563.911.116,50	1.668.594.606,35	1.832.533.221,42

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşme Tablosu

GELİR BÜTÇESİ	BÜTÇE TUTARI (A)	GERÇEKLEŞME (B)	KALAN (C=A-B)	ORAN % (B/A)	GİDER BÜTÇESİ	BAŞLANGIÇ BÜTÇE TUTARI	AKTARMA SONRASI BÜTÇE TUTARI (D)	GERÇEKLEŞME (E)	KALAN (F=D-E)	ORAN % (E/D)
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.	420.000.000,00	430.973.219,94	-10.973.219,94	103	Personel Giderleri	63.080.893,00	57.722.298,94	55.638.103,98	2.084.194,96	96
Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler	-	6.389.810,05	-6.389.810,05	-	S.G.K. D. Prim. Giderleri	9.905.107,00	10.308.533,90	9.764.969,62	543.564,28	95
Diğer Gelirler	105.500.000,00	77.163.645,35	28.336.354,65	73	Mal Ve Hiz. A. Giderleri	146.365.000,00	156.562.648,70	152.790.857,66	3.771.791,04	98
Sermaye Gelirleri	1.500.000,00	1.009.954,37	490.045,63	67	Faiz Giderleri	7.100.000,00	4.935.688,64	3.803.258,46	1.132.430,18	77
GELİR BÜTÇESİ	527.000.000,00	515.536.629,71	11.463.370,29	98	Cari Transferler	4.500.000,00	4.345.182,75	4.345.182,75	0,00	100
AÇIK-FAZLA	62.463.000,00	36.944.338,64	25.518.661,36	59	Sermaye Giderleri	332.162.000,00	355.588.647,07	352.566.729,32	3.021.917,75	99
Bankalar	17.525.000,00	13.106.465,71	4.418.543,29	75	Yedek Ödenek	26.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İç Borçlanma	32.162.000,00	52.779.008,62	-20.617.088,62	164	GİDER BÜTÇESİ	589.463.000,00	589.463.000,00	578.909.101,79	10.553.898,21	98
İç Borç Geri Ödeme	-4.319.000,00	-10.475.975,39	6.156.975,39	243						
Dış Borçlanma	34.125.000,00	765.216,70	33.359.783,30	2						
Dış Borç Geri Ödeme	-17.300.000,00	-19.230.448,00	2.200.448,00	113						
TOPLAM	589.463.000,00	552.480.968,35	36.982.031,65	94						

Gelir Bütçesinin Gelir Türlerine Göre Dağılımı




A.3 - Mali Denetim Sonuçları

2014 yılında Avrupa Yatırım Bankası'ndan alınan kredi sözleşmesi gereği her yıl Mayıs - Haziran aylarında Uluslararası Denetim Firması tarafından bir önceki yıla ait mali kayıtlar denetlenmekte olup 2013 yılı kayıtları denetlenmiştir.

2014 yılı Temmuz ayı içinde Sayıştay Başkanlığı Denetçileri tarafından kurumumuzda denetim yapılmıştır.

Gerçekleşen Gider Bütçesinin Gider Türlerine Göre Dağılımı

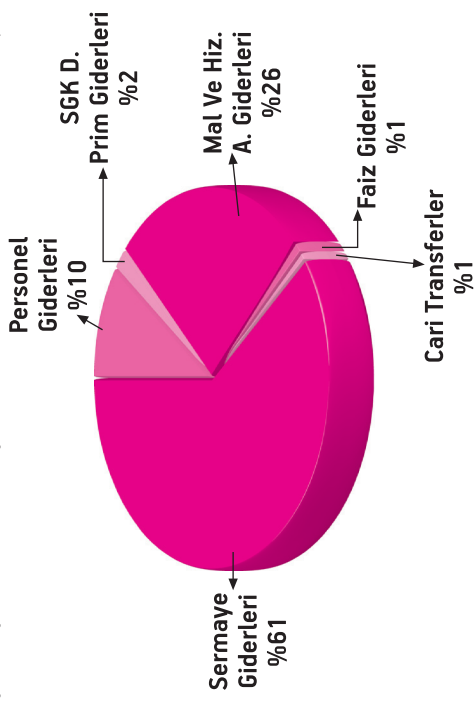

B. Performans Bilgileri

B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

İşin Adı	: Ayvalı Derenin Minareliçavuş-Özlüce Geçiş Köprüsü ile Nilüfer Deresi Arası Bölümünün Dere Islah Uygulama Projesinin Hazırlanması İş		
Sözleşme Bedeli	:	44.500,00 TL	
Çalışma Yapılan İlçe	:	Nilüfer	
Gerçekleşme Düzeyi	:	%100	
İşin Tamamlanma Tarihi	:	22.05.2014	

İşin Adı	: Nilüfer Çayı ile Yan Derelerinin Yerleşim Yerleri ile Arazilerinin Taşkından Korunması Master Plan Raporu ve Aplikasyona Dayalı Uygulama Projelerinin ve İnşaat İhale Dosyalarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı İş		
Sözleşme Bedeli	:	3.300.000,00 TL (KDV Hariç)	
Çalışma Yapılan İlçe	:	Nilüfer	
Gerçekleşme Düzeyi	:	Devam ediyor.	
İşin Tamamlanma Tarihi	:	18.11.2016	

İşin Adı	: Bursa Nilüfer Deresi Odunluk Mevkiinde Uluslar arası standartlarda Kano Yarış Parkuru Projelerinin Hazırlanması İş		
Sözleşme Bedeli	:	120.800,00 TL	
Çalışma Yapılan İlçe	:	Osmangazi-Nilüfer	
Gerçekleşme Düzeyi	:	%100	
İşin Tamamlanma Tarihi	:	06.07.2014	

İşin Adı	: Çınarcık Barajı Su Alma Branşmanı-DC4-6 Su Deposu Arası İsale Hattı Uygulama Projesi Yapılması İçin İhale Dokümanlarının Hazırlanması İş		
Sözleşme Bedeli	:	34.500,00 TL	
Çalışma Yapılan İlçe	:	Nilüfer	
Gerçekleşme Düzeyi	:	%100	
İşin Tamamlanma Tarihi	:	25.07.2014	

İşin Adı : Dağyenice Termal Turizm Merkezi İçmesuyu İsale ve Terfi Hattı Uygulama Projelerinin Hazırlanması İş

Sözleşme Bedeli : 42.300,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osangazi

Gerçekleşme Düzeyi : %100

İşin Tamamlanma Tarihi : 16.06.2014



İsale Hattı Projesi


İşin Adı : Bursa İli Gemlik İlçesi 2 (İki) Noktada Yüze Çıkan Suların Yerlerinin Tespiti (Zemin Sondajı ve Jeofizik Rezistivite Yöntemiyle) 1/1000 Ölçekli Haritalara AutoCAD - NetCAD Ortamında Aktarılması Hidrojeolojik ve Jeofizik Raporların Hazırlanması İş

Sözleşme Bedeli : 12.900,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Gemlik

Gerçekleşme Düzeyi : %100

İşin Tamamlanma Tarihi : 07.07.2014

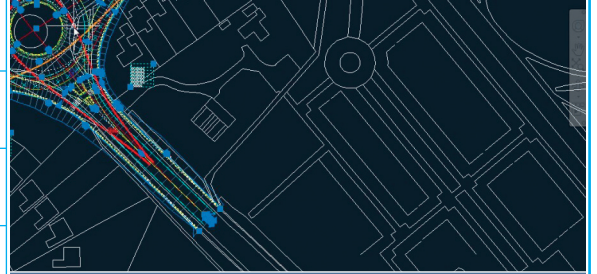

Altyapı Bakım Onarım Yapım İş

İşin Adı : Bursa İli Muhtelif İlçelerde Su Sondajı ve Hidrojeolojik Etüt Yapılması Yapım İş

Sözleşme Bedeli : 638.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Bursa İli Sınırları -Muhtelif İlçe ve Köyler

Gerçekleşme Düzeyi : % 30

İşin Tamamlanma Tarihi : 31.08.2016



Sondaj Makinası

İşin Adı : Bursa Atıksu Projesi II İşin Teknik Destek ve Müşavirlik Hizmetleri (Sözleşme No: KMH-2011/1A)

Sözleşme Bedeli : 9.876.166,95 TL + 150.000 Euro
(Şartlı Bütçe)

Çalışma Yapılan İlçe : Osangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu,
Kestel, Gemlik, Mudanya

Gerçekleşme Düzeyi : % 65

İşin Tamamlanma Tarihi : 17/05/2015



Arıtma Tesisi

İşin Adı : Uluabat Gölü-Marmara Denizi Arası Dere Islahı ve Taşkın Önleme Projesi Hazırlanması İşİ

Sözleşme Bedeli : 1.490.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Karacabey

Gerçekleşme Düzeyi : % 40

İşin Tam. Tarihi : 17.12.2014



Dere Islahı

İşin Adı : 5 Adet HES Tesisi Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması İşİ

Sözleşme Bedeli : 42.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Kestel, İnegöl, Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 100

İşin Tamamlanma Tarihi : 04.04.2014



Hes İnşaatı

İşin Adı : Tarihi Çeşmelerin Bakım ve Onarımının Yapılması İşİ

Sözleşme Bedeli : 289.000,00 TL +(%20 İş Artışı)

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif yerler

Gerçekleşme Düzeyi : % 100

İşin Tamamlanma Tarihi : 25.09.2014



Onarılan Beşir Ağa Çeşmesi - Fatma Hanım Çeşmesi

İşin Adı : Muhtelif Hizmet Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının Yaptırılması İşİ

Sözleşme Bedeli : 3.351.508,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif Yerler

Gerçekleşme Düzeyi : % 80

İşin Tamamlanma Tarihi : 21.02.2015



Eğitim Tahsilat Şubesi Düzenlemesi

İşin Adı : Kestel ve Mudanya Hizmet Binaları İnşaatı Yapımı İşi

Sözleşme Bedeli : 2.275.750,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif Yerler

Gerçekleşme Düzeyi : % 80

İşin Tamamlanma Tarihi : 20.03.2015



Kestel Hizmet Binası İnşaatı

İşin Adı : 2014-1 Muhtelif Hizmet Tesislerinin Bakım Onarımlarının Yaptırılması İşi

Sözleşme Bedeli : 2.193.000 ,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 10

İşin Tamamlanma Tarihi : 03.09.2016



BUSKİ Abone İşleri Binası Çatı Onarımı

İşin Adı : Nilüfer Çayı İle Yan Derelerinin Yerleşim Yerleri İle Arazilerinin Taşkından Koruması Master Plan Rap. ve Apl. Dayalı Uyg. Proj. ve İnş. İhale Dos. Haz. Dan. Hiz. Alm. İş.

Sözleşme Bedeli : 3.300.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 10

İşin Tamamlanma Tarihi : 18.11.2016



Nilüfer Çayı

SU BURSA'DA ÇEŞMEDEN İÇİLİR

Çeşmeden içilen su
sağlıklı, güvenli ve
daha ekonomiktir...



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ

www.buski.gov.tr



İşletmeler Dairesi Başkanlığı**İşin Adı : 2014/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ**

Sözleşme Bedeli : 2.796.075,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 20,14

İşin Tamamlanma Tarihi : 24.06.2016



Acil Kanal Yapım İşİ

İşin Adı : 2014/2 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 2.902.797,65tl

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 28,88

İşin Tamamlanma Tarihi : 09.06.2016



Acil Kanal Yapım İşİ

İşin Adı : 2014/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 2.812.870,90 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Yıldırım

Gerçekleşme Düzeyi : % 27,23

İşin Tamamlanma Tarihi : 26.08.2016



Acil Kanal Yapım İşİ

İşin Adı : 2014/2 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 3.130.155,60 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Yıldırım

Gerçekleşme Düzeyi : % 11,62

İşin Tamamlanma Tarihi : 26.08.2016



Acil Kanal Yapım İşİ

İşin Adı : 2013/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 1.749.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Yıldırım

Gerçekleşme Düzeyi : % 113,55

İşin Tamamlanma Tarihi : 22.08.2016



Acil Kanal Yapım İşİ

İşin Adı : 2014/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 2.629.014,40 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 11,56

İşin Tamamlanma Tarihi : 24.09.2016



Acil Kanal Yapım İşİ

İşin Adı : 2014/1 Gemlik Kanal Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 2,073,880.00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Gemlik

Gerçekleşme Düzeyi : % 49,88

İşin Tamamlanma Tarihi : 16.06.2016



Kanal Yapım İşİ

İşin Adı : 2014 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 3.701.597,40 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Mudanya

Gerçekleşme Düzeyi : % 26,64

İşin Tamamlanma Tarihi : 17.06.2016



Altyapı Bakım Onarım İnşaatı Yapım İşİ

İşin Adı : 2014/1 Görükle Acil Kanal Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 2.006.700,50 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Kayapa

Gerçekleşme Düzeyi : % 53,64

İşin Tamamlanma Tarihi : 07.06.2016



Acil Kanal Yapım İşİ

İşin Adı : 2014/1 Kestel Ve Gürsu İlçeleri Acil Kanal Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 1.682.475,68 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Kestel, Gürsu

Gerçekleşme Düzeyi : % 52,36

İşin Tamamlanma Tarihi : 17.06.2016



Acil Kanal Yapım İşİ

İşin Adı : Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçelerinde İçmesuyu Arızaları Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 1.949.275,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 39,89

İşin Tamamlanma Tarihi : 13.11.2015



İçme Suyu Arızaları Yapım İşİ

İşin Adı : 2013/1 Buski Merkez İçmesuyu Evsel Bağlantı Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 757.437,50 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi, Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 93,08

İşin Tamamlanma Tarihi : 27.07.2014



Evsel Bağlantı Çalışması


İşin Adı : 2014/1 Buski Merkez İçmesuyu Eysel Bağlantı İşİ

Sözleşme Bedeli : 1.559.608,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 3,65

İşin Tamamlanma Tarihi : 01.11.2016

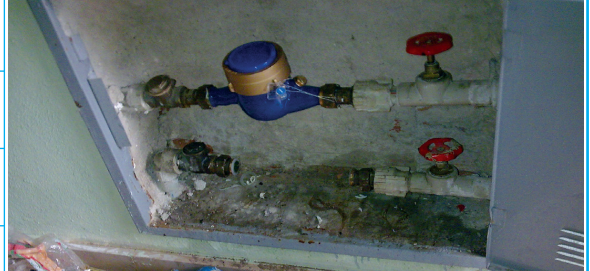

Eysel Bağlantı Çalışması

İşin Adı : 2012/1 Yıldırım, Kestel, Gürsu, Gemlik İlçelerinin Merkez Ve Köylerinde Asfalt Yapımı Ve Onarımı İşİ

Sözleşme Bedeli : 27.227.900,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Yıldırım, Kestel, Gürsu, Gemlik

Gerçekleşme Düzeyi : % 107,14

İşin Tamamlanma Tarihi : 17.03.2015



Asfalt Çalışması

İşin Adı : Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhanlı, Büyükorhan, Harmancık, Keles İlçe Sınırları Dahilinde Asfalt Yapımı Ve Onarımı

Sözleşme Bedeli : 29.979.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, M.K.Paşa, B.Orhan, Harmancık, Keles

Gerçekleşme Düzeyi : % 23,88

İşin Tamamlanma Tarihi : 16.09.2016



Asfalt Çalışması

İşin Adı : 2013/1 Buski Merkez Atıksu Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi Ve Temizlenmesi Hizmet Alımı İşİ.

Sözleşme Bedeli : 978.855,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 58,40

İşin Tamamlanma Tarihi : 28.04.2015



Yağmursuyu Hatları Görüntüleme ve Temizleme

İşin Adı : 2013/1 Nilüfer Ve Doğancı Su Alma Havzasındaki Köylerdeki Atıksu Depolarının Vidanjörle Çekilmesi Hizmet Alım İş

Sözleşme Bedeli : 1.093.750,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 96,19

İşin Tamamlanma Tarihi : 15.12.2014



Vidanjörle Temizlik Çalışması

İşin Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Köylerde Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İş

Sözleşme Bedeli : 2.540.430,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Mücavir Alan Sınırlarındaki Köyler

Gerçekleşme Düzeyi : % 106,11

İşin Tamamlanma Tarihi : 15.08.2014



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2014/1 Orhangazi, İznik İlçe Ve Köylerinde Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İş

Sözleşme Bedeli : 929.197,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : İznik, Orhanhaneli

Gerçekleşme Düzeyi : % 81,53

İşin Tamamlanma Tarihi : 25.05.2015



Altyapı Bakım Onarım Çalışması

İşin Adı : 2014/1 Keles, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık İlçe Ve Köylerinde Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İş

İşin Sözleşme Bedeli : 1.020.025,60 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Keles, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık

Gerçekleşme Düzeyi : % 119,34

İşin Tamamlanma Tarihi : 29.05.2015



Altyapı Bakım Onarım Çalışması

İşin Adı : 2013/1 Buski Merkez Kanalizasyon, Evsel Bağlantıları İle Yağmursuyu Izgarası Ve Bağlantıları Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 1.819.900,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 116,17

İşin Tamamlanma Tarihi : 05.09.2014



Izgara Ve Bağlantılarının Yapılması Çalışması

İşin Adı : 2014/1 Yıldırım İlçesi Kan. Ve Yağ. Hattı Arızası Onarımı, Kan. Ve Yağ. Evsel Bağlantı Yap., Yağ. Izgara Yap., Kan. Ve Yağ. Kap. İle Izg. Yüks. Ve Alç. Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 1.488.290,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Yıldırım

Gerçekleşme Düzeyi : % 15,72

İşin Tamamlanma Tarihi : 04.12.2015



Kapak Yükseltme Çalışması

İşin Adı : 2012/1 Yıldırım, Kestel, Gürsu, Gemlik İlçelerinin Merkez Ve Köylerinde Asfalt Yapımı Ve Onarımı İşİ

Sözleşme Bedeli : 27.227.900,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Yıldırım, Kestel, Gürsu, Gemlik

Gerçekleşme Düzeyi : % 93,08

İşin Tamamlanma Tarihi : 22.10.2014



Asfalt Yapım Bakım Onarım Çalışması

İşin Adı : 2013/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 855.285,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 111,38

İşin Tamamlanma Tarihi : 02.06.2014



Acil Kanal Yapım İşİ

İşin Adı : 2012 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı Yapım İşi

Sözleşme Bedeli : 1.856.671,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Mudanya

Gerçekleşme Düzeyi : % 111,48

İşin Tamamlanma Tarihi : 15.05.2014



Altyapı Bakım Onarım Çalışması

İşin Adı : 2012/1 Kayapa Altyapı Bakım Onarım İnşaatı Yapım İşi

Sözleşme Bedeli : 1.291.136,50 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Kayapa, Görükle

Gerçekleşme Düzeyi : % 119,33

İşin Tamamlanma Tarihi : 06.08.2014



Altyapı Bakım Onarım Çalışması

İşin Adı : 2013/1 Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi

Sözleşme Bedeli : 1.267.820,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Gemlik

Gerçekleşme Düzeyi : % 116,50

İşin Tamamlanma Tarihi : 01.09.2014



Altyapı Bakım Onarım Çalışması


İşin Adı : 2013/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi

Sözleşme Bedeli : 1.628.996,80 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 99,32

İşin Tamamlanma Tarihi : 11.08.2014

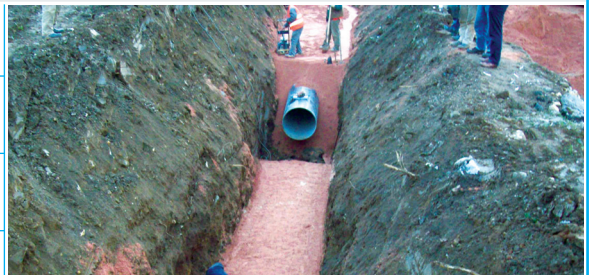

Acil Kanal Yapım Çalışması

İşin Adı : 2014/1 İnegöl, Yenişehir İlçe Ve Köylerinde Altyapı Bakım Onarım İşİ

Sözleşme Bedeli : 887.908,50 TL

Çalışma Yapılan İlçe : İnegöl, Yenişehir

Gerçekleşme Düzeyi : % 47,98

İşin Tamamlanma Tarihi : 29.05.2014



Altyapı Bakım Onarım Çalışması

İşin Adı : 2014/1 Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçe Ve Köylerinde Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşİ

Sözleşme Bedeli : 956.064,80 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Mustafakemalpaşa, Karacabey

Gerçekleşme Düzeyi : % 43,03

İşin Tamamlanma Tarihi : 29.05.2015



Altyapı Bakım Onarım Çalışması

İşin Adı : Orhaneli Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı Yapım İşİ

İşin Sözleşme Bedeli : 955.372,26 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Orhaneli

Gerçekleşme Düzeyi : % 87,63

İşin Tamamlanma Tarihi : 05.12.2014



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

İşin Adı	: 2012/1A Muh. Mah. İçmesuyu Şeb. Reh. Ve Yeni Şebeke İnş.	
Sözleşme Bedeli	: 1.935.000,00 TL	
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif	
Gerçekleşme Düzeyi	: % 116,16	
İşin Tamamlanma Tarihi	: 04/05/2014	

İçmesuyu Şebeke İnşaatı Çalışması

İşin Adı	: 2012/3 Muh. Mah. İçmesuyu Şeb. Reh. Ve Yeni Şebeke İnş.	
Sözleşme Bedeli	: 2.079.369,50 TL	
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif	
Gerçekleşme Düzeyi	: % 116,16	
İşin Tamamlanma Tarihi	: 06/08/2014	

İçmesuyu Şebeke İnşaatı Çalışması

İşin Adı	: 2013/1 Muh. Mah. İçmesuyu Şeb. Reh. Ve Yeni Şeb. İnş.	
Sözleşme Bedeli	: 2.063.663,17 TL	
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif	
Gerçekleşme Düzeyi	: % 117,10	
İşin Tamamlanma Tarihi	: 19/08/2014	

İçmesuyu Şebeke İnşaatı Çalışması

İşin Adı	: 2013/3 Muh. Mah. İçmesuyu Şeb. Reh. Ve Yeni Şeb. İnş. İşi (Kestel, Gürsu ve Gemlik Köyler)	
Sözleşme Bedeli	: 1.665.061,72 TL	
Çalışma Yapılan İlçe	: Kestel, Gürsu ve Gemlik	
Gerçekleşme Düzeyi	: % 117,76	
İşin Tamamlanma Tarihi	: 06/11/2014	

İçmesuyu Şebeke İnşaatı Çalışması

İşin Adı : 2014/1 Muh. Mah. İçmesuyu Şeb. Reh. Ve Yeni Şeb. İnş. İş

Sözleşme Bedeli : 1.971.925,97 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 62,97

İşin Tamamlanma Tarihi : 18/09/2015



İçmesuyu Şebeke İnşaatı Çalışması

İşin Adı : 2014/2 Muh. Mah. İçmesuyu Şeb. Reh. Ve Yeni Şeb. İnş.İşi. (Elle Kazı)

Sözleşme Bedeli : 695.020,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 93,86

İşin Tamamlanma Tarihi : 14/02/2015



İçmesuyu Şebeke İnşaatı Çalışması

İşin Adı : 2013/1 Muh. Mah. Abone Talepleri İnş. İş

Sözleşme Bedeli : 645.007,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 88,15

İşin Tamamlanma Tarihi : 14/08/2014



Abone Talepleri Çalışması

İşin Adı : 2014/1 Muh. Mah. Abone Talepleri İnş. İş

Sözleşme Bedeli : 916.155,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 3,94

İşin Tamamlanma Tarihi : 30/10/2015



Abone Talepleri Çalışması

İşin Adı : 2012/1 Muh. Mah. İsale Hattı Yapılması Ve Deplase İnş İşi

Sözleşme Bedeli : 1.689.040,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 114,14

İşin Tamamlanma Tarihi : 28/01/2014



İsale Hattı Çalışması

İşin Adı : 2014/1 İçmesuyu Ana İletim Hatlarında Karayollarının Delerek Yatay Delgi Yapım İşi

Sözleşme Bedeli : 521.010,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 96,50

İşin Tamamlanma Tarihi : 02/03/2015



Yatay Delgi Çalışması

İşin Adı : 2013/1 Muh. Mah. İsale Hattı Yapımı Ve Deplase İnş. İşi

Sözleşme Bedeli : 1.483.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 94,65

İşin Tamamlanma Tarihi : 06/11/2014



İsale Hattı Çalışması

İşin Adı : 2012/2 Muh. Mah. İsale Hattı Yapımı Ve Deplase İnş. İşi

Sözleşme Bedeli : 2.571.800,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 99,54

İşin Tamamlanma Tarihi : 11/08/2014



İsale Hattı Çalışması

İşin Adı : 2013/2 Muh. Mah. İsale Hattı Yapımı Ve Deplase İnş. İşi

Sözleşme Bedeli : 1.924.802,70 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 85,88

İşin Tamamlanma Tarihi : 14/08/2015



İsale Hattı Çalışması

İşin Adı : 2014/1 Muh. Mah. İsale Hattı Yapımı ve Deplase İnş. İşi

Sözleşme Bedeli : 2.567.420,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 80,09

İşin Tamamlanma Tarihi : 07/02/2016



İsale Hattı Çalışması

İşin Adı : 2014/4 Muh. Mah. İsale Hatları Yapım İşi(Çınarcık Barajı Muh. Mah.)

Sözleşme Bedeli : 2.249.101,66 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Çınarcık Barajı

Gerçekleşme Düzeyi : % 20,02

İşin Tamamlanma Tarihi : 23/03/2016



İsale Hattı Çalışması

İşin Adı : 2014/1 Muh. Köylere Su Depoları İnş. Yapım İşi

Sözleşme Bedeli : 1.850.725,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 48,34

İşin Tamamlanma Tarihi : 09/10/2015



Depo İnşaatı İşi

İşin Adı	: D9-1 20.000 m. Su Depo Ve Pompa İst. – D12-3 10.000 m. Ve D18 5.000 m. Rezerv İçmesuyu Depo İnş. İşi
Sözleşme Bedeli	: 4.559.950,90 TL
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	: % 105,15
İşin Tamamlanma Tarihi	: 20/05/2015



Depo İnşaatı İşi

İşin Adı : 2013/1 Köy Su Deposu İnş. İşi

Sözleşme Bedeli	: 1.900.320,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	: % 115,89
İşin Tamamlanma Tarihi	: 15/10/2014



Depo İnşaatı İşi

İşin Adı : 2014/1 Pınar Kaynaklarının Islahı İnş. Yapım İşi (Uludağ Oteller Bölgesi Depo Terfi İstasyonu)

Sözleşme Bedeli	: 4.041.696,09 TL
Çalışma Yapılan İlçe	: Uludağ
Gerçekleşme Düzeyi	: % 107,39
İşin Tamamlanma Tarihi	: 02/10/2015



Pınar Kaynağı Islah Çalışması

İşin Adı : 2013/1 Pınar Kaynaklarının Islahı İnş. Yapım İşi

Sözleşme Bedeli	: 1.727.533,04 TL
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	: % 108,11
İşin Tamamlanma Tarihi	: 09/09/2015



Pınar Kaynağı Islah Çalışması

İşin Adı : 2012/1 Pınar Kaynaklarının Islahı İnş. (Uludağ Oteller Bölgesi) Yapım İş

Sözleşme Bedeli : 3.279.705,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Uludağ

Gerçekleşme Düzeyi : % 117,75

İşin Tamamlanma Tarihi : 27/03/2014



Pınar Kaynakları Islahı Çalışması

İşin Adı : 2014/2 Pınar Kaynaklarının Islahı İnş. Yapım İş

Sözleşme Bedeli : 2.392.612,80 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 25,54

İşin Tamamlanma Tarihi : 16/01/2015



Pınar Kaynakları Islahı Çalışması

İşin Adı : 2012/2 Muh. Su Depoları İnş. Yapım İş

Sözleşme Bedeli : 2.846.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 112,17

İşin Tamamlanma Tarihi : 16/01/2014



Su Deposu İnşaatı

İşin Adı : 2012/1A Muh. Su Depoları Ve Pompa İstasyonu İnş. Yapım İş

Sözleşme Bedeli : 3.592.300,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 118,52

İşin Tamamlanma Tarihi : 31/07/2014



Su Deposu İnşaatı

İşin Adı	: Muh. Debi Ölçer Odaları VE Bağ. İle Muh. Mah. İsale/ŞEb. Hat. Dep. İnş. İşi	
Sözleşme Bedeli	: 698.985,00 TL	
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif	
Gerçekleşme Düzeyi	: % 86,87	
İşin Tamamlanma Tarihi	: 10/09/2014	

Debiölçer Odası İnşaatı

İşin Adı	: 2012/1 Muh. Köylere Su Depoları İnş. İşi	
Sözleşme Bedeli	: 1.629.964,00 TL	
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif	
Gerçekleşme Düzeyi	: % 115,17	
İşin Tamamlanma Tarihi	: 22/02/2014	

Su Deposu İnşaatı

İşin Adı	: 2012/2 Muh. Köylere Su Depoları İnş. İşi	
Sözleşme Bedeli	: 1.383.155,00 TL	
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif	
Gerçekleşme Düzeyi	: % 119,32	
İşin Tamamlanma Tarihi	: 15/01/2014	

Altyapı Bakım Onarım Yapım İşi

İşin Adı	: 2013/1 Muh. Su Depoları İnş. Yapım İşi	
Sözleşme Bedeli	: 4.159.755,00 TL	
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif	
Gerçekleşme Düzeyi	: % 109,01	
İşin Tamamlanma Tarihi	: 27/11/2014	

Su Deposu İnşaatı

İşin Adı : 2013/2 Muh. Köylere Su Depoları İnş. Yapım İş

Sözleşme Bedeli : 1.912.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 51,10

İşin Tamamlanma Tarihi : 24/12/2014



Altyapı Bakım Onarım Yapım İş

İşin Adı : Orhangazi Belediyesi İçmesuyu İnş. İş

Sözleşme Bedeli : 6.397.544,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Orhangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 91,72

İşin Tamamlanma Tarihi : 09/03/2015



Altyapı Bakım Onarım Yapım İş

İşin Adı : Orhaneli Keles B.Orhan Harmancık Muh. Mah. İçmesuyu Şeb. Ve İsale Hattı İnş. Yapım İş

Sözleşme Bedeli : 2.873.646,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Orhaneli, Keles, B.Orhan, Harmancık

Gerçekleşme Düzeyi : % 42,32

İşin Tamamlanma Tarihi : 05/03/2016



İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı İnşaatı

İşin Adı : M.Kemalpaşa, Karacabey Muh. Mah. İçmesuyu Şeb. Ve İsale Hattı İnş. Yapım İş

Sözleşme Bedeli : 1.902.286,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : M.Kemalpaşa, Karacabey

Gerçekleşme Düzeyi : % 17,20

İşin Tamamlanma Tarihi : 29/02/2016



İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı İnşaatı

İşin Adı	: İznik, Orhangazi Muh. Mah. İçmesuyu Şeb. Ve İsale Hattı Yapım İşİ
Sözleşme Bedeli	: 2.367.337,09 TL
Çalışma Yapılan İlçe	: İznik, Orhangazi
Gerçekleşme Düzeyi	: % 11,62
İşin Tamamlanma Tarihi	: 10/03/2016



İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Çalışması

İşin Adı	: İnegöl, Yenişehir Muh. Mah. İçmesuyu Şeb. Ve İsale Hattı İnş. Yapım İşİ
Sözleşme Bedeli	: 1.909.088,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	: İnegöl, Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	: % 12,04
İşin Tamamlanma Tarihi	: 04/03/2016



İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Çalışması


Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı**İşin Adı** : 2010_08_Mudanya İlç. Mah. ve Köyler Yağ. ve Kan. Şeb. İnş. Yap. İşi

Sözleşme Bedeli : 2.994.987,90 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Mudanya

Gerçekleşme Düzeyi : % 116,83

İşin Tamamlanma Tarihi : 05.05.2014

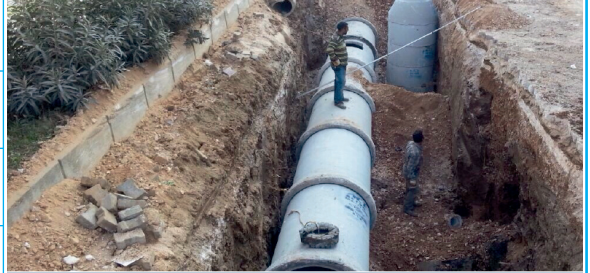

Kanalizasyon Yapım İşi

İşin Adı : 2011_15_Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Elle Kazım Yapım İşi

Sözleşme Bedeli : 419.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 105,00

İşin Tamamlanma Tarihi : 31.08.2014



Altyapı Bakım Onarım Yapım İşi

İşin Adı : 2011_16_Muhtelif Yerlerde Betonarme Kutu Kesit ve Box Yapım İşi.

Sözleşme Bedeli : 4.187.370,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 113,47

İşin Tamamlanma Tarihi : 16.12.2014



Kutu Kesit ve Box Yapım İşi

İşin Adı : 2012_03_Nilüfer 3.Bölge Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 3.946.500,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 118,20

İşin Tamamlanma Tarihi : 10.07.2014



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2012_04_Osmangazi Kuzeyi Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 2.865.695,70 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 97,48

İşin Tamamlanma Tarihi : 24.07.2014



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2012_05_Osmangazi 3.Bölge Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 1.456.320,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 118,20

İşin Tamamlanma Tarihi : 10.04.2014



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2012_08_Osmangazi İlç. Demirtaş Bölgesi Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 1.668.275,30 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 119,99

İşin Tamamlanma Tarihi : 24.07.2014



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2012_09_Gemlik İlç. Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 3.393.701,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Gemlik

Gerçekleşme Düzeyi : % 115,05

İşin Tamamlanma Tarihi : 21.03.2016



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2013_01_Osmangazi İlç. Güneyi Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 1.585.230,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 119,80

İşin Tamamlanma Tarihi : 05.08.2014



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2013_02_Yıldırım Kuzeyi Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 1.989.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Yıldırım

Gerçekleşme Düzeyi : % 96,44

İşin Tamamlanma Tarihi : 05.08.2014



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2013_03_Nilüfer Kuzeyi Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 1.993.962,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 119,89

İşin Tamamlanma Tarihi : 10.10.2014



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2013_04_Nilüfer İlç. Güneyi Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 3.987.765,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 114,98

İşin Tamamlanma Tarihi : 08.10.2014



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı


İşin Adı : 2013_05_Osmangazi İlç. Başaran Mah. Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 2.295.882,52 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 79,75

İşin Tamamlanma Tarihi : 11.04.2015

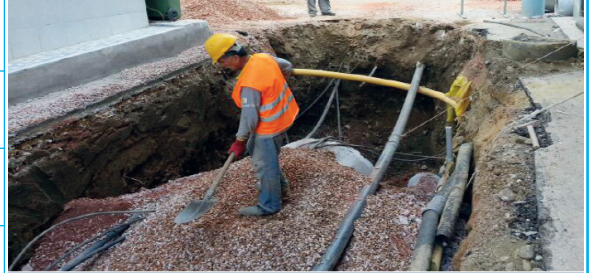

Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2013_06_Yıldırım İlç. Güneyi Mah. Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 1.601.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Yıldırım

Gerçekleşme Düzeyi : % 115,90

İşin Tamamlanma Tarihi : 13.01.2015



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2013_07_Nilüfer İlç. Kuzeyi Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 2.519.690,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 95,37

İşin Tamamlanma Tarihi : 03.06.2015



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2014_01_Osmangazi 1.Bölge Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 2.663.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 80,23

İşin Tamamlanma Tarihi : 13.10.2015



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2014_02_Osmangazi 2.Bölge Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 2.567.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 10,01

İşin Tamamlanma Tarihi : 05.01.2016



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2014_03_Osmangazi 3.Bölge Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 2.058.430,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 57,60

İşin Tamamlanma Tarihi : 21.12.2015



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2014_04_Osmangazi 4.Bölge Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 1.891.360,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 67,64

İşin Tamamlanma Tarihi : 24.04.2016



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2014_06_Nilüfer 2.Bölge Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 2.114.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 77,70

İşin Tamamlanma Tarihi : 16.06.2016



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2014_07_Kestel İlç. Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 2.684.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Kestel

Gerçekleşme Düzeyi : % 50,03

İşin Tamamlanma Tarihi : 01.03.2016



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2014_09_Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı

Sözleşme Bedeli : 4.079.340,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 1,46

İşin Tamamlanma Tarihi : 31.05.2016



Betonarme Kutu Kesit İnşaatı

İşin Adı : 2014_10_Osmangazi 5.Bölge Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 3.193.812,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 1,46

İşin Tamamlanma Tarihi : 30.12.2015



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : 2014_11_Nilüfer 3.Bölge Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 1.697.930,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 97,93

İşin Tamamlanma Tarihi : 16.06.2016



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı


İşin Adı : 2014_12_Yıldırım İlç. Güneyi Kan. ve Yağm. İnş.

Sözleşme Bedeli : 2.599.624,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Yıldırım

Gerçekleşme Düzeyi : % 8,07

İşin Tamamlanma Tarihi : 18.04.2016

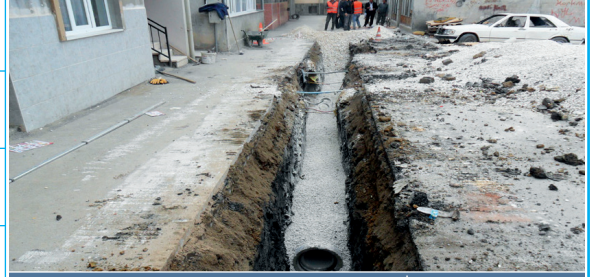

Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı


İşin Adı : A3.3.1_Samanlı Kolektörü Kan. ve Yağm. Drenajı Yapım İş.

Sözleşme Bedeli : 11.861.529,04 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Yıldırım, Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 117,89

İşin Tamamlanma Tarihi : 15.11.2014

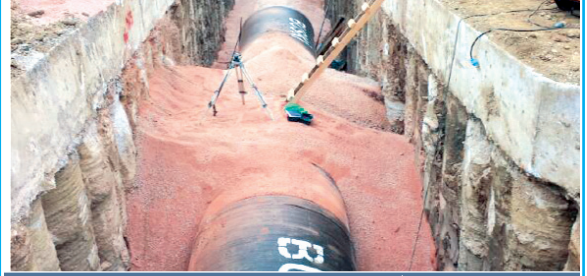

Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : A3.2_Gemlik Körfezi Yağm. ve Kan. Drenaj Yapım İşleri

Sözleşme Bedeli : 54.490.842,55 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Gemlik, Mudanya

Gerçekleşme Düzeyi : % 10,82

İşin Tamamlanma Tarihi : 29.07.2016



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : A3.3.2_Barakfakih ve Panayır Kan. ve Yağm. Kolektörleri Yapım İş

Sözleşme Bedeli : 33.224.328,38 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel

Gerçekleşme Düzeyi : % 69,07

İşin Tamamlanma Tarihi : 25.11.2015



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : Gemlik ve Mudanya İlçelerindeki Deresi Islahı Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 1.282.470,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Mudanya, Gemlik

Gerçekleşme Düzeyi : % 64,37

İşin Tamamlanma Tarihi : 20.01.2016



Dere Islahı

İşin Adı : Alman Kanalı Islahı Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 8.128.080,50 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 114,28

İşin Tamamlanma Tarihi : 10.05.2015



Dere Islahı

İşin Adı : Cilimboz Deresi Islahı Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 662.257,24 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 100

İşin Tamamlanma Tarihi : 12.06.2015



Dere Islahı

İşin Adı : Muhtelif Bölgelerde Yatay Delgi Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 1.978.499,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 119,95

İşin Tamamlanma Tarihi : 16.03.2014



Yatay Delgi İnşaatı

İşin Adı : İsmetiye Deresi Islahı Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 9.797.820,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmaniye

Gerçekleşme Düzeyi : % 44,28

İşin Tamamlanma Tarihi : 12.03.2018



Dere Islahı

İşin Adı : Mandıras Deresi Islahı Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 3.749.085,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Kestel

Gerçekleşme Düzeyi : % 13,80

İşin Tamamlanma Tarihi : 27.03.2016



Dere Islahı

İşin Adı : Nilüfer Deresi Hüdavendigar Kent Parkı Yanı Dere Düzenlemesi İşİ.

Sözleşme Bedeli : 2.866.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 119,95

İşin Tamamlanma Tarihi : 08.10.2014



Dere Islahı

İşin Adı : Hacivat Deresi Islahı Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 5.897.100,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Yıldırım

Gerçekleşme Düzeyi : % 98,48

İşin Tamamlanma Tarihi : 27.09.2014



Dere Islahı

İşin Adı : Gökdere Deresi Islahı Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 4.237.040,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Yıldırım

Gerçekleşme Düzeyi : % 109,97

İşin Tamamlanma Tarihi : 27.08.2014



Dere Islahı

İşin Adı : Gemlik Çarşı Deresi Islahı

Sözleşme Bedeli : 748.585,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Gemlik

Gerçekleşme Düzeyi : % 119,18

İşin Tamamlanma Tarihi : 08.06.2014



Dere Islahı

İşin Adı : Altınşehir DSİ Kurutma Kanalı Islahı

Sözleşme Bedeli : 1.715.550,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 83,77

İşin Tamamlanma Tarihi : 02.12.2014



Dere Islahı

İşin Adı : Orhangazi (Bursa) Kanalizasyon İnş.

Sözleşme Bedeli : 12.438.330,20 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Orhangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 86,06

İşin Tamamlanma Tarihi : 08.04.2015



Kanalizasyon Hattı İnşaatı


İşin Adı : Orhangazi (Bursa) Yağmursuyu İnş.

Sözleşme Bedeli : 7.049.405,50 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Orhangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 100

İşin Tamamlanma Tarihi : 28.04.2014

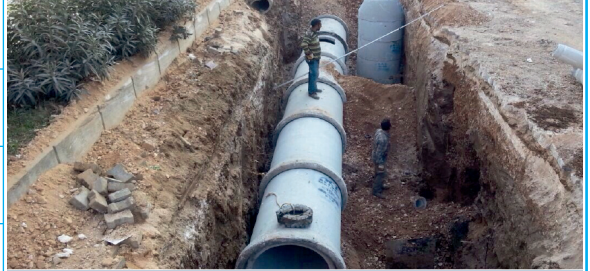

Yağmur Suyu Hattı İnşaatı

İşin Adı : İznik (Bursa) Kanalizasyon İnş.

Sözleşme Bedeli : 38.246.971,50 TL

Çalışma Yapılan İlçe : İznik

Gerçekleşme Düzeyi : % 79,73

İşin Tamamlanma Tarihi : 27.05.2014



Kanalizasyon Hattı İnşaatı

İşin Adı : Yenişehir (Bursa) Kanalizasyon İnş.

Sözleşme Bedeli : 32.690.515,70 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Yenişehir


Gerçekleşme Düzeyi : % 56,78

İşin Tamamlanma Tarihi : 03.10.2014




Kanalizasyon Hattı İnşaatı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

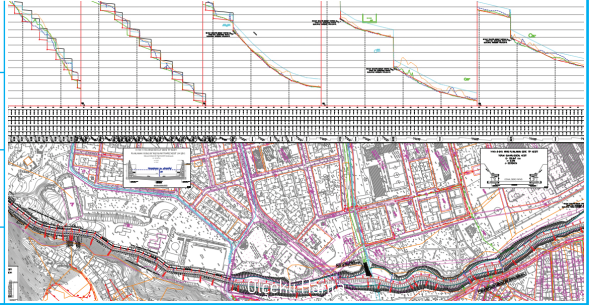İşin Adı	: Yaklaşık 1.200m km² içinde 1/1000 Ölç. Ortofoto Haritalar ile Yaklaşık 8500 km² Alan İçerisinde 1/1000 ve 1/5000 Ölç. Vektör Haritaların Üretimi (M5 Projesi)	
Sözleşme Bedeli	: 13.500.500,00 TL	
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif	
Gerçekleşme Düzeyi	: %9	
İşin Tamamlanma Tarihi	: 28.06.2017	

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

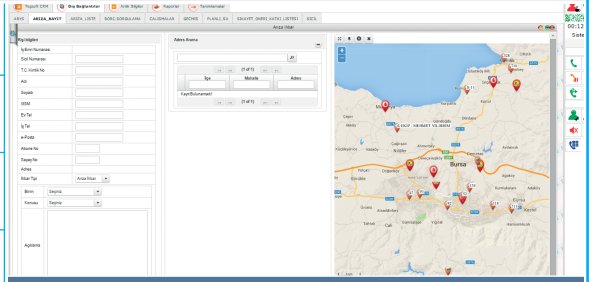İşin Adı	: Buski Çağrı ve Hizmet Merkezi, Mobil Ekip Yönetim Sistemi Satın Alınması İş.	
Sözleşme Bedeli	: 1.003.189,85 TL	
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif	
Gerçekleşme Düzeyi	: %100	
İşin Tamamlanma Tarihi	: 09.02.2015	

Çağrı Yönetim Programı Arayüzü

İşin Adı : Otomatik Vezne Sistemi Satın Alınması.

Sözleşme Bedeli	: 669.800,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	: % 100
İşin Tamamlanma Tarihi	: 10.01.2015



Otomatik Vezne Noktası

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı**İşin Adı : Endeks Okuma, İhbarname Dağıtılması, Açma-Kapama Hizmeti İşlemlerinin Yapılması (4 Ay)**

Sözleşme Bedeli : 3.714.512,40 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : %77

İşin Tamamlanma Tarihi : 22.11.2014



Su Sayacı


İşin Adı : Endeks Okuma, İhbarname Dağıtılması, Açma-Kapama Hizmeti İşlemlerinin Yapılması (18 Ay)

Sözleşme Bedeli : 8.477.369,64 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : %86

İşin Tamamlanma Tarihi : 21.07.2014

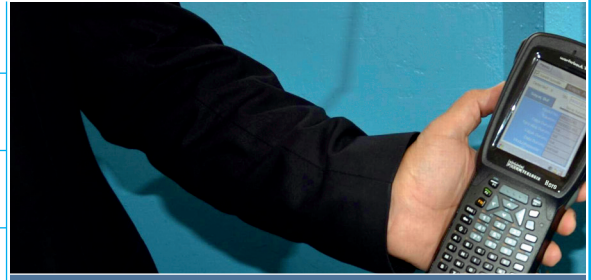

Endeks Okuma

İşin Adı : Endeks Okuma, İhbarname Bırakma, Kapama-Açma Hizmetleri Alımı İşi (24ay)

Sözleşme Bedeli : 22.283.040,40 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : %77

İşin Tamamlanma Tarihi : 22.11.2016



Su Sayacı

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı**İşin Adı : Büyükorhan Belediyesi İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı İş**

Sözleşme Bedeli : 554.473,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Büyükorhan

Gerçekleşme Düzeyi : % 79

İşin Tamamlanma Tarihi : 20/06/2014



Arıtma Tesisi

İşin Adı : Buski Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Depolama Alanı Koku Önleme Perdesi Yapım İş

Sözleşme Bedeli : 1.152.000,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Nilüfer

Gerçekleşme Düzeyi : % 109,25

İşin Tamamlanma Tarihi : 19/12/2013



Koku Perdesi

İşin Adı : Arıtma Klorlama Tamiri ve Yapım İş (73 Adet Dezenfeksiyon Klor Odası Yapım İş)

Sözleşme Bedeli : 585.270,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Kestel, Gürsu, Yıldırım, İnegöl,
Yenişehir, Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 118,09

İşin Tamamlanma Tarihi : 08.12.2014



Klor Odası

İşin Adı : İş Güvenliği Kapsamında Hareketsizlik Sensörleri ve İletişim Sisteminin Satın Alınması (Tuz Serpme Makinesi)

Sözleşme Bedeli : 11.250,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 100

İşin Tamamlanma Tarihi : 14/03/2014



Tuz Serpme Makinesi

İşin Adı : 4 Kalem Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi Alımı, Montajı ve 12 Ay Süreyle İşletilmesi İşi

Sözleşme Bedeli : 2.034.500,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik

Gerçekleşme Düzeyi : % 100

İşin Tamamlanma Tarihi : 31/12/2014



Atık Su İzleme Odası

İşin Adı : Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Lagün İnşaatı Yapım İşi

Sözleşme Bedeli : 679.750,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Bursa İli Doğu Arıtma Tesisi

Gerçekleşme Düzeyi : % 100

İşin Tamamlanma Tarihi : 31/10/2013



Arıtma Tesisi

Su Arıtma ve İşletme Dairesi Başkanlığı

İşin Adı	: Bursa Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri Alım İşi (Arıtma 4)
Sözleşme Bedeli	: 22.960.593,71 TL
Çalışma Yapılan İlçe	: Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	: % 100
İşin Tamamlanma Tarihi	: 30/09/2014



Arıtma Tesis

İşin Adı	: Bursa Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri Alım İşi (Arıtma 5)
Sözleşme Bedeli	: 35.690.082,58 TL
Çalışma Yapılan İlçe	: Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	: % 15
İşin Tamamlanma Tarihi	: 31.03.2017



Atık Su Arıtma Tesis

İşin Adı	: 400 ton/gün kapasiteli Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesis Teknik Dan. ve Arş. Glşt. Hizmet Alım İşi
Sözleşme Bedeli	: 1.200.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	: Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	: % 20
İşin Tamamlanma Tarihi	: 16.01.2017



Çamur Yakma Tesis İnşaatı

İşin Adı	: 73 Adet Prefabrik Klor Odası Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	: 585.270,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	: Tüm İlçeler
Gerçekleşme Düzeyi	: % 118
İşin Tamamlanma Tarihi	: 08.02.2014



Klor Odası

İşin Adı : İznik Belediyesi MBR Teknoloji Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı İşİ

Sözleşme Bedeli : 38.246.971,50 TL

Çalışma Yapılan İlçe : İznik

Gerçekleşme Düzeyi : % 79

İşin Tamamlanma Tarihi : 23/5/2015



Arıtma Tesisi İnşaatı

İşin Adı : Orhaneli Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı İşİ

Sözleşme Bedeli : 3.964.788,67 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Orhaneli

Gerçekleşme Düzeyi : % 100

İşin Tamamlanma Tarihi : 25/9/2015



Arıtma Tesisi

İşin Adı : Yenişehir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı İşİ

Sözleşme Bedeli : 32.690.515,70 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Yenişehir

Gerçekleşme Düzeyi : % 71

İşin Tamamlanma Tarihi : 28/5/2015



Arıtma Tesisi

İşin Adı : Orhangazi Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı İşİ

Sözleşme Bedeli : 8.104.998,00 TL


Çalışma Yapılan İlçe : Orhangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 69

İşin Tamamlanma Tarihi : 28/2/2015



Arıtma Tesisi

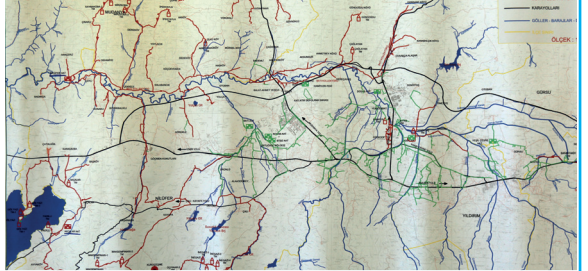İşin Adı	: KMH-2010/1K Bursa Atık Su Projesi Müşavirlik Hizmeti	
Sözleşme Bedeli	: 3.560.810,42 Avro +	
	: 309.141,72 Avro (şartlı bütçe)	
Çalışma Yapılan İlçe	: Kumla, Gemlik, Mudanya, Akçalar,	
	: Nilüfer, Kurşunlu	
Gerçekleşme Düzeyi	: % 43	Atık Su Projesi
İşin Tamamlanma Tarihi	: 30.09.2017	

Elektrik Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı**İşin Adı : Scada Sistemi Bakım ve Destek Hizmeti Alım İş.**

Sözleşme Bedeli : 129.000.00 Avro

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : %77

İşin Tamamlanma Tarihi : 14.05.2014



Skada Hizmet Paneli

İşin Adı : 19 Ay Süre İle 150 Adet Muhtelif Binek Araç, Minibüs ve Çift Kabin Kamyonet Kiralanması Hizmet Alım İş.

Sözleşme Bedeli : 9.417.283,88 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : %87

İşin Tamamlanma Tarihi : 02.04.2014



Araçlar

İşin Adı : 8 Ay Süre İle Muhtelif Binek Araç, Minibüs ve Çift Kabin Kamyonet Kiralanması Hizmet Alım İş.

Sözleşme Bedeli : 9.988.390,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : %89

İşin Tamamlanma Tarihi : 16.11.2014



Araçlar

İşin Adı : Muhtelif Binek Araç, Minibüs ve Çift Kabin Kamyonet Kiralanması Hizmet Alım İş.(İNEGÖL)

Sözleşme Bedeli : 1.159.082,01 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : %100

İşin Tamamlanma Tarihi : 26.12.2014



Araçlar

İşin Adı	: 5 Ay Süre İle Muhtelif Binek Araç, Minibüs ve Çift Kabin Kamyonet Kiralanması Hizmet Alım İşİ.	
Sözleşme Bedeli	: 7.682.164,80TL	 Altyapı Bakım Onarım Yapım İşİ
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif	
Gerçekleşme Düzeyi	: %23	
İşin Tamamlanma Tarihi	: 18.04.2015	

İşin Adı	: 12 Ay Süre İle Kazıcı, Yükleyici, Kırıcı İş Makine ve Kamyon Kiralanması İşİ.	
Sözleşme Bedeli	: 2.546.308,78TL	 Altyapı Bakım Onarım Yapım İşİ
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif	
Gerçekleşme Düzeyi	: %92	
İşin Tamamlanma Tarihi	: 09.03.2014	

İşin Adı	: Havuzların 18 Ay Süre İle Bakımı	
Sözleşme Bedeli	: 969.758,33 TL	 Havuz Bakım
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif	
Gerçekleşme Düzeyi	: %88	
İşin Tamamlanma Tarihi	: 23.07.2014	

İşin Adı	: Havuzların Bakım, Onarım ve İşletilmesi Hizmet Alım İşİ.	
Sözleşme Bedeli	: 1.297.325,00 TL	 Karafatma Havuz Bakımı
Çalışma Yapılan İlçe	: Muhtelif	
Gerçekleşme Düzeyi	: %13	
İşin Tamamlanma Tarihi	: 05.09.2016	

İşin Adı : 2013 BUSKİ Yeşil Alanlarının Bakımının Yapılması Hizmet Alım İşi

Sözleşme Bedeli : 496.552,04 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : %100

İşin Tamamlanma Tarihi : 27.05.2014



BUSKİ Yeşil Alanlar

İşin Adı : BUSKİ Yeşil Alanların Bakım Yaptırılması Hizmet Alım İşi.

Sözleşme Bedeli : 434.425,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : %15

İşin Tamamlanma Tarihi : 16.09.2015



BUSKİ Yeşil Alanlar

İşin Adı : İlçelerde Enerji Nakil Hattı Yapılması İşi.

Sözleşme Bedeli : 1.709.172,00TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : %41

İşin Tamamlanma Tarihi : 21.09.2016



Enerji Nakil Hattı

İşin Adı : 177 Kalem Pompalı İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesislerinin Bakım, Onarım ve İşletilmesi.

Sözleşme Bedeli : 413.692,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : %73

İşin Tamamlanma Tarihi : 14.04.2015



P6 Pompa İstasyonu

İşin Adı : D0 Su Deposuna Hes Tesisi Yapım İşİ.

Sözleşme Bedeli : 2.064.100,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : %34

İşin Tamamlanma Tarihi : 30.06.2014



Hes Su Türbin Çarkı

İşin Adı : Muhtelif Depo ve Pompalara Enerji Nakil Hattı Yapılması İşİ

Sözleşme Bedeli : 458.930,75 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : %100

İşin Tamamlanma Tarihi : 11.02.2015



Enerji Nakil Hattı Yapımı

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı**İşin Adı : Buski Altyapı Projeleri Uygulama Bilgi İşlem Hizmetleri**

Sözleşme Bedeli : 83.077.392,80 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 16

İşin Tamamlanma Tarihi : 31/12/2016



Altyapı Bakım Onarım Yapım İşİ

İşin Adı : Buski Hizmet Binalarının Genel Temizliği ve Sekreterlik Hizmeti Alım İşİ

Sözleşme Bedeli : 4.133.435,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 35

İşin Tamamlanma Tarihi : 31/01/2015



Temizlik Hizmetleri

İşin Adı : 80 Kişilik Özel Güvenlik Hizmet Alım İşİ

Sözleşme Bedeli : 4.052.280,00 TL

Çalışma Yapılan İlçe : Muhtelif

Gerçekleşme Düzeyi : % 100

İşin Tamamlanma Tarihi : 31/01/2014



Güvenlik

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı**İşin Adı : 2010 - 2014 Yılları Arasında Mali Kayıtların Bağımsız Denetimi İşİ**

Sözleşme Bedeli : 90.000,00 Avro

Çalışma Yapılan İlçe : Osmangazi

Gerçekleşme Düzeyi : % 80

İşin Tamamlanma Tarihi : 02.07.2015



Denetim Ön Çalışması

B.2. Performans Sonuçları Tablosu ve Değerlendirilmesi

Performans Göstergesi	Başarı Seviyesi	Performans Seviyesi
	% ...-99	↓ DÜŞÜK
	%100	★ TAMAM
	%100-üstü	↑ YÜKSEK
İdare veya birim hedefi/göstergeyi geçerli sebeplerden dolayı gerçekleştirmekten vazgeçti ise		⊗ İPTAL

STRATEJİK AMAÇ 1 : Mevcut su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilirliğinin sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF 1. 1. : Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 95 km. pınar kaynağı ıslahının, 2017 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1. 1. 1. : 2014 yılında 20 km pınar kaynağı ıslahı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		20	54	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Pınar kaynakları ıslahı için içmesuyu borusu döşemek (km)	20	54	
STRATEJİK HEDEF 1. 2. : Nüfus artışı, hizmet sınırlarının genişlemesi, kuraklık v.b. konular dikkate alınarak 2017 yılı sonuna kadar "su ihtiyacı"nı belirlemek ve karşılanması için çalışmaları yapmak, Çınarcık Barajından su temini için arıtma tesisi ve ana isale hatlarını projelendirmek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1. 2. 1. : 2014 yılında Çınarcık Barajından su temini için arıtma tesisi ve ana isale hatlarının %40 oranında projelendirmek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		40	-	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Öncelikli çalışma bölgelerinin ilgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilmesi (%)	40	-	
	2. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)	40	-	
	3. Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)	1	-	
STRATEJİK AMAÇ 2. : Alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve geliştirmek.				
STRATEJİK HEDEF 2. 1. : 2014 yılı sonuna kadar İçmesuyu Dolum Tesisi yapmak				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 2. 1. 1. : 2014 yılında dolum tesisinin %50' sini tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		50	-	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknolojik Projelerinin hazırlanması.(%)	30	-	
	2. Teknolojik şartnamenin hazırlanması.(%)	30	-	
	3. İnşaat çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması.(%)	50	-	
STRATEJİK HEDEF 2. 2. : 2017 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan su kaynaklarının tahsis yetkisinin Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilebilmesi için gerekli yasal işlemleri başlatmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 2. 2. 1. : İl Özel İdaresine gerekli yasal başvurunun yapılarak su kaynaklarının devrinin talep edilmesi, bu talebin rededilmesi halinde işlemin iptal edilmesi için dava açmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		10	-	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Su kaynaklarının devri işlemleri (%)	10	-	
STRATEJİK HEDEF 2. 3. : Su kaynaklarından enerji temin edilmesi için yapılan çalışmaları 2014 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 2. 3. 1. : 2014 yılında su kaynaklarının enerji temini için yapılacak Hidro Elektrik Santralinin %20'sini tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		20	-	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İnşaat çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması.(%)	20	-	
STRATEJİK AMAÇ 3. : Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.				

STRATEJİK HEDEF 3. 1. : Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde 2012 yılı sonu hedeflenen %23 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar %22'ye düşürmek .				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 1. 1. : 2014 yılında Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranını % 23 olarak korumak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		23	23	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kayıp oranı (%)	23	23	
STRATEJİK HEDEF 3. 2. : Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezleri dışındaki yerlerde (Demirtaş, Ovaakça, Emek, Görükle,				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 2. 1. : 2014 yılında ölçülebilir hale gelen kaçak su oranını %3 oranında azaltmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		3	0	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS	Kayıp Azaltma Oranı (%)	3	0	
STRATEJİK HEDEF 3. 3. : Gemlik ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 50 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 35'e düşürmek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 3. 1. : 2014 yılında Gemlik ilçesinde %50 olan kaçak su oranını sabit tutmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		50	39	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kayıp oranı (%)	50	39	
STRATEJİK HEDEF 3. 4. : Kestel ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 45 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 30'a düşürmek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 4. 1. : 2014 yılında Kestel ilçesinde %45 olan kaçak su oranını sabit tutmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		45	45	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kayıp oranı (%)	45	45	
STRATEJİK HEDEF 3. 5. : Mudanya ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 35 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 30'a düşürmek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 5. 1. : 2014 yılında Mudanya ilçesinde %35 olan kaçak su oranını sabit tutmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		35	23	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kayıp oranı (%)	35	23	
STRATEJİK HEDEF 3. 6. : Gürsu ilçesinde 2012 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale gelecek olan kaçak su oranını her yıl % 3 azaltmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 6. 1. : 2014 yılında Gürsu ilçesinde ölçülebilir hale gelen kaçak su oranını %3 oranında azaltmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		3	0	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kayıp Azaltma Oranı (%)	3	0	
STRATEJİK HEDEF 3. 7. : 2017 yılı sonuna kadar 104 adet alt bölge sınırlarını kesinleştirmek ve fiziksel olarak izole etmek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 7. 1. : 2014 yılında 21 adet alt bölge sınırlarını kesinleştirmek ve fiziksel olarak izole etmek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		21	9	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Sınırları belirlenen alt bölge (adet)	21	9	
	2. İzole edilen bölge sayısı (adet)	21	9	
STRATEJİK HEDEF 3. 8. : 2017 yılı sonuna kadar sınırları kesinleştirilen 104 adet alt bölgeye debiölçer takmak ve ölçülebilir hale getirmek.				

2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 8. 1. : 2014 yılında 21 adet alt bölgeye debimetrelerin takılarak ölçülebilir hale getirmek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		21	24	YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Sınırları belirlenen alt bölge (adet)	21	24	
	2. Debimetrelerin takılma oranı (%)	100	100	
	3. Debimetrelerin ölçülebilir hale getirilme oranı (%)	100	100	
STRATEJİK HEDEF 3. 9. : 2017 yılı sonuna kadar kesinleştirilen 104 adet alt bölge sınırlarının veritabanına girişini sağlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 9. 1. : 2014 yılında kesinleşen 21 adet alt bölge sınırlarının veritabanına girişini sağlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		21	11	DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Sınırları belirlenen alt bölge (adet)	21	11	YÜKSEK
	2. Harita ölçümlerinin yapılma oranı (%)	100	100	
STRATEJİK AMAÇ 4.: İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlanmak amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.				
STRATEJİK HEDEF 4.1: Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 500 km şebeke inşaatı yapmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1.: 2014 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 100 km şebeke inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	118	YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan şebeke inşaatı (km)	100	118	
STRATEJİK HEDEF 4.2.: Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km isale hattı inşaatı yapmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1.: 2014 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 10 km isale hattı inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		10	38	YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan isale hattı inşaatı (km)	10	38	
STRATEJİK HEDEF 4.3.: Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 20 adet depo inşaatı yapmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1.: 2014 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 4 adet depo inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		4	10	YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İnşaatı tamamlanan depo (adet)	4	10	
STRATEJİK HEDEF 4.4.: Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 80 km şebeke inşaatı yapmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1.: 2014 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 16 km şebeke inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		16	13,4	DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan şebeke inşaatı (km)	16	13,4	
STRATEJİK HEDEF 4.5.: Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 15 km isale hattı inşaatı yapmak.				

2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1.: 2014 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 3 km isale hattı inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		3	6	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan isale hattı inşaatı (km)	3	6	
STRATEJİK HEDEF 4.6.: Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 6 adet depo inşaatı yapmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.6.1.: 2014 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 1 adet depo hattı inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		1	2	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İnşaatı tamamlanan depo (adet)	1	2	
STRATEJİK HEDEF 4.7.: Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 100 km şebeke inşaatı yapmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1.: 2014 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 20 km şebeke inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		20	5,6	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan şebeke inşaatı (km)	20	5,6	
STRATEJİK HEDEF 4.8.: Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 30 km isale hattı inşaatı yapmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1.: 2014 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 6 km isale hattı inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		6	7,3	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan isale hattı inşaatı (km)	6	7,3	
STRATEJİK HEDEF 4.9.: Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 5 adet depo inşaatı yapmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.9.1.: 2014 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 1 adet depo inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		1	1	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İnşaatı tamamlanan depo (adet)	1	1	
STRATEJİK HEDEF 4.10.: Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km şebeke inşaatı yapmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.10.1.: 2014 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 10 km şebeke inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		10	0	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan şebeke inşaatı (km)	10	0	
STRATEJİK HEDEF 4.11.: Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 15 km isale hattı inşaatı yapmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.11.1.: 2014 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 3 km isale hattı inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		3	0,7	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan isale hattı inşaatı (km)	3	0,7	
STRATEJİK HEDEF 4.12.: Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 6 adet depo inşaatı yapmak.				

2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.12.1.: 2014 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 2 adet depo inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		2	0	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İnşaatı tamamlanan depo (adet)	2	0	
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.13.1.: 2014 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 20 km şebeke inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		20	51	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan şebeke inşaatı (km)	20	51	
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.14.1.: 2014 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 8 km isale hattı inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		8	11,4	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan isale hattı inşaatı (km)	8	11,4	
STRATEJİK HEDEF 4.15.: Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 10 adet depo inşaatı yapmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.15.1.: 2014 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 2 adet depo inşaatı yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		2	3	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İnşaatı tamamlanan depo (adet)	2	3	
STRATEJİK HEDEF 4.16.: 2013 yılı sonuna kadar 500, 1000, 2500, 5000, 10.000, 20.000, 30.000 m3 kapasiteli su depolarının uygulama projelerinin tamamının dört ayrı zemin için hazırlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.16.1.: 2013 YILINDA HEDEF TAMAMLANDI.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	-	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İhale dökümanlarının tamamlanıp ihaleye çıkılması (%)	100	-	
	2.Sözleşmenin imzalanması (%)	100	-	
	3.Mimari projelerin statik hesaplarının ve betonarme projelerinin kontrol edilerek onaylanması (%)	100	-	
	4.Kabulün ve hakediş ödemelerinin yapılması (%)	100	-	
STRATEJİK HEDEF 4.17.: 2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 500 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.17.1.: 2014 yılı sonuna kadar 50 km içmesuyu projesi hazırlamak ve onaylamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		50	103,2	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Avan/Uygulama projesi (km)	50	103,2	
STRATEJİK AMAÇ 5. : İçme suyunun aboneye ulaştırılmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF 5. 1. : 2012 yılı sonunda hedeflenen, hizmet sınırlarımız içerisinde, içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresi olan ortalama 34 saati, 2017 yılı sonuna kadar 31 saate düşürmek.				

2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 1. 1. : 2014 yılında hizmet sınırlarımız içerisinde; içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresi olan ortalama 33 saati korumak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		33	32	↑YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Arıza tamir süreleri (saat)	33	32	
STRATEJİK HEDEF 5. 2. : Sözleşmesi tamamlanmış ve bağlantı için iş emri ulaşmış abonelerin, su bağlanmasına engel olacak bir durumu olmaması halinde, 2017 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sularını 3 iş günü içinde % 80 'ini bağlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 2. 1. : 2014 yılında kat abonelerinin sularını 3 iş günü içinde % 70'ini bağlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		70	70	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kat Aboneliklerinin yapılması (%)	70	70	
STRATEJİK HEDEF 5. 3. : Sözleşmesi tamamlanmış ve bağlantı için iş emri ulaşmış abonelerin, su bağlanmasına engel olacak bir durumu olmaması halinde 2017 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin sularını 7 iş günü içinde % 85'ini bağlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 3. 1. : 2014 yılında yeni abonelerinin sularını 7 iş günü içinde % 80'ini bağlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		80	80	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yeni su aboneliklerinin yapılması (%)	80	80	
STRATEJİK HEDEF 5. 4. : 2017 yılı sonuna kadar abone olmayan 15 adet köyün abonelik işlemlerini sonuçlandırmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 4. 1. : 2014 yılında 3 adet köyün abonelik işlemlerini tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		3	3	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Aboneliği yapılan köy sayısı (adet)	3	3	
STRATEJİK HEDEF 5. 5. : Her yıl, bir önceki yıl sonu itibariyle, 10 yılını doldurmuş sayaçların %90'ını değiştirmek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 5. 1. : 2014 yılında 10 yılını doldurmuş sayaçların %50' sini değiştirmek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		50	30	↓DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Yıpranma süresi dolmuş sayaç (adet)	242.454	40.619	
	2. Süresi dolmuş sayaçların değiştirilme oranı (%)	50	30	
STRATEJİK HEDEF 5. 6. : 2017 yılı sonuna kadar müracaattan itibaren abonelik sözleşme işlemlerini 2 iş günü içerisinde tamamlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 6. 1. : 2014 yılında 4 iş günü içerisinde abonelik işlemlerini tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		4	4	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İşlemin tamamlanma süresi (gün)	4	4	
STRATEJİK HEDEF 5. 7. : 2012 yılı sonu itibariyle % 70 olması hedeflenen günü geçmiş alacakların tahsilat oranını 2017 yılı sonuna kadar % 75'e çıkarmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 7. 1. : 2014 yılında günü geçmiş alacakların tahsilat oranını %72'ye çıkarmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		72	93	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Günü geçmiş alacakların tahsilat oranı (%)	72	93	

STRATEJİK HEDEF 5. 8. : Her yıl abone memnuniyeti araştırması yapmak, memnun olunmayan konularda memnuniyetsizlik oranını her yıl en az % 2 oranında azaltmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 8. 1. : 2014 yılında abone memnuniyetsizlik oranını %2 oranında azaltmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		2	0	 DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Abone memnuniyet anketi (adet)	1	0	
STRATEJİK HEDEF 5. 9. : Abone bazlı oluşturulan Hizmet Masalarını Genel Müdürlüğümüzün tüm hizmetlerini kapsayacak şekilde 2015 yılı sonuna kadar revize etmek ve tek bir birimde birleştirmek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 9. 1. : Hizmetin kaliteli ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için fiziki mekanın tespitini yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		30	100	 YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Fiziki mekanın tesbiti (%)	30	100	
STRATEJİK HEDEF 5. 10. : 2017 yılı sonuna kadar Kestel, Mudanya ve		Gürsu'da hizmet binaları yapmak.		
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 10. 1. : 2014 yılında Kestel, Mudanya ve Gürsu hizmet binalarının %20'sini tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		20	30	 YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hizmet binası inşaatı tamamlanma oranı (%)	20	30	
STRATEJİK AMAÇ 6: 2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının		çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacı ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.		
STRATEJİK HEDEF 6.1: Nüfus artışı, hizmet sınırlarının genişlemesi olasılığı, iklim değişikliği etkilerini dikkate alarak 450 km atıksu, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerini 2017 yılı sonuna kadar hazırlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1.: 2014 yılında 150 km atıksu, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projesi yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		150	292,5	 YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Avan/uygulama projesi (km)	150	292,5	
STRATEJİK HEDEF 6.2: 2014-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde		merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 350 km. kanalizasyon hattı döşemek.		
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1.: 2014 yılında merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 50 km. kanalizasyon hattı döşemek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		50	107	 YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan şebeke imalatı (km)	50	107	
STRATEJİK HEDEF 6.3: 2014-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde		merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 200 km. yağmursuyu hattı döşemek.		
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1.: 2014 yılında merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 40 km. yağmursuyu hattı döşemek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		40	71,1	 YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan şebeke imalatı (km)	40	71,1	
STRATEJİK HEDEF 6.4: 2014-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde		diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 250 km. kanalizasyon hattı döşemek.		

2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.4.1.: 2014 yılında diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 50 km. kanalizasyon hattı döşemek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		50	53	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan şebeke imalatı (km)	50	53	
STRATEJİK HEDEF 6.5: 2014-2014 yılları arasında BBB sınırları içinde diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 125 km. yağmursuyu hattı döşemek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.5.1.: 2014 yılında diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 25 km. yağmursuyu hattı döşemek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		25	20,1	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan şebeke imalatı (km)	25	20,1	
STRATEJİK HEDEF 6.6: 2014-2017 yılları arasında BBB sınırları içindeki derelerin 15 km.'sini ıslah ederek sel taşkınlarını önlemek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.6.1.: 2014 yılında BBB sınırları içindeki derelerin 3 km'sini ıslah ederek sel taşkınlarını önlemek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		3	4	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmalat (Islah çalışmaları) (km)	3	4	
STRATEJİK HEDEF 6.7: 2014-2014 yılları arasında Samanlı Kolektörü inşaatının % 100' ünü tamamlayarak, Doğu Bölgesinin atık sularını atık su arıtma tesislerine ulaştırmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.7.1.: 2014 yılında Samanlı Kolektörü inşaatının % 33'ünü tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		33	33	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmalat çalışmaları (%)	33	33	
STRATEJİK HEDEF 6.8: 2014-2017 yılları arasında Demirtaş, Ovaakça, Kurşunlu, Mudanya, Nilüferköy, Barakfakih Havzalarındaki atık su hatlarının % 100' ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.8.1.: 2014 yılında Demirtaş, Ovaakça, Kurşunlu, Mudanya, Nilüferköy, Barakfakih Havzalarındaki atıksu hatlarının % 30'unu tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		30	49	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmalat çalışmaları (%)	30	49	
STRATEJİK HEDEF 6.9: 2014-2017 yılları arasında Batı Nilüfer Havzasındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.9.1.: 2014 yılında Batı Nilüfer Havzasındaki atıksu hatlarının % 30'unu tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		30	0	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmalat çalışmaları (%)	30	0	
STRATEJİK HEDEF 6.10: 2014-2017 yılları arasında Karsak Kumla Havzasındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.10.1.: 2014 yılında Karsak Kumla Havzasındaki atıksu hatlarının % 30'unu tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		30	0	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmalat çalışmaları (%)	30	0	
STRATEJİK HEDEF 6.11: 2014-2017 yılları arasında Doğu Bursa Havzasındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.				

2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.11.1.: 2014 yılında Doğu Bursa Havzasındaki atıksu hatlarının % 30'unu tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		30	0	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmalat çalışmaları (%)	30	0	
STRATEJİK HEDEF 6.12: 2014-2017 yılları arasında Nilüfer Kayapa Çalı Uluabat Havzasındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.12.1.: 2014 yılında Nilüfer Kayapa Çalı Ulubat Havzasındaki atıksu hatlarının % 30'unu tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		30	0	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İmalat çalışmaları (%)	30	0	
STRATEJİK AMAÇ 7.:Atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.				
STRATEJİK HEDEF 7.1.:Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı olmayıp talepte bulunan veya talebi olmayıp tespit edilen firmaları 2017 yılı sonuna kadar %90'ının ruhsat işlemlerini tamamlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1.: 2014 yılında endüstriyel atık su üreten işletmelerin %75'inde Atık Su Kalite Kontrol Ruhsatı işlemlerini tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		75	75	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Başvuru yapan, diğer kurumlarca bildirilen veya tespiti yapılan işyerlerinde denetimlerin başlaması (%)	100	0	↓ DÜŞÜK
	2.İşletmelere, denetim işlemlerinin tamamlanarak, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı verilmesi (%)	75	75	↑ YÜKSEK
STRATEJİK HEDEF 7.2.: 2014 yılı sonuna kadar seçilen Endüstriyel Tesislerin kanalizasyona deşarj noktalarına atık suların kalitesel ve miktarsal olarak durumlarının izlenmesine yönelik online izleme sistemini kurmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1.: 2013 YILINDA HEDEF TAMAMLANDI.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		-	-	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Sistem kurulumu ihalesinin yapılması (%)	-	-	
	2. Sistemin kurulması (%)	-	-	
	3. Sistemin devreye alınması (%)	-	-	
STRATEJİK HEDEF 7.3.: 2016 yılında BUSKİ AAT'lerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.3.1.: 2016 yılında çamur bertaraf tesisinin inşaatına başlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		0	0	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İnşaata başlanması (%)	0	0	
STRATEJİK HEDEF 7.4.: 2015 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.				

2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.4.1.: 2014 yılında Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisinin inşaatının %50'sini tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		50	10	 DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İnşaata başlanması (%)	50	10	
STRATEJİK AMAÇ 8. : Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.				
STRATEJİK HEDEF 8. 1. : 2015 yılı sonuna kadar Gemlik İlçesi Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8. 1. 1 : 2014 yılında Gemlik İlçesi Atık su Arıtma Tesisinin inşaatının %40'ını tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		40	0	 DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapım işlerinin tamamlanması (%)	40	0	
STRATEJİK HEDEF 8. 2. : 2015 yılı sonuna kadar Mudanya Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8. 2. 1 : 2014 yılında Mudanya İlçesi Atık su Arıtma Tesisinin inşaatının %40'ını tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		40	0	 DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapım işlerinin tamamlanması (%)	40	0	
STRATEJİK HEDEF 8. 3. : 2015 yılı sonuna kadar Kumsaz Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8. 3. 1 : 2014 yılında Kumsaz İlçesi Atık su Arıtma Tesisinin inşaatının %40'ını tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		40	0	 DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapım işlerinin tamamlanması (%)	40	0	
STRATEJİK HEDEF 8. 4. : 2015 yılı sonuna kadar K.Kumla Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8. 4. 1 : 2014 yılında K.Kumla İlçesi Atık su Arıtma Tesisinin inşaatının %40'ını tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		40	0	 DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapım işlerinin tamamlanması (%)	40	0	
STRATEJİK HEDEF 8. 5. : 2015 yılı sonuna kadar Badırğa Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8. 5. 1 : 2014 yılında Badırğa Atık su Arıtma Tesisinin inşaatının %40'ını tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		40	0	 DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapım işlerinin tamamlanması (%)	40	0	
STRATEJİK HEDEF 8. 6. : 2015 yılı sonuna kadar Akçalar Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8. 6. 1 : 2014 yılında Akçalar İlçesi Atık su Arıtma Tesisinin inşaatının %40'ını tamamlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		40	0	 DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapım işlerinin tamamlanması (%)	40	0	

STRATEJİK AMAÇ 9.: Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.		politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir		
STRATEJİK HEDEF 9. 1. : Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak, memnun olunmayan konularda memnuniyetsizlik oranını her yıl en az % 2 oranında azaltmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 1. 1. : 2014 yılında çalışan memnuniyetsizlik oranını en az %2 oranında azaltmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		2	0	 DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çalışan memnuniyet anketi (adet)	1	0	
STRATEJİK HEDEF 9. 2. : 2017 yılı sonuna kadar yıllık eğitim saatini 8 saate çıkartmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 2. 1. : 2014 yılında her personel için eğitim saatini 6 saate çıkarmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		6	8	 YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kişi başına verilecek eğitim süresi (saat)	6	8	
STRATEJİK HEDEF 9. 3. : Her yıl emekli olan personel kadar yeni personel temin etmek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 3. 1. : 2014 yılında emekli olan personel kadar personel temin etmek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	325	 YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Emekli olacak personel (adet)	25	51	
	2.Yeni başlayacak personel (adet)	25	217	
STRATEJİK HEDEF 9. 4. : İçme suyu, atık su, yağmursuyu imalatlarının talep edilen konum kontrolünü takip eden 2 ay içerisinde yapmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 4. 1. : 2014 yılında içme suyu, atık su, yağmursuyu imalatlarının talep edilen konum kontrolünü 2 ay içerisinde yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	100	 TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Proje faaliyetleri.(%)	100	100	
	2.Yüklenicinin ölçü değerlerini getirmesi ve takip etmesi.(%)	100	100	
	3.Arazi kontrolünün yapılması.(%)	100	100	
	4.Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğu.(%)	100	100	
	5.Arazi ekip sayısı (adet)	100	100	
	6.Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	100	100	
	7.Ölçüm ve kontrollük faaliyeti (gün)	100	100	
STRATEJİK HEDEF 9. 5. : Her yıl yapılan kanal ve yağmursuyu hatlarının tamamını takip eden yıl sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemine veri girişini yapmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 5. 1. : 2012 yılında yapılan kanal ve yağmursuyu imalatlarının tamamını 2014 içerisinde Coğrafi Bilgi Sistemine veri girişini yapmak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	100	 TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Veri girişi (%)	100	100	
STRATEJİK HEDEF 9. 6. : 2014-2017 yılları arasında 104 adet alt bölgede bulunan içme suyu alt yapı bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine veri girişini yapmak.				

2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 6. 1. : 2014 yılında 21 adet alt bölgede bulunan içme suyu alt yapı bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine veri girişini yapmak		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		21	21	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Sisteme girişi yapılan bölge (adet)	21	21	
	2.Giriş işlemlerinin tamamlanması (%)	100	100	
STRATEJİK HEDEF 9. 7. : Mülkiyeti BUSKİ adına tescil edilen veya kullanımına tahsis edilen veya tasarrufunda olan taşınmazlar ile BUSKİ lehine kurulan irtifak haklarına ait tüm emlak bilgilerinin emlak bilgi sisteminde güncelliğinin devamını sağlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 7. 1. : 2014 yılında BUSKİ lehine kurulan irtifak haklarına ait tüm emlak bilgilerinin Emlak bilgi sisteminde güncelliğinin devamını sağlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	100	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Tescili tamamlanan ve ödeme emri hazırlanan taşınmazlara ait bilgilerin Emlak Bilgi Sistemine girişi (%)	100	100	
	2.Teslim ve tesellüm tutanağı tamamlanan ve tahsis belgesi alınan taşınmazlara ait bilgilerin Emlak Bilgi Sistemine girişi (%)	100	100	
STRATEJİK HEDEF 9. 8. : İşletilmekte olan mevcut su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncelliğinin devamını sağlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 8. 1. : 2014 yılında işletilmekte olan mevcut su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncelliğinin devamını sağlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	100	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncelliği (%)	100	100	
STRATEJİK HEDEF 9. 9. : Bakım onarım çalışmaları kapsamında yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin yıllık verilerin o yıl içerisinde tamamının veri tabanına işletimini sağlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 9. 1. : 2014 yılı sonuna kadar altyapı bilgilerinin tamamını veri tabanına işlemek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	100	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Veri tabanı giriş oranı (%)	100	100	
STRATEJİK HEDEF 9. 10. : Coğrafi Bilgi Sistemi veritabanının tasarımı, raporlanması ve yönetimini sağlamak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 10. 1. : Coğrafi Bilgi Sistemi veritabanının tasarımı, raporlanması ve yönetimini sağlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	100	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	CBS veri tabanı tasarımı ve yönetimi (%)	100	100	
STRATEJİK HEDEF 9. 11. : Kitle iletişim araçları ile su bilinci ve kültürünü arttırmak amaçlı Osmangazi,Yıldırım ve Nilüfer sınırları içerisindeki tüm okulları 2017 yılı sonuna kadar bilgilendirmek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 11. 1. : 2014 yılında su bilinci ve kültürünü arttırmak amaçlı Osmangazi,Yıldırım ve Nilüfer sınırları içerisindeki okulların %20'sini bilgilendirmek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		20	100	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Tüm okulların ilçe bazında tespiti (%)	100	100	
	2.Bilgilendirilecek okulların tespiti (%)	100	100	
	3.Bilgilendirilme zamanı ile ilgili okullarla iletişime geçme (%)	100	100	
	4.Okulların bilgilendirme işleminin yapılması (%)	100	100	

STRATEJİK HEDEF 9. 12. : Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 80 adet kuyuyu aktif halde tutmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 12. 1. : 2014 yılı sonuna kadar 23 adet kuyuyu aktif hale getirmek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		23	12	DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Aktifleştirilecek kuyu (adet)	23	12	
STRATEJİK HEDEF 9. 13. : 2014 yılı sonuna kadar Ar-Ge, istatistik birimi ve iç kontrol faaliyetlerini kapsayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya girmek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 13. 1. : 2014 yılı sonuna kadar Ar-Ge ve istatistik birimlerinin oluşturulması.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		30	0	DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Ar-Ge biriminin oluşturulması (%)	30	0	
	2.İstatistik biriminin oluşturulması (%)	30	0	
STRATEJİK HEDEF 9. 14. : Yeni işe girenlere ilk altı ay içerisinde oryantasyon ve mesleki eğitim vermek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 14. 1. : 2014 yılında yeni işe başlayan personelin tamamına altı ay içinde oryantasyon eğitimi vermek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	100	TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Oryantasyon eğitimi (%)	100	100	
	2.Katılım oranı (%)	100	80	
STRATEJİK AMAÇ 10. : Hizmet sınırlarının genişlemesi ve il sınırına çıkarılması ihtimaline karşın gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak.				
STRATEJİK HEDEF 10. 1. : Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki mevcut altyapılarının tespiti çalışmasını 2014 yılında başlatmak, 2015 yılı sonuna kadar altyapı varlıklarının tespiti çalışmasını sonuçlandırmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 10. 1. 1. : 2014 yılında hizmet alanımıza yeni katılan bölgelerle ilgili tüm dökümanları, programları vb. güncellemek.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		40	0	DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Su isale hatlarının tespiti (%)	40	0	
	2.Kanalizasyon hatlarının tespiti (%)	40	0	
	3.Kuyuların tespiti (%)	40	0	
STRATEJİK HEDEF 10. 2. : Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki mevcut altyapıların tespiti sonrasında, 2016 yılında Genel Müdürlük bünyesinde ilgili tüm dokümanları, programları v.b. güncellemek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 10. 2. 1. : 2014 yılı içerisinde genişleyen sınırlar içerisindeki altyapı varlıklarının tespitine başlamak.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		30	50	YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tespiti yapılan altyapı varlıkları (%)	30	50	
STRATEJİK HEDEF 10. 3. : Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda yeni katılacak bölgelerdeki 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritalarının 2017 yılı sonuna kadar tamamının üretimini yapmak.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 10. 3. 1. : Yeni katılacak bölgelerdeki 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto harita üretimini yapmak		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		20	20	TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İhale süreci (%)	20	20	

STRATEJİK HEDEF 10. 4. : Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda yeni katılacak bölgeler de dahil olmak üzere hizmetlerimizde eksiklik olmaması amacı ile organizasyonel değişikliği tespit etmek.				
2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ 10. 4. 1. : 2013 YILINDA HEDEF TAMAMLANDI.		2014 YILI PLANLANAN	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	PERFORMANS SEVİYESİ
		-	-	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tespitlerin yapılması (%)	-	-	★ TAMAM



Çeşmeden
İçilen
Su
Sağlıklı,
Güvenli ve
Daha
Ekonomiktir...

www.buski.gov.tr



IV KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- A. Üstünlükler
- B. Zayıflıklar
- C. Değerlendirme

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

Güçlü Yönler

1. Özel bir kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip köklü bir kurum olması,
2. Dünyada tanınır konumda ve Türkiye'de benzer kamu kurum ve kuruluşlara öncülük edecek nitelikte olması,
3. Finansal açıdan güçlü bir kurum olması,
4. Büyük ölçekli yatırımcı bir kuruluş olması nedeniyle profesyonel hizmet alma ve profesyonel hizmet verme gücüne sahip olması,
5. Su kalitesinde standartları yakalamış olması,
6. TS-EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip olması,
7. Yatırım ihtiyacının karşılanmasında kredibilitésinin yüksek olması,
8. Abonelere yönelik sanal ortamdaki çözüm ve uygulamalarının gelişmişliği,
9. Tahsilat noktalarının çokluğu ve bölgesel dağılımının dengeli olması,
10. Bursa genelinde atık su ve yağmur suyu hatlarının %99'unun ayrıştırılmış olması,
11. Su kayıpları konusunda Türkiye'de birinci sırada olması,
12. Nilüfer ve Doğancı gibi iki adet büyük barajının olması.

Fırsatlar

1. Su kaynaklarına ulaşma ve kullanma imkânına sahip olunması,
2. Bursa'da su ve atık su konusunda yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip üniversitelerin ve araştırma kurumlarının oluşmaya başlaması,
3. Tedarikçi kullanımı açısından güçlü özel sektörün olması ve alternatif hizmet yöntemlerinin gelişmesi,
4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik yönetim anlayışına geçilmesi zorunluluğu, AB müktesebatına uyum çabalarının ve politikalarının varlığı,
5. Yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki gelişmeler.

B- Zayıflıklar

Zayıf Yönler

1. Özel bir kanunla kurulmuş olmakla birlikte diğer kanunlarla bazı kısıtlamaların oluşması,
2. Personele yönelik imkanların (lokal, kreş v.b.) yetersiz kalması,
3. Kurum çalışanları arasında ücret dengesizliğinin olması,

Tehditler

1. Bursa'nın sürekli göç almasına bağlı olarak nüfusun hızla artması.
2. Bursa'nın coğrafi konumu.
3. Su kaynaklarının yüzeysel sulardan oluşması.
4. İçme suyu kaynaklarının bulunduğu arazilerdeki mülkiyet sorunu nedeniyle kamulaştırma bedellerinin giderek yükselmesi ve havzaların korunmasına yönelik kamulaştırma ve kamulaştırmaz el atma mahiyetli davaların ciddi boyutlara ulaşması.
5. Havza çevrelerinin doğal güzelliğinin nitelikli kaçak yapılaşmalar için cazibe merkezleri olması.
6. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri.
7. Bursa'da doğal afet risklerinin varlığı (1.dereceden deprem bölgesi olması).
8. Yağmursuyu ve derelerle ilgili yetki ve görev karmaşası, koordinasyon ve mevzuat eksiklikleri.

C- Değerlendirme

- Doğancı Barajı yanında Nilüfer Barajı'nın da devrede bulunması ilimiz açısından bir avantaj olurken, şehrin yoğun göç alarak nüfusun hızla artması nedeniyle yeni yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyacı, planlama ve hizmet kalitesi yönünden dezavantaj oluşturmaktadır.
- İdarece açılacak davalar ve icra takibine konacak dosyalar önceden bilinmemektedir. Bu hususlar, tamamıyla diğer birimlerin taleplerine bağlı olduğundan, bu konuları içeren, ileriye dönük plan ve programların yapılmasında güçlük çekilmektedir. İdare faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, üçüncü kişilerle idare arasında doğabilecek ihtilaflarda, kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, üçüncü kişinin haklı olması durumunda, açılan davaların kaybedilmesi riski bulunmaktadır.
- Kayıp-kaçak ile ilgili çalışmalara çok yönlü olarak ve kararlılıkla devam edilecektir.
- Enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
- Yeni teknoloji ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalara devam edilecektir.
- Halkla ilişkiler ve hizmet masasının güçlendirilmesine, hizmet verilen abonelerin öneri ve şikayetlerine karşılık gerekli tedbirleri almaya, duyarlı olmaya ve kurum hizmetleri hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam edilecektir.
- Kurumsal kültürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, personelin nitelik olarak geliştirilmesi, bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.
- Yeraltı ve yerüstü tüm su kaynaklarının kullanımında kurumlar arası yetki ve sorumlulukların karmaşıklığını giderecek, yeni bir "Yer Altı Suları Yasası"na ihtiyaç vardır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.




İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
BUSKİ Genel Müdürü

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.



Halit KARASU
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı



BUSKİ

BURSA SU ve KANALİZASYON İDARESİ

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Halit KARASU

Strateji Geliştirme Şube Müdürü
Niğar ETİK UĞURBAŞ

Çalışma Ekibi

Arzu ERTEN

Ahmet TEMİZ

Eyüp Can ÇATAL

Handan KARAYAĞIZ

Yasemin ÖZEL

Yasemin DURMAZ

Kübra KARABACAK

Gizem AKGÖZ

Şenol KÖSE

Yusuf GÜNDÜZ

Elektronik örneği

www.buski.gov.tr



adresinde bulabilirsiniz.
