
Hayat Su ile Başladı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Şehrimizin alt yapı sorunlarına kalıcı, kesin çözümler buluyoruz. Yaşanılabilir dünya, genelden özele doğru gidilirse ülkeleri, şehirleri, mahalleleri ve sokaklarıyla temiz çevreden başlar. Mikro çözümler, makro çözümlere kapı aralar. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz şehir merkezinde bulunan mahallelerimizin su ve kanalizasyon sorununu tamamen çözmüştür. 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu kapsamında hizmet alanımıza giren köy ve beldelerde de aynı hassasiyet ve kararlılıkla su ve kanalizasyon hizmetleri verilmektedir.

İlçelerimizde halihazırda yapımı devam eden atıksu arıtma tesislerimizle arıtılacak suyun tekrar kullanımı baz alan projelerimiz mevcuttur. Sanayide, tarımda, evsel kullanımda en değerli madde olan suyun en rasyonel biçimde kullanımını sağlamak üzere en hassas icraatları üstlenen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılacak olan suyu sulama amaçlı kullanılabilecek hale getiriyor.

Suyun yanında enerji tasarrufuna da büyük önem veren Genel Müdürlüğü'müz, Konya Atıksu Arıtma Tesisi'nde güneş enerji santrali de kuracaktır. Kurulacak Güneş Enerji Santrali ile atık su arıtma tesislerimizin elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerjiden karşılanacaktır. Tesis, yenilebilir enerjiden üretilen enerjiyle elektrik ihtiyacını karşılayarak doğal çevreyi koruma amacına dolaylı olarak katkı sağlayacaktır.

Konya'daki tüm su ve atık su hizmetlerini başarıyla ve eksiksiz yerine getiren KOSKİ Genel Müdürlüğümüz; kesintisiz, sürdürülebilir, kaliteli, sağlıklı su hizmetini hemşehrilerimize sunmak için 24 saat aralıksız çalışmakta ve kentimizi geleceğe güvenle taşıyacak projeleri uygulamaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin yer aldığı ve hesap verebilirliğin gerçekleştirilmesinde önemli bir belge niteliğine haiz 2015 Faaliyet Raporunu kamuoyu bilgisine sunmanın gururunu yaşamaktayız. Bu vesileyle çalışmalarımızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

TAHİR AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı





2015 YILI HİZMET YILI OLMUŞTUR

Konya, şehir suyu, sulama suyu, tatlı su, kirli su, yağmur suyu ve Mor Şebeke ile Türkiye'de 6 ayrı su şebekesine sahip tek şehirdir. Bundan dolayı şehrimize kalite standartları içerisinde ve kesintisiz su ve atık su hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik, öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmak vizyonu ve Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili mevzuata uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suları yerleşim merkezinden uzaklaştırmak ve arıtmak misyonuyla çalışmalarını sürdüren KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, verimli bir yıl daha geçirmiştir.

Yeni Büyükşehir Yasası ile bağlanan mahalle ve ilçe merkezlerimize yönelik altyapı yatırımlarımıza daha da yoğunlaşmış bulunmaktayız. 2015 yılında sağlıklı, sürdürülebilir su hizmetinin devamı için eskimiş, işletim ömrü dolmuş, paslanmış boruları 100 yıl ömürlü, sağlıklı ve yüksek basınca dayanıklı borularla değiştirerek su şebeke ıslahı yapan KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, ayrıca yeni yerleşim birimlerinde alt yapı hizmetleri kapsamında yeni şebeke hatları döşemiştir.

2015 yılında 803 bin 720 metre su şebekesi yapan KOSKİ Genel Müdürlüğü'müz, ayrıca 16 bin 822 metre sondaj açarak 99 adet derin su temini yapmıştır. Şehir merkezinde 84 milyon, ilçe ve yeni bağlanan mahallelerde 120 milyon metreküp olmak üzere toplam 204 milyon metreküp içme ve kullanma su üretimi hizmeti gerçekleştirilmiştir

Kötü koku, kötü görüntü ve insan sağlığına zarar veren pis suyun yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi noktasında kanalizasyon şebeke yapımı da önemli bir yer teşkil etmektedir. Bundan dolayı KOSKİ Genel Müdürlüğü'müzce 2015 yılında 823 bin metre kanalizasyon şebeke yapımı gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki faaliyet dönemleri de hamle ve atılım dönemleri olacaktır. Tüm bu hizmetlerde üstüne düşen görevi yerine getiren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum.

İSMAİL SELİM UZBAŞ
Koski Genel Müdürü

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



Tahir **AKYÜREK**
Büyükşehir Belediye Başkanı

GENEL KURUL ÜYELERİ

SELÇUKLU



U.İbrahim Altay
Belediye Başkanı



Ahmet Pekyatırmacı



Ömer Faruk Özcan



Fatma Tuba Sarı



Gürsoy Bilgin



Sabri Çelik



Ertuğrul Uslu



Mehmet Yavaş



Meryem Altıntaş



Hüseyin Korkmaz

MERAM



Fatma Toru
Belediye Başkanı



Osman Elvan



Ali Selvi



Abdullah Topatan



Mehmet Çalık



Mahmut Sami Şahin



M.Bahettin Kulu



Übeyit Aça

KARATAY



Mehmet Hançerli
Belediye Başkanı



Hatice Tulukcu Erkan



Yahya Ak



Mithat Büyükalim



Ethem Örge



Hasan Ali Ünlü



Kasım Küçüktosun



Ahmet Mıhçı

EREĞLİ



Özkan Özgüven
Belediye Başkanı



Ömer Eğer



Erdinç Akça



Kezban Çatlı



Mehmet Tunç



Cengiz Uysal



Mehmet Vehbi Arık

AKŞEHİR



Salih Akkaya
Belediye Başkanı



Tuncay Çoban



Ahmet Yıldız



Haldun Salman



Mehmet Battal

GENEL KURUL ÜYELERİ

BEYŞEHİR


Murat Özaltun
Belediye Başkanı


Mehmet Ali
Gökler


Nihat
Ulu


Nuri
Bülbül


Mustafa
Uzbaş


Selahattin
Mızrak

ÇUMRA


Mehmet Oğuz
Belediye Başkanı


Bekir
Yaşar


Ahmet
Çoban


Harun Reşit
Ersöz


Necip
Çimen


Mehmet
Almalı

SEYDİŞEHİR


Mehmet Tutal
Seydişehir Belediye Başkanı


Şafak
Kabak


Mevlüt
Güray


Hüseyin
Kılıçkaya


Mehmet
Çetiner


Yusuf
Arıcıoğlu

ILGIN


Halil İbrahim Oral
Ilgın Belediye Başkanı


Ahmet
Boran


Mehmet Ali
Turan


Hüsnü
Büyükışık


Servet
Kokulu


Şahin
Karaaslan

CİHANBEYLİ


Mehmet Kale
Cihanbeyli Belediye Başkanı


M.Ali
Duymaz


Nizamettin
Kenanoğlu


Hamit
Avcı


Yakup
Dumanlı


Mehmet
Harımcı

KULU


Ahmet Yıldız
Kulu Belediye Başkanı


Ethem
Ateş


Bekir
Demirtaş


Gündüz
Habiboğlu


Fevzi
Yıldırım


Esin Akgül
Güneş

KARAPINAR


Mehmet Yaka
Karapınar Bld.Bşk.


Mustafa
Kemal Gök


Emre
Özsoy


Osman
Arı

KADINHANI


Mehmet Nuri Ödük
Kadınhanı Bld.Bşk.


Ali
Küçükbal


H.Hasan
Karatoprak


Mehmet
Küçükacar

BOZKIR


İbrahim Gün
Bozkır Belediye Başkanı


Mehmet
Demirel


Hüseyin
Bozkurt


Mustafa
Candan

SARAYÖNÜ


Nafiz Solak
Sarayönü Bld.Bşk.


Hayrettin
Bayraktar


Mevlüt
Göksu


Muammer
Özşahin

YUNAK



A.Emre Demirhan
Belediye Başkanı



Sami
Yaşar



Abdülkadir
Yıldırımer



Ali
Konak

HÜYÜK



Mehmet Şahin
Belediye Başkanı



Mustafa
Sarıaslan



Hasan
Şahin

HADİM



Ahmet Hadimioğlu
Belediye Başkanı



Ramazan
Durmazer



Metin
Kılınçaslan

GÜNEYSINIR



İsmail Özcan
Belediye Başkanı



Mustafa
Kurşun

DEREBUCAK



Ahmet Kısa
Belediye Başkanı



Mehmet
Akkanat

TAŞKENT



Osman Arı
Belediye Başkanı



Kenan
Küçük

AHIRLI



İsa Akgül
Belediye Başkanı



Mehmet
Tugay

HALKAPINAR



Fahri Vardar
Belediye Başkanı



İbrahim
Özkoç

DOĞANHİSAR



Abdullah Koç
Belediye Başkanı



Süleyman
Köprülü



İsmet
Akdeniz

ALTINEKİN



Muharrem Dere
Belediye Başkanı



Seyit Ali
Atçeken



Mehmet
Elmalı

ÇELTİK



Mehmet Ekizoğlu
Belediye Başkanı



Ramazan
Sargın



Yusuf
Şimşek

EMİRGAZİ



Nurişen Koçak
Belediye Başkanı



Ekrem
Bayrakcı

TUZLUKÇU



Nurettin Akbuğa
Belediye Başkanı



Yaşar
Tona

AKÖREN



Ekrem Tulukçu
Belediye Başkanı



Rıfkı
Özbakan

DERBENT



Hamdi Acar
Belediye Başkanı



İsmail
Öz

YALIHÜYÜK



Hasan Koçer
Belediye Başkanı



Mehmet
Gözel

YÖNETİM KURULU



Tahir AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
KOSKİ Yönetim Kurulu Başkanı



İsmail Selim UZBAŞ
KOSKİ Genel Müdürü
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili




Mehmet KÖSEOĞLU
KOSKİ Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi



Muammer PARLAR
KOSKİ Yönetim Kurulu Üyesi

KONYA SU VE KANAİLZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

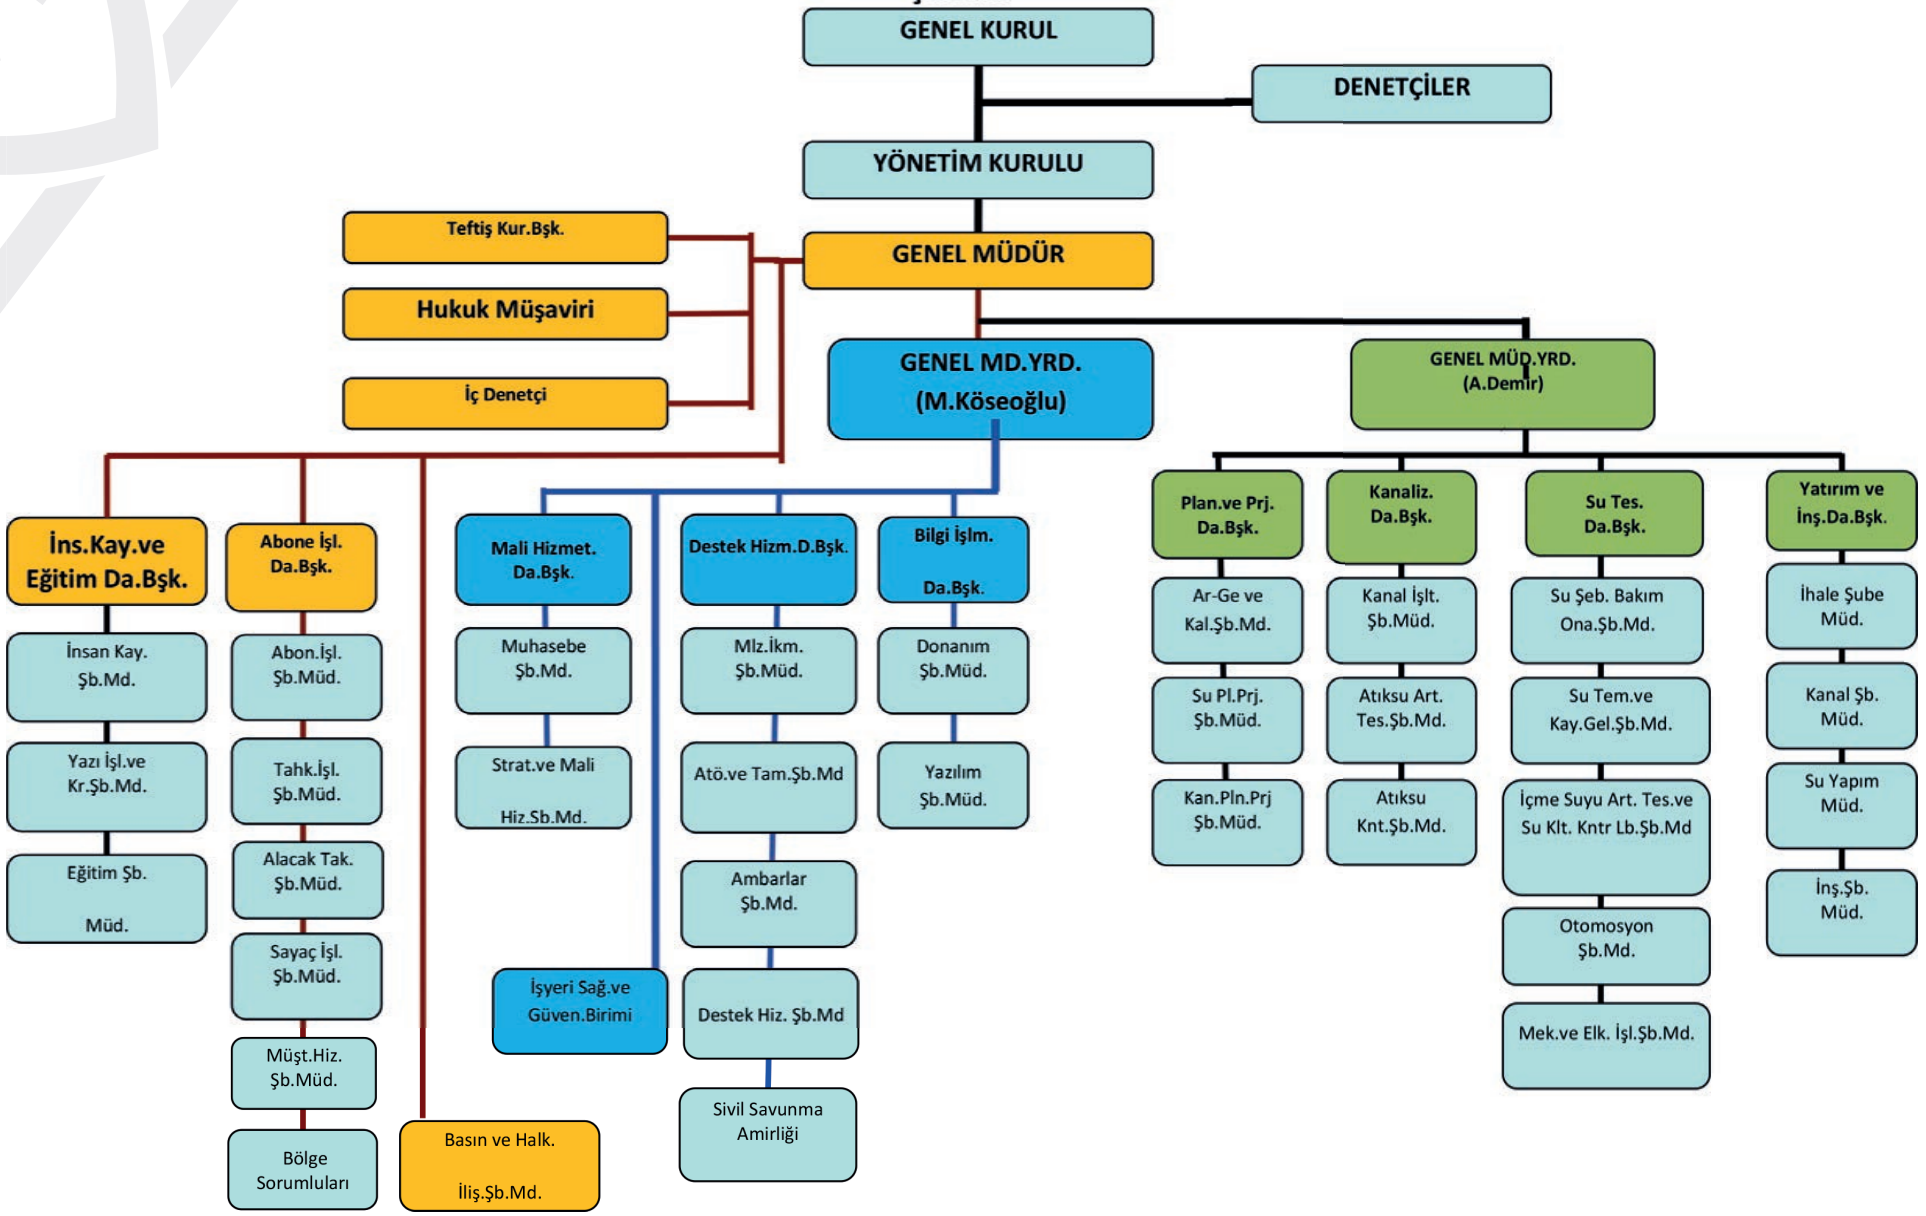

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
YÖNETİM ŞEMASI

I. GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı
2- Teşkilat Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Performans Bilgileri
Performans Sonuçları Tablosu
B- Mali Bilgiler
Mali Tablolar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Güçlü Yönler
B- Zayıflıklar
C- Fırsatlar
D- Tehditler

V- GÜVENCE BEYANLARI



GENEL BİLGİLER

A – MİSYON VE VİZYON
B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER



A – MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili mevzuata uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suları şehir merkezinden uzaklaştırmak ve arıtmaktır.

VİZYONUMUZ

Şehrimize kalite standartları içerisinde ve kesintisiz su ve atık su hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik, öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmaktır.



İLKELERİMİZ

Hizmette Kalite
Su hizmetlerini, vat andaşların ihtiyaçlarını tam ve gerektiği gibi karşılayacak şekilde yürütür.

Verimlilik ve Tasarruf
Hizmetlerin sadece yapılıyor olmasını değil, en az masrafla ve verimli bir şekilde, mevcut kaynaklarla daha çok hizmet üretilmesini benimser.

Yeniliklere Açıklık
Yöneticileri ve her düzeydeki çalışanlar, bilimsel, teknolojik ve toplumsal nitelikli değişimleri öğrenmeye, anlamaya ve uygulamaya açık ve isteklidir. AR-GE çalışmalarına gereken önemi verir.

İnsan Haklarına Saygı
Müşterilerimizin işleri görülürken, insanlık onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınır.

Tarafsızlık ve Eşitlik
Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayrım yapmaz, aynı durumda olanlara aynı biçimde davranır, siyasi veya kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket etmez.

Katılımcılık ve Aktif Hemşerilik
Karar alma ve uygulamada, yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.

Hesap Verebilirlik
Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.

Saydamlık
Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.

Ulaşılabilirlik
Vatandaşlarımızın hizmetlere ulaşabilirliğini etkin olarak sağlar.

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Kanunu ile diğer kanun ve ilgili yönetmeliklerle görev ve yetkileri belirlenmiştir.

KOSKİ Genel Müdürlüğü, Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmekte ve bu konulardaki yetkileri kullanmaktadır.

Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almaktadır.

İçme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmaktadır.

Her türlü taşınır ve taşınmaz satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KOSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmektedir. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün yukarıda sayılan hizmetleri, Konya Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir belediye sınırları dışında da olsa kuruluşumuzca yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarının teklifi ile Bakanlar Kurulu, anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de Genel Müdürlüğümüze verebilir.

KURULUŞUN TABİ OLDUĞU MEVZUAT

Kanun Adı	
Büyükşehir Belediyesi Kanunu	5216
İSKİ Kanunu	2560
Belediyeler Kanunu	5393
Belediye Gelirleri Kanunu	2464
Umumi Hıfzısıhha Kanunu	1593
Türk Ticaret Kanunu	6102
Sular Hakkında Kanunu	831
Çevre Kanunu	2872
Yeraltı Suları Hakkında Kanun	167
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	5018
Kamu İhale Kanunu	4734
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	4735
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	4982
Devlet Memurları Kanunu	657
İş Kanunu	4857
Sosyal Sigortalar Kanunu	506
Emekli Sandığı Kanunu	5434
Kamulaştırma Kanunu	2942
Borçlar Kanunu	6098
Türk Ceza Kanunu	5237
İcra İflas Kanunu	2004
Taşıt kanunu	237
Gelir Vergisi Kanunu	193
KDV Kanunu	3065
Harcırah Kanunu	6245
Damga Vergisi Kanunu	488
Tebligat Kanunu	7201
TDevlet İhale Kanunu	2886
On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması 6360 İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu	6360
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu	5510

C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1) FİZİKSEL YAPI

Genel Müdürlük olarak İdari binalar, tesisler, ek hizmet binaları, su arıtma tesisleri, pompa istasyon binaları, depolar, su ve kanal alt yapıları fiziksel yapımızı teşekkül ettirmektedir.

KOSKİ Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası, Konya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yanındadır. İdari bina 8 katlı olup Genel Müdürlük bu binadadır.

KOSKİ Genel Müdürlüğünün Meram ve Selçuklu ilçelerindeki tesislerinde idari ve teknik büro hizmeti içinde yazı işleri, sağlık hizmetleri, ihale, satın alma ve idari birimleri ile atölyeler, malzeme ikmal ambarları, garajlar, iş makineleri ve baş şoförlük hizmetlerinin yanı sıra şebeke kazı ve bakım ekiplerinin toplanma merkezi, Meram Eski Yol üzerinde Çay suları kontrol birimi, ayrıca Akyokuş Arıtma Tesislerimizde arıtma, kalite kontrol ve pompaj birimleri ile Konya mücavir alanı içerisinde aşağıda belirtilen tesislere sahiptir.

KOSKİ Genel Müdürlüğü Selçuklu ve Meram Tesisleri her biri 34.000 m² dir. Selçuklu tesisimizde 1800 m² kapalı ambar ve 1800 m² açık ambar mevcuttur. Bu tesisimizde 3.600 m² idari büro ve 1.200 m² atölyeler bulunmaktadır. Meram tesisimizde 1800 m² kapalı ambar ve 1800 m² açık ambar mevcut olup, bu tesisimizde 2.400 m² idari büro ve 1.200 m² atölyeler bulunmaktadır. 12 Bölgemizde ve bunlara bağlı alt bölgelerde 38 adet idari bina, 26 adet tesisle hizmet verilmektedir.


Derin Kuyu Adedi:	1204 adet
Ana Pompa İstasyonu Adedi:	53 adet
Terfi Merkezi Adedi:	93 adet
Depo Adedi:	Betonarme gömme su deposu, ayaklı su deposu ve mebran kaplamalı depo olmak üzere toplamda 961 adet su deposu bulunmaktadır.
Toplam Depo Hacmi:	562.440 m³
Arıtma Tesisi Adedi:	1 adet 104.000 m³/gün kapasiteli
Baraj:	1 adet Hacim 32milyon m³
Tatlı Su Çeşme Adedi:	1002 adet
Atölyeler:	4 adet (Elekrik atölyesi, Pompa montaj, bakım onarım atölyesi, Arıtma Tesisleri bakım onarım atölyesi, SCADA atölyesi)
Toplam Şebeke Uzunluğu: uzunluklarına ait	Merkezde 5.349.052 m (4.872.971 m içme ve kullanma suyu şebekesi, 476.081 m tatlı su şebekesi), İlçelerde şebeke veri tespit çalışmaları devam etmektedir.
Sulama Kanalı Uzunluğu:	110 km (97 km beton kanal, 13 km toprak kanal)
SCADA Merkezi:	1 Adet Merkez, 4 Adet Operatör İş İstasyonu
Su Kaynakları:	İçme ve kullanma suyu 1 Adet Baraj (Altınapa), 1661 adet Su kuyusundan ve cazibeli kaynaklardan sağlanmaktadır. Tatlı su 6 adet doğal kaynaktan sağlanmaktadır. (Mukbil, Beypınarı, Kırankaya, Dutlu, Çayırbağı, Dere) Toplam 90 lt/sn
Jeneratör:	46 Adet
Kompresör:	55 Adet
Elektrofizyon Kaynak makinesi:	29 Adet
Metal arama dedektörü:	61 Adet
Boru don çözme makinesi:	19 Adet
Asfalt beton derz kesici:	65 Adet
Elektrikli Seyyar Dalgıç:	86 Adet
Havalı Seyyar Dalgıç:	8 Adet
Boya Kalınlık Ölçme Cihazı:	1 Adet
Seyyar Pompa Test Standı:	1 Adet
Seyyar Kuyu Metre:	10 Adet
Elektronik Bakım Atölyesi:	1 Adet

ARAÇ MAKİNE LİSTESİ

SIRA NO	ARACIN CİNSİ	ADET
1	Binek Arabaları, Pıck-Up Ve Minibüsler	44
2	İş Makinaları	117
3	Donanımlı Araçlar	57
4	Çekilebilir Tip Kanal Temizleme aracı	14
5	Kamyonlar	72
6	Kasalı Ekip Araçları	43
7	Seyyar Hava Kompresörleri	24
8	Otobüs	2
9	Motosiklet	14
10	Dorse ve Römork	8
11	Forklift	4
12	Transpalet	2
13	Kiralık Araçlar	312

2) TEŞKİLAT ŞEMASI

KOSKİ Yönetimi 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlüktür.

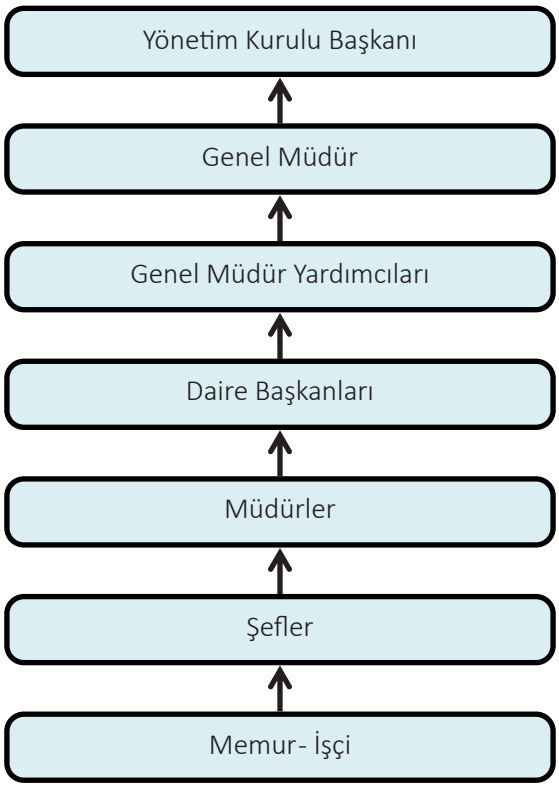

1 - Genel Kurul:

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda KOSKİ Genel Kurulunu oluşturur. KOSKİ Genel Kurulu,2560 sayılı Kanunda yazılı olan yetki ve görevleri çerçevesinde ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere senede iki defa özel gündemle toplanır.

Genel Kurulun görevleri şunlardır:

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
- Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilânçosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- 10 yıldan fazla süreli veya 10 TL.'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,
- Dava değeri 0,10 TL.'sının üstünde olan davaların sulh en ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

2 - Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır.

Yönetim Kuruluna atanacak olanların KOSKİ' nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

- Kuruluş amacına uygun olarak KOSKİ' nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
- Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
- Yıl içinde bütçede yedek ödenekten aktarma yapmak,
- Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
- Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
- Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
- Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
- Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,
- 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 TL.'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
- Dava değeri 0,10 TL.'nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
- Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
- Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,
- Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Büyük Şehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
- Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.

3 - Denetçiler:

KOSKİ' nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en ez birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.

Denetçilerin görevleri şunlardır:

Denetçiler KOSKİ' nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Konya Büyük şehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

4 - Genel Müdürlük:

KOSKİ Genel Müdürü Konya Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.


Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Konya Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

Genel Müdürün görevleri şunlardır:

- KOSKİ' nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı KOSKİ' yi temsil etmek,
- Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,
- 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,
- Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak,
- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
- Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
- Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Çalışma Bölgelerimiz

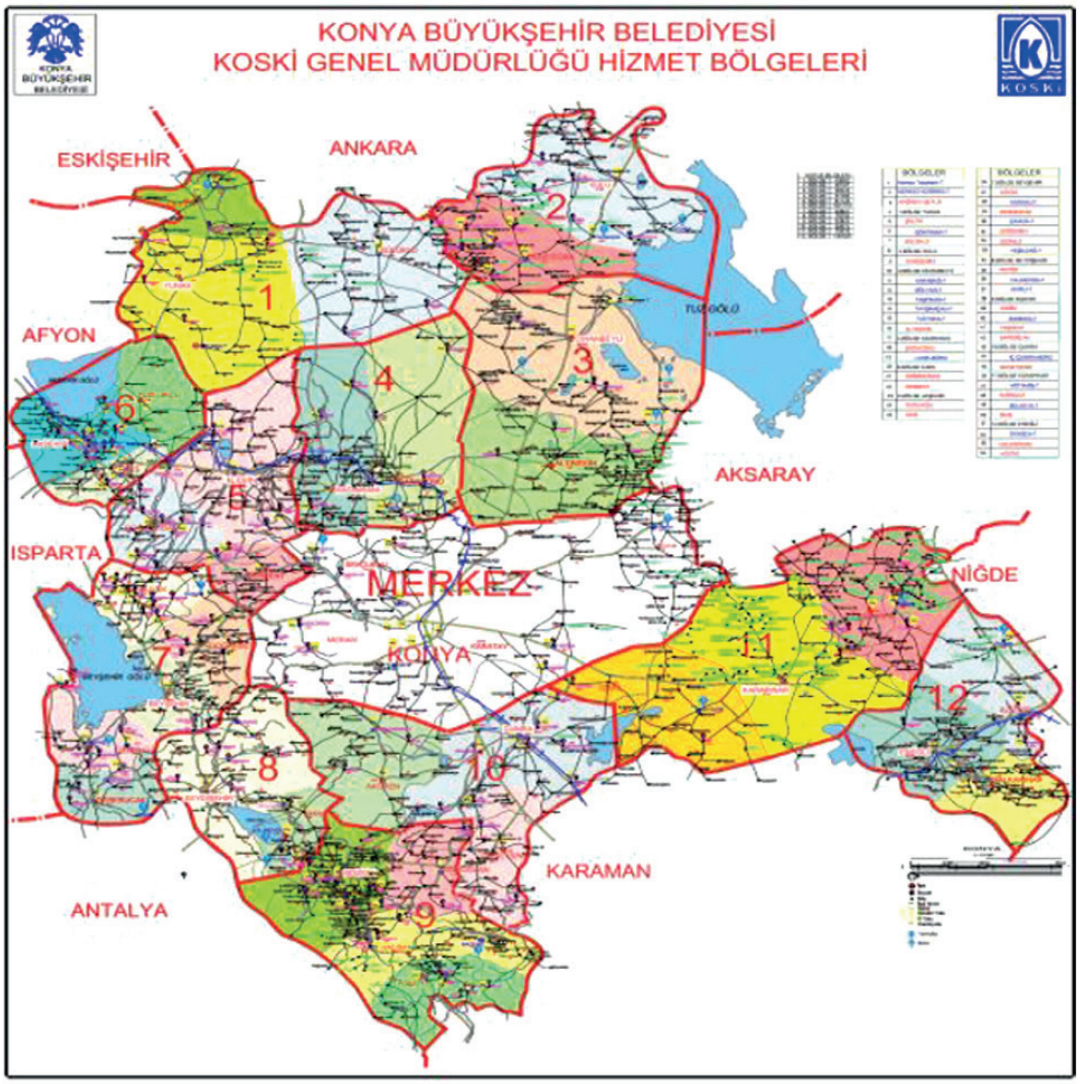

3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

Otomasyonumuzda hizmet veren toplam 19 adet Ana Sunucu(Server) bulunmaktadır. Bu sunucularımız günün ihtiyacına göre gerek yazılım ve gerekse donanım yönünden güçlü ve güncel hale getirilmektedir.

BİLGİSAYAR ARAÇ VE GEREÇLER	ADET
Ana Makine (Server)	19
PC,Notebook	900
Tepegöz	1
Sinevizyon (Projeksiyon)	6
Kamera	150
Araç Telsizi	100
El Telsizi	160
Röle Merkezi	1
Harita Ölçüm Aletleri	10

4 - İNSAN KAYNAKLARI

KADRO	NORM KADRO	DOLU KADRO
Genel Müdür	1	1
Genel Müdür Yardımcısı	3	2
Yönetim Kurulu Üyesi	3	1
İç Denetçi	3	1
Teftiş Kurulu Başkanı	1	1
Daire Başkanı	18	5
1. Hukuk Müşaviri	1	1
Hukuk Müşaviri	2	-
Avukat	22	3
Özel Kalem Müdürü	1	-
Şube Müdürü	55	33
Uzman	13	3
Şef	110	12
Müfettiş	8	-
Müfettiş Yardımcısı	4	-
Mali Hizmetler Uzmanı	4	-
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	-
İdari Personel	380	183
Teknik Personel	400	246
Sağlık Personeli	35	4
Daimi İşçi	516	481
TOPLAM	1582	977

EĞİTİM DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
İlkokul	17	255	272
Ortaokul	36	84	120
Lise	114	121	235
Yüksekokul	160	10	170
Lisans	169	11	180
TOPLAM	**496**	**481**	**977**


YAŞ DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
18 – 30	63	10	73
31 – 40	137	149	286
41 – 50	199	282	481
51 – 60	97	40	137
TOPLAM	**496**	**481**	**977**


İSTİHDAM VE HİZMET DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
0 – 5	199	404	603
6 – 15	32	57	89
16 – 25	211	19	230
26 ve sonrası	54	1	55
TOPLAM	**496**	**481**	**977**

CİNSİYET DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
Bayan	17	8	25
Erkek	479	473	952
TOPLAM	496	481	977


Kuruluşun Personel Ve Ücret Politikası

KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 657 sayılı kanuna tabi personelin maaşları merkezi hükümet tarafından belirlenmekte olup idaremizin bu konuda herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. İşçi personelin maaşları ise toplu iş sözleşmeleri ile tespit edilmektedir. Bu tespit yapılırken eşit işe eşit ücret prensibi göz önünde tutulmaktadır. Kalifiye personel istihdam edilebilmesi için mevzuatımızda gerekli değişiklik yapılmış olup, hizmetine ihtiyaç duyulan mühendis, avukat, doktor gibi mesleklerde, personelin sözleşmeli olarak daha yüksek maaşla istihdam edilebilmesinin yolu açılmıştır.

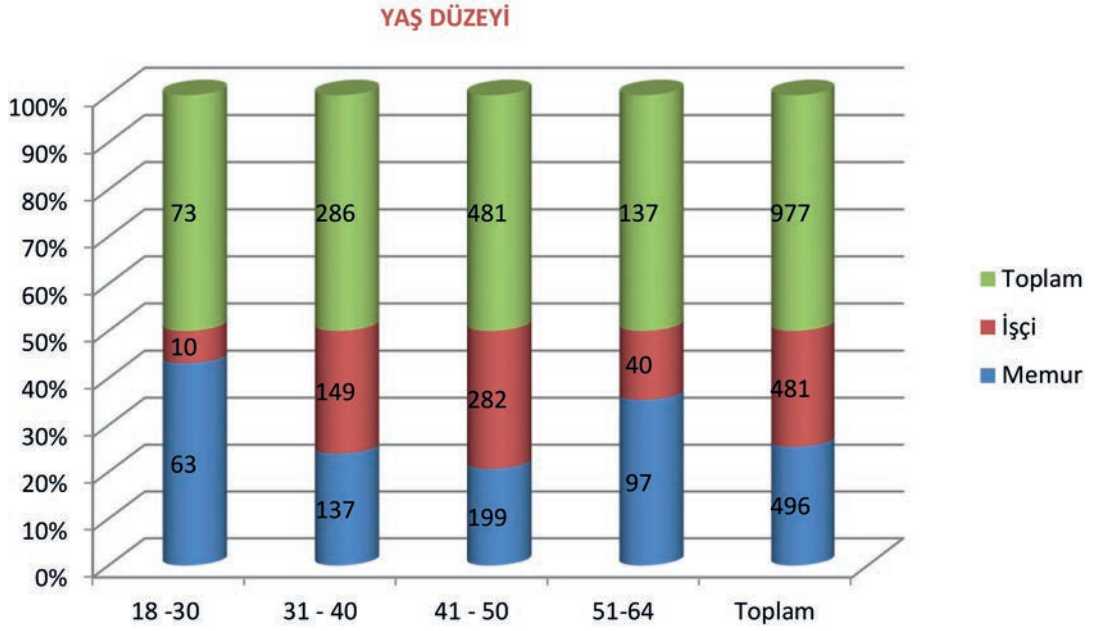

YAŞ DÜZEYİ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
73
10
63
286
149
137
481
282
199
137
40
97
977
481
496
18 -30
31 - 40
41 - 50
51-64
Toplam
Toplam
İşçi
Memur

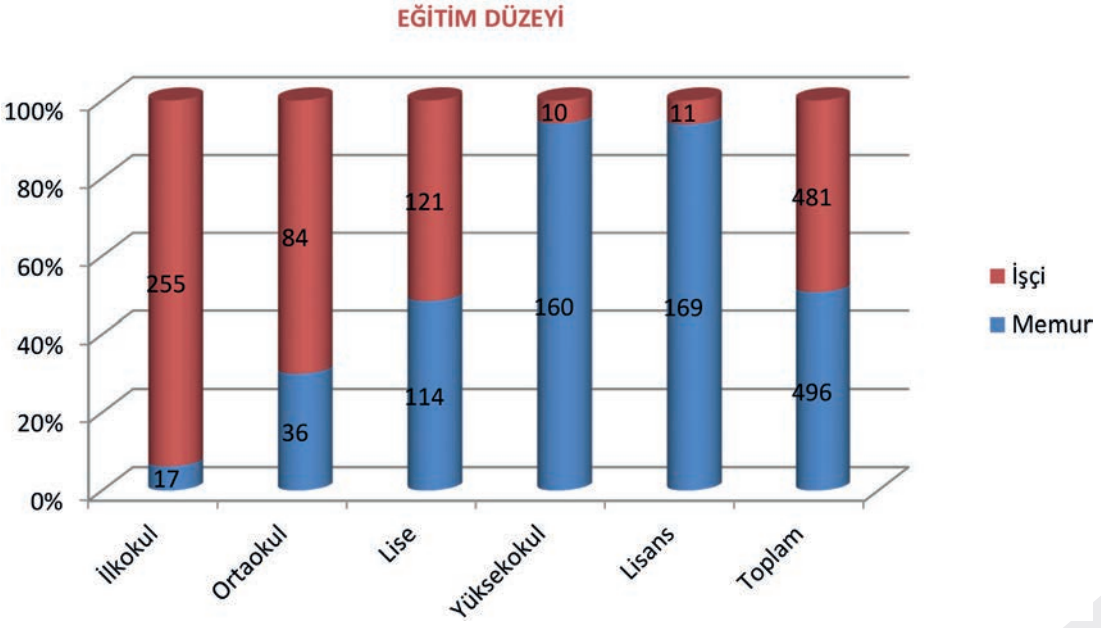
EĞİTİM DÜZEYİ
100%
80%
60%
40%
20%
0%
255
17
84
36
121
114
10
160
11
169
481
496
İlkokul
Ortaokul
Lise
Yüksekokul
Lisans
Toplam
İşçi
Memur

İSTİHDAM VE HİZMET DÜZEYİ

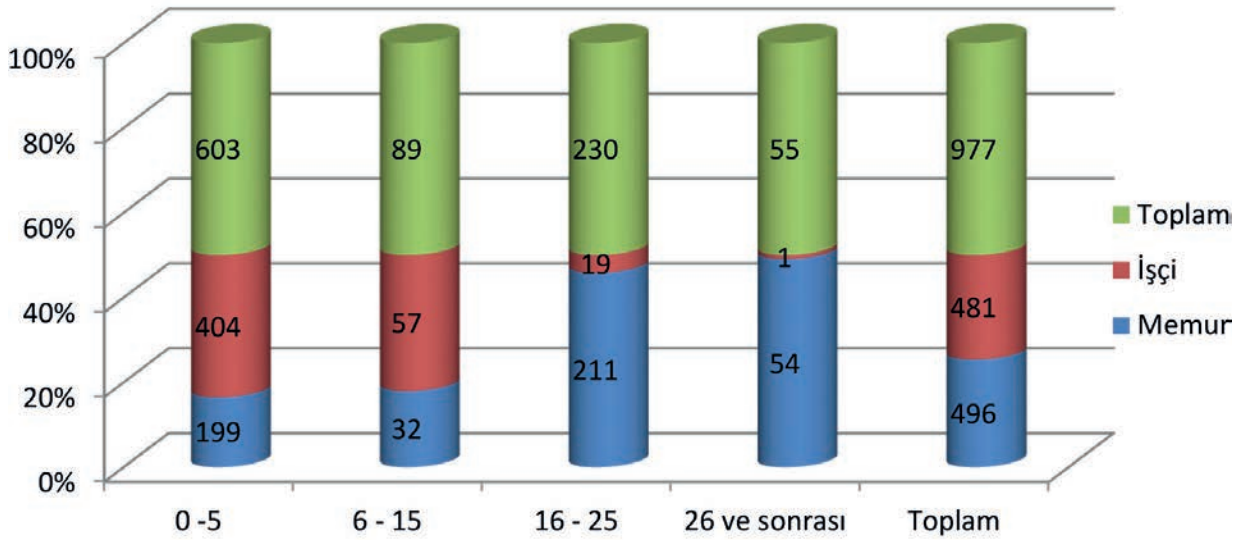

CİNSİYET DURUMU

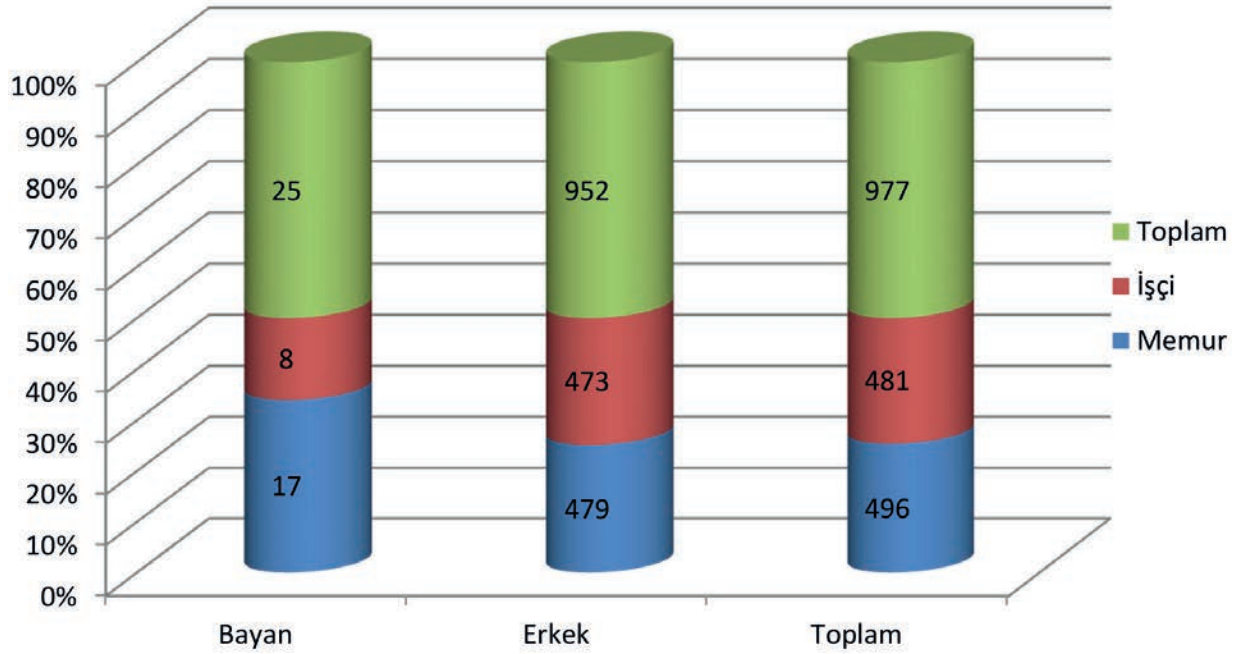

5 – SUNULAN HİZMETLER

KOSKİ su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütür ve bununla ilgili her türlü yatırımı yapar. Vatandaşın içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarını, her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlayarak bunları en uygun şekilde müşterilerine sunar. Bunun için her türlü projeyi yapar, yaptırır ve hayata geçirir. Bu projelere göre yaptırdığı tesisleri hizmete sunar ve gerektiğinde bakım ve onarımlarını yaptırır.

KOSKİ, içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre hareket etmektedir. Su kaynaklarıyla ilgili olarak barajları işletmek, barajlardan arıtma tesislerine gelen ham suyu sağlık şartlarına uygun olarak şebekeye vermek, suyun şehrin en uç noktasına kadar sağlık şartlarına uygunluğunu kontrol etmek KOSKİ' nin sunduğu hizmetler arasındadır. Konya ve ilçelerine suyun dağıtımı ve kumandasını da KOSKİ yapmaktadır. İsale ve şebeke hatlarıyla şehre ulaştırılan su, bu konuda dünyanın gelişmiş teknolojik altyapısına uygun olarak SCADA sistemiyle KOSKİ tarafından tek merkezde kumanda edilmektedir.

Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için mahallinde yönetim sistemini benimseyen KOSKİ, bu amaca uygun olarak şube müdürlükleri kurmuştur. Şube müdürlüklerinde su ve kanalizasyon ile alakalı kamu hizmetleri daha kaliteli ve daha hızlı bir biçimde vatandaşa sunulmaktadır.

KOSKİ, kullanılmış suları uzaklaştırmak için Konya' nın atıksu havzalarında yatırımlar yapmaktadır. Buna göre, kullanılmış suların ve yağmur sularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması da KOSKİ' nin sunduğu hizmetler arasındadır.

Konya' nın doğal güzelliklerini atıksu tehdidinden korumak için atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri gibi atıksu toplayıcı sistemine ait unsurlara yönelik öncelikleri belirler önlemleri tespit eder. KOSKİ kullanılmış suları ve yağmur sularını toplar, yerleşim merkezlerinden uzaklaştırarak, zararsız bir biçimde deşarj noktalarına ulaştırır ve gerekirse yeniden yararlanır.

KOSKİ bu amaçlara yönelik projeler gerçekleştirir. Yine bunun için hizmete aldığı tesisleri işletir, gerekli bakım ve onarımını yapar. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Kurulu tarafından devredilen ıslah yetkisi çerçevesinde derelerin ıslah hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Derelerin yanı sıra yağmur suyu kolektörlerinin temizliği ve onarımı için ilgili belediye ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Yine bu tesislere ait belli noktalarda bulunan ızgara, taş ve kum tutucuların temizlik ve onarım çalışmaları KOSKİ tarafından yapılmaktadır.



YATIRIM İNŞAAT


DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015 YILI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILAN İHALELER

SIRA NO	İŞİN ADI	YAKLAŞIK MALİYET	İHALE BEDELİ	KİME VERİLDİĞİ
1	MUHTELİF İLÇELERDE İÇME SUYU KUYULARINA OG TESİS YAPIM İŞİ	229.769,57	164.620,00	ONUR MÜH. - ONUR DİNÇER
2	BEYŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ REVİZYONU İŞİ	3.549.008,05	2.520.000,00	DETAY ARITMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
3	2015 YILI MERAM KANALİZASYON YAPIM VE ISLAHI İŞİ	4.885.427,10	3.442.610,00	İMEN MÜH. İNŞ. NAK. TİC. LTD. ŞTİ.
4	2015 YILI KARATAY KANALİZASYON YAPIM VE ISLAHI İŞİ	5.848.128,98	3.938.104,00	KAMURAN İNAN - ÜÇGEN İNŞ. TAAH.
5	2015 YILI 3. KISIM (KARKIN - YENİSU) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	11.125.962,24	9.258.505,00	KAMURAN İNAN - ÜÇGEN İNŞ. TAAH.
6	2015 YILI SELÇUKLU KANALİZASYON YAPIMI VE ISLAHI İŞİ	5.975.111,96	3.925.080,80	İMDAT ŞEN - LAPİDEM YAPI LTD.ŞTİ. (ORTAK GİRİŞİMİ)
7	BEYŞEHİR İÇME SUYU PROJESİ YAPTIRILMASI İŞİ	572.033,33	187.000,00	AZBOY MÜH. HİZ. İNŞ. MAD. MAK. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
8	KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ YAPTIRILMASI İŞİ	416.333,33	298.000,00	AZBOY MÜH. HİZ. İNŞ. MAD. MAK. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
9	2015 YILI KONYA MERKEZ SU ŞEBEKE ISLAHI İÇİN BORU DÖŞEME İŞİ	5.104.130,26	3.393.248,00	FATİH ARSLAN - FAY İNŞ. TAAH.
10	2015 YILI KARATAY-MERAM İLÇELERİ YENİ SU ŞEBEKE TESİSİ VE ISLAHI İÇİN BORU DÖŞEME İŞİ	9.573.286,81	4.987.772,00	ALTSİS MÜH. HİZ. İNŞ. TAAH. İML. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
11	2015 YILI SELÇUKLU İLÇESİ SU ŞEBEKE ISLAHI İÇİN BORU DÖŞEME İŞİ	4.548.971,17	2.890.373,00	ALTSİS MÜH. HİZ. İNŞ. TAAH. İML. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
12	2015 YILI ILGIN İLÇESİ KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	8.815.922,58	6.891.150,00	ALİ ÖZTAŞ - VURALLAR KUM TESİSLERİ NAK. MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (ORTAK GİRİŞİMİ)
13	SARAYÖNÜ - HÜYÜK - DERBENT ATIKSU ARITMA TESİSLERİ UYGULAMA PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİ	235.250,00	123.350,00	MENA YAPI TAS. VE TİC. LTD. ŞTİ.
14	2015 YILI 1.GRUP ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ VE SU DEPOLARI YAPIM İŞİ	4.338.549,90	3.666.025,00	UZ-AY İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
15	TAŞRA (EREĞLİ MERKEZ VE EREĞLİ KUTÖREN 2000 M3'LÜK) GÖMME SU DEPOSU YAPTIRILMASI İŞİ	2.195.606,74	1.829.000,00	VOLKAN ŞANAL İNŞ. MÜH.
16	SU SONDAJ KUYUSU AÇIM İŞİ	1.217.102,50	787.840,00	ALİ ÖTKÜN
17	2015 YILI EREĞLİ - NAMIK KEMAL KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	4.720.459,36	3.107.632,14	ERDİNÇ İNŞ. MAD. TİC. VE SAN. A.Ş.
18	KONYA İLİ MUHTELİF İLÇELERİNDE İÇME SUYU KUYULARINI BESLEYECEK ENH TESİSİ YAPIM İŞİ	230.362,60	179.300,00	AEN İNŞ. MAD. NAK. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
19	2015 YILI 4. KISIM (DERBENT - KARAAĞA) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	6.839.074,27	5.669.000,00	SERİL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
20	2015 YILI KONYA MERKEZ MAVİ TÜNEL İSALE VE TERFİ HATLARI YAPIM İŞİ	11.976.829,41	6.880.528,00	ATAK İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
21	2015 YILI 9'UNCU KISIM (YUNAK PİRİBEYLİ - KUZÖREN) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	8.297.292,60	7.470.700,00	ATAK İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
22	2015 YILI 2'NCİ KISIM EMİRGAZİ (DEMİRCİ - IŞIKLAR) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	3.373.456,30	2.742.130,00	İSKİT YAPI MÜH. MİM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
23	2015 YILI 2'NCİ KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	9.889.944,03	7.217.268,60	FATİH ARSLAN - FAY İNŞ. TAAH.
24	2015 YILI 1'NCİ KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	7.222.288,41	6.860.952,00	FATİH ARSLAN - FAY İNŞ. TAAH.
25	2015 YILI 3'NCÜ KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	8.979.130,91	6.842.441,00	ALTSİS MÜH. HİZ. İNŞ. TAAH. İML. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


26	2015 YILI 1'NCİ KISIM İÇME SUYU ŞEBEKESİ BORU VE EKİPMANLARI ONARIMI VE YENİLENMESİ İŞİ	2.682.234,60	1.767.500,00	ALTYAPI TEM. TEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
27	2015 YILI 2'NCİ KISIM İÇME SUYU ŞEBEKESİ BORU VE EKİPMANLARI ONARIMI VE YENİLENMESİ İŞİ	2.075.591,20	1.318.250,00	ALTYAPI TEM. TEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
28	KONYA İLİ SELÇUKLU, KADINHANI VE ILGIN İLÇELERİ MUHTELİF YERLERDE İÇME SUYU OG TESİSİ YAPIM İŞİ	143.606,48	107.300,00	ENES ELEK. İNŞ. TAR. HAYV. NAK. OTO. PET. VE TİC. LTD. ŞTİ.
29	2015 YILI 2'NCİ BÖLGE SU SONDAJ KUYUSU AÇIM İŞİ	1.063.630,67	803.880,00	ÜMİT ZOR - DELGİ YERALTI ARAŞTIMA VE SONDAJ
30	2015 YILI 1'NCİ KISIM (ÇAYIRBAĞI - KARADİĞİN - ÇARIKLAR) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	10.745.868,12	8.364.140,00	TİKA MÜH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
31	2015 YILI II'NCİ GRUP ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ VE SU DEPOLARI YAPIM İŞİ	8.843.592,35	8.740.600,00	ALİ EKREM ERGÜN
32	2015 YILI 6'NCI KISIM (KOÇYAZI - KARACADAĞ) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	11.814.127,80	8.216.000,00	SERİL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - FM MÜHENDİSLİK FATİH MEHMET ERGÜÇLÜ (İŞ ORTAKLIĞI)
33	2015 YILI 7'NCİ KISIM (BADEMLİ - YALINÇEVRE) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	1.881.999,75	1.474.617,00	AHMET KIRIKÇI
34	2015 YILI 10'NCU KISIM KONYA MERKEZ VE TAŞRA MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	10.262.217,81	8.885.050,00	SERİL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - FM MÜHENDİSLİK FATİH MEHMET ERGÜÇLÜ (İŞ ORTAKLIĞI)
35	2015 YILI TAŞKENT KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	2.277.500,30	1.784.410,00	SİDAR İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
36	KONYA İLİ 5 İLÇEDE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ BAKIM VE ONARIM İŞİ	649.455,18		İPTAL EDİLDİ
37	KONYA İLİ 12 MAHALLEDE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ BAKIM VE ONARIM İŞİ	486.119,64		İPTAL EDİLDİ
38	2015 YILI 3'NCÜ BÖLGE SU SONDAJ KUYUSU AÇIM İŞİ	1.053.768,75	678.310,00	SELİM DÖNDER - ARAS SONDAJ
39	ORTAKARAÖREN - AKKİSE ORTAK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	2.266.687,98	1.375.000,00	AHMET SARAL
40	2015 YILI 8'NCİ KISIM (GÜNEYSINIR - GÜRAĞAÇ) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	6.511.489,45	4.690.405,00	SİDAR İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
41	CİHANBEYLİ - DEREBUCAK - YENİCEOBA - HOTAMIŞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ	332.000,00	182.000,00	ARBİOTEK ÇEVRE İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
42	ZENGEN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	841.285,80	544.000,00	ARMASAN ARITMA MAD. İNŞ. GID. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
	GENEL TOPLAM	194.090.608,29	144.204.091,54	

2015 YILI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN İHALELERİN MALİYET TOPLAMASI

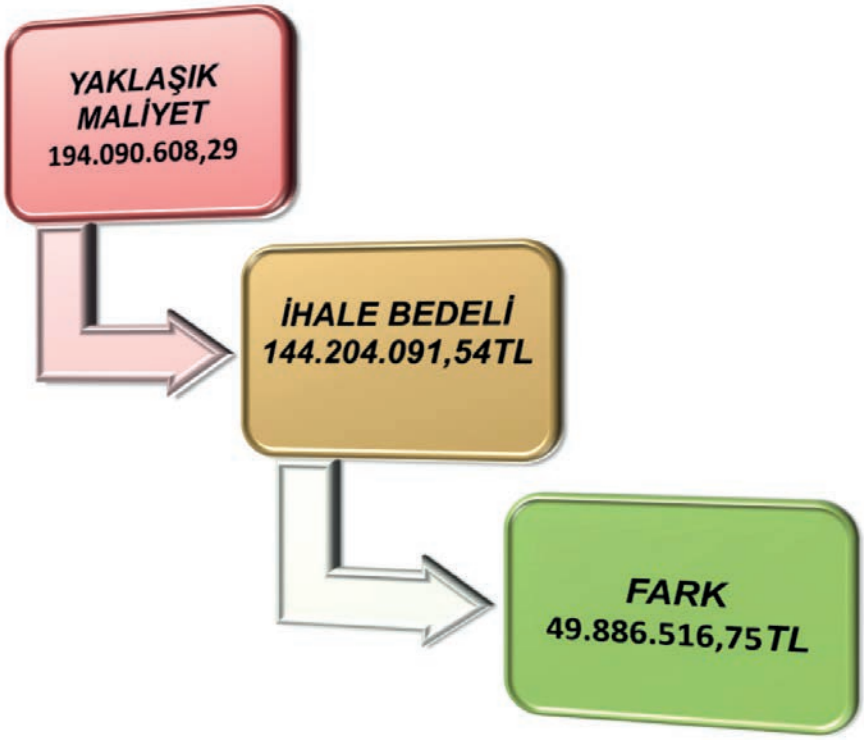



İHALE SÜRECİMİZ

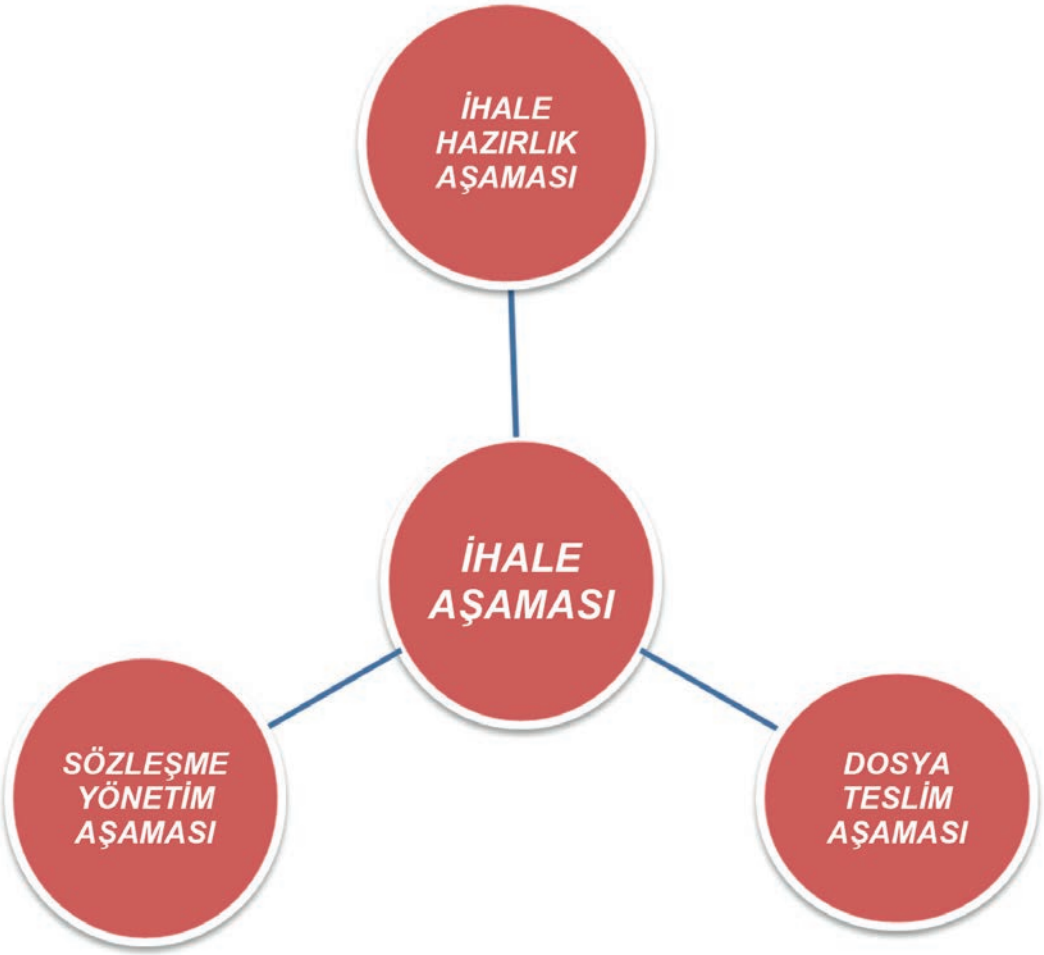


Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da titiz bir şekilde genel müdürlüğümüzce yerine getirilmesi uygun görülen mal alımı, hizmet alımı ve özellikle yapım ihalelerinin zamanında karşılanmasını güvenirlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yerine getirmeye azami gayret sarf etmiş, bundan sonrada aynı titizlikle devam edecektir.


KANALİZASYON HATTI UZUNLUKLARI(Mt)

YENİ ŞEBEKE

İLÇE	2014	2015	TOPLAM
KARATAY	39.827,25	46.061,20	85.888,45
MERAM	62.097,55	68.407,50	130.505,05
SELÇUKLU	23.879,75	27.490,75	51.370,50
AKÖREN		644,9	644,90
AKŞEHİR		819,1	819,10
BEYŞEHİR		2.052,40	2.052,40
BOZKIR		135,3	135,30
CİHANBEYLİ	245,1	3.635,60	3.880,70
ÇUMRA	2.649,45	45.044,00	47.693,45
DERBENT		9.045,70	9.045,70
DOĞANHİSAR		14.472,95	14.472,95
EMİRGAZİ		7.972,75	7.972,75
EREĞLİ	17.932,05	29.610,90	47.542,95
GÜNEYSINIR		3.154,10	3.154,10
HADİM		4.715,10	4.715,10
HALKAPINAR		3.441,35	3.441,35
ILGIN		18.831,10	18.831,10
KADINHANI		37.834,24	37.834,24
KARAPINAR	57.313,75	4.089,50	61.403,25
KULU	14.863,10	73.529,85	88.392,95
SARAYÖNÜ	1.409,10	23.007,40	24.416,50
SEYDİŞEHİR	217,4	3.877,95	4.095,35
TAŞKENT		3.809,25	3.809,25
TUZLUKÇU	0	5.418,60	5.418,60
YUNAK		49.155,80	49.155,80
TOPLAM	**220.434,50**	**486.257,29**	**706.691,79**

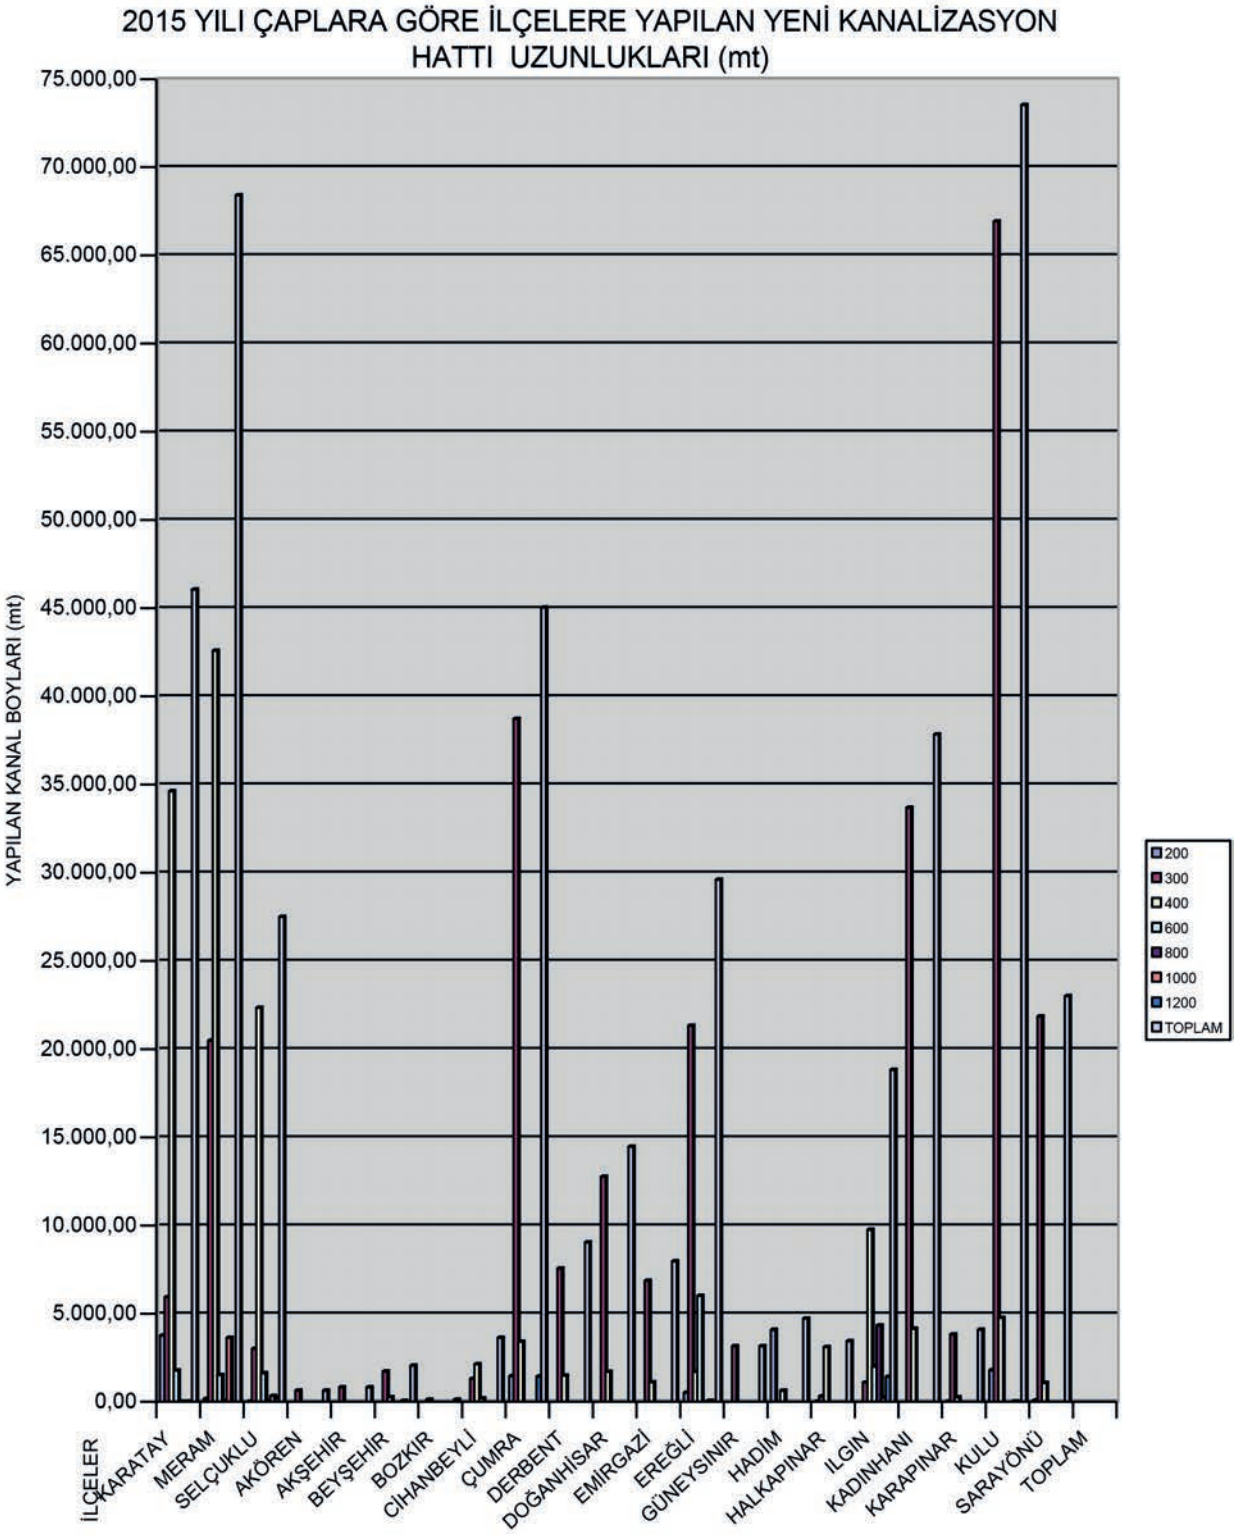
2015 YILI ÇAPLARA GÖRE İLÇELERE YAPILAN YENİ KANALİZASYON HATTI UZUNLUKLARI (mt)
YAPILAN KANAL BOYLARI (mt)
75.000,00
70.000,00
65.000,00
60.000,00
55.000,00
50.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
İLÇELER
KARATAY
MERAM
SELÇUKLU
AKÖREN
AKŞEHİR
BEYŞEHİR
BOZKIR
CİHANBEYLİ
ÇUMRA
DERBENT
DOĞANHİSAR
EMİRGAZİ
EREĞLİ
GÜNEYSINIR
HADİM
HALKAPINAR
ILGIN
KADINHANI
KARAPINAR
KULU
SARAYÖNÜ
TOPLAM
200
300
400
600
800
1000
1200
TOPLAM


2015 YILINDA ÇAPLARA GÖRE İLÇELERE YAPILAN ISLAH KANAL UZUNLUKLARI (mt)

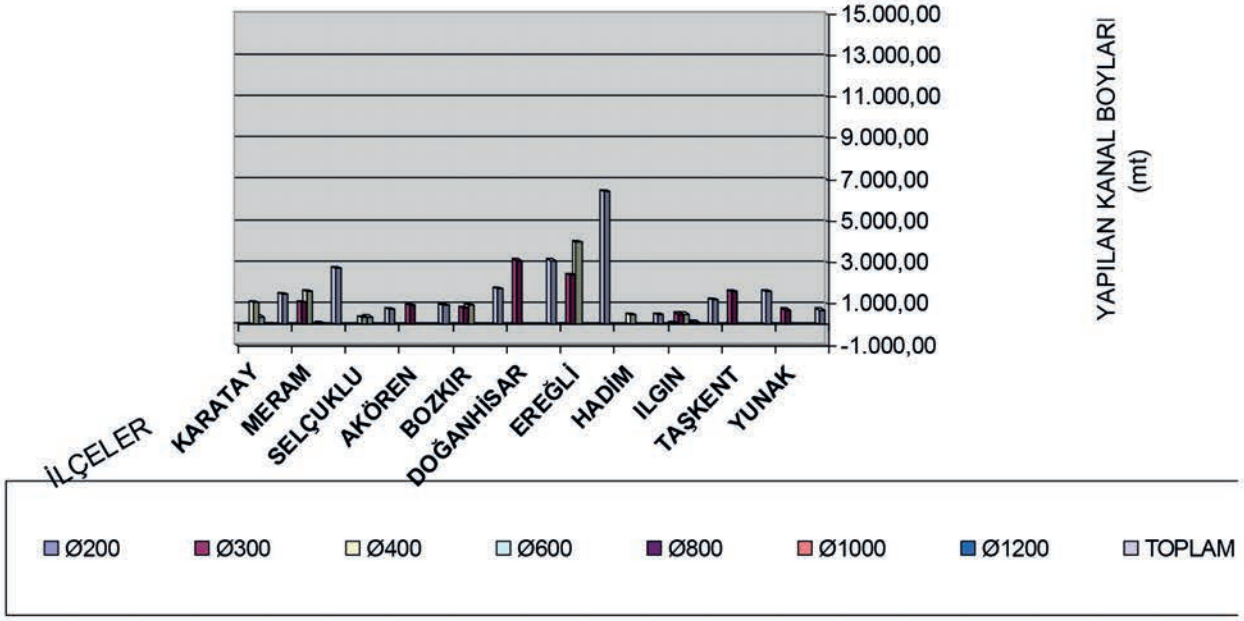


KONYA GENELİNDE MEVCUT ISLAH KANALİZASYON DURUMU

İLÇE	2010 ÖNCESİ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOPLAM
KARATAY	27,439.20	5,323.15	1,643.75	3,801.45	621.00	111.50	1,453.90	40,393.95
MERAM	36,936.85	4,391.85	2,707.85	1,165.60	748.20	2,448.25	2,732.30	51,130.90
SELÇUKLU	52,236.55	1,474.05	1,238.70	2,870.90	3,002.60	1,317.65	725.10	62,865.55
AKÖREN							960.80	960.80
BOZKIR							1,730.00	1,730.00
DOĞANHİSAR							3,096.10	3,096.10
EREĞLİ						614.80	6,417.85	7,032.65
HADİM							490.10	490.10
ILGIN							1,193.65	1,193.65
TAŞKENT							1,618.80	1,618.80
YUNAK							711.30	711.30
TOPLAM	**116,612.60**	**11,189.05**	**5,590.30**	**7,837.95**	**4,371.80**	**4,492.20**	**21,129.90**	171,223.80


2006-2015 YILLARINDA YAPILAN KANAL UZUNLUKLARI (MT)

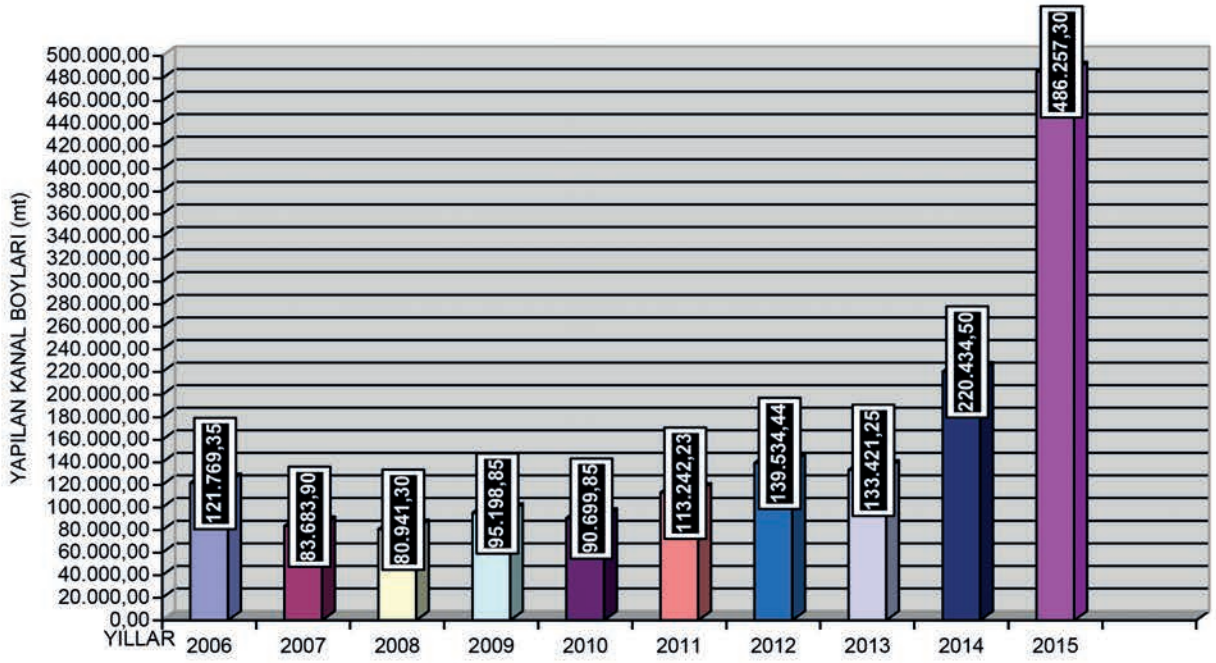

2006-2015 YILLARINDA YAPILAN KANAL UZUNLUKLARI VE ARTIŞ DURUMU (km)

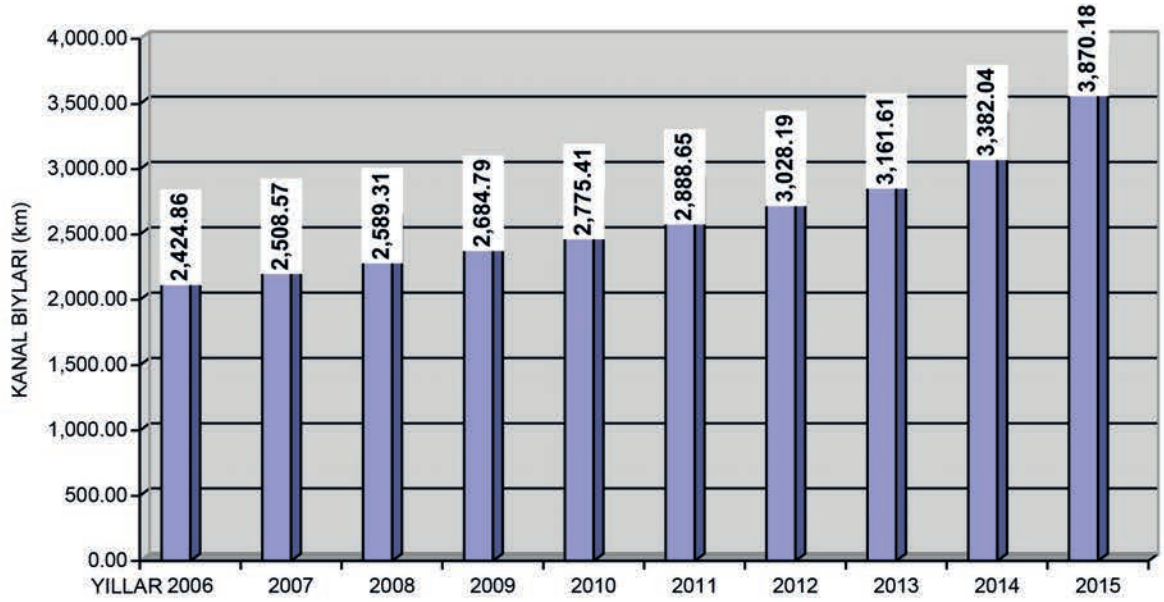

2006-2015 YILLARINDA İLÇELERE YAPILAN KANAL UZUNLUKLARI (mt)

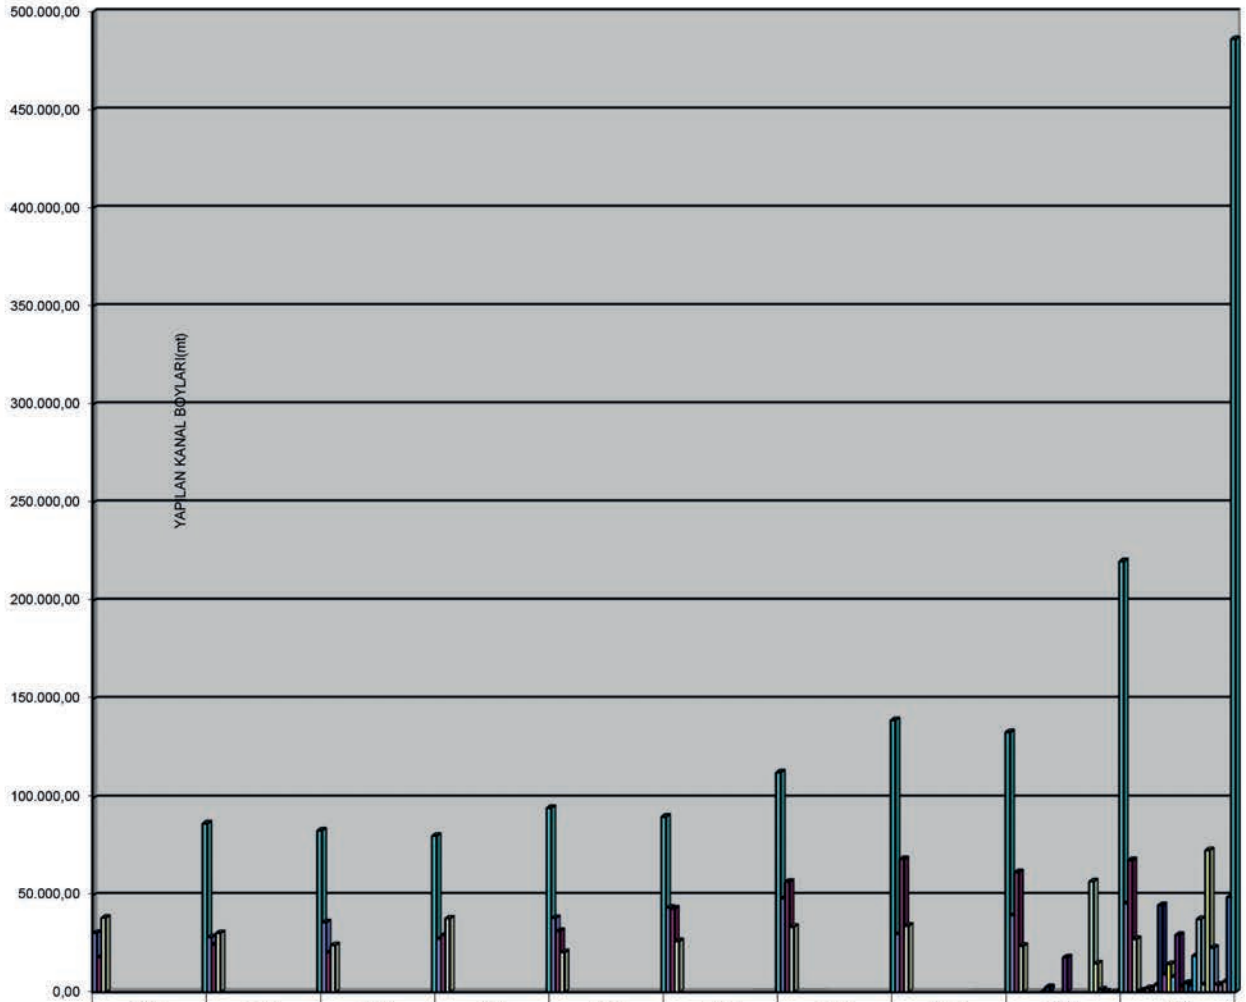

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
KARATAY	30.635,35	28.452,33	36.113,75	27.586,80	38.351,85	43.657,80	48.527,45	30.055,70	39.827,25	46.061,20
MERAM	18.155,40	24.690,80	20.602,65	29.489,10	31.705,50	43.230,53	57.188,26	68.988,45	62.097,55	68.407,50
SELÇUKLU	38.478,60	30.550,55	24.224,90	38.122,95	20.642,50	26.354,60	33.818,73	34.377,10	23.879,75	27.490,75
AKÖREN										644,9
AKŞEHİR										819,1
BEYŞEHİR										2.052,40
BOZKIR										135,3
CİHANBEYLİ									245,1	3.635,60
ÇUMRA									2.649,45	45.044,00
DERBENT										9.045,70
DOĞANHİSAR										14.472,95
EMİRGAZİ										7.972,75
EREĞLİ									17.932,05	29.610,90
GÜNEYSINIR										3.154,10
HADİM										4.715,10
HALKAPINAR										3.441,35
ILGIN										18.831,10
KADINHANI										37.834,24
KARAPINAR									57.313,75	4.089,50
KULU									14.863,10	73.529,85
SARAYÖNÜ									1.409,10	23.007,40
SEYDİŞEHİR									217,4	3.877,95
TAŞKENT										3.809,25
TUZLUKÇU									0	5.418,60

İŞİN ADI	2014 YILI 1.KISIM EREĞLİ-ZENGEN KAN. İNŞ.İŞİ (Sari)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	11.06.2014		
MÜTEAHHİDİ	İSKİT YAPI		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.942.290,00	TL	
BÜTÇE	2.500.000,00	TL	% 94.25
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 1.463.540,58 2015 YILI: 333.991,73 TOPLAM :1.830.532,31	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	27.000,00	MT	% 97,99
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 20.651,95 2015 YILI: 5.806,80 TOPLAM : 26.458,75	MT	



İŞİN ADI	2014 YILI MUHTELİF SOKAKLAR KAN. YAPIM VE ISLAHI İŞİ (Sari)		
İŞİN AMACI	2014 yılı yatırım programlarına alınmayıp yapımı aciliyet gerektiren Konya genelindeki yerlerin yapılabilmesi için ihale edilen sokakları kapsamaktadır(sari)		
İHALE TARİHİ	26.06.2014		
MÜTEAHHİDİ	FATİH ASLAN FAY İNŞ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	5.692.530,00	TL	
BÜTÇE	6.500.000,00	TL	% 98,44
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 5.125.888,46 2015 YILI: 411.648,47 TOPLAM: 5.537.506,93	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	30.000,000	MT	% 77,80
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 21.149,25 2015 YILI: 2.191,00 TOPLAM: 23.340,25	MT	



İŞİN ADI	2014 YILI HOTAMIŞ KAN. YAPIM İŞİ (Sari)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	16.07.2014		
MÜTEAHHİDİ	ERÇAL İNŞ. SAN.		
SÖZLEŞME BEDELİ	2.609.870,40	TL	
BÜTÇE	3.500.00,00	TL	% 99,25
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 2.205.335,84 2015 YILI: 384.864,06 TOPLAM: 2.590.199,90	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	33.308,00	MT	% 101.07
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 28.330,85 2015 YILI: 5.336,55 TOPLAM: 33.667,40	MT	



İŞİN ADI	2014 YILI 3.KISIM (İSLİK) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ (Sari)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	23.07.2014		
MÜTEAHHİDİ	HAYATİ DÜNDAR İNŞ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.722.000,00	TL	
BÜTÇE	3.000.000,00	TL	% 97,03
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 1.569.428,31 2015 YILI: 101.357,28 TOPLAM: 1.670.785,59	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	31.280,00	MT	% 100,64
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 31.396,50 2015 YILI: 11.30 TOPLAM: 31.407,80	MT	



İŞİN ADI	2014 YILI 5. KISIM (KAVAK-OVAKAVAĞI) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ (Sari)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	12.08.2014		
MÜTEAHHİDİ	KAMURAN İNAN ÜÇGEN İNŞ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	3.428.514,00	TL	
BÜTÇE	5.300.000,00	TL	% 88,00
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 1.293.908,00 2015 YILI: 1.747.196,06 TOPLAM: 3.017.104,06	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	40.170,00	MT	% 70,49
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 15.768,20 2015 YILI: 12.548,10 TOPLAM: 28.316,30	MT	



İŞİN ADI	2014 YILI 4. KISIM (TUZYAKA-BEŞKARDEŞ) KANALİZASYON İNŞAAT İŞİ (Sari)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	13.08.2014		
MÜTEAHHİDİ	TİKA MÜH. MAD. İNŞ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.429.667,00	TL	
BÜTÇE	6.500.000,00	TL	% 99,87
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI:1.096.473,45 2015 YILI:4.212.631,61 TOPLAM:5.309.105,06	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	65.195,00	MT	% 95,52
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 19.541,40 2015 YILI: 42.731,30 TOPLAM: 62.272,70	MT	



İŞİN ADI	2014 YILI 6. KISIM (MUHTELİF BELDELER) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ (Sari)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	01.10.2014		
MÜTEAHHİDİ	FATİH ARSLAN FAY İNŞ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	2.559.910,00	TL	
BÜTÇE	3.500.000,00	TL	% 95,16
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 242.868,36 2015 YILI:2.193.180,40 TOPLAM :2.436.048,79	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	25.000,00	MT	% 74,50
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 1.724,00 2015 YILI:16.900,40 TOPLAM :18.624,40	MT	



İŞİN ADI	2014 YILI ATLANTI-GÖZLÜ KANALİZASYON YAPIM İŞİ (Sari)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	02.10.2014		
MÜTEAHHİDİ	HAYATİ DÜNDAR İNŞ. MÜH.		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.631.000,00	TL	
BÜTÇE	7.000.000,00	TL	% 85,00
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 132.302,65 2015 YILI:3.804.127,22 TOPLAM:3.936.429,87	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	67.900,00	MT	% 82,19
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 2.108,10 2015 YILI:53.700,80 TOPLAM: 55.808,90	MT	



İŞİN ADI	2014 YILI KAŞINHANI VE MRK. MUH.SOK. KAN.YAPIM İŞİ (Sari)		
İŞİN AMACI	2014 yılı yatırım programlarına alınmayıp yapımı acili yet gerektiren Konya genelindeki yerler ile Kaşınhanı bölgesindeki yerleri kapsamaktadır.		
İHALE TARİHİ	03.12.2014		
MÜTEAHHİDİ	FM MÜHENDİSLİK		
SÖZLEŞME BEDELİ	5.637.175,00	TL	
BÜTÇE	9.000.000,00	TL	% 99,93
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI:0,00 2015 YILI:5.632.951,62 TOPLAM :5.632.951,62	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	40.000,00	MT	% 93,81
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 YILI: 0,00 2015 YILI: 37.525,55 TOPLAM : 37.525,55	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI MERAM KAN. YAP. VE ISLAH İŞİ		
İŞİN AMACI	Meram İlçesi sınırlarında yeni açılan cadde ve sokakların, daha önceden kanalizasyon şebekesi yapılmış olup ekonomik ömrünü tamamlayan cadde ve sokakların ve işletme tarafından talep edilen cadde ve sokakların kanalizasyon şebekelerinin yapılmasını kapsamaktadır. Bunların tamamlanmasıyla birlikte eksiksiz bir altyapı ve müdahale edilmeden kullanılacak bir üstyapı amaçlanmaktadır.		
İHALE TARİHİ	06.02.2015		
MÜTEAHHİDİ	İMEN MÜHENDİSLİK		
SÖZLEŞME BEDELİ	3.442.610,00	TL	
BÜTÇE	5.000.000,00	TL	% 95,46
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	3.286.403,72	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	25.000,00	MT	% 97,16
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	24.291,30	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI KARATAY KAN. YAPIM VE ISLAH İŞİ		
İŞİN AMACI	Karatay İlçesi sınırlarında yeni açılan cadde ve sokakların, daha önceden kanalizasyon şebekesi yapılmış olup ekonomik ömrünü tamamlayan cadde ve sokakların ve işletme tarafından talep edilen cadde ve sokakların kanalizasyon şebekelerinin yapılmasını kapsamaktadır. Bunların tamamlanmasıyla birlikte eksiksiz bir altyapı ve müdahale edilmeden kullanılacak bir üstyapı amaçlanmaktadır.		
İHALE TARİHİ	09.02.2015		
MÜTEAHHİDİ	KAMURAN İNAN-ÜÇGEN İNŞ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	3.938.104,00	TL	
BÜTÇE	6.000.000,00	TL	% 97,53
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	3.840.975,19	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	24.940,00	MT	% 107,85
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	26.898,90	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI SELÇUKLU KAN YAP. VE ISLAH İŞİ		
İŞİN AMACI	Selçuklu İlçesi sınırlarında yeni açılan cadde ve sokakların, daha önceden kanalizasyon şebekesi yapılmış olup ekonomik ömrünü tamamlayan cadde ve sokakların ve işletme tarafından talep edilen cadde ve sokakların kanalizasyon şebekelerinin yapılmasını kapsamaktadır. Bunların tamamlanmasıyla birlikte eksiksiz bir altyapı ve müdahale edilmeden kullanılacak bir üstyapı amaçlanmaktadır.		
İHALE TARİHİ	12.02.2015		
MÜTEAHHİDİ	İMDAT ŞEN-LAPİDEM		
SÖZLEŞME BEDELİ	3.925.080,80	TL	
BÜTÇE	6.000.000,00	TL	% 98,47
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	3.865.132,83	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	25.000,00	MT	% 108,61
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	27.152,10	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI 3. KISIM (KARKIN-YENİSU) KANALİZASYON YAPIM İŞİ		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	11.02.2015		
MÜTEAHHİDİ	KAMURAN İNAN-ÜÇGEN İNŞ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	9.258.505,00	TL	
BÜTÇE	11.500.00,00	TL	% 96,60
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	8.943.501,80	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	46.125,00	MT	% 105,21
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	48.530,60	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI ILGIN İLÇESİ KANALİZASYON İNŞ. İŞİ		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	05.03.2015		
MÜTEAHHİDİ	ALİ ÖZTAŞ-VURALLAR		
SÖZLEŞME BEDELİ	6.891.150,00	TL	
BÜTÇE	8.900.000,00	TL	% 96,03
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	6.617.888,54	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	17.045,00	MT	% 103,77
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	17.688,05	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI EREĞLİ-NAMIK KEMAL KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	25.03.2015		
MÜTEAHHİDİ	ERDİNÇ İNŞ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	3.107.632,14	TL	
BÜTÇE	5.000.000,00	TL	% 99,91
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	3.105.106,34	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	30.000,00	MT	% 78,56
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	23.569,75	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI 4. KISIM (DERBENT-KARAAĞA) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	08.04.2015		
MÜTEAHHİDİ	SERİL İNŞ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	5.669.000,00	TL	
BÜTÇE	7.000.000,00	TL	% 99,83
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	5.659.550,35	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	30.250,00	MT	% 78,56
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	24.936,75	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI 9. KISIM (YUNAK-PİRİBEYLİ-KUZÖREN) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ (SARİ)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	06.05.2015		
MÜTEAHHİDİ	ATAK İNŞ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	7.470.700,00	TL	
BÜTÇE	8.500.000,00	TL	% 99,91
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:2.894.011,44 2016 YILI:	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	56.000,00	MT	% 78,56
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:27.353,70 2016 YILI:	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI 2. KISIM EMİRGAZİ (DEMİRCİ-IŞIKLAR) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ (SARİ)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	08.05.2015		
MÜTEAHHİDİ	İSKİT YAPI		
SÖZLEŞME BEDELİ	2.742.130,00	TL	
BÜTÇE	3.500.000,00	TL	% 23,04
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:631.903,74 2016 YILI:	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	28.300,00	MT	% 28,17
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:7.972,75 2016 YILI:	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI 1. KISIM (KARADİĞİN-ÇAYIRBAĞI-ÇARIKLAR) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ (SARİ)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	10.06.2015		
MÜTEAHHİDİ	TİKA MÜH.-LİDER HARİTA.		
SÖZLEŞME BEDELİ	8.364.140,00	TL	
BÜTÇE	11.000.000,00	TL	% 69,91
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:5.847.756,98 2016 YILI:	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	26.045,00	MT	% 65,84
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:17.149,85 2016 YILI:	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI 6. KISIM (KOÇYAZI-KARACADAĞ) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ (SARİ)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	30.06.2015		
MÜTEAHHİDİ	SERİL İNŞ.-FATİH MEHMET ERGÜÇLÜ		
SÖZLEŞME BEDELİ	8.216.000,00	TL	
BÜTÇE	12.000.000,00	TL	% 56,97
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:4.680.580,28 2016 YILI:	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	77.000,00	MT	% 64,66
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:49.785,30 2016 YILI:	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI 7. KISIM (BADEMLİ-YALINÇEVRE) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ (SARİ)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	08.07.2015		
MÜTEAHHİDİ	AHMET KIRIKÇI		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.474.617,00	TL	
BÜTÇE	3.500.000,00	TL	% 55,69
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:821.169,57 2016 YILI:	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	10.150,00	MT	% 72,19
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:7.319,90 2016 YILI:	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI 10. KISIM KONYA MERKEZ VE TAŞRA MUHTELİF SOK. KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ (SARİ)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	14.07.2015		
MÜTEAHHİDİ	SERİL İNŞ.-MEHMET FATİH ERGÜÇLÜ		
SÖZLEŞME BEDELİ	8.885.050,00	TL	
BÜTÇE	10.500.000,00	TL	% 37,78
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:3.355.540,27 2016 YILI:	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	40.000,00	MT	% 59,21
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:23.683,90 2016 YILI:	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI TAŞKENT KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ (SARİ)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	15.07.2015		
MÜTEAHHİDİ	SİDAR İNŞ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.784.410,00	TL	
BÜTÇE	2.750.000,00	TL	% 23,93
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:427.092,89 2016 YILI:	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	8.750,00	MT	% 37,93
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:3.318,55 2016 YILI:	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI 8. KISIM (GÜNEYSINIR-GÜRAĞAÇ) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ (SARİ)		
İŞİN AMACI	6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlanan İlçe ve Beldelerde altyapısı eksik olan yerlerin altyapılarının tamamlanıp halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için ihale kapsamına alınmıştır.		
İHALE TARİHİ	29.09.2015		
MÜTEAHHİDİ	SİDAR İNŞ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.690.405,00	TL	
BÜTÇE	6.750.000,00	TL	% 05,59
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:262.100,12 2016 YILI:	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	31.800,00	MT	% 06,55
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2015 YILI:2.083,10 2016 YILI:	MT	



2015 YILI ORANLARI

1	Yaklaşık Maliyet (TL)	103.374.038,32	
2	Sözleşme Bedelleri (TL)	79.859.533,94+(sari 18.854.948,45)=98.714.482,39	
3	Parasal Gerçekleşme Miktarı (TL)	54.238.714,06+ (sari işler: 18.854.948,45)= 73.093.662,51+KDV	% 70,35
4	Fiziki Gerçekleşen Miktar (Mt)	(Islah+ Yeni)507.387,20	% 92,32

İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
A-) İHALE İLE YAPTIRILAN İŞLER

1) MUHTELİF YERLERDE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ

MÜTEAHHİDİ	ALİ EKREM ERGÜN KÜÇÜK MERVE İNŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI
İHALE TARİHİ	17.03.2014
SÖZLEŞME BEDELİ	2.332.700,00.-TL
SÖZLEŞME TARİHİ	20.05.2014
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	26.05.2014
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	26.05.2014
İŞİN SÜRESİ	600 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ	15.01.2016
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH	10.11.2015
İŞ ARTIŞ	% 20
İŞ ARTIŞI PARASAL	466.540TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	2.770.855,36TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%119

BU İŞ KAPSAMINDA;

* Selbasan Çayında 28800m2 saha betonu
* Atıksu arıtma tesislerinde;
  800 mt krom-nikel korkuluk
  3800 m² dış cephe boyası
  700 mt demir korkuluk ve jiletli tel yapılmıştır.
* İçme suyu tesisleri lojmanlarının çatısının tamir ve tadilatı yapılmıştır. Çatının 500m2'sinin mebran ve kiremitleri değiştirilmiştir.






21/11/2014


10/12/2014




2) MUHTELİF YERLERDE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ (TAŞRA)

MÜTEAHHİDİ	SALİH YAVUZ İNŞAAT TAAHHÜT
İHALE TARİHİ	05.08.2014
SÖZLEŞME BEDELİ	3.750.000,00 –TL
SÖZLEŞME TARİHİ	05.09.2014
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	10.09.2014
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	10.09.2014
İŞİN SÜRESİ	480 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ	02.01.2016
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH	29.12.2015
PARASAL GERÇEKLEŞME	3.212.828,04 –TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%86

Bu iş kapsamında ;

* 100 adet eski su deposu ve pompa odasının tadilatı yapılmıştır.
* Ereğli Çayhan 1 adet 500 m3'lük depo
* Kadınhanı Osmancık 1 adet 500 m3'lük depo
* Bozkır Çağlayan 1 adet 100 m3'lük depo yapılmıştır.
* Selbasan Çayı mevcut duvarlar üstüne harpuşta ve ferforje imalatı, Buzlukhanı Deresi mevcut beton taşkın koruma duvarı üstüne ferforje imalatı yapılmıştır.



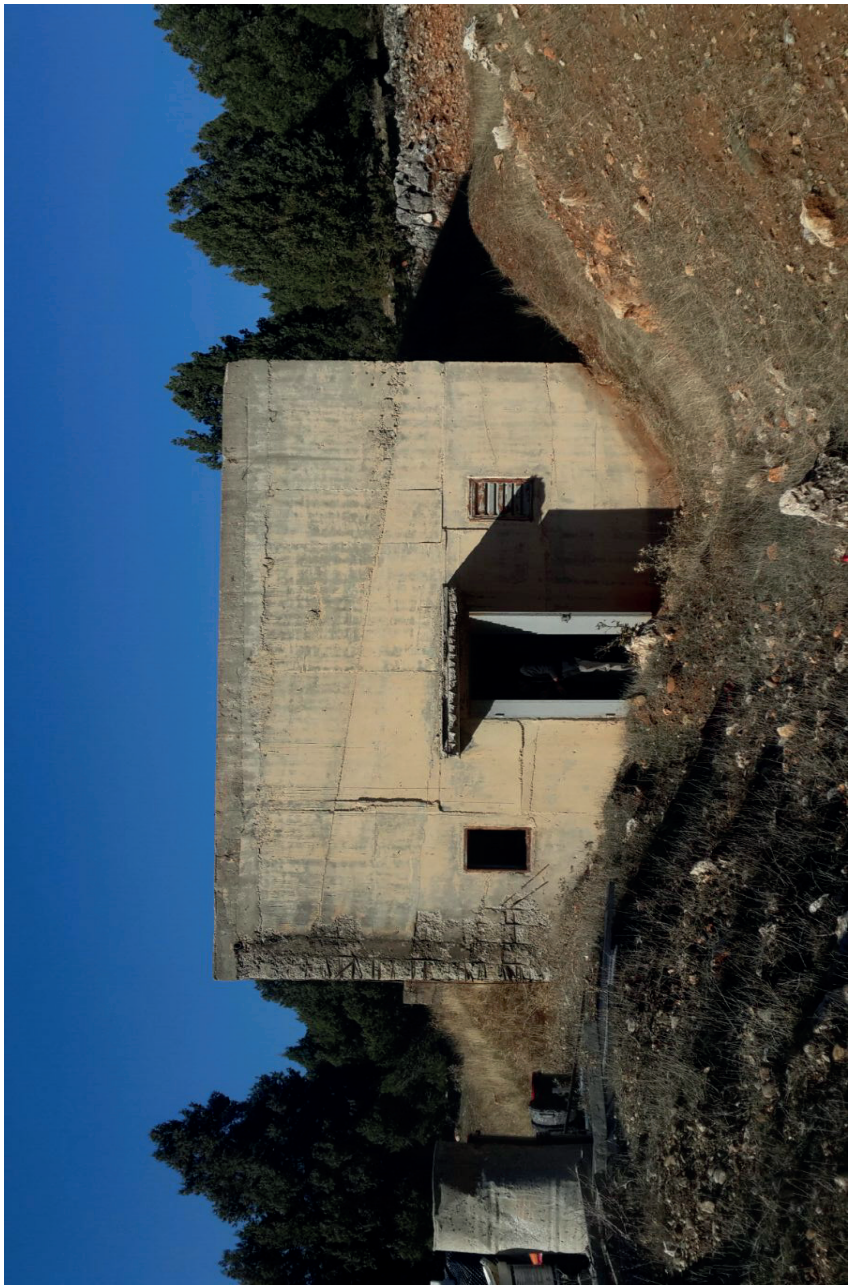



3) GÖMME SU DEPOSU YAPTIRILMASI İŞİ (EREĞLİ MERKEZ VE EREĞLİ KUTÖREN 2000 M³ LÜK)

MÜTEAHHİDİ	Volkan ŞANAL
İHALE TARİHİ	09/03/2015
SÖZLEŞME BEDELİ	1.829.000,00.-TL
SÖZLEŞME TARİHİ	07/04/2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	13/04/2015
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	13/04/2015
İŞİN SÜRESİ	90 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ	12/07/2015
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH	29 / 09 /2015
PARASAL GERÇEKLEŞME	1.829.000,00.-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100

Bu iş kapsamında ;

*Ereğli merkez 1 adet 2000 m3 lük depo,
*Ereğli Kutören 1adet deposu 2000m3 lük su deposu yapılmıştır.









4) 1.GRUP ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ VE SU DEPOLARI YAPIM İŞİ

MÜTEAHHİDİ	Uz-Ay İnş. Tek. Kağıt ve Amb. San. Tic. Ltd. Şti
İHALE TARİHİ	09.03.2015
SÖZLEŞME BEDELİ	3.666.025,00 –TL
SÖZLEŞME TARİHİ	08.04.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	14.04.2015
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	14.04.2015
İŞİN SÜRESİ	150 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ	10.09.2015
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH	30.11.2015
PARASAL GERÇEKLEŞME	3.062.044.78 –TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%84

Bu iş kapsamında ;

* Halkapınar Küsere 1 adet 100m³ depo, Çumra çiçek 1adet 300m³ depo, bozkır söğüt 1adet 300m³ depo, Ereğli Yellice 1 adet 500m³ yeni depo yapılmıştır.
* Selbasan çayında yıkılan taş duvarların yerine 338m³ yeni taş duvar yapılmıştır.
* Çumra tahtalı 1 adet arıtma binası , Altınekin Güvenç 1 adet foseptik yapılmıştır.
* 72 adet su deposu ve pompa odası tadilatı yapılmıştır.




11.11.2015 11:38


29.09.2015 12:45


11.11.2015 12:26






25.06.2015 12:53


25.06.2015 12:52


25.06.2015 12:52

5) 2.GRUP ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ VE SU DEPOLARI YAPIM İŞİ

MÜTEAHHİDİ	ALİ EKREM ERGÜN
İHALE TARİHİ	11.06.2015
SÖZLEŞME BEDELİ	8.740.600,00-TL
SÖZLEŞME TARİHİ	02.07.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	09.07.2015
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	09.07.2015
İŞİN SÜRESİ	500 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ	19.11.2016
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH	İŞ DEVAM EDİYOR
PARASAL GERÇEKLEŞME	3.494.699,40-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%50

Bu iş kapsamında ;

Bozkır Sazlı, Akçapınar, Arslantaş, Karacahisar Mahallelerinde toplam 3 adet 100 m³ depo
Bozkır Hamzalar 1 adet 300 m³ depo
Bozkır merkez 1 adet 500 m³ depo
Ereğli İvriz 1 adet 500 m³ depo
Ereğli Çakmak, Çimencik, Gökçeyazı mahallelerinde toplam 3 adet 300 m³ depo
Seydişehir Madenli, Dikilitaş mahallelerinde toplam 2 adet 100 m³ depo
Yunak merkez 1 adet 500 m³ depo
Ahırlı Bademli 1 adet 100 m³ depo
Meram kavak 1 adet 300 m³ lük depo yapılmıştır.
Kadınhanı 1 adet 5000 m³ lük depo yapımı devam etmektedir.















B-) PERSONEL İLE YAPILAN İŞLER

Şehir içi 200 adet tatlı su çeşmesinin periyodik bakım ve tamiratı işleri yapılmış olup, 52 adet yeni çeşme kaidesi şehrin muhtelif mahallelerine konmuş, 40 adet kaide de mevcut olan kaidelerin eskimesinden ve yer değişikliğinden dolayı yeni kaide ile değiştirilmiştir.

* Mevcut KOSKİ tesislerinin sıva, boya, fayans, kapı tadilatları yapılmıştır.
* İlçelerdeki pompa odalarının kabin betonları atılmıştır.
* İlçelerdeki tel çitlerin tamiratları yapılmıştır.









SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI YAPILAN ŞEBEKE UZUNLUKLARI

Yeni şebeke (Merkez)

İLÇE	Ø 63	Ø 90	Ø140	Ø200	Ø 250	Ø315	TOPLAM
SELÇUKLU	829	15041	468	1134	32		17.504
KARATAY	1	23044	8093	1709	1827		34.674
MERAM	622	10695	2042	883	259		14.501
TOPLAM	1.452	48.780	10.603	3.726	2.118		66.679

Tatlı Su (Merkez)

İLÇE	Ø 63	Ø 90	Ø140	Ø200	Ø 250	Ø315	TOPLAM
SELÇUKLU	490						490
KARATAY							
MERAM							
TOPLAM	490						490

Islah (Merkez)

İLÇE	Ø 63	Ø 90	Ø140	Ø200	Ø 250	Ø315	TOPLAM
SELÇUKLU	246	11109	7094	315	1209	1264	21.237
KARATAY	413	3337	2318	149			6.217
MERAM	939	5275	4174	2326	277	157	13.148
TOPLAM	1.598	19.721	13.586	2.790	14.86	1.421	40.602

Ductil Demir Boru (Merkez)

İLÇE	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	TOPLAM
SELÇUKLU	1522	331					1853
KARATAY							
MERAM							
TOPLAM	1.522	331					1.853

İLÇE	Ø 400	Ø 500	Ø 600	Ø 800	Ø 1000	Ø 1200	TOPLAM
SELÇUKLU							
KARATAY							
MERAM					272	3886	4.158
TOPLAM					272	3.886	4.158

Yeni şebeke

İLÇE	Ø 63	Ø 90	Ø140	Ø200	Ø 250	Ø315	TOPLAM
AHIRLI		8838	640				9.478
AKÖREN	2204	3825					6.029
AKŞEHİR							
ALTINEKİN			5222				5.222
BEYŞEHİR		20187	6409	2186			28.782
BOZKIR	157	6332	852	1007			8.348
CİHANBEYLİ	343	655	22734	8	15	3879	27.634
ÇELTİK	173	7454	1680				9.307
ÇUMRA	2090	1565					3.655
DERBENT							
DEREBUCAK		2123					2.123
DOĞANHİSAR	1104	458					1.562
EMİRGAZİ		4192	23288	3664			31.144
EREĞLİ		10383	4321	9585			24.289
GÜNEYSINIR		4203		18			4.221
HADİM		5143					5.143
HALKAPINAR		15					15
HÜYÜK			3400		40		3.440
ILGIN			5409				5.409
KADINHANI		12602	3717	3207			19.526
KARAPINAR		1600					1.600
KULU		2	1764				1.766
SARAYÖNÜ							
SEYDİŞEHİR		236					236
TAŞKENT	400	40	873	3437			4.750
TUZLUKÇU		7314	3960				11.274
YALIHÜYÜK	738	3402					4.140
YUNAK		11536	633	3155			15.324
TOPLAM	7.209	112.105	84.902	26.267	55	3.879	234.417

Islah

İLÇE	Ø 63	Ø 90	Ø140	Ø200	Ø 250	Ø315	TOPLAM
AHIRLI							
AKÖREN	3	495	1879	1761			4.138
AKŞEHİR							
ALTINEKİN							
BEYŞEHİR		239	1109				1.348
BOZKIR	21	2011	2270	609			4.911
CİHANBEYLİ		13732	10791	2858	1658		29.039
ÇELTİK							
ÇUMRA		135	1078				1.213
DERBENT	21	2719	3042	16			5.798
DEREBUCAK							
DOĞANHİSAR		1387	2710	1661	30	27	5.815
EMİRGAZİ							
EREĞLİ	7	5167	5585	12064	7745	191	30.759
GÜNEYSINIR	46	6481	6345	1030			13.902
HADİM	45	3421	1399	8			4.873
HALKAPINAR	10	597	1859		8		2.474
HÜYÜK	2	3057	855				3.914
ILGIN		3280	6720	3163	979	353	14.495
KADINHANI		7286	4632	1280	48		13.246
KARAPINAR							
KULU		18052	956				19.008
SARAYÖNÜ		1225	6550			1085	8.860
SEYDİŞEHİR		346	2658	796			3.800
TAŞKENT	11	735	1721				2.467
TUZLUKÇU							
YALIHÜYÜK							
YUNAK		5533	5052	1	2065		12.651
TOPLAM	166	75.898	67.211	25.247	12.533	1.656	182.711

Ductil Demir Boru

İLÇE	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 400	Ø 500	Ø 600	Ø 800	TOPLAM
AHIRLI										
AKÖREN										
AKŞEHİR										
ALTINEKİN										
BEYŞEHİR										
BOZKIR	2791									2.791
CİHANBEYLİ										
ÇELTİK										
ÇUMRA	4992									4.992
DERBENT										
DEREBUCAK										
DOĞANHİSAR										
EMİRGAZİ										
EREĞLİ		444		14986		25		1829	583	17.867
GÜNEYSINIR										
HADİM	1176									1.176
HALKAPINAR	6448									6.448
HÜYÜK										
ILGIN							1387	42		1.429
KADINHANI										
KARAPINAR										
KULU										
SARAYÖNÜ										
SEYDİŞEHİR										
TAŞKENT				3134						3.134
TUZLUKÇU										
YALIHÜYÜK										
YUNAK										
TOPLAM	15.407	444		18.120		25	1.387	1.871	583	37.837

İŞİN ADI	2014 YILI KARATAY-MERAM İLÇELERİ YENİ SU ŞEBEKE TESİSİ VE ISLAHI İÇİN BORU DÖŞEME İŞİ (SARİ)		
İŞİN AMACI	Meram-Karatay İlçelerindeki yeni gelen talepler doğrultusunda yeni şebeke ve ıslah ile birlikte abone şube yollarının yapımı gerçekleştirilmiştir.		
İHALE TARİHİ	20.03.2014		
MÜTEAHHİDİ	KAMURAN İNAN – ÜÇGEN İNŞAAT TAAHHÜT		
SÖZLEŞME BEDELİ	5.201.891,50	TL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 5.019.274,92	TL	
	2015 86.278,94	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	106.000	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 89.841	MT	
	2015 3.070	MT	



İŞİN ADI	2014 YILI 2.KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ (CİHANBEYLİ (KONYA) İÇME SUYU ŞEBEKE ISLAHI VE 300 M³ GÖMME SU DEPOSU YAPIMI) (SARİ)		
İŞİN AMACI	Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan komisyonun raporuna göre; Cihanbeyli İlçesindeki içme suyu ihtiyacının karşılanması ve Su Tesisleri Dairesi Başkanlığının talebi üzerine Cihanbeyli İlçesi Karşıyaka Mah. İçme suyu şebekelerinin ıslahının yapılması amaçlanmıştır.		
İHALE TARİHİ	04.08.2014		
MÜTEAHHİDİ	HAVVA KİRAZ-MUSTAFA TOPALOĞLU (İŞ ORTAKLIĞI)		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.322.570,00	TL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 2.965.924,78	TL	
	2015 1.352.194,18	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	49.888	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 16.964	MT	
	2015 30.854	MT	



İŞİN ADI	2014 YILI 3.KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ (SARİ)		
İŞİN AMACI	Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan komisyonun raporuna göre; 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesine bağlanan belde ve köylerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır.		
İHALE TARİHİ	14.08.2014		
MÜTEAHHİDİ	İMDAT ŞEN – ŞEN MÜHENDİSLİK TAAH.		
SÖZLEŞME BEDELİ	7.687.334,00	TL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 1.025.996,26	TL	
	2015 6.592.951,38	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	120.000	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	2014 15.565	MT	
	2015 119.681	MT	
ÇALIŞILAN İLÇELER	Akören, Altınekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Ilgın, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yunak		



İŞİN ADI	2014 YILI 4.KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ		
İŞİN AMACI	Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan komisyonun raporuna göre; 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesine bağlanan belde ve köylerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır.		
İHALE TARİHİ	06.01.2015		
MÜTEAHHİDİ	ALTSİS MÜH. HİZ. İNŞ. TAAH. İM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.683.032,00	TL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	4.681.931,23	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	71.000	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	59.552	MT	
ÇALIŞILAN İLÇELER	Ereğli, Emirgazi, Halkapınar, Selçuklu		



İŞİN ADI	2015 YILI KONYA MERKEZ SU ŞEBEKE ISLAHI İÇİN BORU DÖŞEME İŞİ		
İŞİN AMACI	Konya merkezde Su Tesisleri Dairesi Başkanlığından gelen talepler doğrultusunda eski şebeke ve abone şube yollarının ıslah işi gerçekleştirilmiştir.		
İHALE TARİHİ	02.03.2015		
MÜTEAHHİDİ	FATİH ARSLAN- FAY İNŞAAT TAAHHÜT		
SÖZLEŞME BEDELİ	3.393.248,00	TL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	3.350.004,40	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	42.000	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	39.462	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI SELÇUKLU İLÇESİ SU ŞEBEKE ISLAHI İÇİN BORU DÖŞEME İŞİ		
İŞİN AMACI	Selçuk İlçesinde Su Tesisleri Dairesi Başkanlığından gelen talepler doğrultusunda eski şebeke ve abone şube yollarının ıslah işi gerçekleştirilmiştir.		
İHALE TARİHİ	04.03.2015		
MÜTEAHHİDİ	ALTSİS MÜH. HİZ. İNŞ. TAAH. İML.TUR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ		
SÖZLEŞME BEDELİ	2.890.373,00	TL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	2.888.359,55	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	34.000	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	38.640	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI KARATAY-MERAM İLÇELERİ YENİ SU ŞEBEKE TESİSİ VE ISLAHI İÇİN BORU DÖŞEME İŞİ (SARİ)		
İŞİN AMACI	Meram-Karatay İlçelerindeki yeni gelen talepler doğrultusunda yeni şebeke ve ıslah ile birlikte abone şube yollarının yapımı gerçekleştirilmiştir.		
İHALE TARİHİ	03.03.2015		
MÜTEAHHİDİ	ALTSİS MÜH. HİZ. İNŞ. TAAH. İM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.987.772,00	TL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	4.087.277,67	TL	İŞ DEVAM EDİYOR
YATIRIM MİKTARI (MT)	100.500	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	53.995	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI KONYA MERKEZ MAVİ TÜNEL İSALE VE TERFİ HATLARI YAPIM İŞİ		
İŞİN AMACI	Mavi Tünel çalışmalarına bağlı olarak Konya Merkezde İsale ve Terfi hatlarının yapımı gerçekleştirilmiştir.		
İHALE TARİHİ	20.04.2015		
MÜTEAHHİDİ	ATAK İNŞ. ELEK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ		
SÖZLEŞME BEDELİ	6.880.528,00	TL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	5.828.993,69	TL	İŞ DEVAM EDİYOR
YATIRIM MİKTARI (MT)	7.112	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	4.158	MT	



İŞİN ADI	2015 YILI 1.KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ (SARİ)		
İŞİN AMACI	Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan komisyonun raporuna göre; 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesine bağlanan belde ve köylerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır.		
İHALE TARİHİ	12.05.2015		
MÜTEAHHİDİ	FATİH ARSLAN – FAY İNŞAAT TAAHHÜT		
SÖZLEŞME BEDELİ	6.860.952,00	TL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	4.929.899,23	TL	İŞ DEVAM EDİYOR
YATIRIM MİKTARI (MT)	79.204	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	52.122	MT	
ÇALIŞILAN İLÇELER	Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Çumra, Ahırlı, Yalıhüyük, Beyşehir		



İŞİN ADI	2015 YILI 2. KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ (SARİ)		
İŞİN AMACI	Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan komisyonun raporuna göre; 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesine bağlanan belde ve köylerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır.		
İHALE TARİHİ	11.05.2015		
MÜTEAHHİDİ	FATİH ARSLAN – FAY İNŞAAT TAAHHÜT		
SÖZLEŞME BEDELİ	7.217.268,60	TL	
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	5.823.881,85	TL	İŞ DEVAM EDİYOR
YATIRIM MİKTARI (MT)	102.098	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	98.774	MT	
ÇALIŞILAN İLÇELER	Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük		



İŞİN ADI	2015 YILI 3.KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ		
İŞİN AMACI	Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan komisyonun raporuna göre; 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesine bağlanan belde ve köylerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır.		
İHALE TARİHİ	13.05.2015		
MÜTEAHHİDİ	ALTSİS MÜH. HİZ. İNŞ. TAAH. İM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		
SÖZLEŞME BEDELİ	6.842.441,00+%20	TL	8.210.929,20
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI	8.208.213,02	TL	
YATIRIM MİKTARI (MT)	44.072	MT	
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI	56.745	MT	
ÇALIŞILAN İLÇELER	Ereğli, Ilgın, Emirgazi		




2015 YILINA AİT PARASAL DEĞERLER VE ORANLARI

SÖZLEŞME BEDELLERİ	: 23.493.742,30 TL (2014-2015 SARİ İŞLERİ) : 19.177.582,20 TL (2015 İŞLERİ) : 25.946.520,60 TL (2015-2016 SARİ İŞLERİ)
PARASAL GERÇEKLEŞME BEDELLERİ	: 8.274.856,90+ KDV TL (2014-2015 SARİ İŞLER) : 19.128.508,20+KDV TL (2015 İŞLERİ) : 20.670.052,44+KDV TL (2015-2016 SARİ İŞLER)
PARASAL GERÇEKLEŞME ORANI	: 2014-2015 SARİ İŞLERİ = %35,2 : 2015 İŞLERİ = %99,7 : 2015-2016 SARİ İŞLERİ = %79,6

2015 YILINA AİT METRAJLAR VE ORANLARI

SÖZLEŞME METRAJLARI	: 336,234 METRE 2014-2015 SARİ İŞLERİ : 191,072 METRE 2015 İŞLERİ : 288,914 METRE 2015-2016 SARİ İŞLERİ
FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	:165,299 METRE (2014-2015 SARİ İŞLER) :194,399 METRE (2015 İŞLERİ) : 209,049 METRE (2015-2016 SARİ İŞLER)
FİZİKSEL GERÇEKLEŞME ORANI	: 2014-2015 SARİ İŞLERİ = %49,2 :2015 İŞLERİ = %101,7 :2015-2016 SARİ İŞLERİ = %72,4

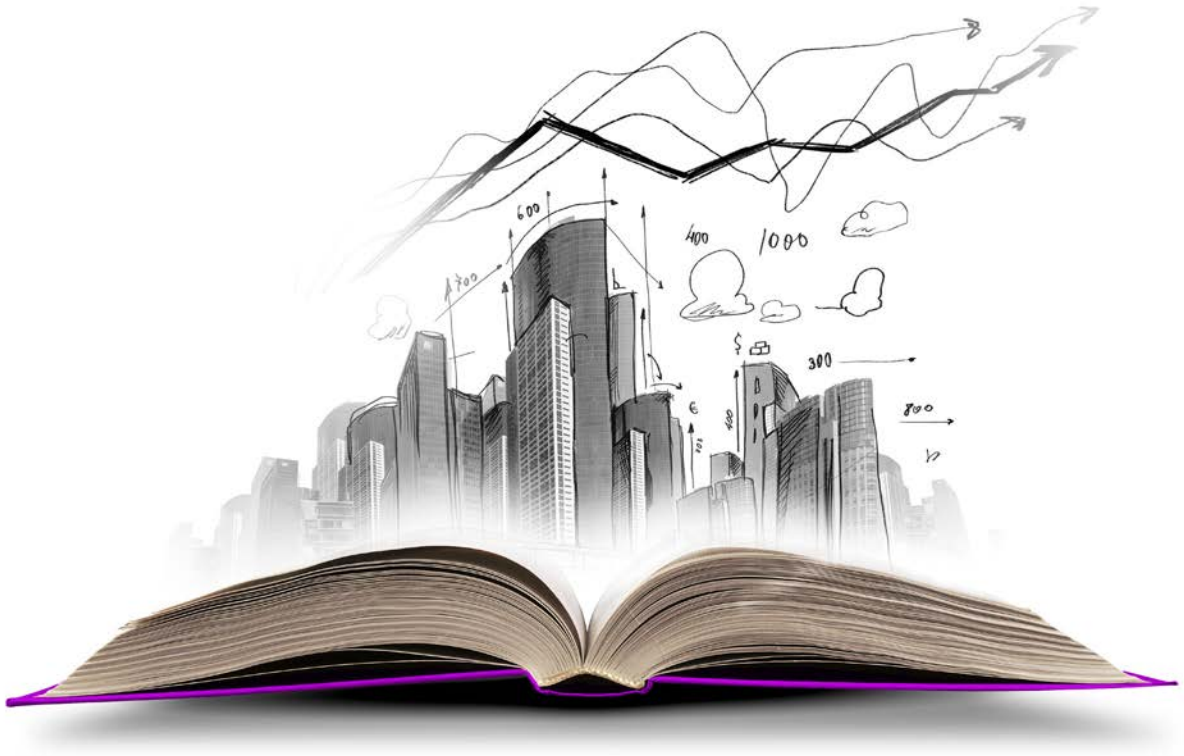

PLAN PROJE

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KOSKİ Genel Müdürlüğümüz
Su Ve Kanalizasyon Hizmetlerini Yasal Mevzuatlar Çerçevesinde Sürekli İyileştirirken;



Müşterilerine en etkin ve güvenilir şekilde ürün ve hizmet sunmak için TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.



Çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirip gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, tükenebilir doğal kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmak için TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.



Çalışanları ile çevresindekilere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturup, kaza risklerini en aza indirmek için TS 18001:2008 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.



İçme ve kullanma suyunu kaynağından son kullanıcıya ulaşana kadar güvenli bir şekilde üretimi, arıtımı, depolanması ve dağıtımını sağlıklı koşullarda yapmak için TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.

KURUMUMUZA AİT İŞLETME BELGESİ:



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No : 2010/20
Tarih : 27/08/2010

İŞLETME BELGESİ

Unvan ve Adresi : KOSKİ SU VE KANALİZZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HOROZLUHAN MAH.ALBAYRAK CAD.NO:2SELÇUKLU-KONYA

İşbu İşletme Belgesi yukarıda unvan ve adresi belirtilen 138.42 sicil no'lu işyeri için 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre çıkarılan İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince işverenin beyanı üzerine düzenlenmiştir.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No : 2010/19
Tarih : 26/08/2010

İŞLETME BELGESİ

Unvan ve Adresi : KOSKİ SU VE KANALİZZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARİFBİLGE MAH.DUVARLI SK.NO:1 MERAM-KONYA

İşbu İşletme Belgesi yukarıda unvan ve adresi belirtilen 91360.42 sicil no'lu işyeri için 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre çıkarılan İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince işverenin beyanı üzerine düzenlenmiştir.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No : 2010/21
Tarih : 27/08/2010

İŞLETME BELGESİ

Unvan ve Adresi : KOSKİ SU VE KANALİZZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YENİŞEHİR MAH.VATAN CAD.NO:2 SELÇUKLU-KONYA

İşbu İşletme Belgesi yukarıda unvan ve adresi belirtilen 85827.42 sicil no'lu işyeri için 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre çıkarılan İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince işverenin beyanı üzerine düzenlenmiştir.

KURUM DIŞI HAZIRLANAN RAPORLAR:

Aşağıdaki kurumlara istemiş oldukları bilgiler doğrultusunda raporlar sunulmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu (Tuik) Verileri: Kurumumuzdan her yıl TUİK tarafından istenen Su, Kanalizasyon, Abone ve Muhasebe Kayıtlarına ait veriler raporlanarak Türkiye İstatistik Kurumuna gönderilmiştir.

Büyükşehir Belediyesine Rapor:

- Devlet büyüklerimizi İlimizi ziyaretlerinde kullanmak üzere Valilik Brifing raporları hazırlanarak Büyükşehir belediyesine gönderilmektedir.
- Kurumumuza ait 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılı yapılan faaliyetlere ait rapor hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına gönderilmiştir.
- 2004 yılından başlayan yıllık ve 2015 aylık olmak üzere her ay DATASİS programına faaliyet raporları hazırlanmaktadır.

Yerel Bilgi Girişi: E-Devlet Yerel Bilgi Projesi kapsamında her yıl kurumumuza ait verilerin derlenerek sisteme girilmesi gerekmektedir. 2015 yılına ait veriler sisteme girilmiştir.

Diğer Kurumlar: TUİK, Valilik Brifing, Ticaret Odası, DSİ, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Diğer Kurum Kuruluşların istatistik çalışma verileri hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiştir.


AR-GE FAALİYETLERİ NETİCESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

1. Mevlana Kalkınma Ajansına Güneş Enerji Santrali İçin Proje Hazırlanması

Mevlana Kalkınma Ajansı, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımının artırılması için proje çağrısında bulunmuştur. Bu kapsamda Atık Su Arıtma tesislerinin elektrik ihtiyacının 252 kw/h kısmının güneş enerjisinden karşılanması için Mevlana Kalkınma Ajansına proje hazırlanmıştır. Hazırlana proje Mevlana Kalkınma Ajansı ve Bağımsız Değerlendiriciler tarafından incelenerek başarılı bulunmuştur. 2016 yılı içerisinde yapılacak tesis için 500.000,00 TL hibe kazanılmıştır.

2. Tarihi Su Sebeli

Bedesten Çarşısı içerisinde hayrat olarak yapılan sebilin yenilenmesi ve modernize edilmesi için tasarım çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatı devam etmektedir.

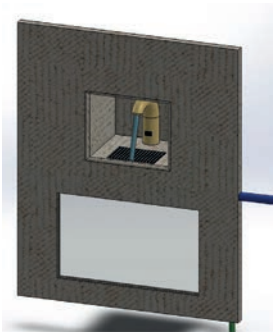

Şekil 1

3. Klor Acil Durum Kitleri

İçme suyu Arıtma Tesisleri ve Pompa istasyonlarımızda kullanılan Gaz Klor tanklarının deformasyonu ve kazalar sonucunda tanklarda oluşabilecek gaz kaçaklarını önlemek için 4 adet klor acil durum kitlerinin teknik çizimleri yapılmış olup prototip ürünlerin imalatı tamamladı.



KLOR ACİL DURUM KİTİ 1



KLOR ACİL DURUM KİTİ 2



KLOR ACİL DURUM KİTİ 3

YAPILAN ÇALIŞMALAR

- Yenilenebilir enerji kaynakları çalışması,
- Radyasyon'dan oluşabilecek rahatsızlıkları önlemek amacıyla merkez binada bulunan odalarda radyasyon ölçümü yapıldı. Bu ölçümler neticesinde merkez binada ki bir çok odaya Non İyonizon perde uygulaması yapıldı.
- Konya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığının TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri belgelendirilmesi için yapılan çalışmalarda destek sağlandı.
- Marka tescilleri için patent başvurularında bulunulmuştur. Başvuru kabul edilmiş ve patent süreci devam etmektedir.
- İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda yeni bir dezenfektan tipi araştırılarak rapor hazırlanmıştır.

KALİTE ÇALIŞMALARI
BELGE YENİLEME TETKİKİ

TSE tarafından 06.01.2016-08.01.2016 tarihleri arasında tüm sistemlerimiz için belge yenileme yapılmış, başarı ile sonuçlandırılarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İSG Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerimiz yenilenmiştir.

İÇ TETKİKLER

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İSG Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için her yıl yapılması gereken iç tetkikler gerçekleştirildi.



İç tetkikler, kurumumuzun dokümanları, kayıtları, uygulamaları ve çalışmalarının incelenerek sürekli iyileştirme çerçevesinde değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Bu amaçla İç tetkik planı hazırlanmış, her birime ait soru formları oluşturulmuş ve 19.10.2015 / 03.11.2015 tarihleri arasında tüm birimler ayrı ayrı tetkik yapılmıştır.

QDMS üzerinden iç tetkikler kayıtları girilerek raporları oluşturulmuştur.

Birimlerin iyi ve güçlü yönleri ile iyileştirilecek yönlere ilişkin öneri ve faaliyetler belirlenmiştir.

Uygunsuzluklara ilişkin düzeltici önleyici faaliyetler açılarak QDMS üzerinden takibi yapılmıştır.

İç tetkik raporu hazırlanmıştır.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

Tüm birimlerden iyileştirme faaliyetleri alınarak iyileştirme faaliyetleri raporları hazırlanmıştır.
Yapılan iç tetkik, saha tetkikleri ve kalite çalışmaları neticesinde iyileştirme önerileri raporu hazırlanmıştır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşteri memnuniyeti anketi yaptırılarak değerlendirilmiştir.

SİSTEM GÜNCELLEMELERİ

Tüm yönetim sistemlerine ait dokümanlar gözden geçirilerek gerekli revizyonlar yapıldı.

SU KALİTE KONTROL LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

ICP MS cihazı alınıp kurulumu gerçekleştirilerek analizlere başlanılmıştır.



ICP MS Cihazı

Mikrobiyolojik analiz kısmı tek bölme olup akredite için elverişsiz ve uygun değildi; bu nedenle tadilat yapılarak ilave bölümler oluşturulmuştur. Akredite için uygun hale gelen birimimizde analizlerimiz standartlara uygun şekilde yapılmaktadır.





Mikrobiyoloji Laboratvarı



Mikrobiyoloji Laboratvarı

Akreditasyon Çalışmaları

Mevcut Akreditasyon Parametreler

Su ve atık su analizlerinde pH, İletkenlik, Toplam Sertlik ve Klorür parametrelerinin akreditasyonun devam etmesi için çalışmalar yapılmıştır. TÜRKAK denetiminde, yapılan çalışmalar Denetçiler tarafından incelenerek pH, İletkenlik, Toplam Sertlik ve Klorür parametrelerinin, su ve atık su analizlerinde akredite parametre olarak devam etmesine karar vermiştir.

Akreditasyon Kapsamının Genişletilmesi

1. İyon Kromotografi Cihazı

Su Kalite Kontrol Laboratuvarında bulunan İyon Kromatografi cihazında yapılan su ve atık su analizlerinde Lityum, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum, Florür, Klorür, Nitrit, Bromür, Nitrat, Fosfat, Sülfat ve Bromat parametrelerinde Akredite olmak için Akreditasyon kapsam genişletme çalışmaları yapılmıştır. TÜRKAK denetiminde, yapılan çalışmalar Denetçiler tarafından incelenerek 14 parametre su, 14 parametre atık su olmak üzere 28 parametreden akredite olmasına karar vermiştir.

2. ICP-MS Cihazı

Su Kalite Kontrol Laboratuvarında bulunan ICP-MS cihazında yapılan su analizlerinde Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır, Kadminyum, Krom, Nikel, Alüminyum, Mangan, Çinko, Selenyum, Arsenik, Antimon, Civa, Kurşun ve Bor parametrelerinde Akredite olmak için Akreditasyon kapsam genişletme çalışmaları yapılmıştır. TÜRKAK denetiminde, yapılan çalışmalar Denetçiler tarafından incelenerek 18 parametreden su analizlerinde akredite olmasına karar vermiştir.

3. Mikrobiyoloji Birimi

Su Kalite Kontrol Laboratuvarının mikrobiyoloji biriminde yapılan su analizlerinde Escherichia Coli, Koliform ve Enterekok parametrelerinde Akredite olmak için Akreditasyon kapsam genişletme çalışmaları yapılmıştır. TÜRKAK denetiminde, yapılan çalışmalar Denetçiler tarafından incelenerek 3 parametreden akredite olmasına karar vermiştir.

Yapılan Akreditasyon çalışmaları ve TÜRKAK tarafından Akreditasyonun sağlanması için istenen Laboratuvar tasarımının tamamlanması neticesinde, Su Kalite Kontrol Laboratuvarının 8 adet olan akredite parametre sayısı, 57 adet parametreye ulaşmıştır.

Su Kalite Kontrol Çalışmaları

Periyodik olarak arıtma tesisi, şebeke hatları, KOSKİ depoları ve kuyuları, tatlı su çeşmeleri, kaynaklar, köy içme suları, ilçelerin içme suları ve kaynakları, Baraj Gölü ve besleme deresinden numuneler alınarak fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik analizleri yapılmaktadır.

Yer	BAKTERİYOLOJİK				FİZİKSEL - KİMYASAL				ALINAN ÜCRET (TL.)
	Numune	Parametre	Olumlu	Olumsuz	Numune	Parametre	Olumlu	Olumsuz	
Kaynak Suları	1.532	4.638	1.507	25	1.775	9.125	1.712	63	
Şebeke	2.626	7.378	2.598	154	6.180	49.666	5.987	346	
Kuyu Suları	168	511	22	146	389	11.425	114	275	
Şikayetler	186	581	127	59	686	10.717	536	150	
TOPLAM	**4.512**	**13.108**	**4.254**	**384**	**9.030**	**80.933**	**8.349**	**834**	**74.150,78**

PARAMETRE	TÜRK STANDARTLAR TSE 266 1997	DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATI (WHO) 1999	ABD ÇEVRE KORUMA AJANSI (EPA) 2002	AVRUPA BİRLİĞİ (EC) 1998	SAĞLIK BAKANLIĞI 2005	ORTALAMA KALİTE DEĞERLERİ			
						HAMSU (BARAJ SUYU)	AKYOKUŞ ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ SUYU	KUYULAR	KAYNAKLAR
Bulanıklık	25	5	1	1	1	5,53	0,5	0,4	0,3
İletkenlik (µS/cm)	2500				2500	352	357	350-650	305
BİRİNCİL STANDARTLAR (MİKROBİYOLOJİK) 100 ml									
Koliform Bakteri	<1	0	<1	0	0	600	0	0	0
Enterekok					0	20	0	0	0
E.koli	<1	0	<1	0	0	0	0	0	0
BİRİNCİL STANDARTLAR(DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ) µg/l									
Toplam Trihalometanlar		460	80	100	150	13,27	11,74	6,3	2,21
BİRİNCİL STANDARTLAR(İNORGANİK KİMYASALLAR) mg/l									
Alüminyum	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,09	<0,01	<0,01
Arsenik	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01	0,005	0,004	<0,0003	<0,0003
Baryum	0,3	0,7	1			0,08	0,07	0,002	0,001
Kadmiyum	0,005	0,005	0,01	0,005	0,005	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003
Krom(Toplam)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	<0,0003	<0,0003	0,001	0,002
Florür	1,5	1,5	0,7-2,4	1,5	1,5	0,17	0,13	0,06	0,03
Kurşun	0,05	0,05	0,05	0,01	0,025	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Civa	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	<0,00005	<0,00005	<0,00005	<0,00005
Nitrat(NO_3)	50	50	45	50	50	2,75	2,83	5-35	3,85
Nitrit(NO_2)				0,1	0,1	0	0	0	0
Amonyak(NH_3)	0,5	1,5		0,5	0,5	0,06	0	0,009	0
Gümüş	0,01		0,05			<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Bor					1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Nikel (µg/lt)					20	<0,00075	<0,00075	<0,00075	<0,00075
Siyanür (µg/lt)	50				50	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
ESTETİK STANDARTLAR mg/l									
Klorür	600	250	250	250	250	5,18	9,01	11,95	3,93
Renk(Pt-co birim)	20	15	15		15	2,01	0,2	0,25	0,25
Bakır	3		1	2		<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
Demir	0,2		0,3	0,2	0,2	0,041	0,035	0,01	<0,0075
Mangan	0,05	0,5	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,001	<0,00075
pH	6,5-9,2	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-9,5	6,5-9,5	8,06	7,75	7,73	8,31
Sülfat	250	250	250	250	250	21,36	23,98	28,33	3,55
Organik Madde						1,47	0,75	0,7-1,8	0,11
Top. Çöz. Madde (180°C)	1500	1000	500			275	211	185	55
Ask. Katı Madde (105°C)						7,08	0	0,19	0
Çinko	5		5			0,0018	<0,012	<0,012	<0,012
İLAVE PARAMETRELER mg/l									
Kalsiyum	200				100	58,96	58,74	52,87	12,73
Fransız sertliği		50				21	21	18-40	17
Magnezyum	50				50	15,03	15,16	30,17	32,61
Potasyum	12				12	2,51	2,56	1-5	0,71
Sodyum	175	200		200	200	4,13	4,13	11,83	1,83
Serbest Klor (1)	0,5				0,5	0	1,2	0,55	0,55


(1) Serbest klor değeri tesis çıkışı olup, serbest klor zamanla azalmaktadır. Bu değer şebekenin en uç noktasında bile serbest klor kalacak şekilde seçilmekte olup, serbest klor değerleri şebekede genellikle 0,1- 0,5 aralığında ölçülmektedir.


SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AKŞEHİR İÇMESUYU PROJESİ

Avrupa Birliği Destekleme Projesi kapsamında hazırlanan projedir. Proje kapsamında içme suyu amaçlı olarak;
- Akşehir İlçe Merkezinin bir bölümünün şebeke ıslah projesi
- Mevcut Kaynak hatlarında ıslah projeleri
- Gemen, Su çıkan ve Ilıca kaynakları için İsale ve iletim hattı projeleri hazırlanmıştır.

Şebeke Islah Projesi

Akşehir İlçe Merkezinin halihazır haritasından da yararlanarak;
- İlçenin içme suyu şebekesi 4 ana bölgeye ayrılmıştır.
- Her bölgeyi besleyecek mevcut ve yeni yapılması planlanan depolardan iletim hatları planlanmıştır.
- Ana bölgeler içerisinde kaçak kullanılan suları yada şebekede bulunan kaçakları tespit etmek amacı ile alt bölgeler oluşturulmuştur. Alt bölgeleri oluşturulması ile işletmenin daha rahatlaması ve tek noktadan müdahele edilmesi amaç edinilmiştir.
- Toplamda 96 km'lik şebeke ıslah projesi planlanmıştır.

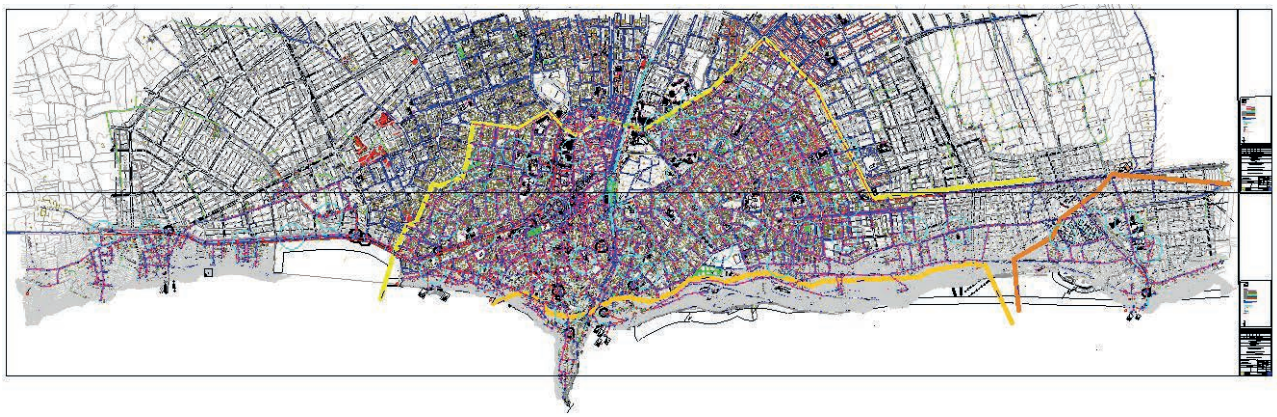

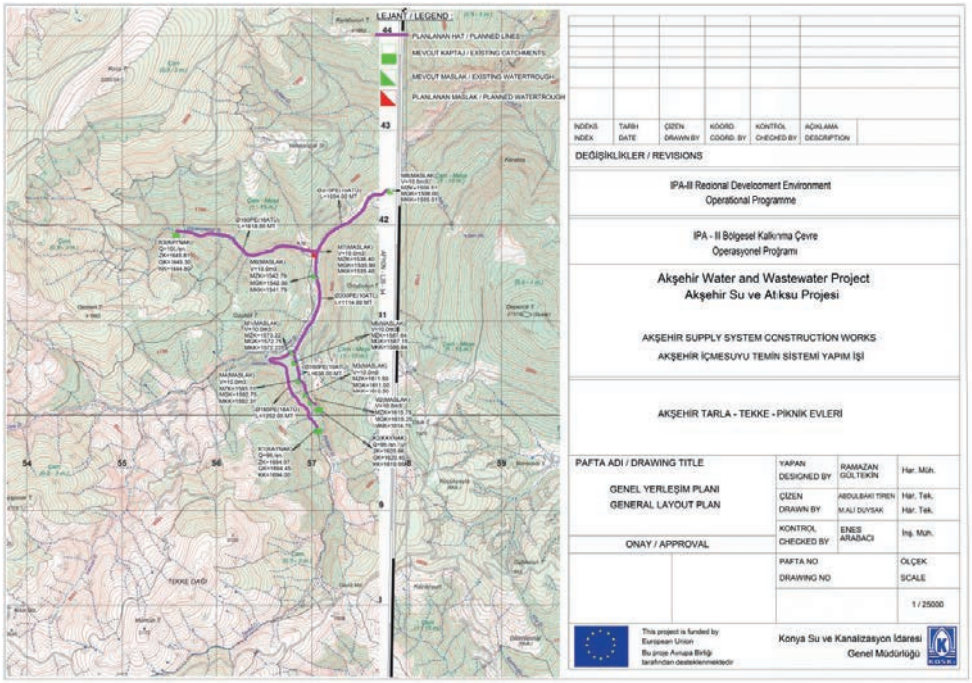


Gemen, Suçıkan ve Ilıca Kaynaklarının İsale Hattı Projeleri

Akşehir İlçe Merkezi ile Atakent ve Saray Mahallelerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacı ile hazırlanmış projedir.


Proje Kapsamında ;

- Gemen, Suçıkan, ve Ilıca kaynaklarında su alma yapısı,
- Yüksek Basıncın Kırılması için 3 adet maslak,
- Kaynakların birleşme noktasında 1000m3'lük depo,
- İlçe Merkezinde 3.000m3 ve 500m3'lük iki adet depo,
- Toplamda 23.5km'l ik isale hattının planlanması yapılmıştır.

Kaynak Projesinin Genel Vaziyet Planı

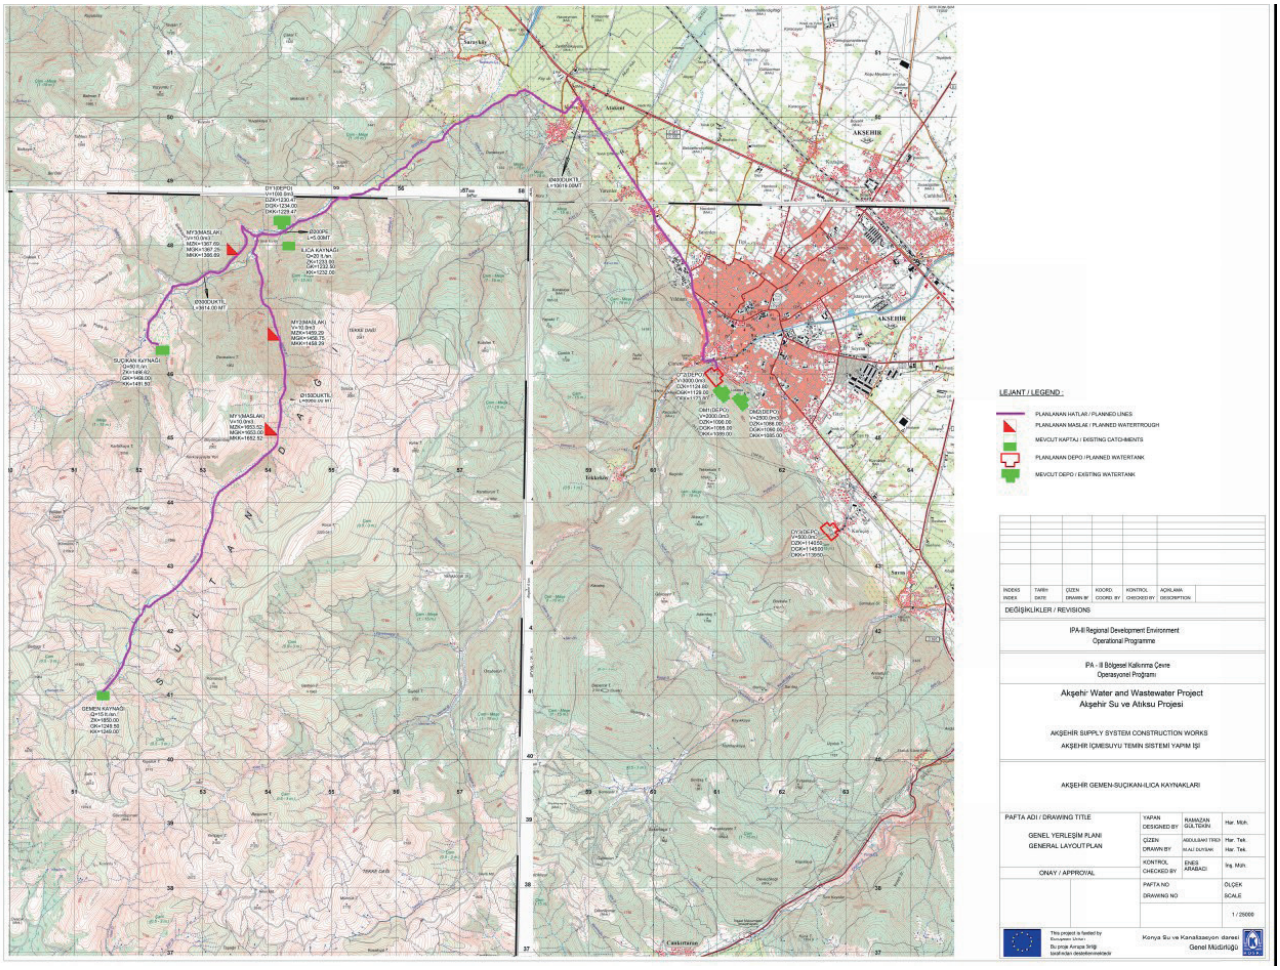

Beyşehir Grup Suyu Projesi
Projenin Genel Durumu:
Proje'nin Şematik Gösterimi;

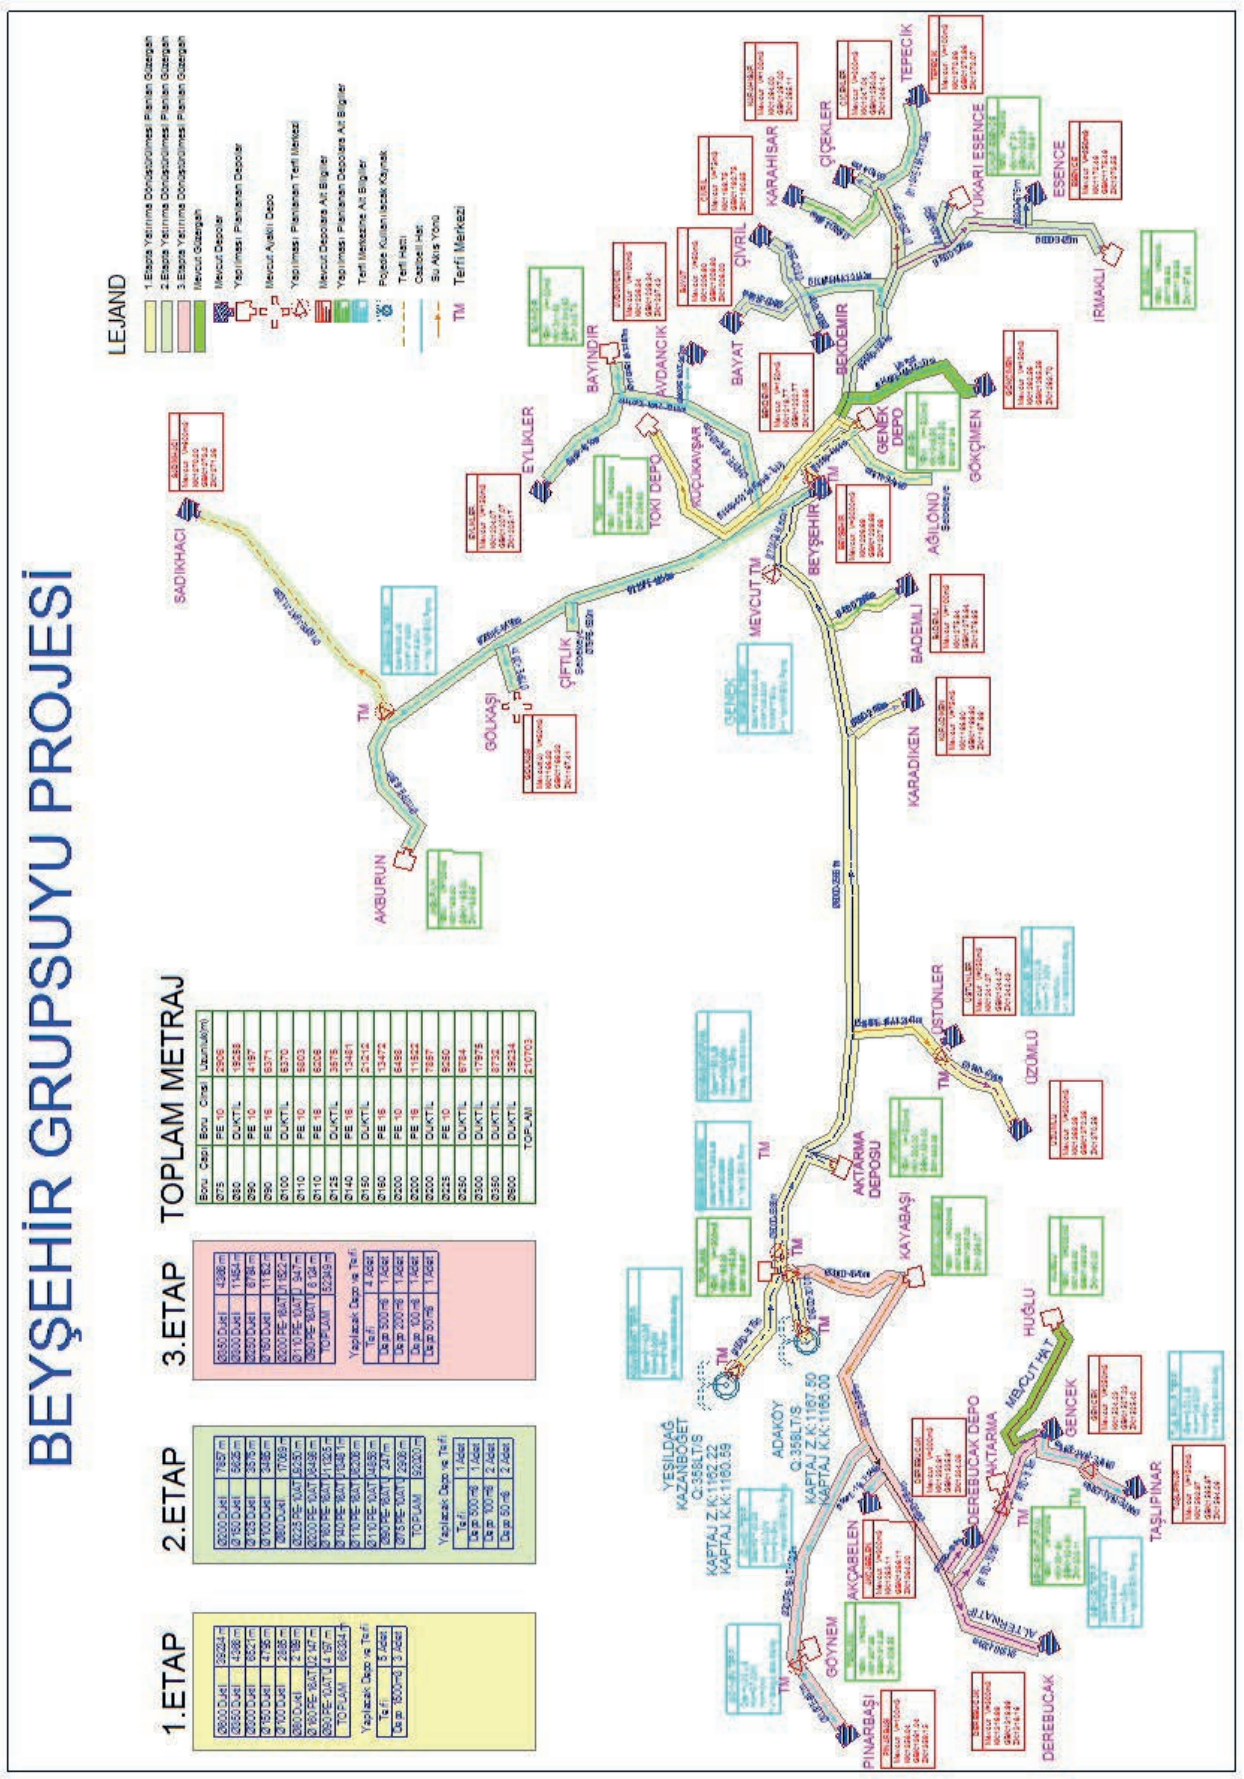

Projenin Amacı

Beyşehir İlçe Merkezi ile 26 Mahallesi, Seydişehir İlçesinin 1 Mahallesi, Derebucak İlçe Merkezi ile 2 Mahallesinin ve Hüyük İlçesinin 1 Mahallesinin kullandığı kalitesi düşük seviyede sular yerine kaynaktan elde edilen suların daha düşük maliyette ve daha rahat işletme yöntemi ile bu mahallelere iletilmesidir.

Beyşehir Grup Suyunu Besleyecek Kaynaklar

Yeşildağ Kazanböğet Kaynağı, Delikli taş Kaynağı, Güldürhacı Kaynağı ve Adaköy Kaynağı'ndan grupsuyu beslenecek şekilde planlanmıştır. Ayrıca grup suyuna alternatif kaynak olarak da Kaynaş Kaynak Suyu ilave edilmiştir. Bu kaynak ilk etap ta devreye alınmayacak olup su sıkıntısı yaşanması durumunda devreye alınacaktır. Bu 4 kaynaktan alınacak içme suyu ile 2 adet grup suyu projesi oluşturulması planlanmıştır. Proje 3 etap olarak yapıma dönüştürülmesi düşünülmektedir.

Proje Kapsamında;

- 3 Adet 1500 Tonluk
- 2 Adet 500 Tonluk
- 4 Adet 100 Tonluk Su Deposu yapılması planlanmaktadır.
- 4 Kaynakta Kaptaj Çalışması
- 7 Adet Terfi Merkezi


Toplamda;

- 1. Etap da toplam 66334m
- 2.Etap da toplam 92020m
- 3 Etap da toplam 52349m şebeke olmak üzere toplamda 210km iletim hattı yapılması planlanmıştır.
- Hattın 39 km'lik kısmı en büyük çap olarak Ø600mm Duktil borudur.

İçme suyu Sağlanacak Yerleşim Yerleri

Beyşehir İlçe Merkezi, Yeşildağ, Adaköy, Karadiken, Bademli, Ağılönü, Küçükavşar,Avdancık, Bayındır, Eylikler, Çitlikköy, Gölkaşı,Akburun,Sadıkhacı, Gökçimen, Bayat, Bektemir,Çivril,Karahisar,Çiçekler,Tepecik,Yukarıesence, Esence, Irmaklı, Üstünler. Üzümlü, Kayabaşı, Akçabelen, Huğlu, Gencek, Taşlıpınar, Göynem ve Pınarbaşı mahalleleri ile Derebucak İlçe Merkezine kadar içme suyu sağlanması planlanmaktadır.

Bozkır Grup Suyu Projesi
Bozkır Grup suyu Projesinin Genel Durumu;

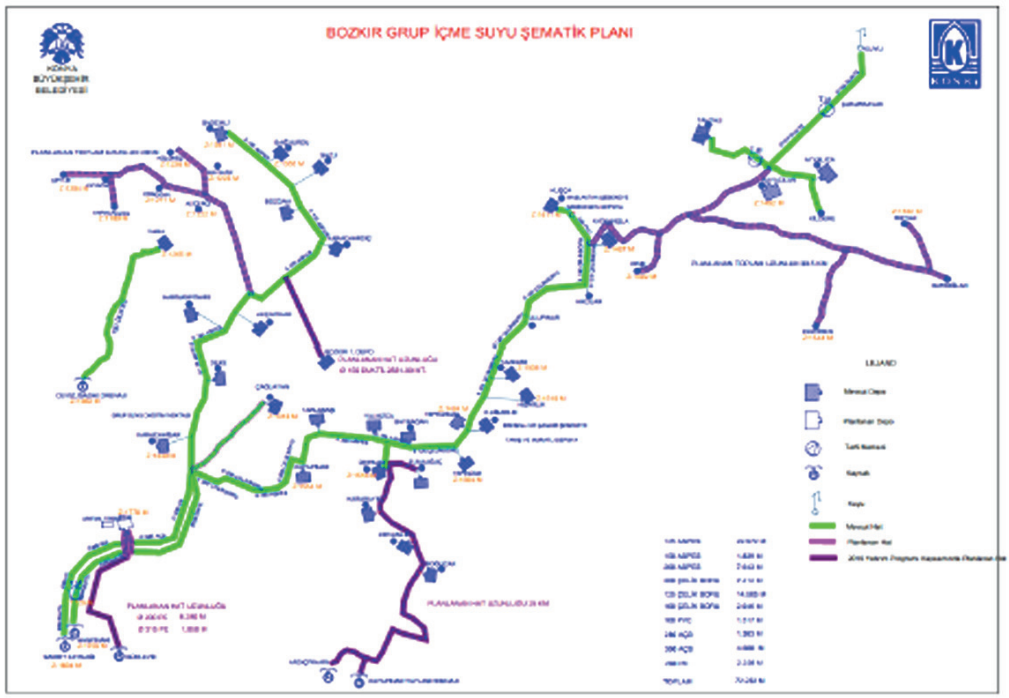


Bozkır Grup suyu projesi kapsamında, içme suyu sağlanan yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarının daha rahat sağlanması ve yeni yerleşim yerlerine içme suyu sağlanması amacı ile Çağlayan Mahallesi'nin yaylasına 5000m3'kük depo ve yağışlarda suyun bulanıklığını önlemek amacı ile arıtma tesisi planlanmıştır. Ayrıca şu an Sarıot kaynağı ile Han pınarından beslenen Bozkır Grupsuyu'na ilave olarak Babuşçu yaylasında bulunan Gürlevik kaynağının da projesi hazırlanarak dahil edilmiştir.

Şu an grupsuyundan aşağıda isimleri yazılı 24 yerleşim yerleri beslenmektedir. Ancak Bozkır İlçe Merkezi'nin hattı zarar gördüğünden ve ihtiyacının artmasında dolayı Bozkır Grupsuyundan Bozkır İlçe Merkezi'nde İdaremiz tarafından 2015 yılında yapılan 500m3'lük depoya bağlantı projesi hazırlanmıştır.

Şu an Bozkır Grupsuyu'ndan faydalanan yerleşim yerleri;

1. Bozkır İlçesi
2. Çağlayan Mh.
3. Dere Mh.
4. Harmanpınar Mh.
5. Hisarlık Mh.
6. Üçpınar Mh.
7. Karacahisar Mh.
8. Akçapınar Mh.
9. Karacaardıç Mh.
10. Bozdam Mh.
11. Sazlı Mh.
12. Bağyurdu Mh.
13. Bademli Mh.
14. Kayapınar Mh.
15. Tarlabaşı Mh.
16. Yalnızca Mh.
17. Baybağan Mh.
18. Tepelice Mh.
19. Tepearası Mh.
20. Küçükhisarlık Mh.
21. Yazdamı Mh.
22. Ulupınar Mh.
23. Aydınkışla Mh.
24. Kuşca Mh.


Bozkır Grupsuyu'ndan Bozkır İlçe Merkezine Bağlantı Projesi

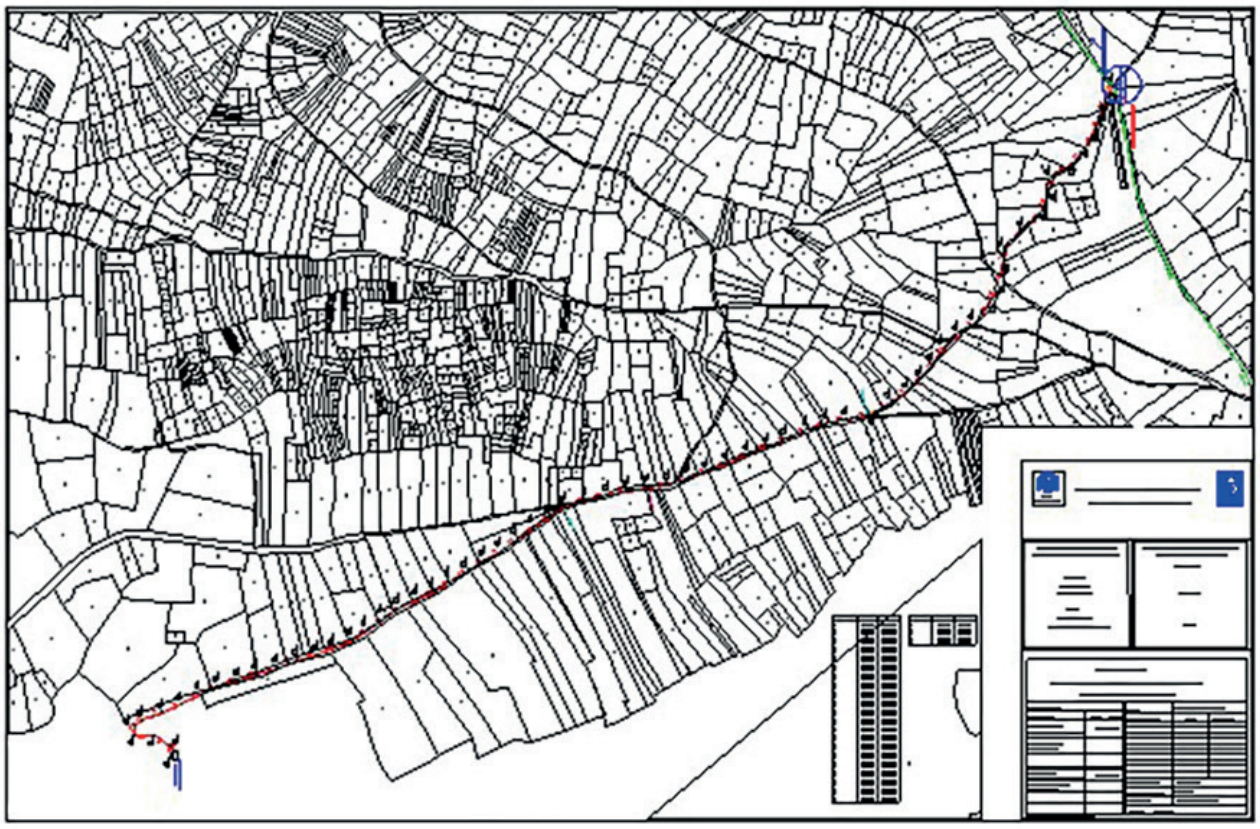

Proje kapsamında 2831m Ø150 Duktil boru döşemesi yapılacaktır.

Üçpınar Grupsuyu Projesi

Bozkır İlçesi sınırları içerinde bulunan içmesuyu sıkıntısı yaşanan Soğucak, Kovanlık, Karabayır, Üçpınar ve Elmaağaç mahalelerinin içmesuyu sıkıntılarının giderilmesi amacı ile hazırlanan projedir.

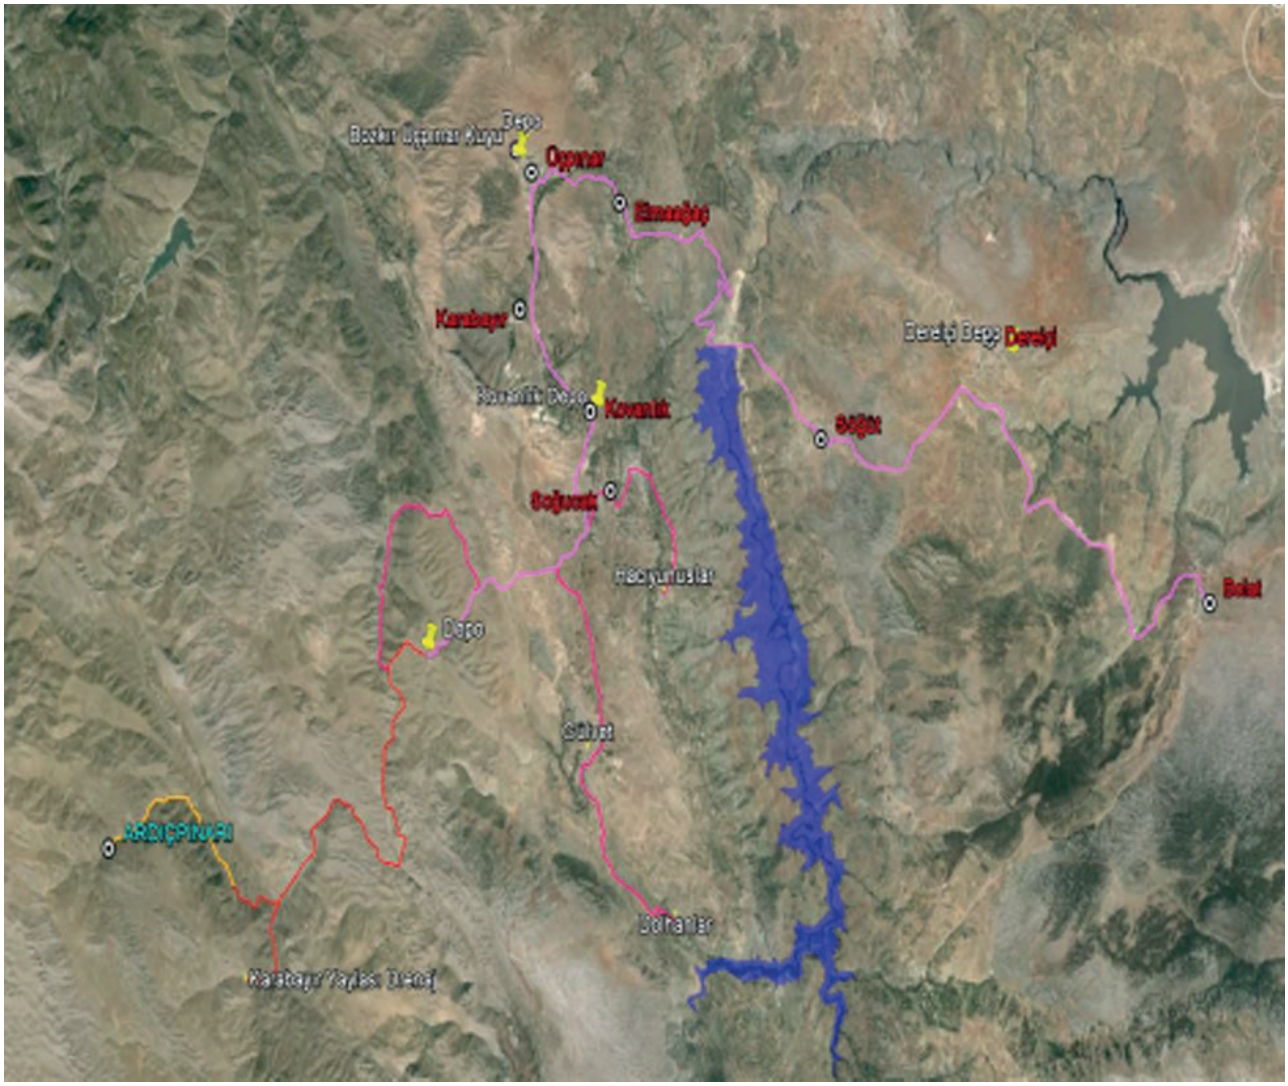


Proje Kapsamında;

Üçpınar Yaylasında bulunan Ardıçpınarı Kaynağı ile Karabayır Yaylasında bulunan kaynaktan yararlanılacaktır. Ardıçpınarı kaynağı için yaklaşık 1.5km, Karabayır Yaylası kaynağı için ise yaklaşık 1km yol açılması çalışması yapılacaktır. Ayrıca Karabayır Yaylasında suyun artırılması için drenaj çalışması, Ardıçpınarı'nda ise su alma yapısı yapılacaktır. Kaynaklardan yukarıda isimleri belirtilen mahallelerin depolarına 27km iletim hattı döşenmesi planlanmaktadır.

Başgöze Kaynak Projesi

Beyşehir İlçesi, Doğanbey ve Başgöze Mahalleleri ile Başgöze Mahallesi'nin Yaylasının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacı ile hazırlanmış projedir. Projede Başgöze Mahallesi'nin yaylasında bulunan 4 adet kaynaktan yararlanılmıştır. 4 Adet kaynağın bulunduğu alanda drenaj çalışması ile kaynak suları bir noktada birleştirilecek, bu noktaya su alma yapısı yapılarak yaylanın şebekesine, Başgöze Mahallesi için yeni yapılması planlanan depoya ve Doğanbey Mahallesinin deposuna bağlantı yapılacaktır. Ayrıca Başgöze Mahallesinde suyun çıkmadığı ve şebekesi olmayan binalar içinde şebeke döşenmesi işini kapsamaktadır.

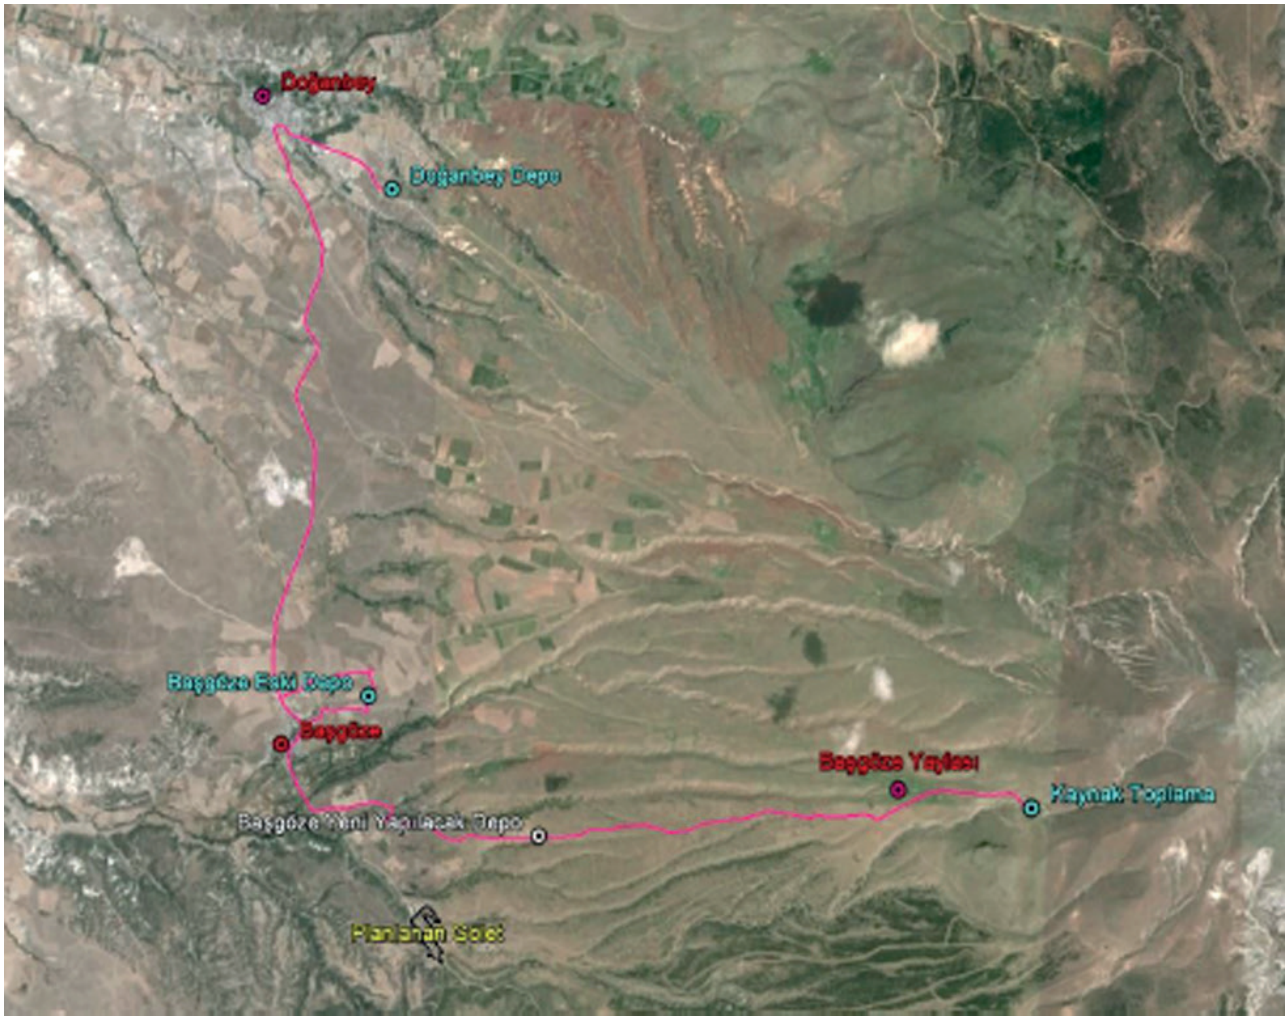


Proje Kapsamında;

- Kaynakta Drenaj çalışması yapılacak.
- Kaynakların birleşme noktasında su alma yapısı yapılacak.
- Başgöze Mahallesi için 100m³'lük Su Deposu yapılacak.
- Basıncın kırılması için 3 adet maslak yapılacak.
- 15 km iletim ve şebeke hattı döşemesi yapılacaktır.

Dedemli Kaynak Projesi

Hadim İlçesi Dedemli, Korualan, Yalınçevre, Bolat, İğdeören ve Fakılar Mahalleleri ile Bozkır İlçesi Söğüt Mahallesi ile Dereiçi Mahallelerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile hazırlanan projedir. Projede Dedemli Mahallesi'nin yaylasında bulunan kaynaktan yararlanılacaktır. Proje de ilk etapta kaynaktan Dedemli Mahallesinin deposuna kadar olan kısmı planlanmıştır. Depodan sonraki kısmı ise Bozkır Barajı kapsamında yapımı sürmekte olan yol tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

İlk etap proje kapsamında 14km isale hattı yapılması planlanmaktadır. Bozkır Barajı için yapımı devam etmekte olan tamamlandıktan sonra ki planlama ile proje kapsamında toplamda 30km civarında iletim hattı yapılması planlanmaktadır.

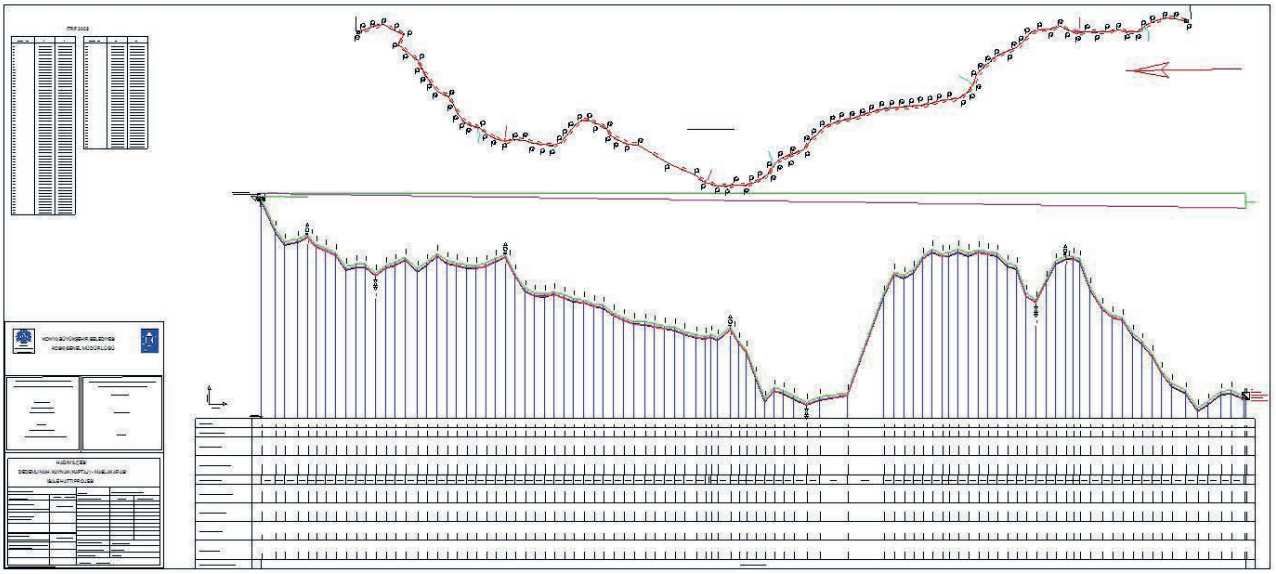

Mavi Tünel Projesi'nin Şehir Şebekesine Entegre Projesi

Mavitünel İçme suyu kapsamında DSİ tarafından ihalesi yapılan ve yapımı devam etmekte olan projenin şehir şebekesine entegre etmek için hazırlanan iki adet projeden oluşmaktadır.


- Mavitünel hattının Antalya Çevre yolu ile kesiştiği noktadan P3 pompa istasyonuna bağlantı projesidir. Proje kapsamında 3950m Ø1200 ÇB boru döşenmesi planlanmıştır.

Mavi Tünel Hattı P3 Pompa İstasyonu Projesi



- İkinci kısım projede ise Mavitünel İçmesuyu hattının Dedekorkut deposuna girmeden önce P2 Alavardı pompa istasyonu bağlantı hattı ile P1 Pompa istasyonu hattına bağlantı projesi olup 2285m Ø1000'lik, 235m Ø800'lük çelik boru döşenmesi planlanmıştır.

Mavitünel P1 ve P2 Pompa İstasyonu Bağlantı Projesi

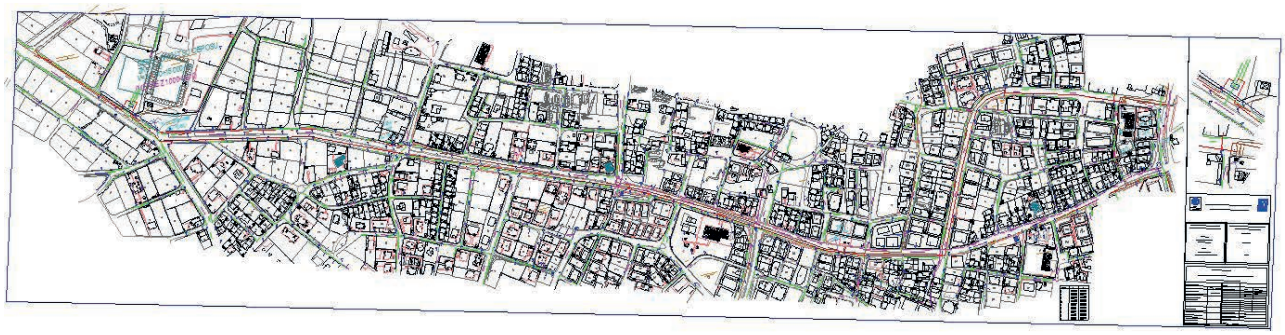

Bu projenin uygulanması ile Mavitünel Hattından gelen su şehrin tamamına ulaştırılmış olacaktır.




Islah Projeleri

İlçe Merkezleri ile bağlı mahallelerde sık arıza yapan yerleşim yerlerinin şebekelerinin yenilenmesi amacı ile şebeke ıslah projeleri hazırlanmıştır.


Taşkent İlçe Merkezi Islah Projesi

Taşkent İlçe Merkezi için 5.5 km'lik şebeke ıslah projesi hazırlanmıştır.

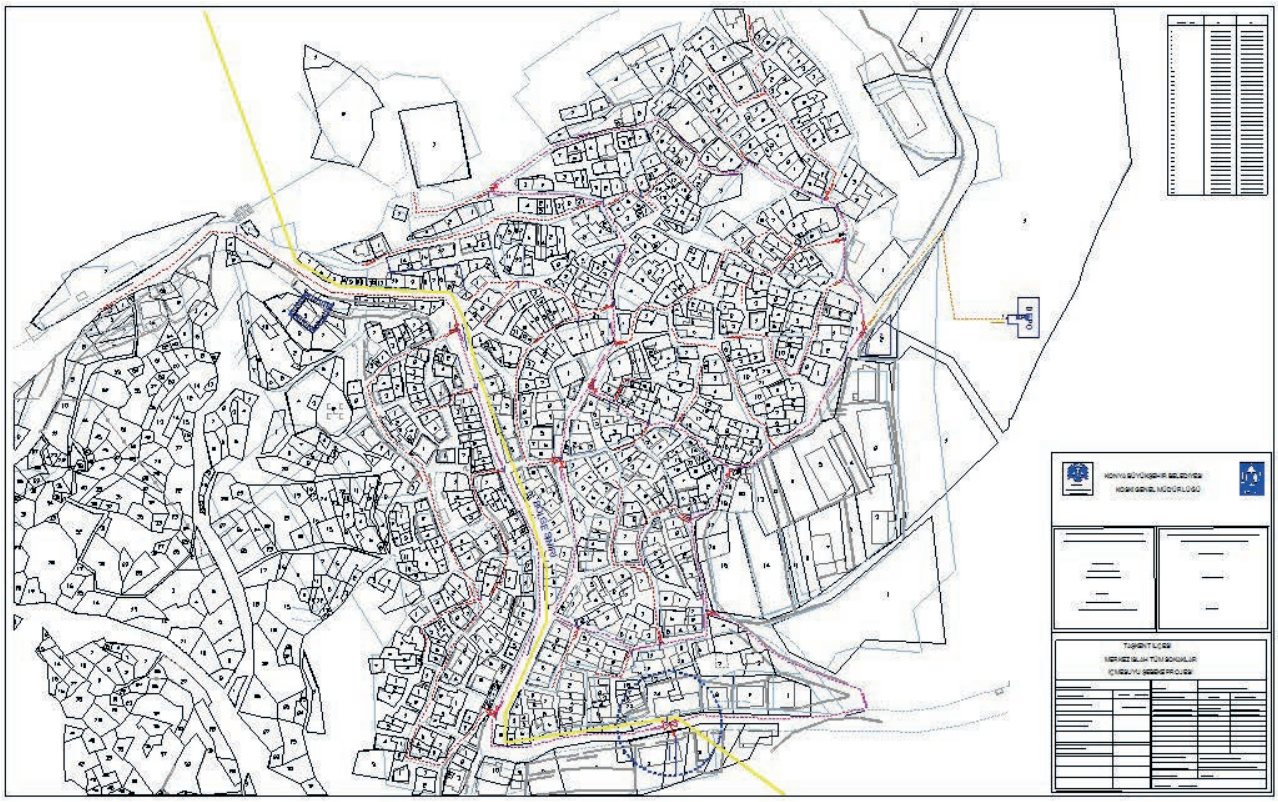


Bozkır İlçe Merkezi Islah Projesi

Bozkır İlçe Merkezi için 15km'lik şebeke ıslah projesi hazırlanmıştır.

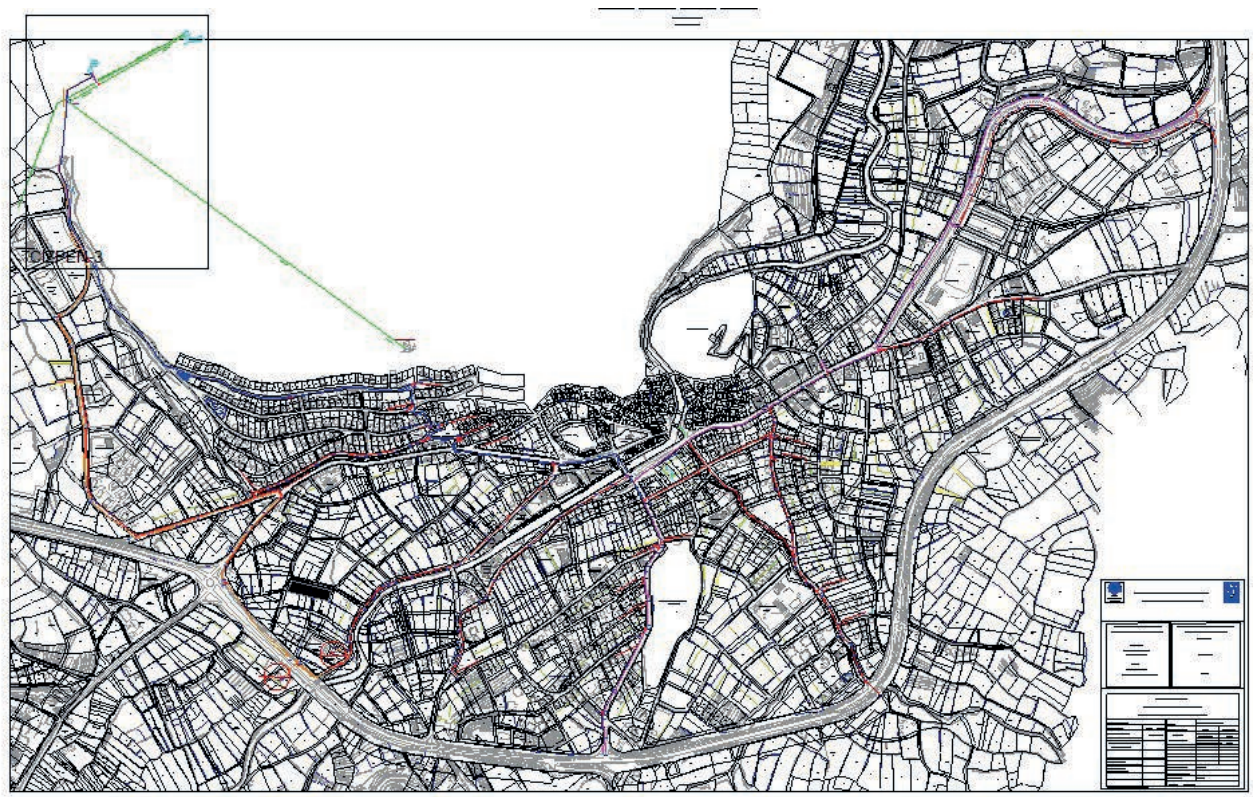

Bozkır İlçesi Üçpınar Şebeke Islah Projesi

Bozkır İlçesi Üçpınar Mahallesi için 2.5km 'lik şebeke ıslah projesi hazırlanmıştır.

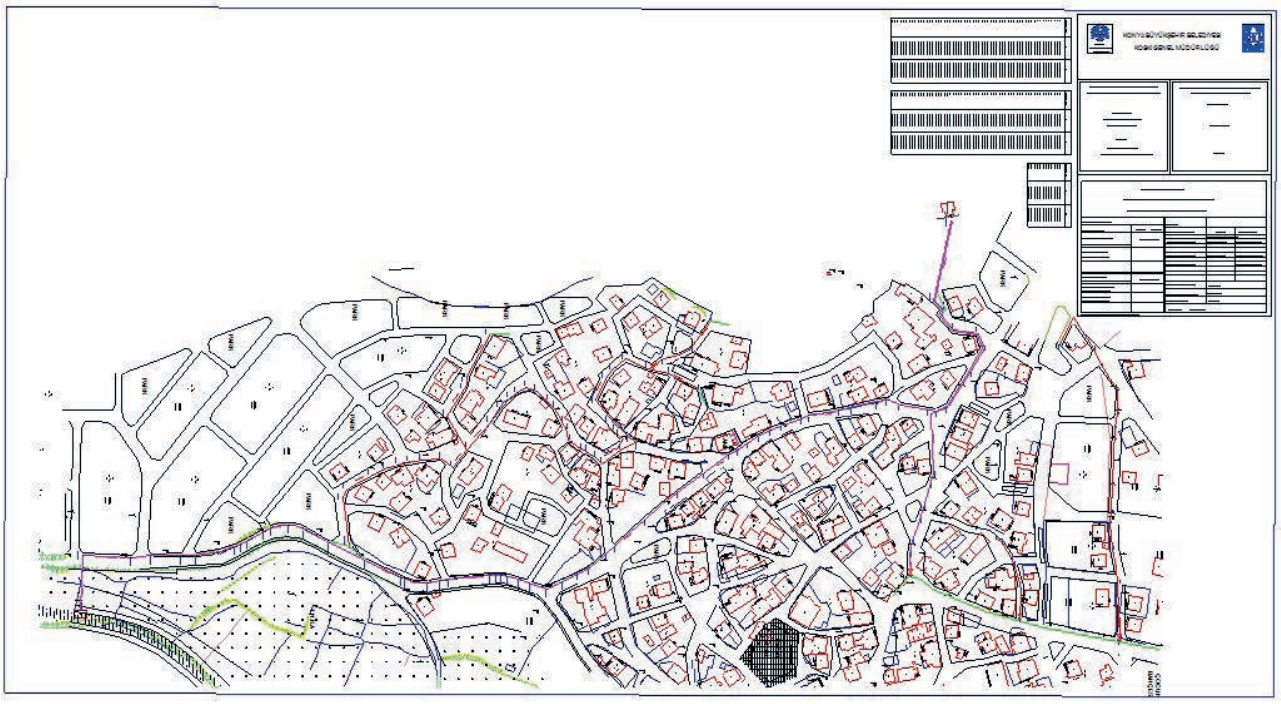


Kadınhanı İlçe Merkezi Islah Projesi

Kadınhanı İlçe Merkezin de fazla oranda kaçak olması nedeni ile pik boruların yenilenmesi amacı ile 11km ıslah projesi hazırlanmıştır.




Kadınhanı İlçesi Kolukısa Mahallesi Şebeke Islah Projesi

Kolukısa Mahallesi için 5.5km şebeke ıslah projesi hazırlanmıştır.

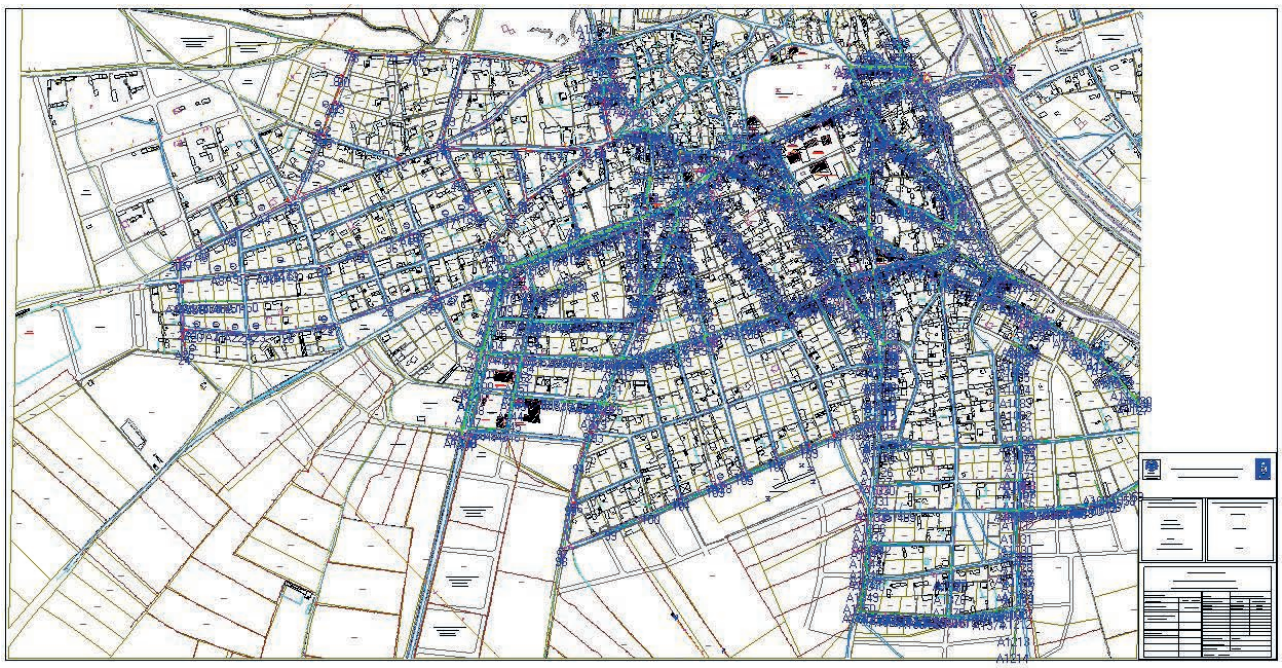

Derebucak İlçesi Çamlık Mahallesi Şebeke Islah Projesi

Çamlık Mahallesi için 11.5 km'lik şebeke ıslah projesi hazırlanmıştır.

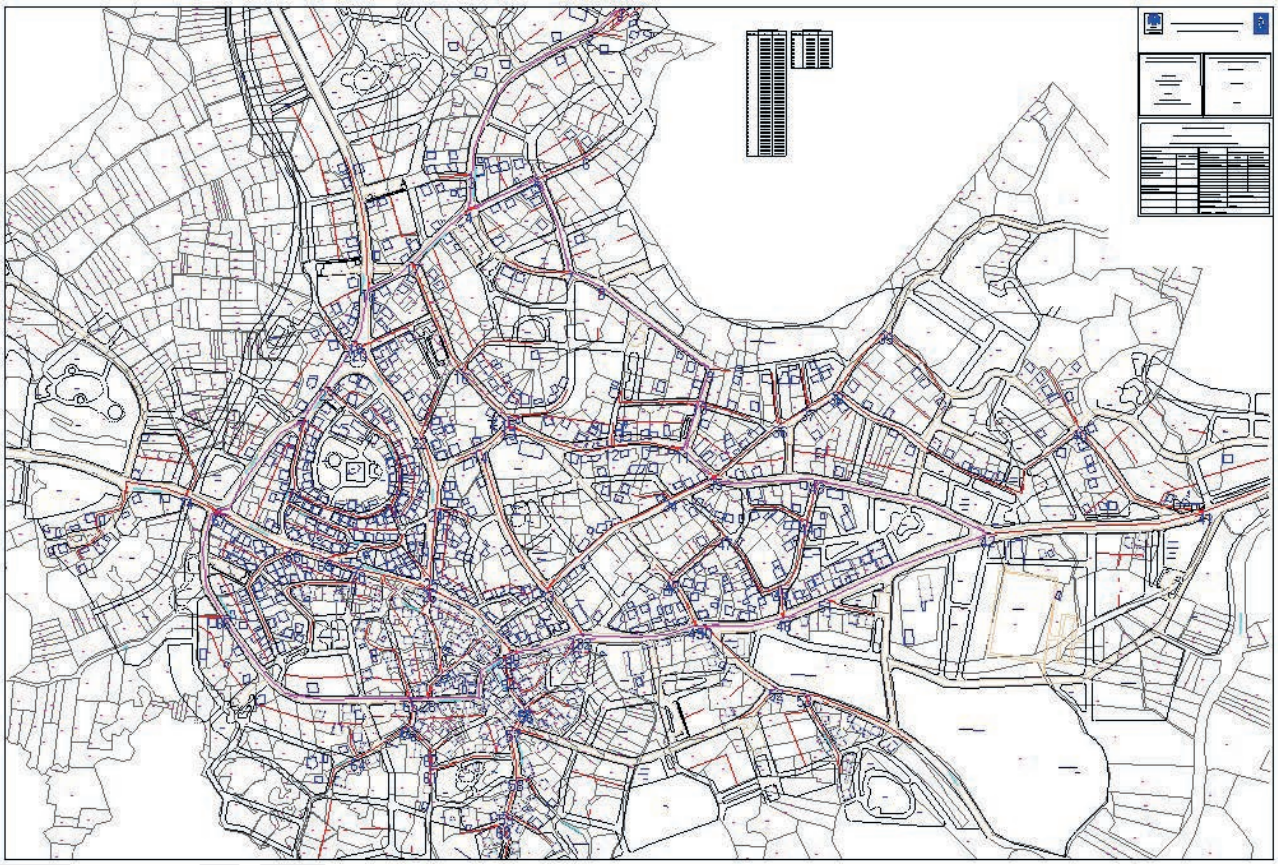

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM LİSTESİ				
İLÇE	MAHALLE	ÇAP	CİNSİ	UZUNLUK
AHIRLI	Kuruçay	63	PE	380
	Büyüköz -Küçüköz Arası İsale Hattı	63	PE	1225
AKÖREN	Meliha Ercan Ve Millet Sokak (Islah	250	PE	400
		200	PE	675
AKŞEHİR	Reis (Terfi Hattı)	90	PE	1486
		140	PE	737
	Kuruçay	200	PR	2107
ALTINEKİN	Hacınuman (Kuyu -Depo)	200	PE	312
	Merkez (Kuyu- Depo Terfi Hattı)	140	PE	4785
BEYŞEHİR	Yenidoğan (Kuyu Depo- Terfi Hattı)	200	PE 16 ATÜ	1941
		200	PE	213
	Bayavşar (Organize Böl Kuyu Bağ)	140	PE	5859
	Doğanbey Başgöze/Kaynak -Depo)	140	PE 16 ATÜ	8524
		140	PE	5829
		90	PE 16 ATÜ	738
	Gökçimen (Hayvancılık Tesis Alanı)	90	PE	8111
	Üzümlü (Taelp1)	90	PE	4928
	Üzümlü (Taelp2)	90	PE	3564
	Bademli)Kaynak- Çeşme-Depo)	90	PE	2178
	Çukurağıl (İsmail Arıkan)	90	PE	820
	Mevlana Cad	90	PE	1110
		140	PE	2789
		200	PE	1881
		250	PE	295
		300	PE	428
		400	PE	256
BOZKIR	Hisarlık (Terfi Hattı)			
	Kildere	90	PE	305
	Kuşça(Kuyu -Depo Terfi Hattı)	100	DUKTİL	2816
	Dereiçi	90	PE	2603
	Merkez Muhtelif Sk.Lar 1. Etap	200	PE	1014
		140	PE	2823
		90	PE	6566
		200	PE 16 ATÜ	1775
CİHANBEYLİ	Merkez	140	PE	2191
	Beşkavak (Kuyu Bağlantısı)	140	PE	581
	Karabağ (Kuyu Bağlantısı)	140	PE	9
	Günyüzü (Kuyu Bağlantısı)	200	PE	42
	Yünlükuyu (Kuyu Bağlantısı)	140	PE	281

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM LİSTESİ				
İLÇE	**MAHALLE**	**ÇAP**	**CİNSİ**	**UZUNLUK**
ÇELTİK	Torunlar (Kuyu-Depo / Depo- Şebeke)	140	PE (KH)	1119
		140	PE	1256
ÇUMRA		90	PE	1268
DOĞANHİSAR	Koçaş (Şebeke Islahı)	90	PE	1656
	Örenarası Damlar Mevkii	140	9E	2667
		90	PE	2388
EREĞLİ	Merkez Muhtelif Sk.Lar	800	DUK	593
		600	DUK	1926
		400	DUK	100
		315	PE	16
		200	PE	17430
		140	PE	6822
		90	PE	800
	Muhtelif Sokakla İlave	315	PE	122
		200	PE	844
		140	PE	2224
		90	PE	295
	Muhtelif Sokakla İlave 2	200	PE	1850
		140	PE	1609
		90	PE	236
	Organize San Bölgesi	160	PE	2079
		110	PE	2260
	Ulumeşe	90	PE	2317
GÜNEYSINIR	Gürağaç(Nuray Yavuzun Talebi)	90	PE	125
	Karasınır(Muhtelif Sk)	90	PE	2803
	Ömeroğlu (Terfi Hattı)	90	PE	1053
HADİM	Çiftepınar (Terfi Islah)	90	PE	1091
	Göynükışla	140	PE	339
	Aşağıeşenler	90	PE	353
HALKAPINAR	Şehit Cihangir Cd. Süleyman Dmeirci Cd	140	PE	1650
		90	PE	155
HÜYÜK	Merkez	90	PE	2725
	Mutlu-Görünmez Depo	90	PE	2198
	Selki	140	PE	1340
		90	PE	240
	İmrenler	140	PE	1313
		90	PE	2155
	İlmen	140	PE	2130
		90	PE	700

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM LİSTESİ				
İLÇE	MAHALLE	ÇAP	CİNSİ	UZUNLUK
ILGIN	Harmanyazı (Kuyu -Depo)	140	PE	3145
	Barakmuslu(Kuyu-Depo)	140	PE	706
KADINHANI	Sarıkaya (Terfi Hattı)	90	PE	4330
	Karasevinç (Terfi Hattı)	90	PE	2680
	Meydanlı (Terfi Hattı)	140	PE	1197
	Kamışlıöz	63	PE	608
	Kolukısa (Islah 2 Kısım)	140	PE	555
		90	PE	2075
KARAPINAR	Asiye UĞUR Un Müracaatı	90	PE	548
KARATAY	YARMA (KÜME EVLERİ Abdullah Akkoyun Un Müracaatı)	90	PE	335
	YARMA Sinan Sait ÖĞÜT Ün Müracaatı)	90	PE	120
	Sürüc (Yamaçkuyu)	63	PE	50
	HAYIROĞLU (Kazım AKTÜRK Ün Talebi)	90	PE	83.84
	HAYIROĞLU (Abdullah BAHADUR Ün Talebi)	90	pe	398
	Akörenkışla(Orhan Yüzbaşuığulları)	90	PE	115
	Bayat (İbrahim -Mehmet Baran)	90	PE	145
	Sürüc (Kuyu Bağlantısı)	140	PE	12
KULU	Yaraşlı (Kuyu Bağlantısı)	140	PE	15
	Merkez Sanayii Sitesi	140	PE	1703
		90	PE	1426
	Yeni (Kuyu Bağlantısı)	140	PE	200
MERAM	Kızılören (Yusuf Karabacak)	63	PE	705
	Kızılören (Ilsha)	63	pe	609
	BAYAT (Hatunsaray Yolu İsale Hattı)	140	PE	3754
		90	PE	1830
	BAYAT (DEPO TERFİ Hattı)	80	DUKTİL	3158
	Kavak (Mustafa Bağrıaçık Cd)	140	PE	283
		90	PE	982
	Kavak (Yenidepo- Şebeke Arası)	140	PE	900
	Gökyurt	90	PE	849
	Yatağan (Şebeke İptali)	90	PE	267
	YATAĞAN (Şebeke Islahı)	90	PE	575
	Botsa (Güneydere) 24056 Sk	90	PE	268

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM LİSTESİ				
İLÇE	MAHALLE	ÇAP	CİNSİ	UZUNLUK
SARAYÖNÜ	İstanbul-Kule Cad.	90	PE	227
		315	9E	1077
		140	PE	324
		200	PE	975
	Bağrıkurt (Talep)	90	PE	901
	Ladik (Afyon-Konya Yolu Islah)	140	PE	135
		90	PE	1560
	Ladik (Kahveci Tarım)	90	PE	575
	Ladik (Ahmet Sarı Saman Cad)	140	PE	3411
	Ladik (Ahmet Sarı Saman Cad) Abone Şb Yolu			260
SELÇUKLU	Sulutas (Yeni Kuyu-Depo Arası)	140	PE	337
	Dağdere (Ekrem Güzel İn Talebi)	63	PE	425
	Dağdere (Talepler)	90	PE	2910
	Yükselen (Mustafa Törön Ün Talebi)	90	PE	
	Eğribayat (Mesut Köse Nin Talebi)	90	PE	299
	Tepekent (Habib Ceylan)	90	PE	147
	Tepekent (Şuayıp Aksoy)	90	PE	488
	Akpınar	90	PE	1740
	Yükselen (Hasan Yöndemin Talebi)	90	PE	81
	Eğribayat (Abdullah Küçükkeleş'in Talebi)	90	PE	510
	Dağdere (25910 Sk)	63	PE	160
	Sızma Kuyu -Depo	140	PE	4900
		90	PE	8547
	Yazıbelen	90	PE	1598
SEYDİŞEHİR	Necati Kalaycıoğlu Cd.	90	PE	90
		140	PE	3311
		250	PE	1658
	Çatmakaya (Kaynak -Depo)	90	PE	3216
	Ulukapı (Asiye Çalışkan)	90	PE	88
	Taraşçı (Kuyu Bağlantısı)	200	PE	3528

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM LİSTESİ				
İLÇE	MAHALLE	ÇAP	CİNSİ	UZUNLUK
TAŞKENT	Balcılar	140	PE	1443
		90	PE	625
	Merkez (Kaynak- Depo İsale Hattı)	200	PE	335
	Derebaşı (Ali İhsan Camgöz)	200	PE	332
	Kecimen (Muhtarlık)	63	PVC	461
		90	PE	321
TUZLUKÇU	Gürsu-Subatan Arası Şebeke	90	PE	4117
	Leylektepe (Yayla)	90	PE	4742
	Erdoğan (Kuyu Bağlantısı)	140	PE	3932
	Erdoğan-Gürsu-Subatan	90	PE	8130

Hazırlanan Kaynak Projeleri

Sıra No	İlçe	Mahalle	İşin konusu
1	Ahırlı	Merkez-Cevizlisazak	Drenaj ve kaptaj projesi
2	Ahırlı	Çiftlikköy -Babas yaylası	Kaptaj projesi
3	Ahırlı	Karacakuyu	Drenaj ve kaptaj projesi
4	Beyşehir	Yunuslar	Drenaj ve kaptaj projesi
5	Çumra	Cicek	Drenaj ve kaptaj projesi
6	Hadim	Aşağı Kızılkaya	Kaptaj projesi
7	Hadim	Oduncu	Kaptaj projesi
8	Kulu	Yaraşlı	Kaptaj projesi
9	Meram	Kızılören	Drenaj ve kaptaj projesi
10	Selçuklu	Tepekent	Drenaj ve kaptaj projesi
11	Selçuklu	Ulumuhsine	Drenaj ve kaptaj projesi
12	Taşkent	Afşar	Kaptaj projesi
13	Taşkent	Kecimen	Drenaj ve kaptaj projesi

Tahsisi Talep Edilen Kaynaklar				
Sıra No	İlçe	Kaynak	Miktar (lt/sn)	Yerleşim Yeri
1	Akşehir	Ilıca (Yörükevleri altı)	20	Akşehir Merkez, Alanyurt, Atakent, Değirmenköy, Doğrugöz, Gölçayır, Saray, Sorkun, Ulupınar, Yeniköy Mahalleleri
2	Akşehir	Nazilli Deresi - Gemen	15-73	Akşehir Merkez, Alanyurt, Atakent, Değirmenköy, Doğrugöz, Gölçayır, Saray, Sorkun, Ulupınar, Yeniköy Mahalleleri
3	Akşehir	Suçıkan	50	Akşehir Merkez, Alanyurt, Atakent, Değirmenköy, Doğrugöz, Gölçayır, Saray, Sorkun, Ulupınar, Yeniköy Mahalleleri
4	Beyşehir	Adaköy	150	Beyşehir ve Derebucak İlçe Merkezleri ile Grup Mahalleleri
5	Beyşehir	Kazanböget	100	Beyşehir ve Derebucak İlçe Merkezleri ile Grup Mahalleleri
6	Beyşehir	Güldürhacı	50	Beyşehir ve Derebucak İlçe Merkezleri ile Grup Mahalleleri
7	Beyşehir	Başgöze	15	Başgöze ve Doğanbey
8	Beyşehir	Damla	4	Başgöze ve Doğanbey
9	Beyşehir	Deliklitaş	50	Beyşehir ve Derebucak İlçe Merkezleri ile Grup Mahalleleri
10	Beyşehir	Kozluca	10	Kurucuova,Gölyaka
11	Beyşehir	Kavakbaşı - Üzümlü	50	Beyşehir İlçe Merkezi
12	Bozkır	Hanpınarı	40	Bozkır,Ahırlı,Yalıhüyük Merkez ve Grup mahalleleri
13	Bozkır	Ardıçpınarı	10	Bozkır,Ahırlı,Yalıhüyük Merkez ve Grup mahalleleri
14	Bozkır	Beşpınar	25	Bozkır,Ahırlı,Yalıhüyük Merkez ve Grup mahalleleri
15	Bozkır	Gürlevik	10	Bozkır,Ahırlı,Yalıhüyük Merkez ve Grup mahalleleri
16	Bozkır	Sultanpınarı	10	Bozkır,Ahırlı,Yalıhüyük Merkez ve Grup mahalleleri
17	Bozkır	Katranpınarı	3	Bozkır,Ahırlı,Yalıhüyük Merkez ve Grup mahalleleri
18	Cihanbeyli	Pınarbaşı	50	Cihanbeyli Merkez, Günyüzü, Yapalı Mahalleleri
19	Hadim		3	Aşağı Kızılkaya
20	Halkapınar	Aksu	25	Halkapınar ve mahalleleri
21	Halkapınar	İvriz	500	Ereğli ve Halkapınar İlçe Merkezleri ve Mahalleleri
22	Halkapınar	Tersakan	25	Halkapınar ve mahalleleri
23	Seydişehir	Kuğulu	150	Seydişehir İlçe Merkezi

Orman İzinleri

Projelerin Orman Arazisi İçerisinden geçmesi durumunda Orman Bölge Müdürlüğünden izinler alınmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları Müdürlüğü personelleri projenin yapılacağı arziye götürülerek bilgilendirilmekte ve bu kurumlardan uygun görüş alındıktan sonra Orman Bölge Müdürlüğünden izin alınarak proje sahasının yer teslimi yapılmaktadır.

ORMAN İZİN LİSTESİ					
SIRA NO	YER	KÜLTÜR VARLIKLARI	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK	ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	SAHA TESLİM
1	HADİM-UMURLAR	EVET	EVET	EVET	EVET
2	HADIM-BOLAT	EVET	EVET	EVET	EVET
3	TAŞKENT-AFŞAR	EVET	EVET	EVET	EVET
4	BEYŞEHİR-KURUCUOVA		EVET	EVET	EVET
5	BOZKIR-HİSARLIK	EVET	EVET	EVET	EVET
6	TAŞKENT-ÇETMİ	EVET	EVET	EVET	EVET
7	ILGIN-HARMANYAZI	EVET	EVET	EVET	EVET
8	ÇUMRA-AFŞAR HAT	EVET	EVET	EVET	EVET
9	AKŞEHİR-ULUPINAR	EVET	EVET		beklemede
10	BOZKIR-ENH	EVET	EVET	EVET	EVET
11	Bozkır Merkez Kuyu-Depo Hatt	EVET	EVET	EVET	
12	Bozkır-Dereiçi Deplesi	EVET	EVET	yapılmayacak	
13	Beyşehir-Başgöze	EVET	EVET	EVET	EVET
14	Beyşehir-Yunuslar	EVET	EVET	EVET	EVET
15	Seydişehir -Kuğulu Park	EVET	EVET	EVET	EVET
16	Ahır-Kayacık ve Karacakuyu	EVET	EVET	yapılmayacak	
17	Ilgın-Boğazkent	EVET	YAZILDI		
18	Beyşehir-Bademli	EVET	YAZILDI		
19	Akören-Dutlu	YAZILDI	YAZILDI		
20	Akşehir-Kuruçay	YAZILDI	EVET		
21	Ahırlı-Bademli	EVET	EVET	teslim edildi	
22	Beyşehir-grupsuyu	YAZILDI	EVET		
23	Seydişehir-Tınaztepe	EVET	EVET		

Karayolları İzinleri

Projelerin Karayollarını kesmesi ve paralel geçmesi durumunda Karayolları Bölge Müdürlüğün izinler alınmaktadır. İlgili üst yazı gönderildikten sonra proje sahası Bölge Müdürlüğü personeline arazide yapılacak proje ile bilgi verildikten sonra protokol yapılarak izinler alınmaktadır.

TCDD İzinleri

Hazırlanan Projelerin TCDD kamulaştırma sınırına girmesi gerektiği durumlarda ve demiryolunu dik olarak kesmek zorunda olduğu durumlarda ilgili Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar hazırlanarak üst yazı ile müracaat edilmektedir.

TCDD'nin İlgili Bölge Müdürlüğü personeline arazide proje hakkında bilgi verilerek protokol yapılarak izinler alınmaktadır.

SIRA NO	İLÇE	MAHALLE	CADDE - SOKAK	ÇAP	UZUNLUK (M)
1	HALKAPINAR	MUHTELİF	Mahalle Depolarına	MUHTELİF	44745
2	ÇUMRA	APA	Kuyu - Depo Arası	Ø 140 PE	387.83
3	EMİRGAZİ	EKİZLİ	Mezarlık	Ø 90 PE	744.07
4	MERKEZ	MERKEZ	Adana Karaman Yolu	Ø 90 PE	236
				Ø 140 PE	1609
				Ø 200 PE	1850
			DERVİŞ İZBUDAK CADDESİ	Ø 90 PE	295
				Ø 140 PE	2224
				Ø 200 PE	844
				Ø 315 PE	122
			MUHTELİF SOKAKLAR	Ø 90 PE	593
				Ø 140 PE	4200
				Ø 200 PE	9874
				Ø 250 PE	970
				Ø 315 PE	16
				Ø 400 DD	16
				Ø 600 DD	1926
				Ø 800 DD	593
5	GÜNEYSINIR	ALANÖZÜ		Ø 90 PE	652.23
6	GÜNEYSINIR	KARAGÜNEY	Kuyu - Depo Arası	Ø 90 PE 16	947.47
7	GÜNEYSINIR	ALANÖZÜ	Eski Terfi - Yeni Terfi	Ø 90 PE	206
8	GÜNEYSINIR	HABİLLER	Muhtelif Sokaklar	Ø 90 PE	5219
				Ø 110 PE	510
				Ø 100 DD	152
9	GÜNEYSINIR	KARASINIR	86. Ve 89. Sokaklar	Ø 90 PE	489.94
10	GÜNEYSINIR	KARASINIR	Muhtelif Sokaklar	Ø 90 PE	2803.56
11	GÜNEYSINIR	MEHMET ALİ	Mehmet Ali Mah. Yolu	Ø 90 PE	1293
12	GÜNEYSINIR	EMİRHAN	Kazım Karabekir Cad.	Ø 90 PE	3103.93
13	KARAPINAR	HOTAMIŞ	Muhtelif Sokaklar	Ø 90 PE	10853
				Ø 140 PE	6402
				Ø 200 PE	962
14	KARAPINAR	HANKAPI	Ömer Seyfettin Cad.	Ø 315 PE	180
15	KARAPINAR	MERKEZ	Piri Reis Caddesi	Ø 315 PE	171
			YAŞAR DOĞU CADDESİ	Ø 140 PE	247
			ZAFER CADDESİ	Ø 315 PE	993
				Ø 160 PE	1062
			TUNA CADDESİ	Ø 160 PE	412
			AYDIN CADDESİ	Ø 140 PE	870
			ÖĞR. ÖZATA CADDESİ	Ø 315 PE	270
				Ø 250 PE	316
				Ø 160 PE	445
16	KARAPINAR	ÇETMİ	Mezarlık	Ø 63 PE	419.83
17	KARAPINAR	SANDIKLI	Fevzi Çakmak Caddesi	Ø 150 PVC	153
			PAK SOKAK		46
18	MERAM	GÜNEYDERE	24056. Sokak	Ø 90 PE	268.85
19	MERAM	GÖKYURT	Gökyurt Caddesi	Ø 90 PE	849.4
20	MERAM	KAVAK	Muhtelif Sokaklar	Ø 140 PE	3760
				Ø 90 PE	8089
21	MERAM	KAYADİBİ	23424. SOKAK	Ø 90 PE	826.83

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARATAY İLÇESİ 2015 YILI YATIRIM TASLAK LİSTESİ						
NO	MAHALLE	CADDE-SOKAK	ÇAP	UZUNLUK	ISLAH/YENİ	TALEP
1	ÇATALHÜYÜK	Açılış Sokak	90	343	ISLAH	KARATAY BELEDİYESİ
		AYDIN SK	90	605	ISLAH	
2	İSTİKLAL	YOLBOYU CD	140	1350	ISLAH	
			200	140	ISLAH	
3	ULUBATLI HASAN	MERCİDABIK SK	140	1117	ISLAH	
			90	185	ISLAH	
4	GAZİOSMANPAŞA	MENZİL CD	200	1877	ISLAH	
			140	24	ISLAH	
			90	204	ISLAH	
5	KUMKÖPRÜ	MANCILIK SK	140	600	ISLAH	
6	SARIYAKUP	BAŞÇİFLİK SK	90	95	ISLAH	
7	HACİİBALİ	ÇANCI CD	140	2132	ISLAH	
			90	248	ISLAH	
			140(TS)	2143	ISLAH	
			63(TS)	40	ISLAH	
		MAMACILAR SK	90	532	ISLAH	
		CEMRE	90	219	ISLAH	
8	FETİH	GUFRAN	90	230	YENİ	
		İNKİŞİAF	140	195	YENİ	
		İNCMEHMET	90	300	ISLAH	
		SEYFULLAH	90	230	ISLAH	
9	SARAÇOĞLU	HOBİ BAHÇELERİ	200	738	YENİ	
			140	2348	YENİ	
		TELSİZ SK	90	305	YENİ	
			140	350	ISLAH	
		YENİDERE	90	170	ISLAH	
		İĞNE	90	660	ISLAH	
10	ÇATALHÜYÜK	CAMGÖZ	90	50	YENİ	
		GEMİCİ	90	10	YENİ	
		TECELLİ	90	10	YENİ	
		KASIRGA	90	810	ISLAH	
		ULUÇAY			ABONE	
11	KARAASLAN DEDE	KAVİM			ABONE	
		EĞRİDAĞ	90	310	ISLAH	
		ZİYALI	90	250	ISLAH	
		NAİM			ABONE	
		TEPEDELEN	90	400	ISLAH	
		AKSOYLU	90	180	ISLAH	
		RİAYET	90	150	ISLAH	
		ARISU	90	210	ISLAH	
12	KAYACIK ARAPLAR	ARAPLAR CD	140	503	ISLAH	SU TESİSLERİ
			90	58	ISLAH	
		YİĞİTBAŞI	140	236	ISLAH	
13	AKÇEŞME	GARAJ CD	200	497	ISLAH	
			140	315	ISLAH	
			90	10	ISLAH	
14	AZİZİYE	FAKİH	90	223	ISLAH	

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARATAY İLÇESİ 2015 YILI YATIRIM TASLAK LİSTESİ						
NO	MAHALLE	CADDE-SOKAK	ÇAP	UZUNLUK	ISLAH/YENİ	TALEP
15	FEVZİ ÇAKMAK	AKAN	200	630	ISLAH	SU TESİSLERİ
		ZİRVE CD	140	450	ISLAH	
		10519	140	880	ISLAH	
		10521	140	850	ISLAH	
		10522	140	450	ISLAH	
		10523	140	840	ISLAH	
		10406	200	230	ISLAH	
			90	300	ISLAH	
16	SARIYAKUP	BÜYÜKKUMKÖPRÜ CD	250	2895	ISLAH	
			200	880	ISLAH	
			140	2862	ISLAH	
			90	1099	ISLAH	
		MAHMUTDEDE	140	660	ISLAH	
		ADAK	200	250	ISLAH	
			140	220	ISLAH	
17	GAZİOSMANPAŞA,AKABE	YENİCELER CD	200	1394	ISLAH	
			140	363	ISLAH	
			90	80	ISLAH	
		MENZİL CD	200	137	ISLAH	
			140	1731	ISLAH	
			90	638	ISLAH	
			63(TS)	177	ISLAH	
		KÜÇÜKKUMKÖPRÜ CD	250	23	ISLAH	
			200	2170	ISLAH	
			140	360	ISLAH	
			90	256	ISLAH	
			90(TS)	2103	ISLAH	
			63(TS)	36	ISLAH	
18	ŞEMSİ TEBRİZİ	KASAPSİNAN ÇIKMAZI	90	140	ISLAH	
		SULTAN VELED CD	140	698	ISLAH	
		ESKİ İSTANBUL CD	200	295	ISLAH	
			140	474	ISLAH	
			90	303	ISLAH	
19	ÇELEBİ	FARABİ	90	412	ISLAH	
20	KARAASLAN DEDE	KARAASLAN	140	1790	ISLAH	
21	KARAASLAN ÜZÜMCÜ, SARAÇOĞLU	ŞELALE CD	140	2600	ISLAH	
		SARAÇOĞLU CD	300	2425	ISLAH	
			200	220	ISLAH	
			140	2552	ISLAH	
			90	423	ISLAH	
			90(TS)	1508	ISLAH	
22	HACI SADIK	DALYAN	140	455	ISLAH	
			90	194	ISLAH	
23	TATLICAK	KONYA-EREĞLİ YOLU	200	4915	ISLAH	
24	SARAÇOĞLU	TELSİZ YOLU(ATIŞ POLİGONU)	90	2730	ISLAH	
25	ÇELEBİ	HACI KALFA	90	289	ISLAH	
26	AKABE	SULUOLUK	90	226	ISLAH	

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARATAY İLÇESİ 2015 YILI YATIRIM TASLAK LİSTESİ						
NO	MAHALLE	CADDE-SOKAK	ÇAP	UZUNLUK	ISLAH/YENİ	TALEP
27	ULUBATLI HASAN	BAŞAK CD	140	1262	ISLAH	SU TESİSLERİ
			90	1315	ISLAH	
			63(TS)	761	ISLAH	
		HEKİM GAZNEVİ	250	391	ISLAH	
			140	29	ISLAH	
			90	56	ISLAH	
28	ORHANGAZİ	CEZAYİR CD	140	1490	ISLAH	
			90	1125	ISLAH	
			63(TS)	622	ISLAH	
		İSKENDER CD	140	1645	ISLAH	
			90	270	ISLAH	
			63(TS)	215	ISLAH	
29	KEÇECİLER	GÜLTEKİN	90	170	ISLAH	
30	KUMKÖPRÜ	SİPAHİ	90	104	ISLAH	
		MANCILIK SK	140	604	ISLAH	
31	HASANDEDE MESCİT	HİLAL CD	90	900	ISLAH	
32	KEYKUBAT	PARMAKLI	90	70	ISLAH	KARATAY BELEDİYESİ
		KUŞADALI İBRAHİM	140	100	ISLAH	
33	İSTİKLAL	ÖZTOKACI	90	700	YENİ	
TOPLAM			300	2425		
TOPLAM			250	3309		
TOPLAM			200	14373		
TOPLAM			140	32535		
TOPLAM			90	18797		
TOPLAM			140(TS)	2143		
TOPLAM			90(TS)	3611		
TOPLAM			63(TS)	1851		
GENEL TOPLAM				79044		

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERAM İLÇESİ 2015 YILI YATIRIM TASLAK LİSTESİ						
NO	MAHALLE	CADDE-SOKAK	ÇAP	UZUNLUK		TALEP
1	DERE AŞIKLAR	SESLİKAYA SK	90	530	ISLAH	SU TESİSLERİ
		ELEKTRİK	90	1420	ISLAH	
		TEPEHAN	90	327	ISLAH	
2	YUNUS EMRE	BAYRAMŞİT	90	510	ISLAH	
3	ALAVARDI	SABIRHAN	90	378	ISLAH	
		ÖZALAN	90	211	ISLAH	
		KEÇİLİ	90	240	ISLAH	
4	ÇANDIR	AVGIN	90	750	ISLAH	
5	TOPRAK SARNIÇ	GÜMRAH	200	664	ISLAH	
6	KAŞINHANI YENİ	BARBAROS CD	140	1539	ISLAH	
			90	63	ISLAH	
		HACIBEKTAŞ CD	140	1529	ISLAH	
			90	1150	ISLAH	
		KAVACIKLAR	90	380	ISLAH	
		İSTASYON CD	90	1420	ISLAH	
7	KAŞINHANI İSTASYON	MUHTELİF SOKAKLAR	140	364	ISLAH	
			90	5640	ISLAH	
8	ŞÜKRAN	SAHİBİ ATA CD	250	680	ISLAH	
			200	94	ISLAH	
			140	499	ISLAH	
			140(TS)	1155	ISLAH	
			90(TS)	67	ISLAH	
			63(TS)	20	ISLAH	
9	MAMURİYE	LARENDE CD	250	1300	ISLAH	
			200	120	ISLAH	
			140	182	ISLAH	
			90	374	ISLAH	
			63(TS)	427	ISLAH	
10	AKSİNNE,MEHMET VEHBİ	TAŞCAMİİ UZUNHARMANLAR CD	200	1013	ISLAH	
			140	1655	ISLAH	
			90	1553	ISLAH	
			200(TS)	313	ISLAH	
			90(TS)	2262	ISLAH	
			63(TS)	89	ISLAH	
11	DOĞU HADİMİ	ABDURREŞİT CD	300	1100	ISLAH	
12	DURUNDAY	YORGANCI	140	1200	ISLAH	
13	YORGANCI	AĞABEY	90	600	ISLAH	
		SAFAHAT	90	117	ISLAH	
14	DERE CAMİİ KEBİR	TEPEBAYIR	90	330	ISLAH	
15	ALPARSLAN	ZENGEN	90	710	ISLAH	
16	ARİF BİLGE	YARIMCA	90	174	ISLAH	
17	AŞKAN	HINIS	90	255	ISLAH	
18	YAKA	KÖYCEĞİZ CD	300	1007	ISLAH	
19	SELAM	DERE CD	200	515	ISLAH	
20	HARMANCIK	ÇAKILHARMANLAR CD	140	1600	ISLAH	
21	BÜYÜKKOVANAĞZI	ALTINSİNİ	90	78	ISLAH	
22	SELAM	ŞEYH EBUL VEFA	200	180	ISLAH	
23	UZUNHARMANLAR	MEHMET AYTAÇ	140	1430	ISLAH	

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERAM İLÇESİ 2015 YILI YATIRIM TASLAK LİSTESİ						
NO	MAHALLE	CADDE-SOKAK	ÇAP	UZUNLUK		TALEP
24	ALAKOVA	KÖYİÇİ	90	2498	ISLAH	MERAM BELEDİYESİ
25	ALAKOVA	ALAKOVA - ÇOMAKLI ARASI YOL	90	2135	ISLAH	
26	KARAASLAN AYBAHÇE	ÇOBANOĞLU	90	97	ISLAH	
27	BATI HADİMİ	İRFANİYE	90	226	ISLAH	
		BERKOĞLU	90	310	ISLAH	
		FİKİRLİ	90	303	ISLAH	
28	BEYBES	KIŞLA	90	167	YENİ	
		ÖDÜL	140	264	YENİ	
			90	1130	ISLAH	
		OSMANLI	90	295	ISLAH	
29	BÜYÜK AYMANAS	AŞAĞI ÇAYIR	90	36	YENİ	
		DERMAN	90	90	YENİ	
30	BÜYÜKKOVANAĞZI	BILDIRCIN	90	104	YENİ	
		ŞENYÜZLÜ	90	109	ISLAH	
31	DEDEKORKUT	KÜTÜKKÖY	90	48	ISLAH	
32	DR. ZİYA BARLAS	KARATEKİN	90	186	ISLAH	
33	KOZAĞAÇ	GONCALI	90	232	ISLAH	
34	LALEBAHÇE	ERHAT	90	379	ISLAH	
35	SELVER	SELVER	200	164	YENİ	
			140	403	YENİ	
			90	300	YENİ	
36	YAKA	KERVANCI	90	126	ISLAH	
		MALİK	90	205	ISLAH	
37	GÜLBAHÇE	NAİM	90	57	ISLAH	
		ÖYKÜ	90	304	ISLAH	
		RUFAİ	90	85	YENİ	
		YEŞİLKAVAK	90	373	ISLAH	
38	HACIŞABAN	GÜRÇAY	90	110	ISLAH	
39	HARMANCIK	PARSEL	90	250	ISLAH	
		KOZAN	90	110	ISLAH	
40	HATIP	MARAŞ	90	115	ISLAH	
41	KARAHÜYÜK	YENİ FİKİR	90	124	ISLAH	
42	ULUIRMAK ALİ HOCA	BADEMLİ	90	274	ISLAH	
43	KARAHÜYÜK	EYNESİL	90	336	ISLAH	
		ÇETİNLER	90	122	ISLAH	
		MANTARLI	90	133	ISLAH	
		AKDUMAN	90	163	ISLAH	
		ÖZSU	90	24	YENİ	
		SARIMSAKLI	90	301	ISLAH	
44	KARAHÜYÜK	SERİNCAN	140	806	ISLAH	MAVİTÜNEL-DEDEKORKUT
45	KARAHÜYÜK,LALEBAHÇE	PİRHASAN CD	140	1800	ISLAH	
			63(TS)	1000	ISLAH	
46	DURUNDAY	ANASULTAN	200	290	ISLAH	
			140	500	ISLAH	
47	AYANBEY	AYANBEY	140	610	ISLAH	
48	YAKA	ABACILAR	140	335	ISLAH	
			63(TS)	335	ISLAH	
49	YUNUS EMRE	KÖKPINAR CD	200	600	ISLAH	

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERAM İLÇESİ 2015 YILI YATIRIM TASLAK LİSTESİ						
NO	MAHALLE	CADDE-SOKAK	ÇAP	UZUNLUK		TALEP
50	YUNUS EMRE	KÖKPINAR CD	140	2000	ISLAH	MAVİTÜNELDEDEKORKT
51	HARMANCIK	HALEDAR	90	383	ISLAH	MAVİTÜNEL P.3 ARASI
52	KÜÇÜKKOVANAĞZI	ÇİMENBAĞI	140	670	ISLAH	
53	KÜÇÜKKOVANAĞZI	SAFRANBOLU CD	140	1010	ISLAH	
54	SÜLEYMAN ŞAH	AZİZ MAHMUT HÜDAİ CD	140	1000	ISLAH	DEDEKORKT P.2 ARASI
			90	1000	ISLAH	
55	DEDEKORKUT	EZİNE SK	140	1100	ISLAH	
TOPLAM			300	2107		
TOPLAM			250	1980		
TOPLAM			200	3640		
TOPLAM			140	20496		
TOPLAM			90	30450		
TOPLAM			200(TS)	313		
TOPLAM			140(TS)	1155		
TOPLAM			90(TS)	2329		
TOPLAM			63(TS)	1851		
GENEL TOPLAM				64321		

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI SELÇUKLU İLÇESİ 2015 YILI YATIRIM TASLAK LİSTESİ						
NO	**MAHALLE**	**CADDE-SOKAK**	ÇAP	**UZUNLUK**	ISLAH/YENİ	**TALEP**
1	AKINCILAR	AHMET AYIK	90	115	ISLAH	SELÇUKLU BELEDİYESİ
		SARAY CD	200	430	ISLAH	
			140	1050	ISLAH	
			90	550	ISLAH	
			90(TS)	1000	ISLAH	
3	AYDINLIKEVLER	AKKÖPRÜ	90	320	ISLAH	
		METE	90	219	ISLAH	
		HASBEYOĞLU	90	129	ISLAH	
		KAYISILI	90	464	ISLAH	
		KALABA	90	228	ISLAH	
4	BEDİR	YEŞİLAĞAÇ	90	115	ISLAH	
		AKBULUT	90	330	ISLAH	
		SEDEFKÖY	90	280	ISLAH	
		ŞAİRAN	90	108	ISLAH	
		GÖKAL	90	160	ISLAH	
		GÖKYER	90	275	ISLAH	
		FİLİZLİ	90	180	ISLAH	
		YAĞMUR	90	110	ISLAH	
		ÖZALTIN	90	110	ISLAH	
		HÜRGÜL	90	140	ISLAH	
		ANANE	90	157	ISLAH	
		BESTE	90	110	ISLAH	
		HALIÖREN	90	240	ISLAH	
		ADAY	90	160	ISLAH	
		GENCER	90	365	ISLAH	
		MÜSTESNA	140	595	ISLAH	
		ADAKLI	140	600	ISLAH	
		AKYAMAÇ	140	200	ISLAH	
		BEYAZBENLİ	90	117	ISLAH	
		PAŞADAĞI	140	270	ISLAH	
		YURTTAŞ	90	190	ISLAH	
		MAKALE	90	65	ISLAH	
		HEDEF	90	340	ISLAH	
		KUZEY	90	250	ISLAH	
5	BEYHEKİM	BÜYÜKŞEHİR CD	90	830	YENİ	
		GÜLAÇAR	140	267	YENİ	
			90	370	YENİ	
		DEMİRMİL	90	283	YENİ	
		BOSTAN	90	50	YENİ	
		HARİTA			ABONE	
		ÇETİNERLER			ABONE	
		ABDULLAHULUBAY	90	160	YENİ	
		ERENLER			ABONE	
6	BİNKONUTLAR(1)	DUTDİBİ	90	250	ISLAH	
		TEZEL	90	34	ISLAH	
		SUVARİBEY	90	88	ISLAH	
		ÖZTÜRK	90	89	ISLAH	
		ŞENDAĞLI	90	43	ISLAH	
		YANER	90	368	ISLAH	
		TARHAN	90	312	ISLAH	
		YİĞİTLER	90	128	ISLAH	
		İHYA	90	350	ISLAH	
		DOLUÇAY	90	394	ISLAH	
		SİVRİKALE	90	96	ISLAH	

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI SELÇUKLU İLÇESİ 2015 YILI YATIRIM TASLAK LİSTESİ						
NO	**MAHALLE**	**CADDE-SOKAK**	ÇAP	**UZUNLUK**	ISLAH/YENİ	**TALEP**
7	BİNKONUTLAR(1)	HİSARKULE	90	275	ISLAH	SELÇUKLU BELEDİYESİ
		KONDUK	90	85	ISLAH	
		GÜLNEHİR	90	140	ISLAH	
		GÜÇLÜ	90	128	ISLAH	
		KAVAKÇI	90	130	ISLAH	
		DİNÇER	90	128	ISLAH	
		YEŞİLTEPE	90	67	ISLAH	
		İLTAŞ	90	106	ISLAH	
		MEŞALİ	90	180	ISLAH	
		YENİÇAY	90	91	ISLAH	
8	BİNKONUTLAR(2)	BAŞKAN	90	238	ISLAH	
		DİKMEÇAY	90	228	ISLAH	
		GÜRKAVAK	90	176	ISLAH	
		DİKTAŞ	90	337	ISLAH	
		ULUNAY	90	117	ISLAH	
		DİKMETAŞ	90	237	ISLAH	
		DİKYAMAÇ	90	120	ISLAH	
		ARAMAK	90	62	ISLAH	
9	BİNKONUTLAR(3)	MUHTELİF SOKAKLAR	250	110	ISLAH	
			140	1328	ISLAH	
			90	1500	ISLAH	
10	BİNKONUTLAR(4)	MUHTELİF SOKAKLAR	140	803	ISLAH	
			90	2355	ISLAH	
11	CUMHURİYET	YEŞİLYALI CD	140	356	ISLAH	
		CEYLAN	90	287	ISLAH	
		BEYDERE	140	298	ISLAH	
			90	32	ISLAH	
		ORUÇ	90	93	ISLAH	
		NURYOL	140	55	ISLAH	
			90	200	ISLAH	
		ÖNDER	90	127	ISLAH	
		SADIKDÜLGER	90	291	ISLAH	
		YAZARLAR	90	267	ISLAH	
		MELİKŞAH CD	140	248	ISLAH	
		GAZİOĞLU	90	37	ISLAH	
		OLGUN	90	335	ISLAH	
		ÖNCÜ	90	133	ISLAH	
		SOMUNCUBABA CD	140	310	ISLAH	
		EMİRSULTAN CD	140	370	ISLAH	
		ADİL	90	139	ISLAH	
12	DUMLUPINAR	AKARSU	90	150	ISLAH	
		AKMERCAN	90	112	ISLAH	
		DEVLET	90	155	ISLAH	
		AVDANLIK	90	315	ISLAH	
		AŞURE	90	75	ISLAH	
		BEYHAN	90	142	ISLAH	
		CEVİZ	90	100	ISLAH	
		CUMHURİYET CD	90	430	ISLAH	
		ÇINARALTI	90	136	ISLAH	
		SAKARYA	200	160	ISLAH	
		ÇINARKÖY	90	110	ISLAH	
		ÇİÇEKKÖY	90	95	ISLAH	
		DEĞERLİ	90	47	ISLAH	
		EŞREFLİ	90	220	ISLAH	
		EVKURAN	90	210	ISLAH	
		GAZİTEPE	90	133	ISLAH	
		GÜRSOY	90	150	ISLAH	

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI SELÇUKLU İLÇESİ 2015 YILI YATIRIM TASLAK LİSTESİ						
NO	**MAHALLE**	**CADDE-SOKAK**	ÇAP	**UZUNLUK**	ISLAH/YENİ	**TALEP**
13	DUMLUPINAR	GÜLÜŞ	90	424	ISLAH	SELÇUKLU BELEDİYESİ
		GÜNEYSARAY	90	220	ISLAH	
		HACIBAYRAM	90	130	ISLAH	
		NURHATUN	300	240	ISLAH	
		MİRZA	90	80	ISLAH	
		HANOBA	90	105	ISLAH	
		İSTİSNA	90	196	ISLAH	
		KIVAM	90	165	ISLAH	
		KİTABE	90	370	ISLAH	
		KÖSTENCE	90	95	ISLAH	
		MELTEMCİK	90	97	ISLAH	
		NADİR	90	103	ISLAH	
		OLCAY	90	174	ISLAH	
		ÖZÇELİK	90	135	ISLAH	
		ÖZDEMİR	90	101	ISLAH	
		ÖZDEŞ	90	128	ISLAH	
		PELİT	90	120	ISLAH	
		RADDE	90	83	ISLAH	
		REYHANLI	90	135	ISLAH	
		REHAVET	90	110	ISLAH	
		ŞAHİNKAYA	140	160	ISLAH	
		ŞAMİL	90	85	ISLAH	
		ŞERBET	90	53	ISLAH	
		TUZLAGÖLÜ	90	125	ISLAH	
		ULUŞAHİN	90	107	ISLAH	
		YEŞİLDERE	90	105	ISLAH	
14	ERENKÖY	TERZİOĞLU			ABONE	
		HİRA	90	10		
		SAFAYOLU	90	394	ISLAH	
		KARLIBEL CD	140	990	ISLAH	
			200	520	ISLAH	
15	ESENLER	BADEM	90	110	ISLAH	
16	FATİH	ALINKALEM	140	90	ISLAH	
			90	145	ISLAH	
		HİSARTAŞ	140	212	ISLAH	
			90	138	ISLAH	
		BASİT	90	115	ISLAH	
		BEYLİ	90	100	ISLAH	
		DAMLASU	90	80	ISLAH	
		MİTHATBAYRAK	90	100	ISLAH	
		YEYFİKKUŞ	90	140	ISLAH	
		Ş.ÖMERALİAĞAOĞLU	90	92	ISLAH	
		ULUTEPE	140	138	ISLAH	
			90	146	ISLAH	
		HAMİT KAPLAN	140	398	ISLAH	
		FENERLİHAN	90	185	ISLAH	
		DAĞSARAY	200	562	ISLAH	
		KARABABA	200	561	ISLAH	
			90	274	ISLAH	
		GÜRIŞIK	90	162	ISLAH	
			140	270	ISLAH	
		VALİDE SULTAN	90	290	ISLAH	
		MİMAR HÜSNÜ	90	161	ISLAH	
		GÜLLÜOVA	140	123	ISLAH	
			90	55	ISLAH	
		REHBER	90	45	ISLAH	
		HARPUTLU	90	33	ISLAH	

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI SELÇUKLU İLÇESİ 2015 YILI YATIRIM TASLAK LİSTESİ						
NO	**MAHALLE**	**CADDE-SOKAK**	ÇAP	**UZUNLUK**	ISLAH/YENİ	**TALEP**
17	FATİH	ETİLER	90	66	ISLAH	SELÇUKLU BELEDİYESİ
		GÜLDALI	90	130	ISLAH	
		HACET	140	326	ISLAH	
		MUALLİM	90	110	ISLAH	
		MENEKŞE	90	155	ISLAH	
		MAMURE	90	181	ISLAH	
		MANAVLI	90	136	ISLAH	
		NİMET	90	123	ISLAH	
		SİRKECİ	90	76	ISLAH	
		ÇIKIŞ	90	72	ISLAH	
		ÖZŞAHİN	90	393	ISLAH	
18	IŞIKLAR	DURANBEY	250	267	ISLAH	
			140	451	ISLAH	
		ASALET,TAMİRCİ	90	323	ISLAH	
		KARACASU	90	146	ISLAH	
		YENİKENT	90	99	ISLAH	
		HİLMİDEDE	140	60	ISLAH	
			90	360	ISLAH	
		YENİYURT	140	256	ISLAH	
		HİCAZ	90	168	ISLAH	
		ŞEREF	90	50	ISLAH	
		İCAT	90	141	ISLAH	
		ÇALTI	90	530	ISLAH	
		İSTİNYE	90	154	ISLAH	
		DOĞUIRMAK	90	162	ISLAH	
		DARIKAPISI	90	112	ISLAH	
		GÜLÜM	90	113	ISLAH	
		MADENYOLU	90	100	ISLAH	
		GÜZELKENT	90	89	ISLAH	
		ORUÇREİS	90	165	ISLAH	
		BALGAT	90	378	ISLAH	
		DERGAH	90	98	ISLAH	
		TANYILDIZI	90	238	ISLAH	
		GAZİTEPE	90	97	ISLAH	
		PENDİK	90	555	ISLAH	
		DEVLETHATUN	90	292	ISLAH	
		AKINCI	90	114	ISLAH	
		ÇATALCA	90	135	ISLAH	
		TUBA	90	318	ISLAH	
		SİLİVRİ	90	144	ISLAH	
		KEKİKPINAR	200	129	ISLAH	
			90	110	ISLAH	
		ANKARALI	90	121	ISLAH	
		VEDAT	90	114	ISLAH	
		GÜMÜŞSU	250	250	ISLAH	
		KADER	140	449	ISLAH	
		AKİFBEY	90	74	ISLAH	
		YARİM	90	210	ISLAH	
		FAKİHKAHRAMANİ	90	405	ISLAH	
		BELEN	90	104	ISLAH	
		KAYGUSUZBABA	140	378	ISLAH	
			90	321	ISLAH	
		AKKENT	90	125	ISLAH	
		YAYLAKENT	90	228	ISLAH	
		FAKİOĞLU	90	117	ISLAH	
		GAZİTEPE	90	97	ISLAH	
		KÜÇÜKDAĞ	90	92	ISLAH	

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI SELÇUKLU İLÇESİ 2015 YILI YATIRIM TASLAK LİSTESİ						
NO	**MAHALLE**	**CADDE-SOKAK**	ÇAP	**UZUNLUK**	ISLAH/YENİ	**TALEP**
19	IŞIKLAR	GEMLİK	90	80	ISLAH	SELÇUKLU BELEDİYESİ
20	FERHUNİYE	ABDULEZELPAŞA CD	140	271	ISLAH	
		DARUŞŞİFA	90	124	ISLAH	
		KARATAY	90	63	ISLAH	
		MÜNECCİMBAŞI	140	330	ISLAH	
		MÜNTAZKORU	90	118	ISLAH	
		YEŞİLAY	90	125	ISLAH	
21	FERİTPAŞA	BUHARİ,KURTUBA	140	105	ISLAH	
			90	62	ISLAH	
		GÜRDAL,MALAZGİRT,RIDVAN	90	325	ISLAH	
		GÜRAĞAÇ	90	390	ISLAH	
22	HACIKAYMAK	ÇAĞPINARI	200	30	ISLAH	
			140	907	ISLAH	
			90	113	ISLAH	
		CEVRİDEDE	90	220	ISLAH	
		ESKİ SİLLE CD	200	1430	ISLAH	
		MANZUM	140	310	ISLAH	
		HAZARFEN AHMET MURAT	90	185	ISLAH	
23	HANAYBAŞI	SADIKLAR	90	91	ISLAH	
		KAVUTOĞLU	90	350	ISLAH	
		BAKİYE	90	913	ISLAH	
		TEKKEÖNÜ	140	218	ISLAH	
		KOCAÇALI	300	1015	ISLAH	
			90	664	ISLAH	
		GÜNEYDERE	90	133	ISLAH	
24	HOROZLUHAN	KURTBEY	140	265	ISLAH	
		ABİDİN	90	750	ISLAH	
		ÖKSÜZ CD	90	720	ISLAH	
		ARDIÇKUŞU	90	270	ISLAH	
		GÜVEN	90	1400	ISLAH	
		ÇAMDERE	90	248	ISLAH	
		ÇAMDALI	90	250	ISLAH	
		İSLAMBEY	90	389	ISLAH	
		KÜÇÜKBEZİRCİ	90	365	ISLAH	
		GÜLÇİÇEK	90	100	ISLAH	
		FERHATLI	140	490	ISLAH	
		CAMİÇEVRESİ,BURAK	90	515	ISLAH	
		HACILAR	90	260	ISLAH	
25	HÜSAMETTİN ÇELEBİ	KAYADERE	90	384	ISLAH	
		İLERİ	90	134	ISLAH	
		ZORLUTUNA	90	234	ISLAH	
		FINDIKZADE	140	450	ISLAH	
		BALIKHİSAR	90	220	ISLAH	
		NARLIOVA	90	165	ISLAH	
		KAYABOĞAZI			ABONE	
		KARŞIKÖY			ABONE	
		PAŞALAR			ABONE	
		DEMİRHAN CD			ABONE	
		İNKILAP CD	90	324	ISLAH	
		ALIÇAĞACI	90	71	ISLAH	
		NAZİK	90	227	ISLAH	
26	İHSANİYE	YEŞİLIRMAK	90	116	ISLAH	
		HAKYOLU	90	162	ISLAH	
		İHSANİYE CD	250	287	ISLAH	
			90	850	ISLAH	
		NURANİ	90	70	ISLAH	
27	KILINÇARSLAN	ADAKALE CD	140	680	ISLAH	

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI SELÇUKLU İLÇESİ 2015 YILI YATIRIM TASLAK LİSTESİ						
NO	**MAHALLE**	**CADDE-SOKAK**	ÇAP	**UZUNLUK**	ISLAH/YENİ	**TALEP**
28	KILINÇARSLAN	NURDAĞI	140	510	ISLAH	SELÇUKLU BELEDİYESİ
		KURTULDU	90	280	ISLAH	
		ANTAKYA	90	155	ISLAH	
		BULUT	90	224	ISLAH	
		HAYDARBEY	90	238	ISLAH	
		ESKİ SİLLE CD	200	735	ISLAH	
		OTLUKBELİ	90	352	ISLAH	
29	KOSOVA	ÜMİTLİ			ABONE	
		ANTİKA	90	80	YENİ	
		Ş.OKTAY NURBAŞ	90	83	YENİ	
		BENDE	90	66	YENİ	
		ÜNLÜER	90	103	YENİ	
30	MALAZGİRT	MUHTELİF SOKAKLAR	200	798	ISLAH	
			140	445	ISLAH	
			90	2016	ISLAH	
31	MEHMET AKİF	ZEMBİLLİ	140	418	ISLAH	
		BÜTÜN,GÜLİZAR	90	140	ISLAH	
		TEBLİĞ	90	110	ISLAH	
		VİLDAN	90	177	ISLAH	
32	NİŞANTAŞI	ŞAHİNAĞA	140	356	ISLAH	
33	PARSANA	HABEŞİ	90	20	ISLAH	
		İMRAN	140	444	ISLAH	
			90	385	ISLAH	
		TAŞERLER	90	37	ISLAH	
		HORASAN	90	40	ISLAH	
		PAŞABEY	90	142	ISLAH	
		KUMAŞCI	90	247	ISLAH	
		YALÇINOBA	140	333	ISLAH	
			90	99	ISLAH	
		KANARYA ADASI	90	150	ISLAH	
34	SAKARYA	SAFA	90	320	ISLAH	
		KAMERA	90	410	ISLAH	
		KANAR	90	97	ISLAH	
		BALYALI	90	135	ISLAH	
		MEDRESE	90	135	ISLAH	
		ACARKÖY	90	157	ISLAH	
		SİREN	90	236	ISLAH	
		AKÇAYALI	90	136	ISLAH	
		GEZİ	90	120	ISLAH	
		NAHŞİ	90	135	ISLAH	
		KADİR	90	200	ISLAH	
		BAKAN	90	85	ISLAH	
		GÜRLEYEN	90	82	ISLAH	
		NÜFUS	90	65	ISLAH	
		MERSİYE	90	60	ISLAH	
		BELOVA	90	84	ISLAH	
		ŞENDERE	90	30	ISLAH	
		GÖZOVA	90	165	ISLAH	
		GÜLEDA	90	160	ISLAH	
		YANIKALİ	90	60	ISLAH	
		ÜÇPINAR	90	81	ISLAH	
35	SANCAK	ZÜMRÜT	315	268	ISLAH	
			90	18	ISLAH	
		SOYDEMİR	315	186	ISLAH	
			90	19	ISLAH	
		FEHİME	315	184	ISLAH	
			90	35	ISLAH	

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI SELÇUKLU İLÇESİ 2015 YILI YATIRIM TASLAK LİSTESİ						
NO	**MAHALLE**	**CADDE-SOKAK**	ÇAP	**UZUNLUK**	ISLAH/YENİ	**TALEP**
36	SANCAK	YONCA	90	30	YENİ	SELÇUKLU BELEDİYESİ
37	SELAHATTİN EYYUBİ	BAHARİSTAN CD	90	750	ISLAH	
		PINARALTI	90	35	ISLAH	
		FUAR	90	280	ISLAH	
		AKSEKİLİ			ABONE	
		GENÇTÜRK	90	214	ISLAH	
		KÜÇÜKKILINÇ	315	686	ISLAH	
		ATABEY	90	140	ISLAH	
		ATLIHAN	90	208	ISLAH	
		MÜZEYYEN	90	150	ISLAH	
		MAMUR	250	119	ISLAH	
		BATI	90	69	ISLAH	
38	SELÇUK	TEKKE CD	200	1325	ISLAH	
		TAŞOVA	90	400	ISLAH	
		HACIBEKİR	90	133	ISLAH	
39	ŞEKER	ADAKALE CD	200	553	ISLAH	
40	SİLLE AK	SEYFİ	300	214	ISLAH	
			90	307	ISLAH	
		SABİT	300	394	ISLAH	
		TALİP	90	396	ISLAH	
		DURAN	90	227	ISLAH	
		AYVALI	90	150	ISLAH	
		ÇAKILCILAR	90	300	ISLAH	
		PAZARYOLU	90	308	ISLAH	
		PÜRNÜR	140	535	ISLAH	
		TEKÇINAR	90	113	ISLAH	
		VURALLAR	90	200	ISLAH	
41	ŞEYH ŞAMİL	BURHAN	90	100	ISLAH	
		ALPER	90	240	ISLAH	
		AĞAÇAYIRI	90	162	ISLAH	
		ARUZ	90	215	ISLAH	
		AÇIKKALPLİ	90	174	ISLAH	
		BANDIRMA	90	760	ISLAH	
		BARIŞIK	90	70	ISLAH	
		BELGESEL	90	55	ISLAH	
		BELİRTİ	90	60	ISLAH	
		BEYAZGÜL	90	180	ISLAH	
		BEZİRHAN	90	70	ISLAH	
		BİRİM	90	112	ISLAH	
		BİZİM	90	320	ISLAH	
		BÜYÜK	90	185	ISLAH	
		ESENTEPE	90	101	ISLAH	
		GÖKOBA	90	180	ISLAH	
		GÖREME	140	251	ISLAH	
		GÜNCE	90	230	ISLAH	
		HAMZA	90	260	ISLAH	
		İPSALA	90	116	ISLAH	
		İRŞAD	90	175	ISLAH	
		İSKENDER	90	570	ISLAH	
		KARABACAK	90	127	ISLAH	
		MİLAS	90	500	ISLAH	
		NECİPBEY	90	280	ISLAH	
		NİMETLİ	90	201	ISLAH	
		RASİMUSTA	90	411	ISLAH	
		RİSALE	90	185	ISLAH	
		SARAYCILAR	90	300	ISLAH	
		SARAÇ	90	340	ISLAH	

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI SELÇUKLU İLÇESİ 2015 YILI YATIRIM TASLAK LİSTESİ						
NO	**MAHALLE**	**CADDE-SOKAK**	ÇAP	**UZUNLUK**	ISLAH/YENİ	**TALEP**
42	ŞEYH ŞAMİL	SEFA	90	220	ISLAH	SELÇUKLU BELEDİYESİ
		SIRADAĞLAR	90	100	ISLAH	
		SIZMA	90	114	ISLAH	
		TACER	90	96	ISLAH	
		TANZİM	90	230	ISLAH	
		TATBİK	90	330	ISLAH	
		TOPRAK	90	138	ISLAH	
		TÜRKÜ	90	366	ISLAH	
		VİCDAN	90	315	ISLAH	
		YAKINÇAĞ	140	180	ISLAH	
		ZİHNİ	90	94	ISLAH	
		ÖZLEM	90	105	ISLAH	
		ÖZNALCI	90	250	ISLAH	
		ÜNAL	90	210	ISLAH	
43	YAZIR	HOŞSOHBET	140	1230	ISLAH	
		FADIL	250	270	YENİ	
		AKKONAK	140	200	YENİ	
		BAŞAK	90	130	YENİ	
44	BOSNA HERSEK	İSTANBUL YOLU İÇİ	300	145	ISLAH	SU TESİSLERİ
		IŞIKLAR	300	271	ISLAH	
		TEKKİRAZ	300	191	ISLAH	
		TEPEALAN	300	123	ISLAH	
45	ŞEYH ŞAMİL	BARIŞ CD	140	400	ISLAH	
46	ERENKÖY	ERENKÖY CD	300	290	ISLAH	
			140	959	ISLAH	
			90	362	ISLAH	
		YİĞİTBAŞI	90	165	ISLAH	
		KARAYAMAÇ	90	50	ISLAH	
47	HOCACİHAN	ARAPSARNIÇ	140	320	ISLAH	
48	AKINCILAR	YENİ SİLLE CD	140	2530	ISLAH	
49	YAZIR	BEYHEKİM	350	695	ISLAH	
			300	521	ISLAH	
			200	441	ISLAH	
			140	4795	ISLAH	
			90	281	ISLAH	
		KARAKOÇLAR	90	620	ISLAH	
50	SANCAK	TACMAHAL	140	381	ISLAH	
		SÜMER	300	582	ISLAH	
			140	582	ISLAH	
		BAHTİYARLI	315	275	ISLAH	
		AKARTUNA	200	1021	ISLAH	
		SERİNCAN	200	604	ISLAH	
		PERVANE,OTAĞ	140	570	ISLAH	
51	SİLLE AK	DÖNÜM	90	762	ISLAH	
		TUTKUN	140	2045	ISLAH	
		HAMİYET,TAKRİR,KARLIDERE	90	320	ISLAH	
52	KILINÇARSLAN	YİĞENOĞLU CD	200	730	ISLAH	

TOPLAM=	350	695
TOPLAM=	315	1599
TOPLAM=	300	3986
TOPLAM=	250	1303
TOPLAM=	200	10029
TOPLAM=	140	32561
TOPLAM=	90	72451
TOPLAM=	90(TS)	1000
GENEL TOPLAM=		123624

KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Servislerimiz

- Kontrol Mühendisleri
- KOSABİS
- Kanal Etüd Proje Servisi
- Kanal Keşif Kontrol Servisi
- Kanal AYKOME Bürosu

Kontrol mühendisleri

Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan tüm bölgenin kanalizasyon ve yağmursuyu projelerinin kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi.

- İhale şartnamelerinin ve ihale evraklarının hazırlanması.
- Birimimizle ilgili yapılacak olan tüm ihalelerin yapılması ve sonuçlandırılması işlerini yürütür
- Su ve Kanalizasyon tesislerinin yapılması gereken alanların kamulaştırılması işlerinin takibini yaparlar.
- TOKİ tarafından ihale edilen ve firmalar tarafından yapılan altyapı projelerinin onaylanması işlerini yürütür. Yapılacak olan protokoller ve proje raporları işlerini yürütür.
- İdaremize ait parseller de ifraz, tevhit ve imar uygulamaları yapılmaktadır. İmar Planı tadilatları hazırlanmaktadır
- Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporları hazırlanmaktadır.
- Diğer servislerin ihtiyaç duydukları proje ile ilgili konularda yardımcı olunmaktadır.
- İdarenin ihtiyaç duyduğu restorasyon, rekreasyon ve mimari projeler hazırlanmaktadır.
- Vatandaşlardan, resmi kurumlardan gelen kanalizasyon müracaatlarının değerlendirilmesi.
- 6360 Sayılı Yasa gereği Konya Büyükşehir Belediyesi İl Sınırı olarak kabul edilmesinden Kurumumuza geçen yeni yerlerin tahsis işlemlerini takip etmek.



Mühendisler



Koski Altyapı Bilgi Sistemleri Bürosu

PERSONELİN YAPTIĞI İŞLER


Kosabis : Koski Altyapı Bilgi Sistemi

Bu birimdeki personellerimiz kanalizasyon şebekelerinin ve yağmursuyu şebekelerinin sayısal ortama aktarılması, plan tadilatlarının takibi işlerini bilgisayar ortamında yapmaktadırlar. Ayrıca etütleri yapılan cadde ve sokakların bilgisayar ortamında projelerinin çizilmesi işlerini yaparlar. Sayısal ortama aktarılan bilgilerin veri tabanına aktarılması ve kent bilgi sistemi ile entegrasyonun sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır.

Kanal Keşif Kontrol Servisi

Belediyelerden, Genel Müdürlüğümüzden, Daire Başkanlığımızdan, Toplu Konut İdarelerinden, kooperatiflerden, firmalardan ve vatandaşlarımızdan gelen kanalizasyon ve yağmursuyu ihtiyaçlarının incelenmesi , fizibilite çalışmalarının yapılması ve proje altlıklarının hazırlanması işlerini yaparlar.


YILLARA GÖRE KANALİZASYON PROJE UZUNLUKLARI (KM)

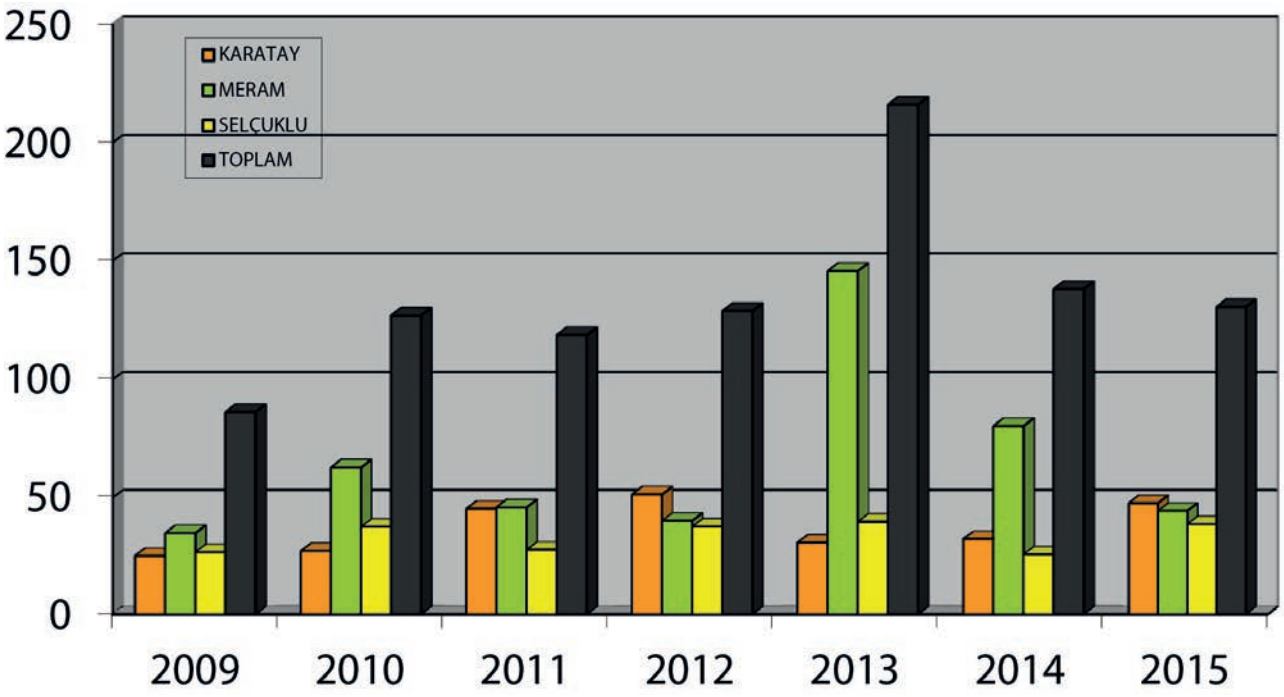

Yıllar	Uzunluk Yıllara Göre (Km.)	Uzunluk (Km.)
2004	51.2	2230.1
2005	62.9	2293.0
2006	192,8	2485.8
2007	51.8	2537.6
2008	80.7	2618.3
2009	86.3	2704.6
2010	127,4	2832,0
2011	118,8	2950,8
2012	128,9	3079,7
2013	216,1	3295,8
2014	138.2	3434
2015	130,64	3564,64


Tablo 1. Arazi ölçümü yapılan proje uzunluğu

YILLARA GÖRE KANALİZASYON PROJE UZUNLUKLARI (KM)

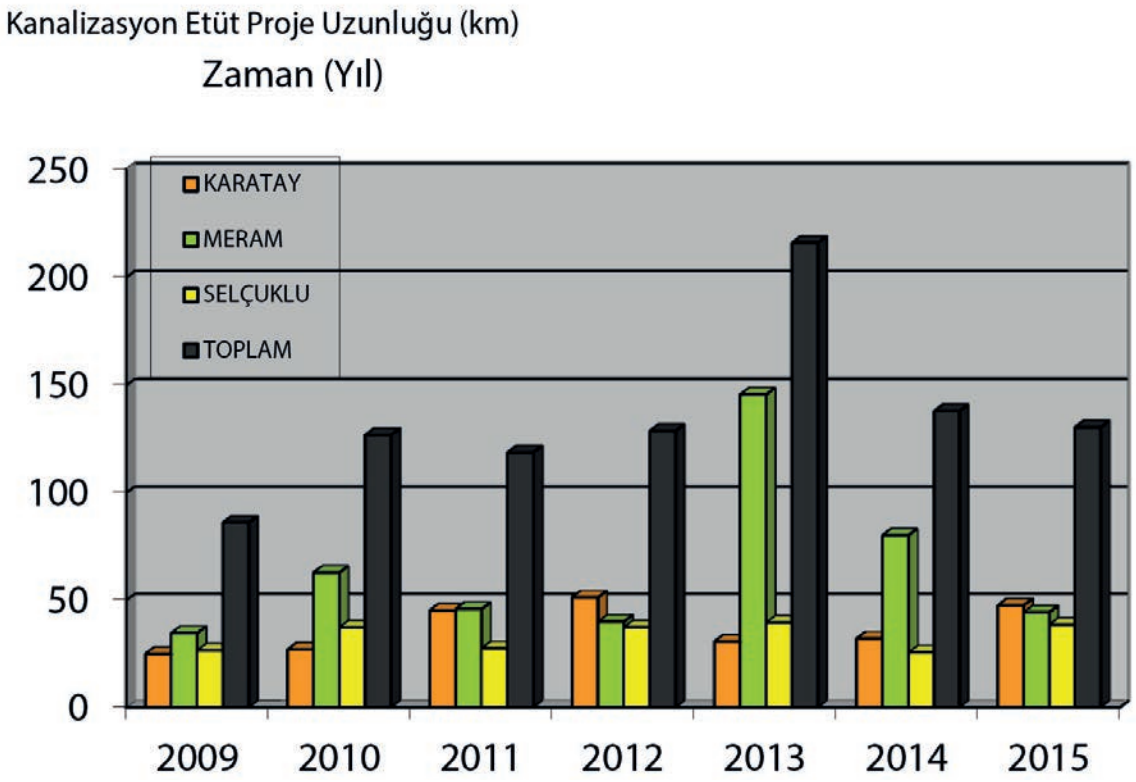

Yıllar	Karatay (km)	Meram (km)	Selçuklu (km)	Toplam (km)
2009	25	34.7	26.6	86.3
2010	37.4	62.9	27.1	127.4
2011	45.3	45.9	27.6	118.8
2012	51.4	40.0	37,5	128,9
2013	30,7	145,8	39,6	216,1
2014	32.14	80.38	25.64	138.16
2015	47,67	44,41	38,56	130,64

Tablo 2. Merkezi İlçelere göre etüt proje uzunlukları

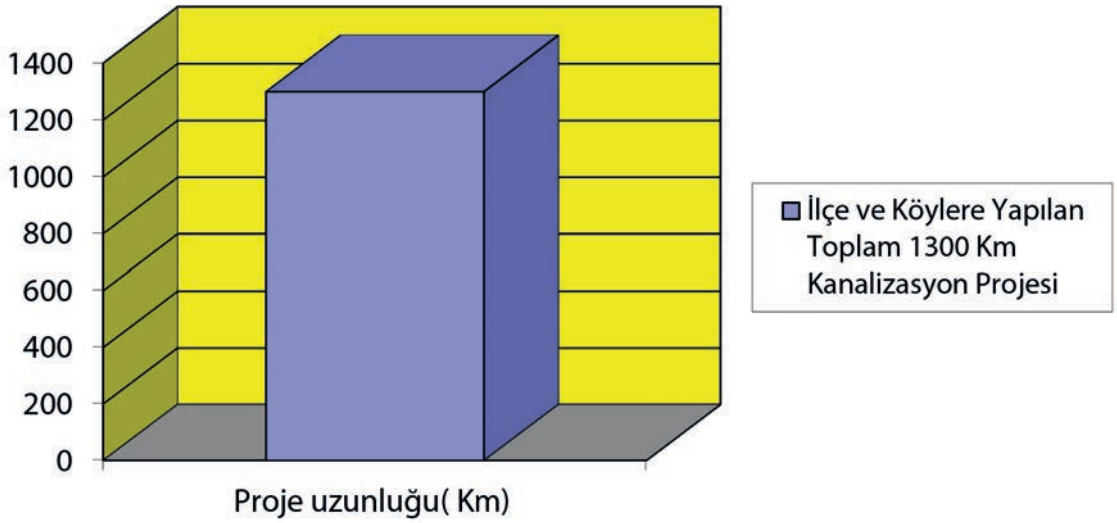

Tablo 3. İlçelere göre etüt proje uzunlukları

Kanal Etüt Proje Servisi

- Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan, Kanal Keşif Kontrol servisi tarafından yapılan çalışmalarının imara uygunluklarının kontrol edilmesi.
- Proje çalışması yapılacak bölgelerin imar yol durumlarının incelenmesi
- Belediyeler tarafından yapılan tadilatların incelenmesi.
- Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi yapılacak cadde ve sokaklarda yer teslimlerinin yapılması.
- Vatandaşlar tarafından yapılan kanalizasyon müracaatlarının değerlendirilmesi.
- Birimimizle ilgili tüm harita ve imar işlerini yürütürler.
- 6360 Sayılı Yasa gereği Konya Büyükşehir Belediyesi İl Sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı çalışma alanımız Büyükşehir İl Sınırı oldu.



Arazide Yapılan Keşif ve Ölçümleri

2015 YILINDA GELEN DİLEKÇELER				
GELEN ŞEBEKE TALEPLERİ (ADET)	2015 YILI			
	SELÇUKLU	MERAM	KARATAY	TOPLAM
Abone İşleri Daire Başkanlığından Gelen	115	99	161	375
İlçelerden ve Köylerden Gelen				727
Vatandaşlardan Gelen	264	258	178	700
Diğer				592
Toplam				2394

Tablo 4. Gelen Şebeke Talep Dilekçeleri


Kanal AYKOME Bürosu

Müdürlüğümüze gelen evrakların kayıt ve takip işleri ile kurum içi ve dışı yazışmalar yapılmaktadır.

Kanalizasyon şebeke yapımları ve arızalar için AYKOME' den gerekli altyapı kazı müsaadeleri alınmaktadır. Aylık ve Yıllık faaliyetler veri bankasına aktarılmaktadır



Aykome (Koski Alt Yapı Koordinasyon Merkezi)

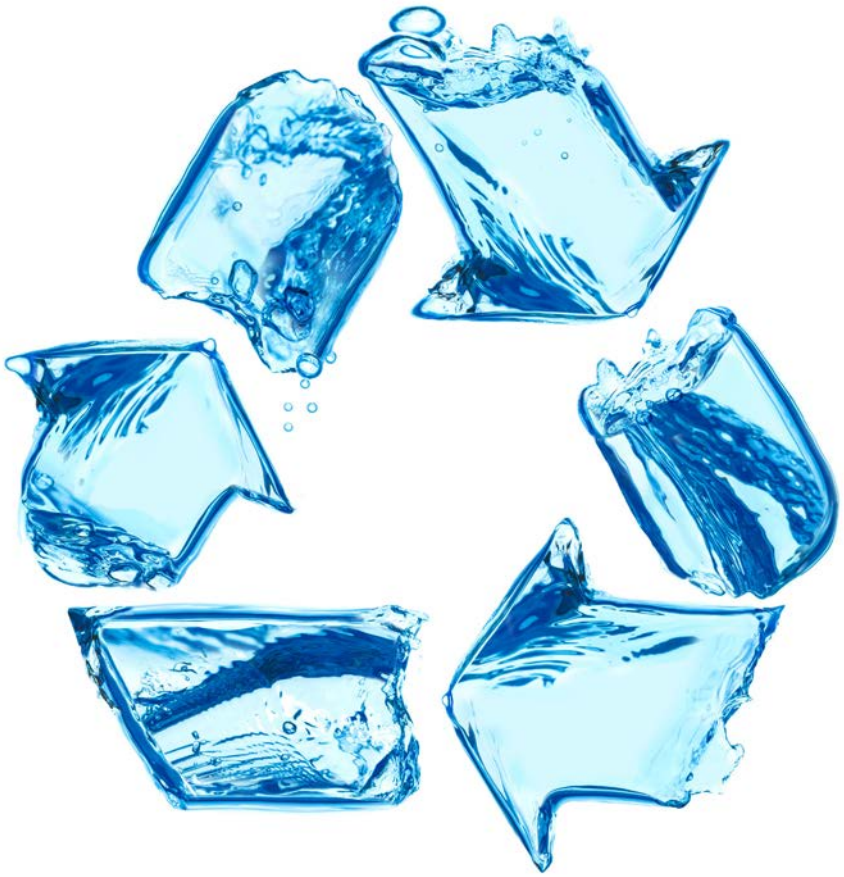

SU TESİSLERİ

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan bölgelerin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının belirlemek, ihtiyaç olan suyu her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklardan temin etmek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar gereken her türlü tesisin etüd ve projelerini yapmak veya yaptırmak, yapılan projelere göre içme suyu tesislerini yapmak veya yaptırmak, ikmal edilmiş su tesislerinin bakım ve işletmesini yapmak veya yaptırmak, mevcut içme suyu tesislerinin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için her türlü tedbiri almak, içme, kullanma ve endüstri suyu kaynaklarının kirletilmesine, su kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek amacıyla her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, şehre verilen içme ve kullanma suyunun sağlık hizmetleri yönünden gerekli kontrollerini yapmak, bu hususta ilgili kuruluşlarla ilişki kurmak ve alınacak önlemleri tesbit ederek gereğini yapmak Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerdir.



Altınapa Baraj Gölü'nü besleyen Keçimuhsine deresi

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ve ÇEVRE SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen faaliyetler:

1- İçme suyu arıtma tesisinin etkin ve verimli şekilde işletilmesi.
2- Tüketime sunulan içme ve kullanma sularının standartlara uygun dezenfeksiyonunun yapılması.
3- Genel Müdürlüğümüze ait su depoları ile talep olması halinde özel ve tüzel kişilere ait su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması.
4- Altınapa Baraj Gölü suyunun bahçe sulaması için planlaması ve işletmesini yapmak.
5- KOSKİ tesislerinin (su depoları, pompa istasyonları, arıtma tesisleri ve işletme tesisleri) yeşil alan tanzim işleri, park-bahçe hizmetleri ve bakım işlerinin yürütülmesi.

A) Altınapa Baraj Gölü

Konya kent merkezi içme ve kullanma suyu ihtiyacı için tek yüzeysel su kaynağı olan Altınapa Baraj Gölü, 2.986.000 m²'lik su toplama alanı ve 32 milyon m³ 'lük maksimum su toplama kapasitesine sahip olup Uluçay, Küçükmuhsine, Akpınar ve Fındıklı Dereleri ve diğer kaynaklarla (yağmur, kar) beslenmektedir



Altınapa Baraj Gölü

Tablo 1. Altınapa Baraj Gölü Su Miktarı (m3), 2009-2015

YIL	AYLAR											
	Ocak	Şubat	**Mart**	**Nisan**	Mayıs	**Haziran**	**Temmuz**	Ağustos	Eylül	**Ekim**	Kasım	Aralık
2009	4.529.000	5.589.000	7.941.000	14.635.000	21.414.000	25.076.000	22.246.000	19.254.000	15.214.000	12.319.000	10.985.000	10.184.000
2010	10.772.000	13.529.000	18.118.000	20.695.000	21.311.000	18.707.000	17.899.000	14.088.000	9.500.000	7.674.000	6.675.000	5.808.000
2011	6.566.000	6.895.000	8.127.000	13.295.000	17.802.000	25.022.000	27.174.000	24.129.000	20.874.000	17.394.000	16.520.000	15.575.000
2012	16.171.000	16.171.000	25.925.000	27.454.000	27.426.000	24.804.000	20.746.000	16.919.000	12.980.000	11.534.000	11.913.000	13.380.000
2013	15.417.000	18.633.000	21.881.000	23.248.000	22.142.000	19.079.000	13.828.000	9.211.000	6.396.000	2.665.000	1.756.000	2.765.000
2014	4.489.000	6.122.000	8.749.000	9.775.000	10.259.000	9.997.000	6.879.000	5.048.000	4.704.000	4691000	5.161.000	9.103.000
2015	12.668.000	18.856.000	30.517.000	29.675.000	29.488.909	30.371.000	27.034.000	23.701.000	20.313.000	18.338.000	17.972.000	17.108.000

B) İçme Suyu Arıtma Tesisi

104.000 m3/gün (1,2 m3/s) kapasiteli İçme Suyu Arıtma Tesisi fiziksel ve kimyasal arıtımının gerçekleştirildiği konvansiyonel bir tesistir.

Tesis 2015 yılı için, 13.01.2015 tarihinde işletmeye alınmıştır.



Resim 3. Konya İçme Suyu Arıtma Tesisi

Tablo 3. Kullanılan Kimyasal Miktarları, 2015

Kimyasal	Polielektrolit	Gaz Klor	PACS
	(kg)	(kg)	(kg)
Ocak	67	545	8000
Şubat	133	778	8000
Mart	208	5510	20000
Nisan	208	5592	10000
Mayıs		10000	
Haziran		9603	
Temmuz		8903	
Ağustos		11906	
Eylül		13310	
Ekim		8754	
Kasım	208	3208	30000
Aralık	166	3090	20000
Toplam	990	81199	96000

Tablo 2. İçme Suyu Arıtma Tesisi Su Üretim Değerleri, 2009-2015

YIL	AYLAR (m^3)												
	Ocak	Şubat	**Mart**	**Nisan**	Mayıs	**Haziran**	**Temmuz**	Ağustos	Eylül	**Ekim**	Kasım	Aralık	**Toplam**
2009	480.800	739.200	1.080.500	1.963.200	2.380.800	2.252.800	2.316.800	2.185.600	2.160.000	1.957.000	2.304.000	1.832.800	**21.653.500**
2010	932.800	1.242.300	2.306.400	2.232.000	2.274.884	2.224.963	1.748.336	2.383.647	1.860.875	1.488.000	1.356.400	1.056.000	**21.106.605**
2011	943.000	857.000	988.000	936.000	1.156.800	1.969.300	2.194.800	2.146.000	2.232.000	1.983.000	2.088.000	0	**17.493.900**
2012	2.170.056	2.450.400	2.426.400	2.323.100	2.976.000	2.911.900	3.276.800	3.028.800	3.072.000	2.364.000	409.200	588.000	**27.996.656**
2013	1.955.450	1.789.925	2.153.600	2.482.200	2.578.000	2.592.000	2.854.500	3.046.400	2.022.500	2.176.100	236.725	0	**23.887.400**
2014	-	-	-	97.548	798.921	1.190.608	1.721.820	1.450.356	935.229	747.049	176.744	-	**7.107.670**
2015	498.675	941.406	2.206.535	2.226.955	2.488.909	2.618.596	2.689.524	2.715.105	2.603.948	2.709.456	1.774.667	1.980.528	**25.545.304**

C) İlçelerdeki İçme Suyu Arıtma Tesisleri:

6360 sayılı Kanun gereğince, ilçelerde bulunan arıtma tesisleri Genel Müdürlüğümüz bünyesine geçmiştir. Bu kapsamda;

- Kulu İlçesi Karacadağ Mahallesinde bulunan 7 lt/sn kapasiteli nitrat giderim paket arıtma tesisi geçici kabulü yapılmış ve İdaremize devir teslimi yapılmıştır.
- Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi sertlik giderim paket arıtma tesisinin revizyonu tamamlanmıştır.
- Kulu İlçesi Tuzyaka Mahallesinde bulunan Bor giderim paket arıtma tesisi revizyonu tamamlanarak işletmesine devam edilmiştir.
- Altınekin ilçesi Dedeler Mahallesi sertlik giderim paket arıtma tesisi revizyonu tamamlanmış, işletmesine devam edilmiştir.
- 7 lt/sn kapasiteli Çumra Tahtalı Mahallesi sertlik giderim paket arıtma tesisi yapımı tamamlanmış ve devreye alınmıştır.





- Ereğli Zengen deki mevcut paket arıtmalar için kontrol ve tespit çalışmaları yapılmıştır.
- Karapınar içme suyu arıtma tesisinde kontrol ve tespit çalışmaları yapılmıştır.
- Taşkent ilçemizde yapılması planlanan bulanık giderim amaçlı paket arıtma tesisi için yerinde incelemeler yapılmış, avan projeleri ve teknik şartname hazırlanmıştır.
- Ayrıca Karapınar ve Altınekin İlçeleri arıtma tesislerinin tuz ihtiyacı, Beyşehir İlçesinin gaz klor ve alüminyum sülfat ihtiyacı vb. ilçelerin kimyasal ihtiyaçları da işletme şefliği tarafından takip edilerek teminleri sağlanmıştır.

Bakım onarım şefliği 1 ustabaşı ve 3 usta ile içme suyu arıtma tesisinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, sağlıklı içme ve kullanma suyunun üretilmesini gerçekleştirmek, barajdan arıtma tesisine gelen suyun ve isale hattının kontrolünü sağlamak, tesisimize ait makinelerin, ekipmanların gerekli olan bakım ve onarımlarının yapılması-yaptırılması, pompa istasyonlarındaki gaz klor ekipmanlarının bakım onarım ve takibinin yapılması-yaptırılması, alanında faaliyet göstermektedir.

Mekanik Bakım Onarım Faaliyetleri

- tpompa istasyonlarındaki boş gaz klor tüpleri doluları ile yer değiştirildi. Ayrıca bu pompa istasyonlarında ve Tesisimizdeki gaz klor arızaları yapıldı.
- Arif Bilge (P3) pompa istasyonundaki gaz klorlama sistemine bağlı 2 adet buster pompasının tamirinin fiyatı, yenisinin fiyatına yakın olduğundan dolayı yenisi acil
- Gaz klorlamada işinde kullanılan 1.000 kg.lık. 14 adet tankların genel bakımı ve boyası yetkili firmaya yaptırıldı.
- İlaçlama işinde kullanılan tekne ve tekne motorunun tamiri ve bakımı yapıldı.
- Altınapa baraj gölünde alg oluşumunu önlemek amacıyla bakır sülfat ilaçlaması yapıldı. Teknenin taşınması göle indirilmesi ve iş bitiminde yeniden tesisimize olan sevk-idaresi yapıldı.
- Altınapa baraj gölü ile tesis arasındaki çelik boru üzerinde bulunan vantuzların kontrolleri sağlandı. Arızalı 3 adet vantuz ve 3 adet vana yenisi ile değiştirilerek yeniden Tesis işletmeye alındı.
- Macar kanalındaki inşaat işleri, KOSKİ inşaat ekiplerine yaptırıldı.
- Durultucu ünitesinde bulunan 0, 1, 2, ve 3 nolu havuzların çamur boşaltma hunilerinin tamiri ve bakımı yapıldı.
- Filtre ünitesinde bulunan 7'şer adet Ø 80'lik, Ø 250'lik, Ø 500'lük, Ø 600'lük ve Ø 750'lik pnomatik vana ve valflerin tamiri-bakımı yapıldı.
- Filtre ünitesi 1, 2 ve 3 nolu geri yıkama pompasının tamiri ve bakımı yapıldı. Ayrıca 2 nolu geri yıkama pompasına ait 400'lük çalpara çek valfin tamiri ve bakımı yapıldı.
- Filtre ünitesindeki 2 adet vidalı kompresör ve 1 adet hava kurutucu cihazının bakımları yetkili servis tarafından yaptırılarak işletmeye alındı.
- Kimya ünitesindeki polielektrolit dozlama hattı, dozaj pompaları ve gaz klorlama dozlama hattı buster pompalarının bakımları yapılarak işletmeye alındı.
- PACS dozlama hattının ve dozaj pompalarının bakımları yapılarak işletmeye alındı.
- Tesisimizde bulunan fortlifin kışlık bakımları yaptırıldı.
- Tesisimizde ve lojmanlarda bulunan gaz yakıtlı brülörlerin tamiri ve bakımları yaptırıldı.
- Tesisimizde bulunan ana kapı, filtre ünitesindeki 600'lük borular ve filtre boru galerisindeki alüminyum kapakların pasifisazyonu yapılarak boyandı.
- Kulu Tuzyaka mahallesinde bulunan paket arıtma tesisinde pasifisazyon işlemi yapılarak, boyama işi yapıldı.
- İdari bina alt bölümde bulunan erkekler ve bayanlar tuvaletine sıcak su tesisatı çekildi.
- Atölye ve ısı merkezinde çalışan hava kompresörü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında atölyenin dış kısmına kabin yaptırılarak buraya taşındı ve bağlantıları yapılarak işletmeye alındı.
- İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, atölye ve ısı merkezinde bulunan atık su kanalına yeni ızgara yapılarak boyandı.
- İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, filtre ünitesindeki 2 adet basınçlı kap, atölye ve ısı merkezinde ve lojmanlardaki 4 adet kalorifer kazanları, 1 adet forklift ve 1 adet elektrikli çaraskalın yetkili firmaya muayene ve testleri yaptırıldı.
- Beyşehir içme suyu arıtma tesisleri, hızlı karıştırma ünitesine ait 2 adet redüktörün yenisi yaptırıldı.
- Beyşehir içme suyu arıtma tesisleri, Filtre ünitesindeki yedek hava blower pompasının tamiri ve bakımı yapıldı.
- Çumra çukur kavak paket arıtma tesisinin geçici kabulleri yapıldı. Öngörülen boruların yalıtımları yapıldı.

Elektrik Bakım Onarım Faaliyetleri

- Elektrik hane olarak bakım programı çerçevesinde günlük, haftalık, aylık ve 6 aylık ve yıllık bakımlar tamamlanmıştır.
- Günlük arıza ve onarım çerçevesinde 81 adet muhtelif çalışma yapılmıştır.

- Filtre binasında havuzların seviye sensörleri yenilendi. İlaveten havuz kumanda konsollarındaki vana açıklıkları ve su seviyelerinin otomasyonlarını sağlayan kontrolör cihazları dijital cihazlarla değiştirildi.
- Filtre kompresör bölümüne kombinasyon panosu hazırlanarak monte edildi. Atölye binasına yeni alınan kompresöre enerji hattı çekildi.
- P1, P2, P3 pompa istasyonları klor bölümü ve ana jeneratörün ısıtıcı rezistansları yenilendi.
- Akyokuş çay suları idari binalarında yapılan ana değişiklikleri kapsamında muhtelif iç tesisat çalışmaları yapıldı. Klor binası tüp taşıma calaskalı yaptırılan yenileme ile verimli hale getirildi.
- Depo temizleme odası iç tesisat tadilatı ile UFO ısıtıcıları takıldı.
- Filtre kombinasyon panosuna 4 adet değişik güçte V otomat takıldı.
- Çumra Çukurkavak paket arıtma tesisinde iç tesisat çalışması yapıldı.

Klorlama Faaliyetleri

- İlçelerde 310 Kuyu ve depoya 12V (güneş enerjili) ve 220V otomatik klorlama sistemi kuruldu.
- Genişleyen Merkez bölgede 37 Adet yeni kurulum ve eski cihazın yenileme çalışması yapıldı.
- 19 ilçede klorlama ekibi araçları ve tüm teknik malzemesiyle birlikte kuruldu.
- Tüm ilçelerde klor sevkiyat çalışması yapıldı.
- Merkeze bağlı olarak ilçelerdeki arıza ve tamirat çalışmalarında çalışacak olan 1 elektrikçi teknik ekip tüm teknik donanımıyla beraber gerekli olan arıza çalışmalarını yaptı.
- İlçelerde kurulan klor ekiplerine pompa arıza giderilmesi, bakiye klor ölçümü ve klor sistemi hakkında gerekli teknik bilgilendirme çalışmaları yapıldı gerekli zamanlarda yerinde çalışmalara teknik destek sağlandı.
- 2016 yılında kullanılmak üzere 1.000.000 kg sıvı klor ihalesi (dağıtım işi dahil)



Güneş Panelli Depo(12 V) Otomatik Klorlama Sistemi

6360 sayılı Kanun gereğince, 2014-2015 yıllarında Merkez ve ilçelerde içme ve kullanma suları için yapılan klorlama çalışmaları Tablo1 ve Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 1. Merkezde İçme Suyu Klorlama Çalışmaları

	Montajı Yapılan Klor Cihazı	Sıvı Klor Tüketimi	Mobil Ekiplerce İlçelere Takılan Cihazlar
2014	67	67200	83
2015	37	144970	0
Toplam	104	212170	83

Tablo 2. İlçelerde İçme Suyu Klorlama Çalışmaları (2014-2015)

S.No	İlçe	220 Volt Klor Cihazı		12 Volt Klor Cihazı		İlçelere Verilen Toplam Klor Cihazı		2014 -2015 İlçelere Verilen Klor Cihazları	Sıvı Klor	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015
1	Akşehir	32	15	8		40	15	55	42160	71420
2	Ilgın	40	7	10	8	50	15	65	18500	74000
3	Ereğli	10	13	2	2	12	15	27	10700	41240
4	Karapınar	30	3	2	7	32	10	42	10000	22730
5	Cihanbeyli	19	1	5		24	1	25	9000	9160
6	Beyşehir	54	5	25	1	79	6	85	17250	81720
7	Yunak	33	11	3	2	36	13	49	6500	23400
8	Bozkır	48	5	12	33	60	38	98	11250	27360
9	Çumra	26	48		8	26	56	82	13675	47980
10	Sarayönü	17	13		2	17	15	32	7800	27440
11	Kulu	31		5		36		36	17450	37060
12	Seydişehir	6	2	2	11	8	13	21	11750	43700
13	Kadınhanı	21	11		12	21	23	44	10700	31300
14	Sülüklü	8		1	2	9	2	11	2500	12490
15	Taşkent	3		2		5		5		
16	Derbent					0			1850	17700
17	Güneysınır	3				3		3	7330	28290
18	Emirgazi	19				19		19	5050	25290
19	Yeniceoba	12			6	12	6	18	6050	26340
20	Derebucak								1140	
21	Altınekin	17	20			17	20	37	1250	41650
22	Derbent	4				4		4		17700
23	Hadim	11		15	25	26	25	51		18900
24	Sarıoğlan									9000
25	Akören								1000	9160
	Toplam	444	154	92	119	536	273	809	212905	745030

Çevre Sulama Faaliyetleri

Altınapa barajından çevre sulamasına verilen suyun sevk ve idaresinin yapılması, Meram İlçesindeki sulama suyu abonelerine tahakkuk çıkarılması ve dağıtılması ile mevcut sulama hattının bakım, onarım, tadilat ve temizlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.

2015 Yılı Abone Çalışma Raporu			
	Yapılan Çalışma	Abone Sayısı	Açıklama
1	Aktif Abone	3441	Sulama Yapan Aboneler.
2	Yeni aboneler	426	Yeni sulamaya başlayan ve tapu ayrımı yapan aboneler.
3	Abone bilgi güncelleme	2113	Çevre sulama aboneleri ve servisimize gelen şebeke abonelerinde bilgi (T.C. kimlik no, telefon, adres) güncellemesi.
4	Mükerrer aboneler	8	Birden fazla abonelerin fesih işlemleri.
5	Sulama yapmayacak aboneler	1903	Sulama yapmayacak aboneler.
6	İlerde sulama yapabilecek Aboneler	609	Sulama imkanı olan ve araştırmaları devam eden aboneler.
7	Toplam Abone	**5953**	Toplam abone sayısı.

Bakım-Onarım ve Sulama İşleri

1- Sulama sistemi, 11 ana kanal ve bunlara bağlı tali kanallardan oluşmaktadır ve toplam uzunluğu 130 km'yi bulmaktadır.
2- 2015 yılında 01 Mayıs-25 Eylül 2015 tarihleri arasında toplam 4 kez barajdan sulama çalışması yapılmıştır.
3- 2015 yılı içinde 1. sulamada 1.750.000 bin m³ 2. sulamada 1.750.000 bin m³ 3. sulamada 1.750.000 bin m³ 4. sulamada 1.750.000bin m³ su kullanılmıştır.. Toplam 7.000.000 m³ su kullanılmıştır. Toplam 14.537 m² alan sulanmış olup, baraj sulama suyu tahakkuk toplamı 19.777,00 TL, Tahsilat toplamı 30.367,66 TL olarak gerçekleşmiştir.
4- Meram bölgesinde 26 mahalleye dağılan bu kanalların tamamı ekiplerimizce periyodik şekilde devamlı temizlenmiştir. Tahrip olan beton kanalların bakım ve onarımları yapılmıştır. İhtiyaç duyulan yerlerde rögar ve su açma ile kapama kapakları montajı yapılmıştır.
5- Meram Belediyesinin 18. madde imar çalışmaları nedeniyle meydana gelen yol tadilatı ve değişiklerinden dolayı bazı kanallarda tadilat yapılmış, bazılarının yerleri değişmiştir. Yeni açılan yolların durumuna göre yeni sulama kanalları açılmıştır. Yeni yol geçişleri, su çevirme avgazları, tıkanan veya çöken mevcut yol geçişleri yenilenmiştir. Bu çalışmalarda 50 adet beton kapak, 165 adet sac kapak, 8 adet çıkma vana 242 mt parça PVC boru, 4mt çelik boru, 12 mt asbest, 2159 mt korige boru 162 torba çimento 30 torba kalekim kullanıldı.110 m³ küp kum kullanıldı.
6- 145 adet yapım dilekçesine cevap verildi.

Peyzaj Ve Depo Temizleme Faaliyetleri

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan İdaremize ait tesislerin (su depoları, pompa istasyonları, arıtma tesisleri ve işletme tesisleri) yeşil alan tanzim işleri, park-bahçe ve bakım hizmetleri, depo temizliği ve dezenfeksiyonu ve sitelerin, apartmanların içme suyu depolarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmektedir.

Çevre Düzenleme ve Peyzaj İşleri hizmet alım ihalesi ile yaptırılmaktadır. Depo Temizleme birimi olarak 1 adet Panelvan minibüs ve 1 adet Kamyonet araçlarla 2 adet ekimiz mevcut olup, İdaremize ait olan su depolarında ve sitelerin su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Ekibimiz 2 adet Usta başı (İşçi- Şoför) ve 8 adet işçi personel ile çalışmalar yürütülmektedir. Ekibimizin birisi sürekli olarak vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda ücretli olarak İçme suyu depolarının temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Diğer ekibimiz de Koski'ye ait merkez ve ilçelerde mevcut olan İçme suyu depolarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasını yılda en az bir kez olmak üzere temizliği ve dezenfeksiyonunu yapmaktadır.

Sille Kırı 2 Aydınlık (25.000 m³) su deposunda ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Ayrıca su depoları ve işletme tesislerinde kuruyan fidanlar değiştirilmiştir.

2015 yılı içinde toplam 252 adet idaremize ait, 541 adet site ve apartmanlara ait su depolarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapılmıştır.

Halkımıza daha sağlıklı ve kaliteli su hizmetini verebilmek için bütün imkânlar kullanılarak gece-gündüz öz verili bir çalışma yürütmekteyiz.

2015 yılı peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalardan görüntüler:




23/06/2015 12:34


14/08/2015 11:04


28/05/2015 09:48

Tablo. 2015 Yılı Peyzaj ve Çevre Düzenleme İhale Bilgileri

S.N	İşin Adı (Hizmetler)	Miktar	Birimi
1	60 Cm Çap ve 80 Cm Derinlikte El İle Fidan Çukurunun Açılması	1.250	Adet
2	60 cm Çap, 80 Cm Derinliğinde Çukurlara Fidan Dikimi	1.250	Adet
3	Yabancı Otların Temizlenmesi	1.300	Da
4	Çim Alanlarında Makine İle Çim Ve Çayır Biçme	1.600	Da
5	Mühendis Çalıştırılması (1adet Mühendis X 8 Ay)	8	Ay
6	İşçi Çalıştırılması (13 İşçi X8ay)	104	Ay
7	Fidan Bakımı	50.000	Adet
8	Araç Çalıştırılması	25.000	Km
9	İlaç Temini (Etkicil Madde Malathion %25 WP) Ve Alanların İlaçlanması	100	Kg
10	Demir Şelat Temini (En Az %13 Fe İçerikli)	100	Kg
11	Çim ve Çiçeklik Saha Tanzimi	1.000	M^2
12	Çim Tohumu	550	Kg
13	Elenmiş Yanmış Sığır Gübresi	100	M^3

Temizlik ve Dezenfeksiyonu Yapılan Depolar		
S. No	İlçeler	Adet
1	Ahırlı	4
2	Akşehir	9
3	Beyşehir	5
4	Bozkır	13
5	Cihanbeyli	14
6	Çumra	14
7	Derbent	7
8	Doğanhisar	9
9	Emirgazi	1
10	Ereğli	3
11	Güneysınır	1
12	Hadim	3
13	Hüyük	6

Temizlik ve Dezenfeksiyonu Yapılan Depolar		
S. No	İlçeler	Adet
14	Ilgın	1
15	Kadınhanı	4
16	Karapınar	2
17	Karatay	3
18	Kulu	1
19	Meram	3
20	Sarayönü	1
21	Selçuklu	10
22	Seydişehir	9
23	Taşkent	3
24	Tuzlukçu	8
25	Yunak	16
Toplam		150



OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Konya gibi coğrafi olarak oldukça geniş bir alan üzerinde su üretim ve dağıtım istasyonları olan bir metropolün bir merkezden sürekli olarak izlenmesine gereksinim duyulduğunda istasyonlara merkezden kumandanın sağlanabileceği ve sahada yapılan ölçümlerle ilgili istatistiksel bilgilerin sürekli olarak elde edilebileceği türden sistemler Merkezi Denetim ve İzleme Sistemi (SCADA) olarak adlandırılmaktadır.

Bu nedenle Konya İli mücavir alanı içerisinde bulunan su temin ve dağıtımında kullanılan, kuyu, depo ve pompa istasyonu tesislerinin tek merkezden denetim ve İzleme edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Dolayısıyla şehrin değişik noktalarında bulunan kuyu, depo ve pompa istasyonlarımızın tek merkezden denetim ve izlenmesini bir otomasyon programıyla sağlamak için 2006 yılında başlatılan ve 2007 yılı sonunda bitirilen SCADA sistemi devreye alınmıştır. 2011 yılında Büyükşehir Yasası ile il sınırları genişletilmiş ve SCADA sistemine ilaveler yapılmıştır.

Proje ile; Konya ilinde yaşamakta olan insanlara sağlıklı ve kesintisiz içme ve kullanma suyu sağlanılması için, su pompaj, depolama ve dağıtım sisteminin yönetilmesi,

Konya ili içerisinde kurumumuza bağlı tüm içme suyu depolama ve pompaj tesislerimizde oluşan arızalara anında müdehale imkanı sağlanması,

Konya ili içerisinde içme ve kullanma suyu dağıtım hizmetinde verimlilik sağlanması,

Konya ili içerisinde kurumumuza bağlı İçme ve kullanma suyu tesislerinde tek merkezden denetim ve izleme sağlanması amaçlanmıştır.

SCADA MERKEZİ:

Su dağıtımını ve yönetimini bilgisayar tabanlı bir sistem aracılığıyla, tek bir merkezden yapmak suretiyle, su üretimi ve dağıtımı üzerinde hâkimiyet ve sürekli denetim mümkün olmaktadır. Bu sistemler su kaynaklarını daha verimli kullanmak, su dağıtımını merkezi olarak izleyebilmek ve yönetebilmek, ortaya çıkan sorunlardan anında haberdar olup müdahale edebilmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Konya ili içerisinde kurulan sistem ile veri iletişiminin hızlı, güvenilir ve planlı olmasına ilave olarak kurumumuza bağlı tüm içme suyu üretim, depolama ve pompaj tesislerimizde oluşan arızalara anında müdahale imkanı ile; malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanarak, dağıtım hattında basınç takibi yapılabildiğinden su kesintileri, depo taşkınları ve aşırı basınçla meydana gelen su kayıpları da önlenmektedir.

Elektronik Arıza Bakım Laboratuvarı:

SCADA Merkezi Teknik Servisinde bulunan laboratuvarımızda Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerin, Telsiz, Telefon, Bilgisayar, RTU, Frekans Konvertörü, Soft Starter ve diğer elektronik donanımlarının arızaları modern cihazlarla tespit edilerek, bakım ve tamirleri yapılmaktadır.

Rezistivite Ölçümü:

Yer altına doğru akım vermek suretiyle su seviyesinin, tabaka kalınlığı ve yer altı topografyasının çıkarılması için kullanılmaktadır.

Pompa Test Standı:

Arif Bilge Tesislerimizde bulanan test standımızda kuyularda ve pompa istasyonlarında kullanılan pompaların, basma yüksekliği (Hm), debi (Q), verim (Elektrik gücünün mil gücüne oranı) paritelerinin ölçülerek kontrolleri yapılmaktadır.

Kaçak Arama Dedektörü:

Su dağıtım şebekeleri üzerinde oluşan kaçakların tesbiti için kullanılan cihazlardır.

SCADA ve Otomasyon servisi nezaretinde mesai saati içinde ve mesai saati dışında meydana gelen diğer servislere ait arızalar (Mekanik atölyesi, Elektrik atölyesi, Arıtma tesisleri klor bakım ve onarım birimi, Şebeke ekipleri) ilgili birimlere zamanında aktarıldı



SCADA Merkezi

Derin Kuyulara ait SCADA Sistemi ile Soft Starter ve Frekans Konvertörlerinde meydana gelen toplam 1279 adet arızaya müdahale ederek bakım ve onarımları yapıldı ve cihazlarımız aktif halde tutuldu.





Soft Starter ve Frekans Konvertörü Panoları

Pompa İstasyonlarına ait SCADA Sistemi ile Soft Starter ve Frekans Konvertörlerinde meydana gelen toplam 153 adet arızaya müdahale ederek bakım ve onarımları yapıldı ve cihazlarımız aktif halde tutuldu.

Tesislerimizdeki pompalar SCADA Sistemi sayesinde üç tarifeli sayaç uygulamasına göre ucuz tarife saatleri gözetilerek çalıştırılmış, basınç değerleri şebeke ihtiyacına göre 2,5-3,5 bar arasında stabil tutulmaya çalışılmış, ayrıca Soft Starter ve Frekans Konvertörleri vasıtasıyla uzun yıllar ortalaması baz alındığında %6,9 enerji tasarrufu yapılmıştır.

Yükselen hattına kurulması planlanan Rüzgâr Enerjisi Türbin ve Trafon merkezleri için belirlenen koruma sahasına ait Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespiti görüş ve bildirmeleri amacı ile Kültür Varlıkları ve Tabiatı Koruma Müdürlüğü ekipleri ile saha çalışması tamamlanmıştır. Ayrıca SUKİ Enerji A.Ş. olarak ölçüm direğimizin kaydı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince onaylanmıştır.





Yükselen Mahallesi Rüzgâr Enerjisi Test Direği

Aşağı Pınarbaşı, Yukarı Pınarbaşı Boyalı, Yenibahçe, Eski ve Yeni Ardıçlı Esentepe, Karadiğin Deresi ve Karadiğin Yukarı Depolarda bulunan Güneş Işını Toplayacı, Güneş Panel Sistemlerine ait muhtelif güçlerdeki Jel aküler ekonomik kullanım ömürlerini doldurduğu için yenilenerek devreye alınmıştır.





Tesislerimizde kullanılan güneş panelleri ve GP Aküleri

Boyalı Depo ve Toki Depo Güneş Pilleri Panolarında meydana gelen arızaları giderilerek sistem devreye alındı.



Güneş Pili Panosu Arıza Giderim Çalışması

Saraçoğlu Hobibahçeleri 2 adet kuyu Frekans Konvertörleri program ve donanımları tamamlanarak devreye alındı.






Saraçoğlu Hobi Bahçesi Frekans Konvertörü Montajı

Konya Merkeze ait SCADA sistemi içindeki; Hasanköy, Aydınlık ve Yazır Terfi İstasyonları, Depo ve kuyularında SCADA revizyonu işleri tamamlanarak tesisler devreye alındı



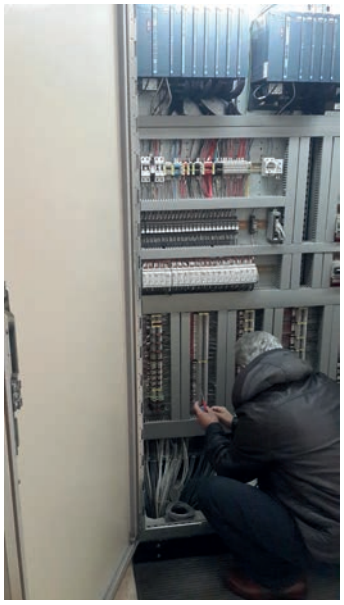





İstasyonlarımızdaki SCADA Revizyonu Çalışmaları

Merkez SCADA sistemine ait 3. Kanalda meydana gelen Haberleşme kilitlenmesi arızası giderilerek, Kanal 3 deki tesislerin haberleşmeleri aktif hale getirildi.

SCADA sistemine dahil olan istasyonlarda her ay kontrolleri ve bakımları tamamlanan Debimetre Transmitter ve Sensörleri yıl sonu itibari ile sıfırlanarak ölçümler yeniden başlatıldı.







Analizör Değeri Yeniden Başlatılan Debimetre Transmiteri

SCADA sistemine dâhil olan istasyonlardaki Debimetre Transmitter ve Sensörlerinin aylık kontrolleri ve bakımları yapıldı.

Tüm debimetrelerimizin endeksleri alınarak aylık üretim değerleri hatasız olarak çıkarıldı. Buna göre Konya il merkezimizde 2015 yılında, kuyularımızdan 58.453.354 m³, Altınapa Barajından 25.397.819 m³ olmak üzere toplam 83.851.173 m³ su üretilerek şebekemize verilmiştir.

2015 YILI SU ÜRETİM TABLOSU			
AYLAR	KUYU ÜRETİMLERİ	ARITMA ÜRETİMİ	**TOPLAM** ÜRETİM
OCAK	5.306.656	498.675	5.805.331
ŞUBAT	4.363.946	884.921	5.248.867
MART	3.826.314	2.206.535	6.032.849
NİSAN	4.079.687	2.226.955	6.306.642
MAYIS	4.964.656	2.488.909	7.453.565
HAZİRAN	4.635.696	2.618.596	7.254.292
TEMMUZ	5.955.194	2.689.524	8.644.718
AĞUSTOS	6.742.617	2.715.105	9.457.722
EYLÜL	5.658.210	2.603.948	8.262.158
EKİM	4.168.800	2.709.456	6.878.256
KASIM	4.610.786	1.774.667	6.385.453
ARALIK	4.140.792	1.980.528	6.121.320
TOPLAM	58.453.354	25.397.819	83.851.173

Merkeze bağlı Yunak-Çeltik-Kulu-Cihanbeyli-Altınekin-Meram-Karatay-Selçuklu İlçelerine ait Kuyu - Depo ve terfi istasyonlarının İçme Suyu Üretim ve Tüketiminin kontrolü için yapılacak Debimetre sistemine ait Keşif çalışmaları tamamlanarak ihalesi yapıldı. 2016 Ocak ayı itibari ile Otomasyon Şube Müdürlüğü nezaretinde yüklenici firma montajlara başlamıştır.









Panosu Transmiter ve Sensörleri

İlçelerde Montajı Tamamlanan Yeni Debimetre

Sarayönü-Kadınhanı-Doğanhisar-Derbent-Tuzlukçu-Akşehir-Beyşehir-Seydişehir-Hadim-Çumra-Karapınar-Emirgazi-Ereğli-Halkapınar İlçe, belde ve mahallelerinin Kuyu- Depo ve terfi istasyonlarının İçme Suyu Üretim ve Tüketiminin kontrolü için yapılacak Debimetre sistemine ait ikinci aşama Debimetre Keşif çalışmaları tamamlandı teknik şartnamesi hazırlanıyor.

Ilgın Merkez, Yunak Merkez ve Piribeyli mahallesine bağlı Kuyu- Depo ve Terfi istasyonları için ihalesi tamamlanan SCADA siteminin Pano donanımları ve Haberleşme sistemlerinin montajları yapılarak devreye alındı.




Ilgın 14 Terfi SCADA Panosu



Ilgın 27 Kuyu SCADA Panosu



Ilgın Vakıfağıl Kuyu SCADA Panosu

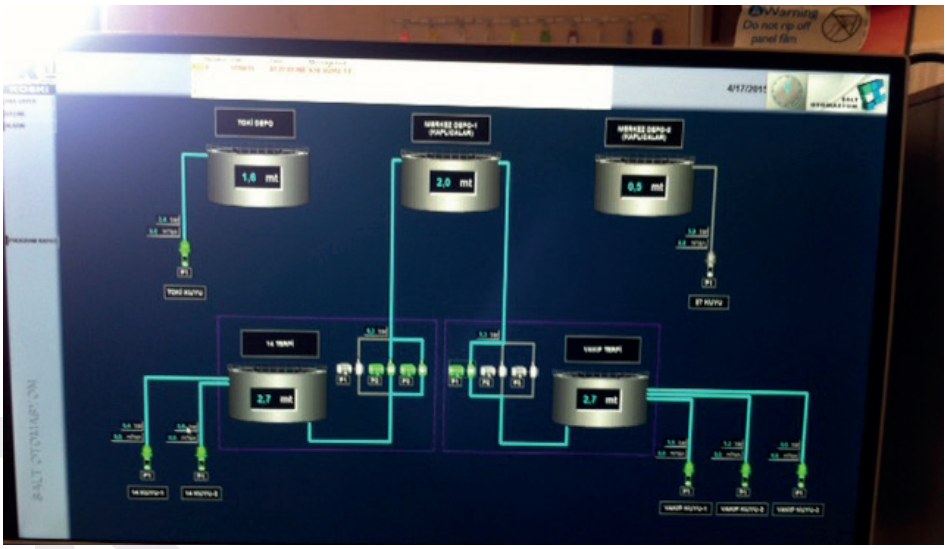

Ilgın SCADA Kumanda Kontrol Odası Operatör Bilgisayarı





Yunak Merkez SCADA Panoları

Seydişehir Kuğulu Park Terfi Merkezine kurulanan 3 adet Soft Starterin çalışma proğramları yapılarak tesis devreye alındı.

Bozkır Merkeze bağlı 3 adet telemetrinin ve Sarayönü Karatepe Mahallesinin telemetri arızaları giderilerek devreye alındı.

Çumra-Alibeyhüyüğü-Sürgüç, Akören-Belkuyu, Sarayönü-Çeşmelisebil, Bozkır-Üçpınar, Yeniceoba-Kütükuşağı, Küçükbeşkavak, Büyükbeşkavak telemetri arızaları giderildi.

Altınekin ilçesi Kuyu Depo arası Telemetri arızası giderilerek devreye alındı.

Kadınhanı Kolukısa ve Argıthanı Kuyu Depo arası Telemetri arızaları giderilerek devreye alındı.

Kadınhanı Kolukısa - Cihanbeyli Karatepe - Sarayönü Çeşmelisebil - Ilgın Küçükkuyu - Yunak Kadıoğlu Uzaktan Haberleşme Telemetri Cihazlarının arızaları giderilerek devreye alındı.

Halkapınar İlçesin de 1 terfi-3 kuyu- 3 deponun telemetri arızaları giderildi.


Cihanbeyli ilçesi Damlakuyu Mahallesi, Kulu merkeze ait 4 adet telemetri, Kulu ilçesi Sazlıpınar-Kumişine ve Kırkpınar mahallelerinin arızalı telemetrileri tamir edildi.


Akören İlçesine İller Bankası İhalesi ile yapılan 1 kuyu ve 1depodan oluşan SCADA sisteminde meydana gelen haberleşme arızası giderildi.


Karapınar-Kulu-Yunak-Akşehir-Beyşehir-Çumra-Ladik-Cihanbeyli-Yeniceoba-Altınekinden gelen toplam 42 adet telemetri sisteminin tamir bakımları yapılarak aktif hale getirildi. Montajları yapıldı.



Telemetri Arıza Bakımı

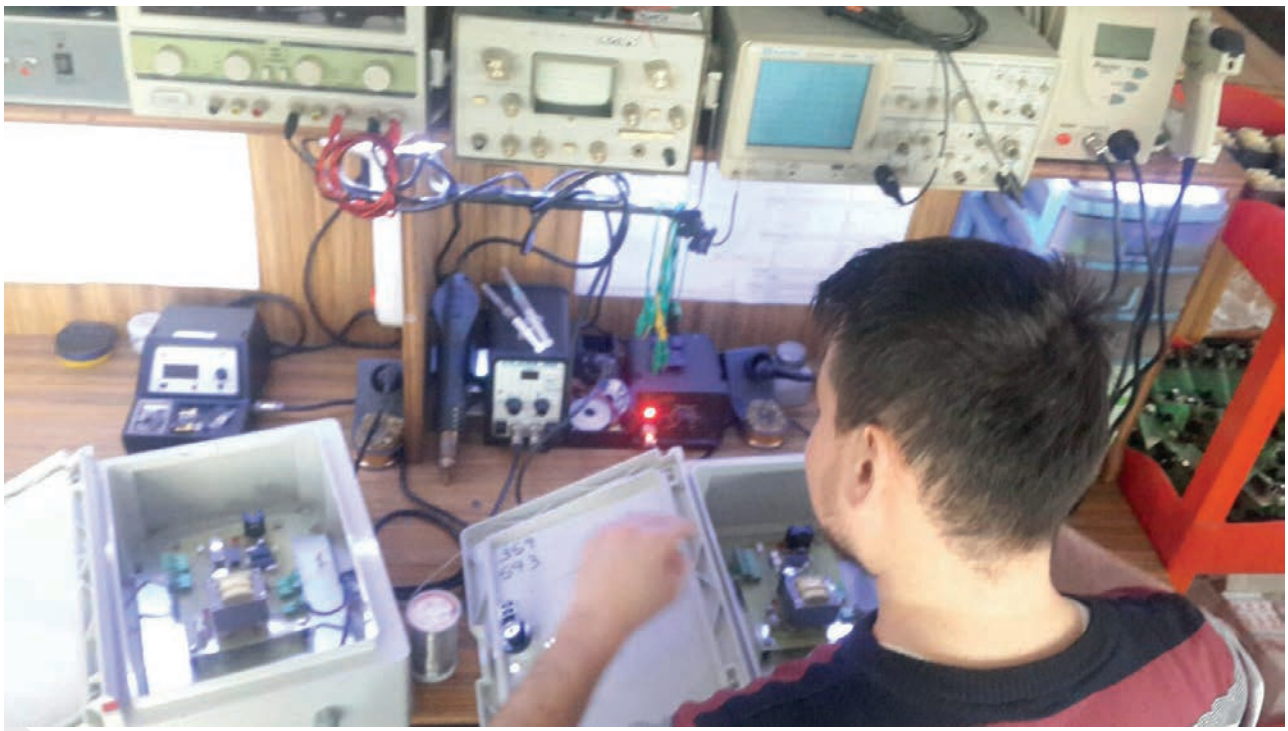

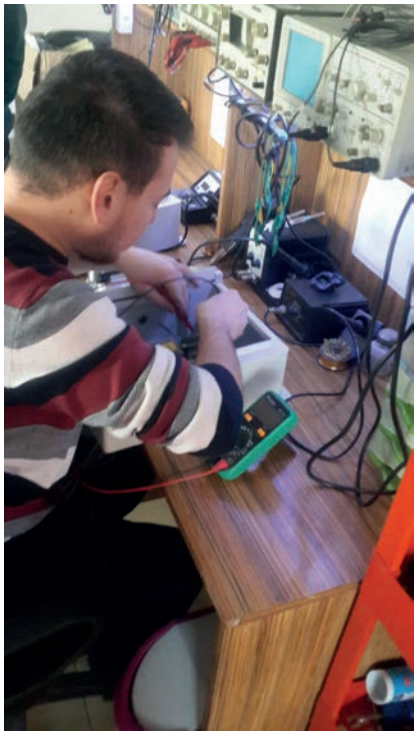

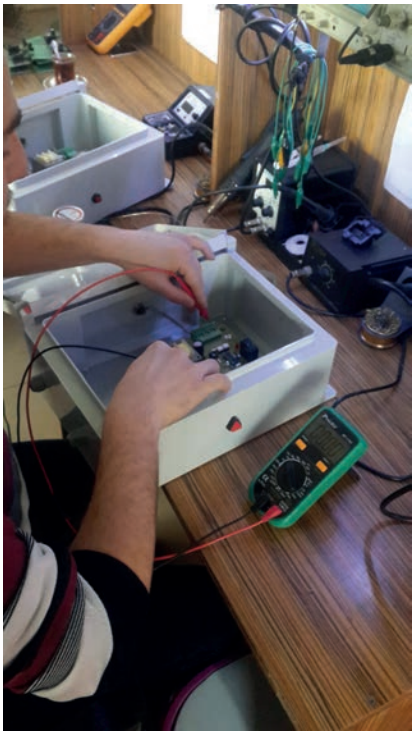


Telemetri Tamirleri

Seydişehir-(Kuğulu Terfi-Çal-kesecik), Kulu-(Yeşilyurt) Telemetri montajları tamamlanarak tesisler devreye alındı.

Akören-Belkuyu, Akşehir-Üçhüyük-Erdoğdu-Konarı Mahallerine Depo - Kuyu arası uzaktan haberleşme radio modem telemetri montajları tamamlanarak devreye alındı.

Karapınar; Kayacı- Tozlu- Kayalı- Akören mahallelerine Uzaktan Haberleşme Radio Modem Telemetri Sistemleri kurularak tesisler devreye alındı.

Bozkır İlçesi Hisarlık mahallesinde 1 kuyu-1 Depo telemetri haberleşme sistemi kurularak devreye alındı.

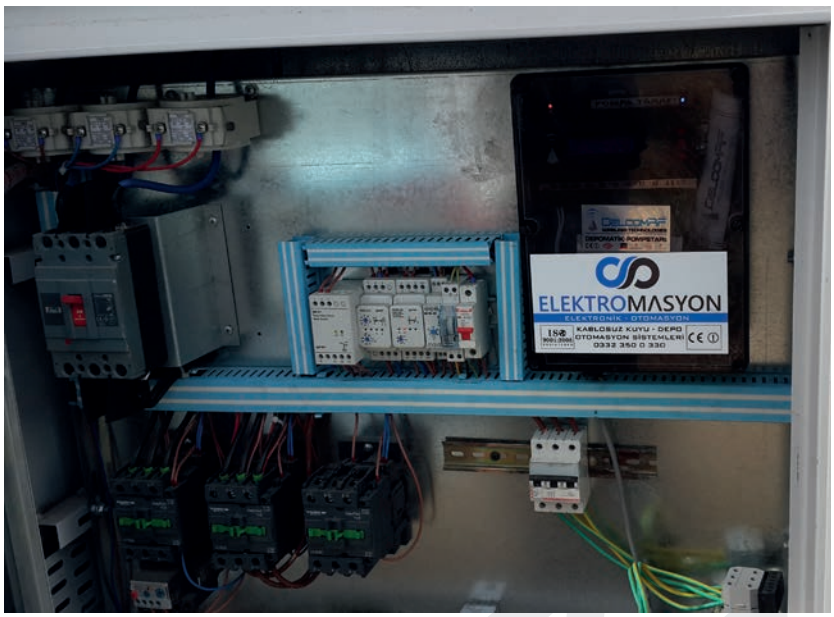Telemetri Kuyu ve Depo Tarafı Montajı





Telemetri Kuyu Tarafı Montajı

Bozkır ilçesi Sarıot yaylasına montajı yapılan Frekans Konvertörü devreye alınarak aktif hale getirildi.





Frekans Konvertörü

Soft Starter Panosu

Sulutas Mahallesi 2. kuyu yazılım güncellenmesi ve eklemeleri yapılarak devreye alındı.

Karadiğin Kaynak Terfi, Harman Yeri Depo, Tatköy Terfi 1-Depo 1 ve Terfi 2-Depo 2, Yükselen Depoda RTU Haberleşme Panolarına 220 VAC Aşırı Akım ve Gerilim Koruma modülü montajı yapılarak devreye alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Yaylapınar 3 Kuyularının kırılan anten direkleri tamir ve onarımı yapılarak aktif hale getirildi.





Yenilenen Anten Direkleri

Beyşehir - Kayabaşı beldesinde kurulu bulunana SCADA sisteminin soğuk ve dondan etkilenen ve arızalanan basınç transmitterleri ve seviye sensörleri yenilenerek tesis aktif hale getirildi.

Beyşehir Merkez Arıtma Tesisleri ve Genek Depo arası Soft Starter, Auma marka çıkış vanaları ve Genek depo ile Arıtma arası Telemetri montajları tamamlanarak devreye alındı.





AUMA Vana Motoru ve Kumanda Panoları

Dedekorkut Pompa İstasyonu By pass ve Pompa çıkış hattı vanalarına AUMA Oransal vana takılarak SCADA yazım ve kablolama işleri tamamlandı. Vana ve motorları devreye alındı.

Merkez SCADA sistemine ait meydana gelen Haberleşme kilitlenmesi arızası giderilerek, Kanal 3 deki tesislerin haberleşmeleri aktif hale getirildi.

SCADA Haberleşmesi Test Çalışmaları

Merkeze bağlı kuyuda arızalanan 57 adet basınç transmitteri yenilenerek devreye alındı.



Basınç Transmitteri Yenileme Çalışması

Yenilenen Arıoğlu 1, Selver 2 ve Şükrü Doruk kuyularının şebeke bağlantıları yaptırıldı. SCADA Sistemi içinde 112 adet vana manevrası yaptırıldı.

Depolarımızda ve Sahada Yapılan Vana Manevraları

Depo- terfi ve kuyularda meydana gelen 58 adet mekaniksel arıza bildirilerek giderilmesi sağlandı. 103 Adet basınç düşüklüğü arızasına bakıldı ve giderildi.



MEKANİK–ELEKTRİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1- GÜNEŞ PANELİ

Yeni yerleşim alanlarında açılan yeni kuyu veya kaynak sularının aktarımı için gerekli olan enerji hat mesafesinin uzak olması enerji nakil hattı direklerinin mülkiyet veya izine tabi alanlardan geçmesi işlerimizin uzaması ve masraflı olması, enerji maliyeti nedeniyle güneş enerjisi ile su üretimi amaçlanmış ve 8 adet mahallemizde uygulama yapılmış başarı elde edilmiştir. Bu mahalleler:

1	HADİM	Aşağıkızılkaya
2	ILGIN	Vakıfağıl
3	ÇUMRA	Tahtalı
4	ÇUMRA	Avşar
5	EMİRGAZİ	Yamaç
6	SEYDİŞEHİR	Kızılca
7	YUNAK	Merkez 1
8	YUNAK	Merkez 2



2- SU SEBİLİ

Kaliteli su sorunu olan 5 adet mahallemize yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında dondan korumak için dışı poliüretan malzeme giydirilmiş 5 tonluk modül tank yaptırılmış. Tankerlerle tatlı su ile doldurularak bölge halkının tatlı su içmesi sağlanmıştır





3- İZALASYON

Yeni Bağlanan mahallelerimizde bulunan kuyuların kış aylarında donma riskine karşı yüzeyde bulunan borular ısı yalıtım malzemesi ile koruma altına alınmıştır. Yapılan gözlemde çetin geçen kış döneminde arıza oranının düşük gelmesi alınan önlemin yerinde olduğunu göstermiştir.



4. DE-MONTAJ

Mahallerimizde bulunan bazı kuyularımızda kuyu temizleme (savaklama) ve vana sistemi olmadığı için de-montaj bağlantıları yapılmıştır.





5. KUYU VE KLOR KABİNLERİ

Yeni Bağlanan mahallelerimizde kuyuların kabin ve klor sisteminin olmaması nedeniyle açık hava şartlarında cihazlarımızı koruyabilecek nitelikte poliüretan malzeme giydirilmiş kuyu kabinleri ve klor kabinleri projelendirilmiş ve yaptırılmıştır.



Eski kuyu kabinlerinden bir görünüm



Yeni kuyu kabin görümü

6. JENERATÖR

Yeni açılan su kuyularında enerji alımında gecikme olması durumlarda kullanılmak üzere jeneratörler alınmış, kullanılmaya başlanmıştır.



Jeneratör uygulaması sonucu çalıştırılan derin su kuyusu



7. SEYYAR GÜNEŞ JENERATÖRÜ

Jeneratör yakıt tüketim miktarının fazlalığı ve masraflı olması nedeniyle TÜBİTAK çalışması örnek alınarak açılır-katlanır seyyar güneş jeneratörü projelendirilmesi yapılmaktadır.



Örnek TÜBİTAK çalışması



Örnek taşınabilir güneş jeneratörü

8. DERİN KUYU SÖKME TAKMA

Mekanik İşleri elemanlarımızca 2014 yılında 456 derin su kuyusu dalgıç pompa arızası 153 hidrofor arızası giderilmiş, 2015 yılı içerisinde 152 adet dalgıç motor , 50 adet kuru tip motor sarımı yapılmıştır. 340 derin su kuyusuna dalgıç pompa – 50 adet hidrofor sökme-takma işlemi yapılmış, mahallelerin pompajdan kaynaklanan su sıkıntıları 24 saat içerisinde giderilmiştir.





9. HİDROFOR YENİLEME

Arızalı olan mevcut hidroforların yerine don tehlikesine karşı giydirilmiş yedekli çift hidrofor montajları yapılmıştır.





Kadınhanı-Bayramlı Mah. Hidrofor Yenileme

10. YENİ ELEKTRİK HATTI

Elektrik enerjisi olmayan yeni Derinkuyu sondaj kuyuları için gerekli enerjiyi temin etmek için keşifler yapılmış, doğrudan temin ile projelendirilmiş, MEDAŞ kabulleri yaptırılıp abonelikleri yapılmıştır.





11. ELEKTRİK PANO YENİLEME

Mevcut elektrik panolarının kullanımının tehlikeli ve sık arızalanmalara müsait olan elektrik panoları yenilenmiştir.



Eski kuyu enerji panosu



Yenilenen kuyu enerji panosu

12. MODÜL TANK

Yeni mahallelerimizin su depolarında bulunan sızıntılar nedeniyle kullanılamayacak durumda olan su depolarının yerine acil olarak modül su depoları yapılmıştır.



Eski Betonarme su deposu





Yeni Modül su deposu

13. ELEKTRİK ARIZALARI


Mahallelerde meydana gelen elektrik arızaları bölgelerde bulunan elektrikçilerimiz tarafından acil olarak giderilmiş, gereklilik durumunda merkezden araç ve ekip takviyeleri yapılarak enerji kaynaklı arızalara müdahale edilmiştir.





14. KATOTİK KORUMA

Elemanlarımız tarafından mevcut çelik hat koruma amaçlı katotik koruma kontrolleri yapılmış, yeni çekilen çelik hatlara koruma sağlanmış, bölgelerde bulunan çelik hatlarda bulunan redresörlere kontrol edilmiş, katotik koruma olmayan hatlara koruma sağlanmıştır.

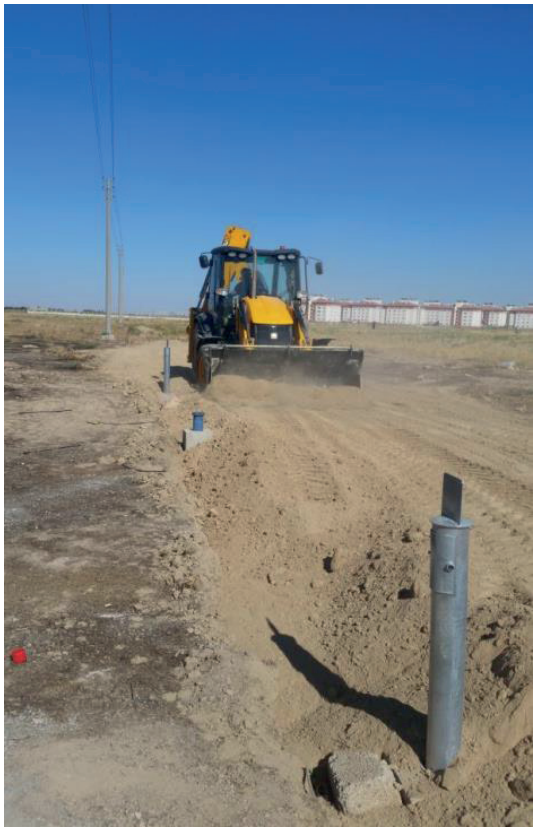







15. POMPA İSTASYONLARI

Merkez Pompa istasyonları ve İlçe pompa istasyonlarında tespit edilen arızalar giderilmiştir. Revizyon gereken bazı pompa istasyonlarında tamir yapılmış, sağlıklı su üretimi gerçekleştirilmiştir.

KARAPINAR-Emirgazi Işıklar pompa istasyonu



Eski durumu



Yeni durumu

1. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YUNAK MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
DEVREYE ALINAN KUYULAR	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
YUNAK / HACIÖMEROĞLU	1
YUNAK / MERKEZ	2
YUNAK / KUYUBAŞI	1
ÇELTİK / MERKEZ	1
YAPILAN TERFİ MERKEZİ (POMPA İSTASYONU)	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
YUNAK / YUKARIPİRİBEYLİ	1
YUNAK / MERKEZ	1
YENİLENEN POMPA	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
YUNAK / MERKEZ	1
YUNAK / YAVAŞLI	1
YUNAK / CEBRAİL	1
TAMİR VE BAKIMI YAPILAN POMPA ADEDİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
ÇELTİK / DOĞANYURT	1
YUNAK / MERKEZ	4
YUNAK / ODABAŞI	1
YUNAK / KARABIYIK	1
YAPILAN ORTA GERİLİM ENH	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
YUNAK / HACIÖMEROĞLU	1
YUNAK / SİNANLI	1
TAMİR EDİLEN TRAFO ADEDİ	
MAHALLESİ	TRAFO GÜCÜ (KVA)
YUNAK / KARABIYIK	25
YUNAK / İMAMOĞLU	50
YUNAK / MEŞELİK	50
YUNAK / ODABAŞI	50
YUNAK / İSAKUŞAĞI	50
YUNAK / KÜÇÜKHASAN	100
YUNAK / KAYIÖREN	50
YUNAK / YIĞAR	50

2. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KULU MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
DEVREYE ALINAN KUYULAR	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
KULU / MERKEZ	1
KULU / YARAŞLI	1
KULU / ÇÖLKÖY	1
YENİLENEN POMPA	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
KULU / BOZAN	1
YENİCEOBA / TAVŞANÇALI	1
YENİCEOBA / KÜTÜKUŞAĞI	1
KULU / DİPDEDE	1
KULU / KIRKPINAR	1
KULU / KORKMAZLAR	1
KULU / KOZANLI	1
TAMİR VE BAKIMI YAPILAN POMPA ADEDİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
KULU / BAHADIRLI	4
KULU / MERKEZ	5
KULU / BEŞKARDEŞ	1
KULU / BOZAN	1
KULU / SARIYAYLA	1
YENİCEOBA / KELHASANLI	1
KULU / DİPDEDE	1
KULU / SOĞUKKUYU	1
KULU / TURANLAR	1
KULU / YEŞİLYURT	1
KULU / KARACADAĞ	1
KULU / ŞEREFLİKÖY	1
KULU / ZİNCİRLİ	2
YENİCEOBA / PINARBAŞI	1
YENİCEOBA / CELEP KUYUSU	1
YAPILAN ORTA GERİLİM ENH	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
KIRKPINAR	1
MEMBRAN DEPO	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
KULU / KORKMAZLAR	100 TONLUK 1 ADET

3. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CİHANBEYLİ MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
DEVREYE ALINAN KUYULAR	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
CİHANBEYLİ / İNSUYU	3
ALTINEKİN / MERKEZ	3
CİHANBEYLİ / HÜYÜKKUYU	1
CİHANBEYLİ / KIRKIŞLA	1
YAPILAN TERFİ MERKEZİ (POMPA İSTASYONU)	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
ALTINEKİN / DEDELER	1
CİHANBEYLİ / GÜLBAHÇE	1
YENİLENEN POMPA	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
ALTINEKİN / HACINUMAN	2
CİHANBEYLİ / İNSUYU	1
ALTINEKİN / AKINCILAR	1
ALTINEKİN / SOYHAN	1
CİHANBEYLİ / GÜNYÜZÜ 1	1
CİHANBEYLİ / KIRKIŞLA	1
TAMİR VE BAKIMI YAPILAN POMPA ADEDİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
CİHANBEYLİ / GÖLYAZI	3
ALTINEKİN / MERKEZ	9
CİHANBEYLİ / YENİCEOBA	2
ALTINEKİN / DEDELER	2
ALTINEKİN / YENİKUYU	2
CİHANBEYLİ / AĞABEYLİ	2
ALTINEKİN / AYIŞIĞI	1
ALTINEKİN / HACINUMAN	1
ALTINEKİN / KARAKAYA	1
CİHANBEYLİ / MERKEZ	1
ALTINEKİN / OĞUZELİ	2
ALTINEKİN / AKÇAŞAR	1
ALTINEKİN / MANTAR	2
ALTINEKİN / YAZIBELEN	1
CİHANBEYLİ / KARABAĞ	1
ALTINEKİN / GÜVENÇ	1
ALTINEKİN / AKINCILAR	2
ALTINEKİN / ÇALDERE	1
CİHANBEYLİ / KULMAÇ	1
CİHANBEYLİ / GÜNYÜZÜ 2	1
CİHANBEYLİ / SAĞLIK	1
CİHANBEYLİ / YAPALI	1

3. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CİHANBEYLİ MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
YAPILAN ORTA GERİLİM ENH	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
CİHANBEYLİ / GÜNYÜZÜ	1
CİHANBEYLİ / TAŞPINAR	1
CİHANBEYLİ / BÜYÜKBEŞKAVAK	1
CİHANBEYLİ / ÇÖL	1
CİHANBEYLİ / İNSUYU	1
CİHANBEYLİ / YÜNLÜKUYU	1
ALTINEKİN / ÖLMEZ	1
ALTINEKİN / KARAKAYA	1
GÜNEŞ ENERJİLİ DALGIÇ POMPA SİSTEMİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
TURANLAR	1

4. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KADINHANI MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
DEVREYE ALINAN KUYULAR	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
KADINHANI / KAMIŞLIÖZ	1
KADINHANI / KARAKURTLU	1
YAPILAN TERFİ MERKEZİ (POMPA İSTASYONU)	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
SARAYÖNÜ / ÇEŞMELİSEBİL	1
YENİLENEN POMPA	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
KADINHANI / KURTHASANLI	1
KADINHANI / MERKEZ	1
KADINHANI / PUSAT	1
TAMİR VE BAKIMI YAPILAN POMPA ADEDİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
KADINHANI / MERKEZ	3
SARAYÖNÜ / DEĞİRMENLİ	2
KADINHANI / CAVDAR	1
KADINHANI / HACIMEHMETLİ	2
KADINHANI / HACIPİRLİ	2
KADINHANI / KIZILKUYU	1
KADINHANI / KONURÖREN	1
KADINHANI / ZENGİ	1
KADINHANI / KAMIŞLIÖZ	1
KADINHANI / KARAKURTLU	1
KADINHANI / ATLANTI	1
KADINHANI / AVŞARLI	1
KADINHANI / HACIOFLAZ	1
KADINHANI / KURTHASANLI	3
KADINHANI / KARAYÜRÜKLÜ	2
KADINHANI / OSMANCIK	2
KADINHANI / TOSUNOĞLU	1
YAPILAN ORTA GERİLİM ENH	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
KADINHANI / BAKIRPINAR	1
KADINHANI / SARIKAYA	1
KADINHANI / MEYDAN	1
SARAYÖNÜ / GÖZLÜ	1
KADINHANI / KAYABAŞI	1
KADINHANI / KARASEVİNÇ	1
TAMİR EDİLEN TRAFO ADEDİ	
MAHALLESİ	TRAFO GÜCÜ (KVA)
KADINHANI / ZENGİ	250

5. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ILGIN MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
DEVREYE ALINAN KUYULAR	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
DOĞANHİSAR / KOÇAŞ	1
ILGIN / HARMANYAZI	1
ILGIN / BARAKMUSLU	1
YAPILAN TERFİ MERKEZİ (POMPA İSTASYONU)	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
ILGIN / ARGITHANI	1
YENİLENEN POMPA	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
ILGIN / HARMANYAZI	1
ILGIN / ARGITHANI	1
DERBENT / SARAYPINAR	1
TAMİR VE BAKIMI YAPILAN POMPA ADEDİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
ILGIN / ÇİĞİL	1
ILGIN / MERKEZ	5
ILGIN / OLUKPINAR	1
DOĞANHİSAR / KEMER	1
ILGIN / BÜYÜKOBA	1
DERBENT / YASSIÖREN	1
ILGIN / ÇAVUŞCU	1
ILGIN / KAYMAKLI	1
DOĞANHİSAR / KOÇAŞ	1
ILGIN / SEBİLLER	1
DERBENT / DEĞİŞ	2
DERBENT / SARAYPINAR	2
ILGIN / GEÇİT	1
ILGIN / ARGITHANI	1
ILGIN / HARMANYAZI	1
ILGIN / KAPAKLI	1
ILGIN/VAKIFAĞILI	1
ILGIN / ZAFERİYE	1
YAPILAN ORTA GERİLİM ENH	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
DOĞANHİSAR /KONAKKALE	1
ILGIN / BARAKMUSLU	1
ILGIN / HARMANYAZI	1
ILGIN / AVDAN	1
ILGIN / GEDİKÖREN	1
ILGIN / SEBİLLER	1
ILGIN / YORAZLAR	1

5. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ILGIN MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
TAMİR EDİLEN TRAFO ADEDİ	
MAHALLESİ	TRAFO GÜCÜ (KVA)
ILGIN / BEYKONAK	50
DERBENT / YAZIÖREN	50
GÜNEŞ ENERJİLİ DALGIÇ POMPA SİSTEMİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
VAKIFAĞIL	1
MEMBRAN DEPO	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
ILGIN / ARGITHANI	200 TONLUK 1 ADET

6. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AKŞEHİR MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
DEVREYE ALINAN KUYULAR	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
AKŞEHİR / MERKEZ	3
TUZLUKÇU / GÜRSU	1
YAPILAN TERFİ MERKEZİ (POMPA İSTASYONU)	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
AKŞEHİR / TUZLUKÇU	1
YENİLENEN POMPA	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
AKŞEHİR / MERKEZ	1
AKŞEHİR / TURSUNLU	1
KONYA YOLU POMPASI	1
AKŞEHİR / ÜÇHÜYÜK	1
TAMİR VE BAKIMI YAPILAN POMPA ADEDİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
AKŞEHİR / MERKEZ	3
AKŞEHİR / TUZLUKÇU	1
AKŞEHİR / GÖZPINARI	1
AKŞEHİR / KONARI	1
AKŞEHİR / KONDULLU	1
AKŞEHİR / ÜÇHÜYÜK	2
AKŞEHİR / SAVAŞ	1
AKŞEHİR / KARAHÜYÜK	1
AKŞEHİR / KARAÇAY	1
KONYA YOLU POMPASI	1
AKŞEHİR / REİS	1
YAPILAN ORTA GERİLİM ENH	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
AKŞEHİR / MERKEZ	1
MEMBRAN DEPO	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
AKŞEHİR / ÜÇHÜYÜK	10 TONLUK 1 ADET

7. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BEYŞEHİR MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
DEVREYE ALINAN KUYULAR	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
BEYŞEHİR / GÖKÇİMEN	1
BEYŞEHİR / GÖYNEM	1
BEYŞEHİR / ORGANİZE	1
HÜYÜK / ÇUKURKENT	1
HÜYÜK / ÇAVUŞ	1
YENİLENEN POMPA	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
BEYŞEHİR / FASILLAR	1
BEYŞEHİR / MUTLU	1
BEYŞEHİR / EYLİKLER	1
DEREBUCAK / ÇAMLIK	1
HÜYÜK / İLMEN	1
HÜYÜK / KIRELİ	1
HÜYÜK / MERKEZ	1
TAMİR VE BAKIMI YAPILAN POMPA ADEDİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
BEYŞEHİR / MERKEZ	6
BEYŞEHİR / KUŞLUCA	3
BEYŞEHİR / ÜZÜMLÜ	3
BEYŞEHİR / FASILLAR	3
BEYŞEHİR / MUTLU	2
BEYŞEHİR / YAZYURDU	1
BEYŞEHİR / YENİDOĞAN	2
BEYŞEHİR / YEŞİLDAĞ	1
BEYŞEHİR / ÇUKURAĞIL	1
DEREBUCAK / ÇAMLIK	1
BEYŞEHİR / EYLİKLER	2
BEYŞEHİR / AKBURUN	1
DOĞANBEY / KARABAYAT	1
HÜYÜK / BURUNSUZ	1
HÜYÜK / ÇAVUŞ	3
HÜYÜK / KIRELİ	2
HÜYÜK / MERKEZ	1

7. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BEYŞEHİR MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
YAPILAN ORTA GERİLİM ENH	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
HÜYÜK / ÇUKURKENT	1
HÜYÜK / İMRENLER	1
GÖKÇİMEN	1
BEYŞEHİR / ORGANİZE	1
HÜYÜK / KIRELİ	1
TAMİR EDİLEN TRAFO ADEDİ	
MAHALLESİ	TRAFO GÜCÜ (KVA)
BEYŞEHİR / BADEMLİ	50

8. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SEYDİŞEHİR MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
DEVREYE ALINAN KUYULAR	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
SEYDİŞEHİR / YALIHÜYÜK	1
SEYDİŞEHİR / KAVAK	1
YAPILAN TERFİ MERKEZİ (POMPA İSTASYONU)	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
SEYDİŞEHİR / AKKİSE	1
YENİLENEN POMPA	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
SEYDİŞEHİR / AKKİSE	1
SEYDİŞEHİR / KAVAK	1
SEYDİŞEHİR / BALIKLAVA	1
SEYDİŞEHİR / KURAN	1
TAMİR VE BAKIMI YAPILAN POMPA ADEDİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
SEYDİŞEHİR / MERKEZ	7
SEYDİŞEHİR / AKKİSE	3
SEYDİŞEHİR / ÇAVUŞ	1
SEYDİŞEHİR / IRMAKLI	1
SEYDİŞEHİR / AKÇALAR	1
YAPILAN ORTA GERİLİM ENH	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
SEYDİŞEHİR / KAVAK	1
YALIHÜYÜK / MERKEZ	1
TAMİR EDİLEN TRAFO ADEDİ	
MAHALLESİ	TRAFO GÜCÜ (KVA)
SEYDİŞEHİR / MERKEZ	100
SEYDİŞEHİR / MERKEZ	50
SEYDİŞEHİR / AKİSSE	160
SEYDİŞEHİR / KİVLİK	50
GÜNEŞ ENERJİLİ DALGIÇ POMPA SİSTEMİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
KIZILCA	1

9. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇUMRA MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
DEVREYE ALINAN KUYULAR	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
GÜNEYSINIR / ÖMEROĞLU	1
YENİLENEN POMPA	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
AKÖREN / ORHANİYE	1
GÜNEYSINIR / GÜRAĞAÇ	1
GÜNEYSINIR / AĞAÇOBA	1
ÇUMRA / ERENTEPE	1
ÇUMRA / KARAGÜNEY	1
TAMİR VE BAKIMI YAPILAN POMPA ADEDİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
ÇUMRA / AVDUL	1
ÇUMRA / İNLİ	2
ÇUMRA / GÜNEYSINIR	1
AKÖREN / KARAAĞAÇ	1
ÇUMRA / ÇİÇEK	1
ÇUMRA / ABDİTOLU	1
ÇUMRA / ALİBEYHÜYÜĞÜ	2
ÇUMRA / SIRÇALIKUYU	1
ÇUMRA / KARKIN	1
AKÖREN / YEŞİLTEKKE	1
AKÖREN / MERKEZ	1
ÇUMRA / APA	1
ÇUMRA / ARIKÖREN	1
ÇUMRA / İÇERİÇUMRA	2
TAMİR EDİLEN TRAFO ADEDİ	
MAHALLESİ	TRAFO GÜCÜ (KVA)
ÇUMRA / BELKUYU	50
AKÖREN / MERKEZ	50
GÜNEŞ ENERJİLİ DALGIÇ POMPA SİSTEMİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
ÇUMRA / AVŞAR	1
ÇUMRA / TAHTALI	1

10. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
DEVREYE ALINAN KUYULAR	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
BOZKIR / IŞIKLAR	1
BOZKIR / HİSARLIK	1
YAPILAN TERFİ MERKEZİ (POMPA İSTASYONU)	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
BOZKIR / KARABAYIR	1
HADİM / KORUALAN	1
BOZKIR / MERKEZ	1
YENİLENEN POMPA	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
BOZKIR / ARMUTLULU	1
BOZKIR / CİCEK	1
BOZKIR / BÜYÜK HİSARLIK	1
BOZKIR / ÇUKURKAVAK	1
BOZKIR / KARACAARDIÇ	1
BOZKIR / YOLÖREN	1
TAMİR VE BAKIMI YAPILAN POMPA ADEDİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
BOZKIR / KOÇAŞ	1
BOZKIR / ÇİCEK	2
TAŞKENT / BALCILAR	1
TAŞKENT / ÇETMİ	2
BOZKIR / AYVALICA	1
BOZKI / AKÇAPINAR	1
BOZKIR / ARMUTLULU	1
SARIOĞLAN / KİLDERE	1
BOZKIR / KARACAARDIÇ	2
BOZKIR / KUŞÇA	1
BOZKIR / YELDEĞİ	1
BOZKIR / SAZLI	1
YAPILAN ORTA GERİLİM ENH	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
BOZKIR / ÇUKURKAVAK	1
HADİM / MERKEZ	1
BOZKIR / IŞIKLAR	1
BOZKIR / HİSARLIK	1

10. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
TAMİR EDİLEN TRAFO ADEDİ	
MAHALLESİ	TRAFO GÜCÜ (KVA)
BOZKIR / CİCEK	50
BOZKIR / SAZLI	50
GÜNEŞ ENERJİLİ DALGIÇ POMPA SİSTEMİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
HADİM / AŞAĞIKIZILKAYA	1

11. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EREĞLİ MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
YAPILAN TERFİ MERKEZİ (POMPA İSTASYONU)	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
EREĞLİ / YILDIZLI	1
YENİLENEN POMPA	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
EREĞLİ / ZENGEN	1
TAMİR VE BAKIMI YAPILAN POMPA ADEDİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
EREĞLİ / MERKEZ	1
EREĞLİ / TOKİ	1
EREĞLİ / ZENGEN	1
EREĞLİ / MELİCEK	2
EREĞLİ / YENİKÖY	2
MEMBRAN DEPO	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
EREĞLİ / YENİKÖY	200 TONLUK 1 ADET

12. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KARAPINAR MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
DEVREYE ALINAN KUYULAR	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
EMİRGAZİ / MERKEZ	2
EMİRGAZİ / KUTÖREN	2
YAPILAN TERFİ MERKEZİ (POMPA İSTASYONU)	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
EMİRGAZİ / IŞIKLAR	1
EMİRGAZİ / TOZLUKUYU	1
KARAPINAR / ARITMA	1
YENİLENEN POMPA	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
EMİRGAZİ / BEYÖREN	1
EMİRGAZİ / ÖBEKTAŞI	1
KARAPINAR / İSMİL	1
EMİRGAZİ / KAYALI	1
EMİRGAZİ / KURTBURUN	1
EMİRGAZİ / GÜZELKIŞLA	2
EMİRGAZİ / DÖLEK	1
İSMİL / HASANOBA	1
KARAPINAR / ÇİĞİL	1
EMİRGAZİ / BELKAYA	1
İSMİL / HASANOBA	1
TAMİR VE BAKIMI YAPILAN POMPA ADEDİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
EMİRGAZİ / GİNİK YAYLASI	2
KARAPINAR / KAZANHÜYÜĞÜ	1
EMİRGAZİ / AVREN YAYLASI	1
KARAPINAR / EMİRGAZİ	1
KARAPINAR / B.AŞLAMA	3
EMİRGAZİ / IŞIKLAR	1
EMİRGAZİ / BEYÖREN	1
EMİRGAZİ / ÖBEKTAŞI	2
KARAPINAR / İSMİL	2
EMİRGAZİ / KAZANHÜYÜĞÜ	1
EMİRGAZİ / KURTBURUN	2
EMİRGAZİ / GÜZELKIŞLA	1
EMİRGAZİ / MEŞELİ	1
KARAPINAR / MERKEZ	2
EMİRGAZİ / BELKAYA	1
EMİRGAZİ / YAMAÇKÖY	1
İSMİL / İSLİK	1
İSMİL / KAYACIK	1

12. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KARAPINAR MERKEZ VE ALT BÖLGELERDE	
DEVREYE ALINAN KUYULAR	
İSMİL / OVAKAVAĞI	1
İSMİL / SELVİ	1
İSMİL / SÜRGÜÇ	1
İSMİL / YENİKUYU	1
İSMİL / UZUNKUYU	1
YAPILAN ORTA GERİLİM ENH	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
KARAPINAR / HOTAMIŞ	1
EMİRGAZİ / IŞIKLAR	1
TAMİR EDİLEN TRAFO ADEDİ	
MAHALLESİ	TRAFO GÜCÜ (KVA)
EMİRGAZİ / MEŞELİ	50
GÜNEŞ ENERJİLİ DALGIÇ POMPA SİSTEMİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
EMİRGAZİ / YAMAÇ	
MEMBRAN DEPO	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
KARAPINAR / OYMALI BAŞIN YAYLASI	100 TONLUK 1 ADET

MERAM SELÇUKLU KARATAY BÖLGELERİ	
DEVREYE ALINAN KUYULAR	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
Karatay	7
Selçuklu	5
Meram	7
YENİLENEN HİDROFOR	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
Karatay	3
Selçuklu	3
Meram	2
TAMİR VE BAKIMI YAPILAN POMPA ADEDİ	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
MERKEZ	5
KARATAY / SULUTAS	1
SELÇUKLU / SIZMA	2
MERAM / YAYLAPINAR	1
KARATAY / BAKIRTOLU	1
SELÇUKLU / SIZMA YENİ	1
KARATAY / ORTAKONAK	1
YAPILAN ORTA GERİLİM ENH	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
KARATAY / AKÖREN KIŞLA	1
SELÇUKLU / SIZMA	1
SELÇUKLU / BAĞRIKURT	1
TAMİR EDİLEN TRAFO ADEDİ	
MAHALLESİ	TRAFO GÜCÜ (KVA)
MERAM / MERKEZ	1.250
SELÇUKLU / MERKEZ	1.000
SELÇUKLU / MERKEZ	630
MEMBRAN DEPO	
MAHALLESİ	KUYU ADEDİ
SARAÇOĞLU HOBİBAHÇELERİ	25 TONLUK 1 ADET
MERAM / ÇALDAĞI YAYLASI	50 TONLUK 1 ADET

2015 YILI BÖLGELERE GÖRE YAPILAN MEKANİK VE ELEKTRİK ÇALIŞMALARI

	MEKANİK İŞLERİ ÇALIŞMALARI												ELEKTRİK İŞLERİ ÇALIŞMALARI									
	MEK.1	**MEK.2**	**MEK.3**	**MEK.4**	**MEK.5**	**MEK.6**	**MEK.7**	**MEK.8**	**MEK.9**	**MEK.10**	**MEK.11**	**MEK.12**	**ELK.1**	**ELK.2**	**ELK.3**	**ELK.4**	**ELK.5**	**ELK.6**	**ELK.7**	**ELK.8**	**ELK.9**	**ELK.10**
	HİDROFOR ARIZA	ESKİ KUYU SÖKME -TAKMA	YENİ KUYU POMPA MONTAJ	DALGIÇ POMPA ARIZA	DALGIÇ MOTOR ARIZA	SANTRAFÜJ YENİLEME -TAMİR	VANA-CEKVALF ARIZA	KUYU AĞZI DE - MONTAJ	KOLON BORU İLAVE	KUYU TAMİR - BAKIM	POMPA İSTASYONU TAMİR -BAKIM	KUYU KABİN	JENERATÖR MONTAJ	OG -A.G. ARIZA	PANO ARIZA VE YENİLEME	R.S.T. ÇEKİMİ	ŞAMANDRA ARIZA	BİNA ELEKTRİK ARIZASI	TRAFO SÖKME - TAKMA	KABLO EKLEME	ÖN KEŞİF	POMPA İSTASYONU ELK. ARIZA
1. BÖLGE YUNAK	0	1	9	6	12	4	1	4	7	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	7	0
2.BÖLGE KULU	4	1	9	4	25	0	0	3	3	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	7	0
3.BÖLGE CİHANBEYLİ	5	1	14	13	29	2	1	4	1	0	0	7	0	3	4	0	0	1	1	1	11	0
4.BÖLGE KADINHANI	15	1	4	9	16	4	0	7	5	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	1	8	0
5.BÖLGE ILGIN	2	0	10	6	14	2	0	8	4	0	0	8	2	7	6	2	0	0	0	1	13	0
6.BÖLGE AKŞEHİR	3	2	9	6	16	1	2	3	3	1	0	6	0	0	3	0	1	0	0	0	11	0
7.BÖLGE BEYŞEHİR	4	4	16	12	25	6	1	14	4	0	2	9	1	1	1	0	0	0	0	1	11	0
8.BÖLGE SEYDİŞEHİR	3	4	4	4	19	2	4	0	0	1	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0
9.BÖLGE BOZKIR	1	3	14	14	8	7	4	4	5	1	0	7	1	1	8	1	1	0	1	0	21	1
10.BÖLGE ÇUMRA	3	0	7	7	21	8	0	2	3	0	0	3	0	2	5	1	1	0	1	1	4	0
11..BÖLGE **KARAPINAR**	2	1	8	20	30	5	2	13	3	2	1	10	0	3	6	0	1	0	0	1	12	0
12.BÖLGE EREĞLİ	1	1	3	2	5	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9	0
MERKEZ	12	11	25	4	21	10	22	11	5	36	29	24	0	34	102	13	16	23	1	32	8	13
TOPLAM	55	30	132	107	241	55	37	74	44	41	33	78	5	58	146	17	22	24	5	39	124	14

2015 YILI AYLARA GÖRE YAPILAN MEKANİK VE ELEKTRİK ÇALIŞMALARI

	MEKANİK İŞLERİ ÇALIŞMALARI												ELEKTRİK İŞLERİ ÇALIŞMALARI									
	MEK.1	**MEK.2**	**MEK.3**	**MEK.4**	**MEK.5**	**MEK.6**	**MEK.7**	**MEK.8**	**MEK.9**	**MEK.10**	**MEK.11**	**MEK.12**	**ELK.1**	**ELK.2**	**ELK.3**	**ELK.4**	**ELK.5**	**ELK.6**	**ELK.7**	**ELK.8**	**ELK.9**	**ELK.10**
TARİH	HİDROFOR ARIZA	ESKİ KUYU SÖKME -TAKMA	YENİ KUYU POMPA MONTAJ	DALGIÇ POMPA ARIZA	DALGIÇ MOTOR ARIZA	SANTRAFÜJ YENİLEME -TAMİR	VANA-CEKVALF ARIZA	KUYU AĞZI DE - MONTAJ	KOLON BORU İLAVE	KUYU TAMİR - BAKIM	POMPA İSTASYONU TAMİR -BAKIM	KUYU KABİN	JENERATÖR MONTAJ	OG -A.G. ARIZA	PANO ARIZA VE YENİLEME	R.S.T. ÇEKİMİ	ŞAMANDRA ARIZA	BİNA ELEKTRİK ARIZASI	TRAFO SÖKME - TAKMA	KABLO EKLEME	ÖN KEŞİF	POMPA İSTASYONU ELK. ARIZA
OCAK	1	0	17	6	11	3	28	50	33	0	0	36	0	5	4	1	0	0	1	27	4	0
ŞUBAT	1	0	9	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1	2	0	3	0	7	0
MART	8	0	11	2	9	5	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	2	0	0	0	10	0
NİSAN	5	0	9	8	21	1	0	0	0	0	0	0	0	6	10	1	2	0	0	0	14	0
MAYIS	13	0	10	17	31	12	0	0	0	0	0	0	0	3	25	0	1	0	0	0	8	0
HAZİRAN	9	0	15	10	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	2	0	1	0	7	0
TEMMUZ	1	0	18	19	43	5	0	0	0	0	0	0	0	11	13	2	1	0	0	0	4	0
AĞUSTOS	3	0	11	15	35	5	0	0	0	0	0	0	0	3	14	0	3	0	0	0	3	0
EYLÜL	5	0	9	8	14	2	0	0	0	0	0	0	0	6	30	3	1	0	0	0	18	0
EKİM	3	11	10	6	29	8	2	8	4	9	6	5	1	8	8	2	1	10	0	9	20	9
KASIM	4	6	9	9	13	7	3	9	3	9	2	10	2	6	13	5	3	10	0	2	19	2
ARALIK	2	13	4	5	7	2	4	7	4	23	25	27	2	3	4	0	4	4	0	1	10	3
TOPLAM	55	30	132	107	241	55	37	74	44	41	33	78	5	58	146	17	22	24	5	39	124	14


SU ŞEBEKELERİ BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1988-2015 Yılları Arası Ulaşılan Su Şebekesi Uzunluğu (Metre)

Yıllar	Döşenen Şebeke Uzunluğu (m)			Eklenik Şebeke Uzunluğu **(m)**
	İçme Suyu (m)	Tatlı Su (m)	Toplam (m)	
1988	1.190.000	-	1.190.000	1.190.000
1989	44.180	11.664	55.844	1.245.844
1990	34.326	65.749	100.075	1.345.919
1991	67.245	72.576	139.821	1.485.740
1992	79.103	24.699	103.802	1.589.542
1993	135.154	17.288	152.442	1.741.984
1994	145.578	3.250	148.828	1.890.812
1995	121.319	14.095	135.414	2.026.226
1996	110.909	33.296	144.205	2.170.431
1997	136.814	7.565	144.379	2.314.810
1998	171.971	13.253	185.224	2.500.034
1999	138.630	9.475	148.105	2.648.139
2000	157.460	4.960	162.420	2.810.559
2001	183.405	16.648	200.053	3.010.612
2002	138.424	25.506	163.930	3.174.542
2003	153.352	43.442	196.794	3.371.336
2004	117.984	15.565	133.549	3.504.885
2005	193.674	9.662	203.336	3.708.221
2006	318.151	1.180	319.331	4.027.552
2007	200.351	1.172	201.523	4.229.075
2008	156.554	400	156.954	4.386.029
2009	95.800	28.490	124.290	4.510.319
2010	81.146	14.776	95.922	4.606.241
2011	72.808	22.273	95.081	4.701.322
2012	55.699	11.489	67.188	4.768.510
2013	99.929	23.666	123.595	4.892.105
2014	88.393	-	88.393	4.980.498
2015	72.870	490	73.360	5.053.858
Çelik Boru	265.915	-	265.915	5.319.773
Ductil	58.107	-	58.107	5.377.880
Toplam(m)	**4.885.251**	**492.629**	**5.377.880**	

2010-2015 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Su Şebeke Arıza Çalışmaları

2010-2015 Yılları Arası Arıza Sayıları (Adet)				
Yıllar	Ana Şebeke (Adet)	Abone Şube Yolu (Adet)	Park, Y. Alan, Hidrant, Çeşme vb. (Adet)	TOPLAM (Adet)
2010	3.327	2.717	6.468	12.512
2011	3.397	2.876	3.749	10.022
2012	3.548	3.366	4.508	11.422
2013	3.452	2.939	4.236	10.627
2014	3.436	2.841	3.726	10.003
2015	3.763	3.368	3.468	10.599

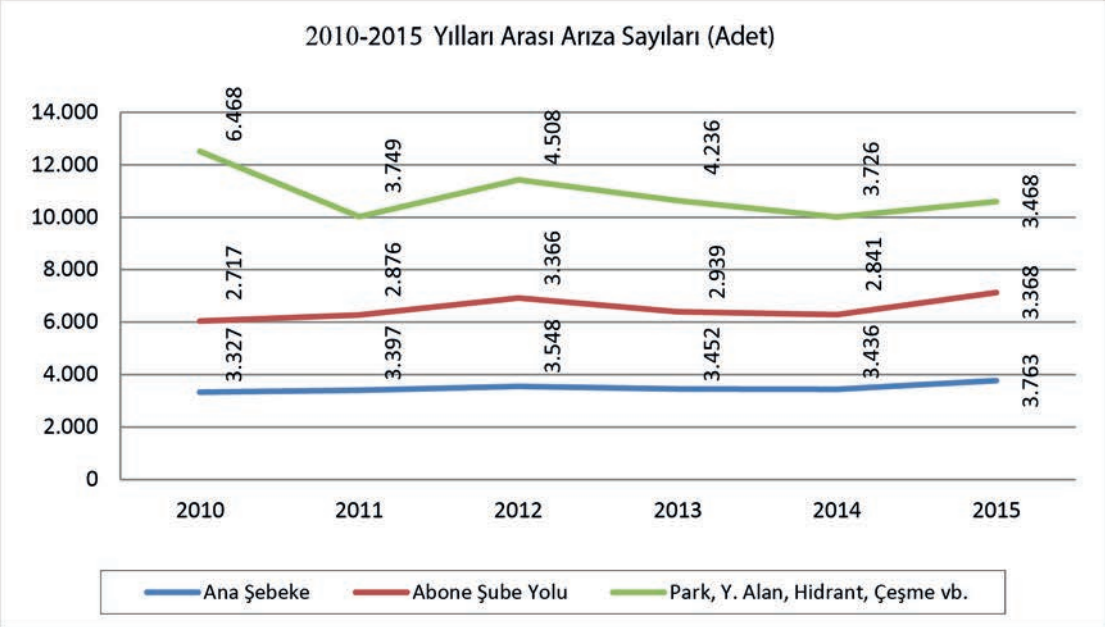






İçme Suyu Şebeke Arıza Sebepleri

Su Şebeke Arızaları		Selçuklu (Adet)	Karatay (Adet)	Meram (Adet)	G.Toplam (Adet)
Müteahhit	Su Şebeke	8	34	51	93
	Kanalizasyon	93	72	256	421
	Medaş	15	22	19	56
	Ptt, Telekom	24	9	26	59
	Doğalgaz	44	47	72	163
	Hafriyat Müt.	43	10	71	124
Ara Toplam (Adet)		**227**	**194**	**495**	**916**
Belediyeler	Selçuklu	33	0	0	33
	Meram	0	0	38	38
	Karatay	0	57	0	57
	Büyükşehir	17	10	11	38
	KOSKİ	16	10	30	56
	Tesis. Odası	7	0	0	7
Ara Toplam (Adet)		**73**	**77**	**79**	**229**
Vatandaş		35	62	36	133
Müdahalesiz		996	385	434	1.815
Şebeke Vanası		271	40	151	462
Ara Toplam		1.302	487	621	2.410
Toplam (Adet)		**1.602**	**758**	**1.195**	**3.555**

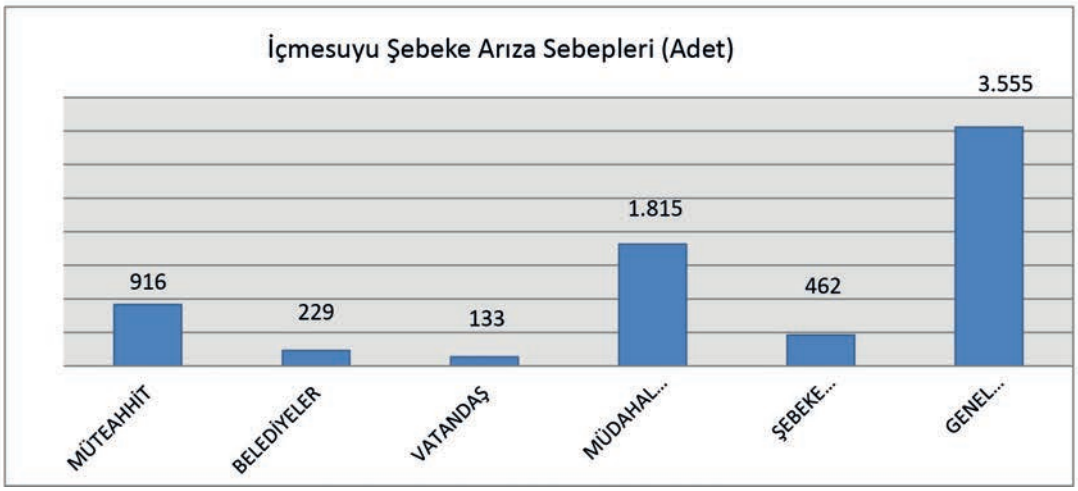






İçme Suyu Şebeke Arıza Sebepleri

Tatlısu Şebeke Arıza Sebepleri ve Sayıları

		Selçuklu (Adet)	Karatay (Adet)	Meram (Adet)	G.Toplam (Adet)
Müteahhit	Su Şebeke	0	2	2	4
	Kanalizasyon	7	0	9	16
	MEDAŞ	2	1	0	3
	PTT,Telekom	0	0	0	0
	Doğalgaz	7	4	5	16
	Hafriyat Müt.	3	0	2	5
Ara Toplam (Adet)		**19**	**7**	**18**	**44**
Belediyeler	Selçuklu	2	0	0	2
	Meram	0	0	2	2
	Karatay	0	1	0	1
	Büyükşehir	1	0	3	4
	KOSKİ	3	0	2	5
	Tesisatçılar Odası	0	0	0	0
Ara Toplam (Adet)		**6**	**1**	**7**	**14**
Vatandaş		5	0	1	6
Müdahalesiz		103	5	22	130
Şebeke Vanası		14	0	0	14
Ara Toplam		122	5	23	150
Toplam (Adet)		**147**	**13**	**48**	**208**

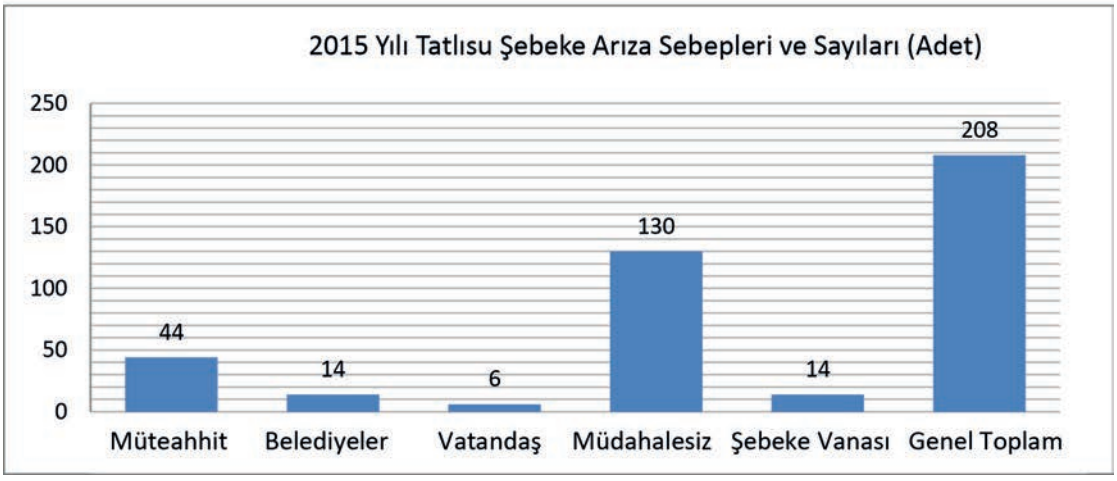







Şebeke Yapım Sayıları

		Selçuklu (Adet)	Karatay (Adet)	Meram (Adet)	G.Toplam (Adet)
Yapım	Yeni Şebeke	43	30	28	101
	Islah	6	1	24	31
	Şebeke İptali	52	44	62	158
	Şebeke Aktarma	3	11	63	77
	Şebeke, Kuyu savak Bağlantısı Ve Hidrant Montajı	11	9	15	35
	Toplam (Adet)	**115**	**95**	**192**	**402**

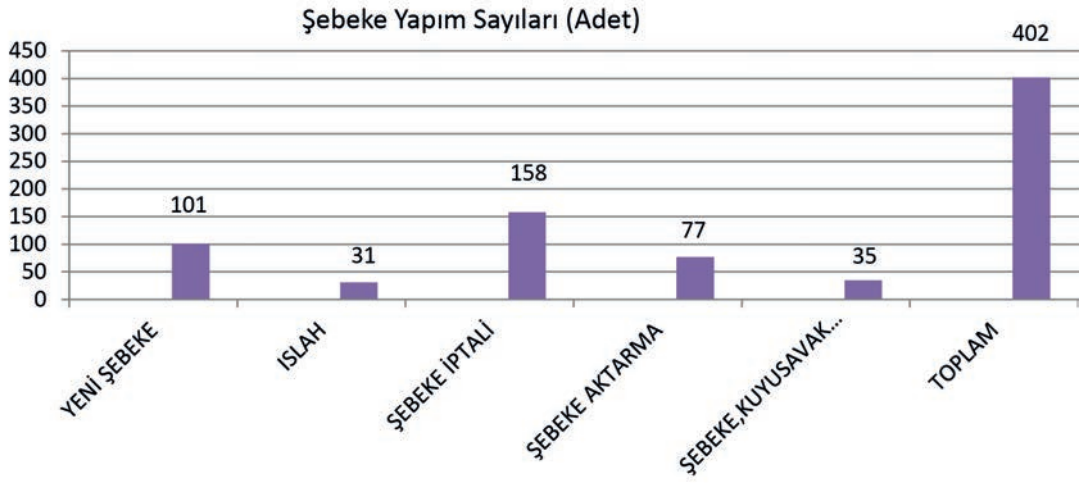




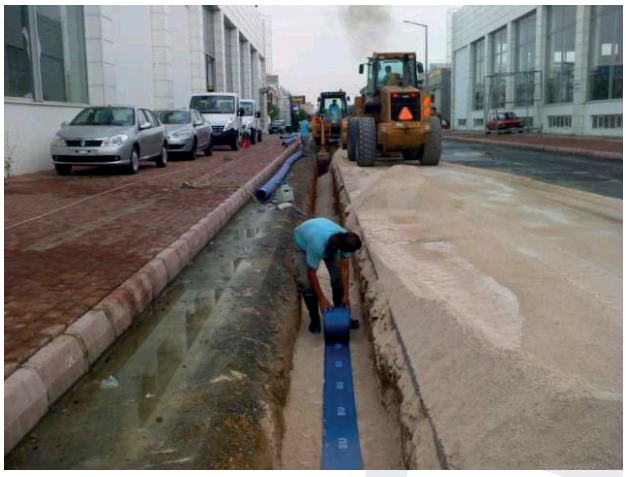


Yeni Şebeke, Islah ve İptal Edilen Şebeke Miktarları

	Yeni Şebeke (m)	İptal Edilen Şebeke (m)	Islah (m)
Karatay	2.176	7	0
Meram	1.239	59	542
Selçuklu	2.867	26	491
Genel Toplam (m)	**6.282**	**92**	**1.033**

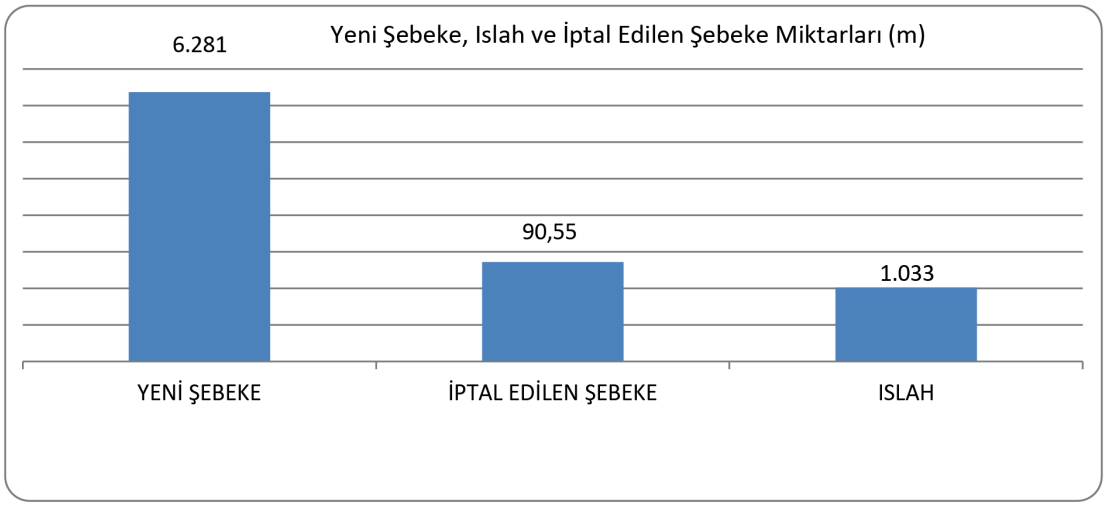




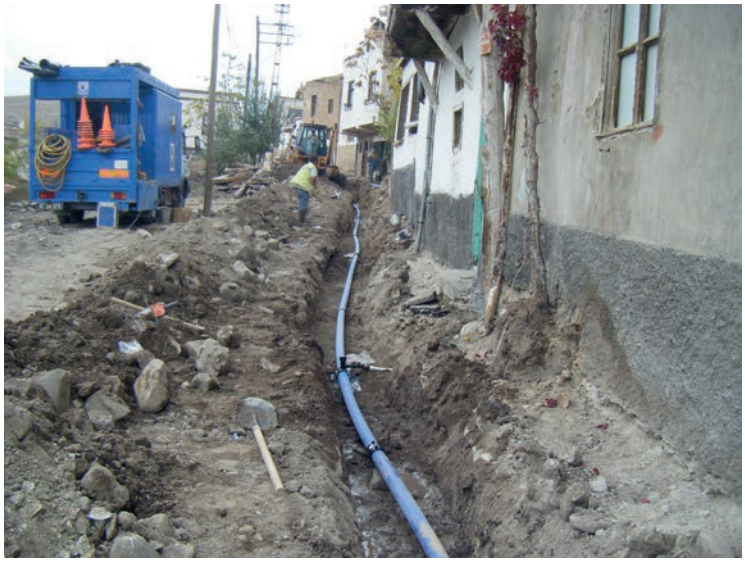

Abone Şube Yolu Çalışmaları

		Selçuklu (Adet)	Karatay (Adet)	Meram (Adet)	G.Toplam (Adet)
Abone Bağlantısı	Tatlı Su,Yeşil Alan,Pazar Yeri	25	5	20	50
	Kamu Binası	9	0	1	10
	Parsel	16	0	1	17
	Yeni Abone Bağlantısı, Aktarma	127	3	42	172
	Belediye Vanası Montajı	83	0	6	89
Açma	Şebekeden Açma	5	14	1	20
	Belediye Vanasından Açma	38	31	14	83
	Sayaç Dikmesinden Açma	11	10	1	22
Kesme	Şebekeden Kesme	109	324	70	503
	Belediye Vanasından Kesme	375	284	230	889
	Sayaç Dikmesinden Kesme	77	54	49	180
Sayaç	Sayaç Yeri Hazırlama	12	12	8	32
	Sayaç Yeri Islahı	4	3	3	10
	Sayaç Kolu	46	25	56	127
	Sayaç Dikmesi	61	32	51	144
	Sayaç Vanası	376	147	255	778
	Sayaç Arızalı	211	29	20	260
Toplam (Adet)		**1.585**	**973**	**828**	**3.386**

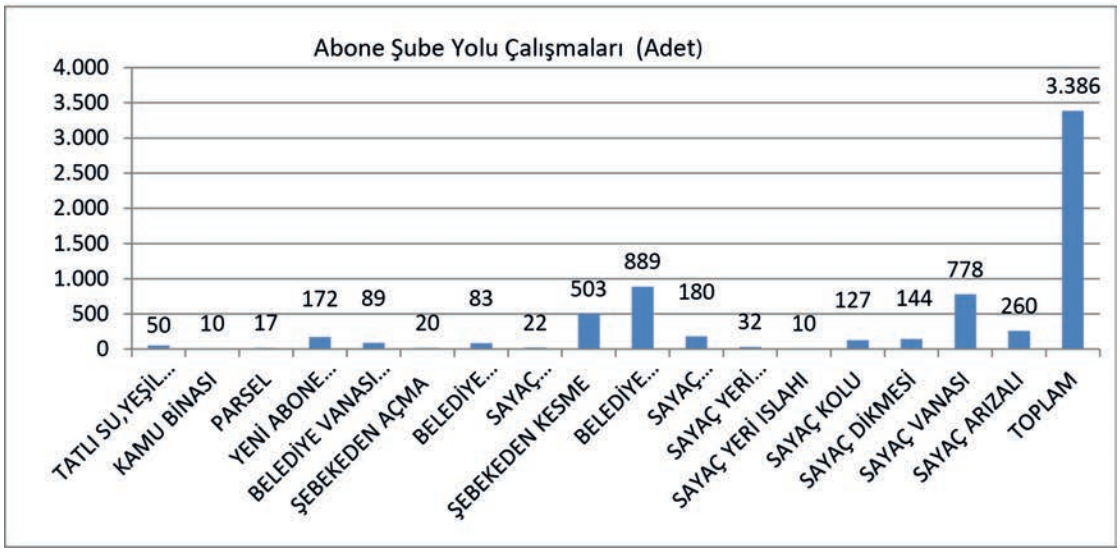








Park, Yeşil Alan, Hidrant vb Arıza Çalışmaları

Yeşil Alan, Hidrant vs Arızalar

	Selçuklu (Adet)	Karatay (Adet)	Meram (Adet)	G.Toplam (Adet)
Park Vanası	68	9	10	87
Park Dikmesi	21	15	15	51
Yangın Hidrantı	42	41	39	122
Umumi Wc	4	2	9	15
Şadırvan	33	21	66	120
Toplam (Adet)	**168**	**88**	**139**	**395**

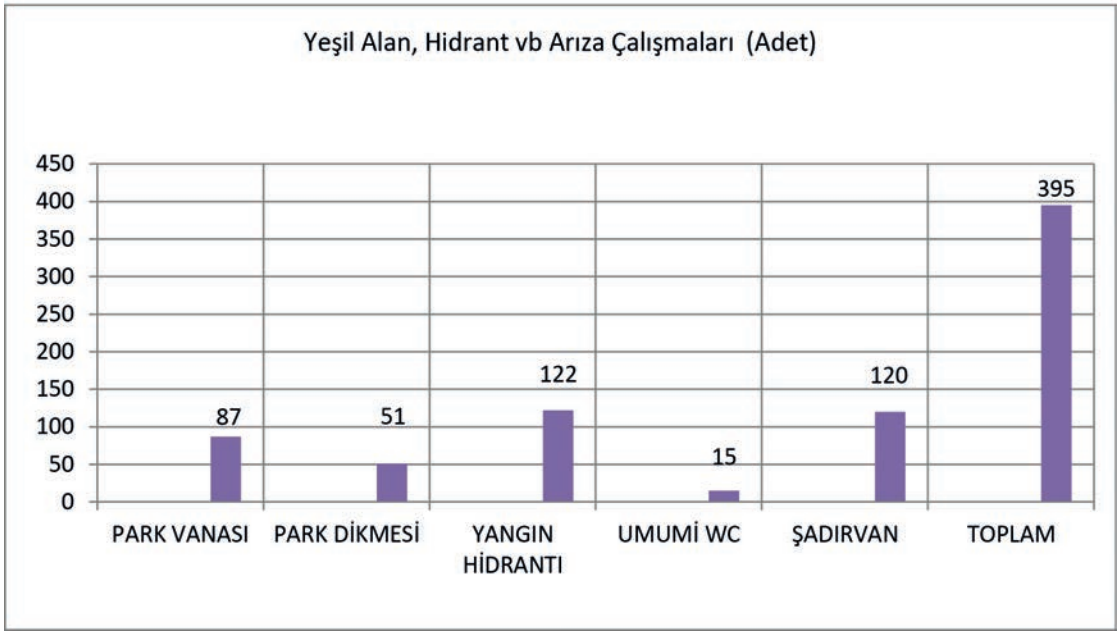








Abone Şube Yolu Arıza Çalışmaları

Abone Şube Yolu Arızaları					
		Selçuklu (Adet)	Karatay (Adet)	Meram (Adet)	G.Toplam (Adet)
Müteahhit	Su Şebeke	1	6	46	53
	Kanalizasyon	14	12	181	207
	MEDAŞ	9	5	13	27
	PTT	9	3	11	23
	Doğalgaz	19	21	49	89
	Hafriyat Müt.	12	7	34	53
Ara Toplam (Adet)		**64**	**54**	**334**	**452**
Belediyeler	Selçuklu	25	1	0	26
	Meram	0	0	25	25
	Karatay	0	19	0	19
	Büyükşehir	2	1	10	13
	KOSKİ	7	6	23	36
	Tesisatçılar Odası	1	1	0	2
Ara Toplam (Adet)		**35**	**28**	**58**	**121**
Vatandaş		98	57	52	207
Müdahalesiz		1.012	791	588	2.391
Ara Toplam (Adet)		**1.110**	**848**	**640**	**2.598**
Belediye Vanası	Dış Müdahale	7	2	6	15
	Müdahalesiz	89	46	47	182
Ara Toplam (Adet)		96	48	53	197
Toplam (Adet)		**1.305**	**978**	**1.085**	**3.368**

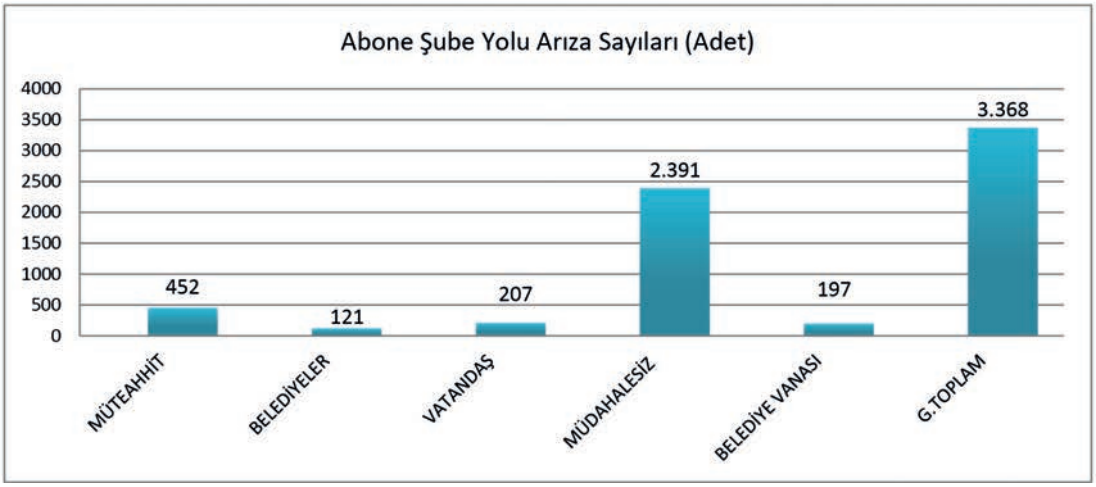








Su Akmıyor, Havalı ve Bulanık Akıyor Şikâyet Sayıları

	Selçuklu (Adet)	Karatay (Adet)	Meram (Adet)	G.Toplam (Adet)
Abone Şube Yolu Donmuş	70	175	229	474
Sayaç Vanası Kapalı	88	12	31	131
Şebeke Vanası Kapalı	59	14	46	119
Belediye Vanası Kapalı	18	0	1	19
İç Tesisat Vanası Kapalı	6	0	1	7
Sayaç Çekvalfi Çalışmıyor	113	19	70	202
Şebekede Çalışma Var	57	31	80	168
Servis Te Delinmemiş	1	0	1	2
Borçtan Dolayı Kesik	8	1	2	11
Abone Şube Yolu Tıkalı	70	29	112	211
Hidrofor Arızalı	19	2	6	27
Su Yetersiz	69	24	195	288
Kuyu, Depo Bakım Onarım	10	0	0	10
Su Bulanık Akıyor	6	6	6	18
Su Havalı Akıyor	3	1	9	13
Toplam (Adet)	**597**	**314**	**789**	**1.700**

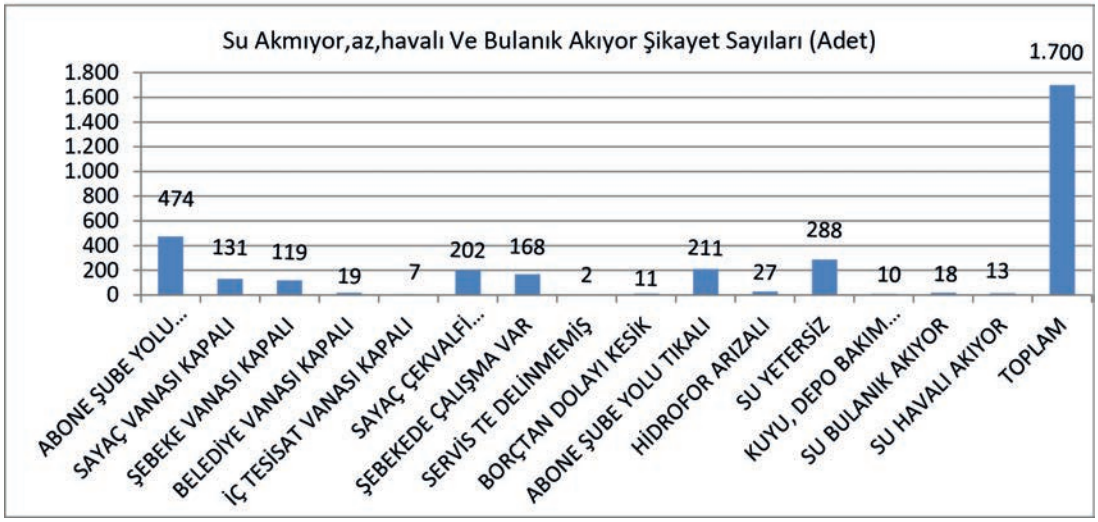






Asılsız, Yanlış İhbar ve Diğer Çalışmalar

Asılsız, Yanlış İhbar Ve Diğer Çalışmalar


		Selçuklu (Adet)	Karatay (Adet)	Meram (Adet)	G.Toplam (Adet)
Yanlış İhbar	Kanal Arızası	74	46	44	164
	Kuyu Arızası	12	27	31	70
	Yağmur, Kar,Halı Yık. Suyu	59	5	28	92
	Diğer Kurum Arızası	113	17	13	143
	İç Tesisat	197	66	142	405
	Asılsız İhbar	243	213	150	606
Asılsız İhbar	Adres Bilgisi Yetersiz	32	7	12	51
	Eski İptal Boru	4	4	0	8
Diğer Çalışmalar	Şebeke Yeri Gösterme	24	8	29	61
	Arıza Sonrası Bakım	1	27	85	113
	Çalışma Seb. İle Kes. - Açma	45	24	17	86
Toplam (Adet)		**804**	**444**	**551**	**1.799**

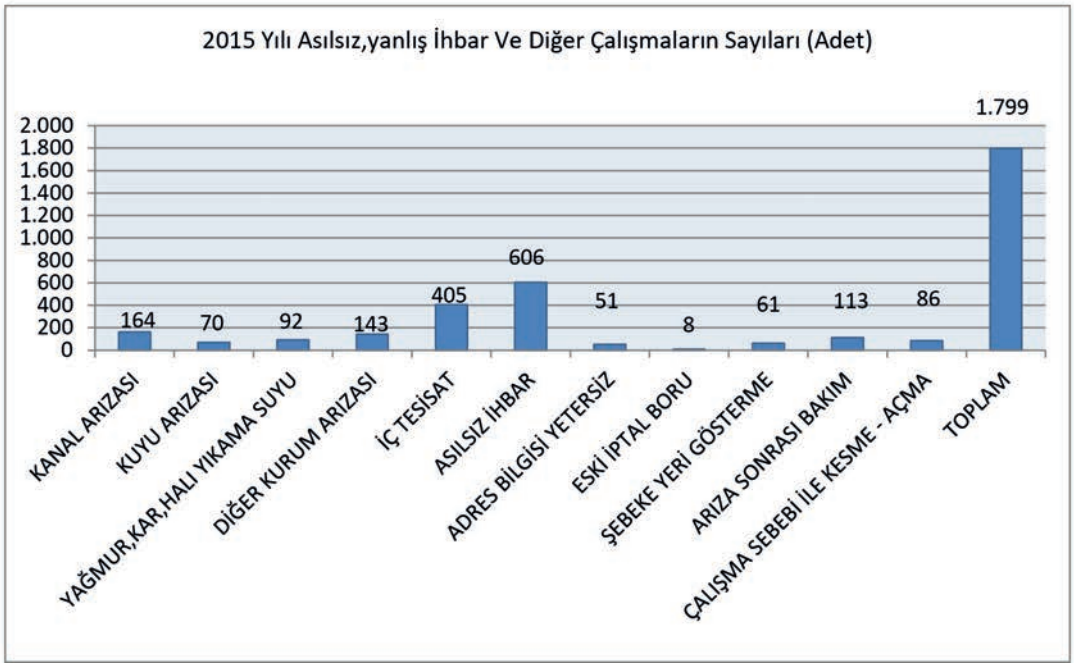

Vana Rögar Kapağı Çalışmaları

Vana Rögar Kapağı Çalışmaları (Adet)

İlçeler	Selçuklu (Adet)	Karatay (Adet)	Meram (Adet)	Toplam (Adet)
Mehhol Yükseltme	1.304	320	643	2.267
Buşakle Yükseltme	1.282	631	448	2.361
Buşakle Montaj	258	222	98	578
Vana Levhası Montajı	613	175	274	1.062
Sfero Kapak Montaj	2.424	1.100	69	4.093
Kapak Arama, Kontrol Ve Bakım	132	82	92	306
Toplam (Adet)	**6.013**	**2.530**	**2.124**	**10.667**

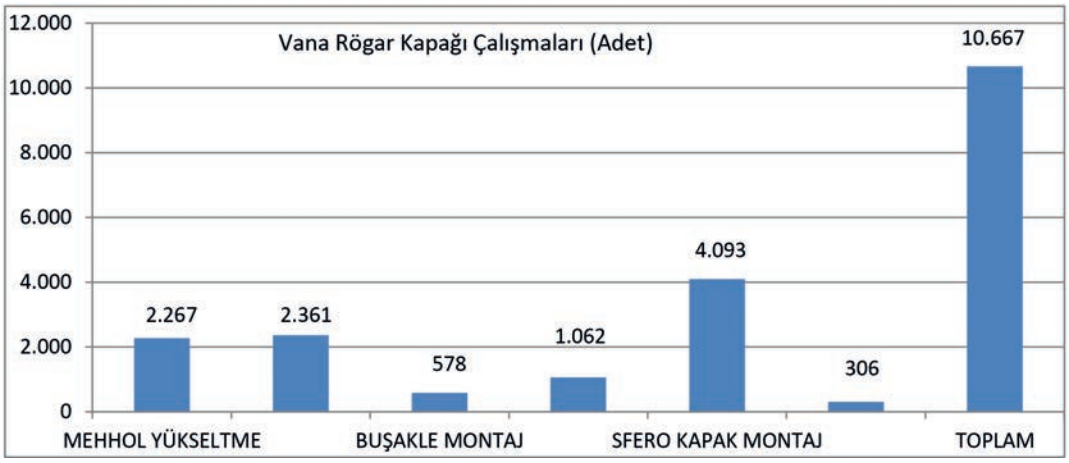




Vana İsale Bakım Onarım Çalışmaları

Vana İsale Bakım Onarım Çalışmaları (Adet)

İlçeler	Selçuklu (Adet)	Karatay (Adet)	Meram (Adet)	Toplam (Adet)
Kelebek Vana	0	1	4	5
Demontaj	0	1	1	2
Sürgülü Vana	1	0	1	2
Dişli Kutusu	9	6	2	17
Vana Menhol Bakım Çalışmaları	76	51	261	388
Canlı Hat Üzerinde Yapılan Çalışmalar	5	0	0	5
Toplam (Adet)	**91**	**59**	**269**	**419**

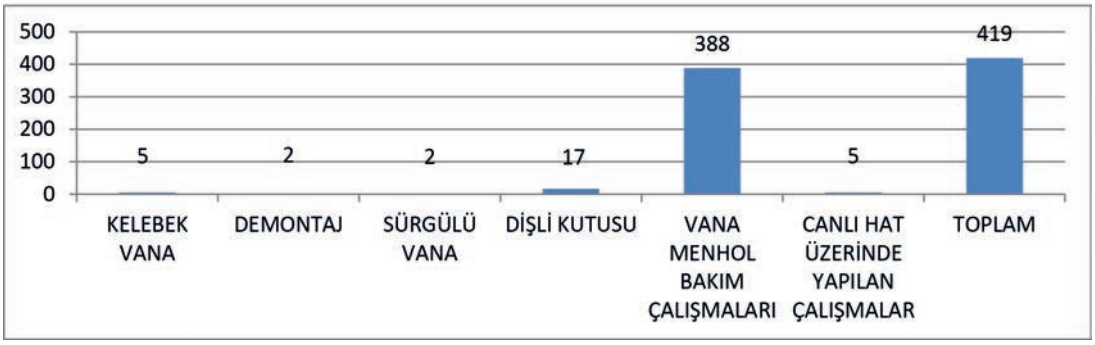










2013-2015 Yılları Hot Tap (Canlı Hattan Branşman Alma) Makinesi İle Bağlantı Yapılan Yerlerin Listesi

2013-2015 Yılları Hot Tap (Canlı Hattan Branşman Alma) Makinesi İle Bağlantı Yapılan Yerlerin Listesi


S.No	Adres	Boru Çapı (mm)	Boru Cinsi	Vana Bağlantı Çapı (mm)	İlçe
1	Yazır M h. Alim Sk.	Ø 450	Çelik Boru	Ø 250	Selçuklu
2	Süleyman Şah. Mh. Aziz M. Hüdai Cd.	Ø 400	Çelik Boru	Ø 150	Meram
3	Kosova Mh. Coşandere Cd.	Ø 700	Çelik Boru	Ø 200	Selçuklu
4	Barsana Depo	Ø 600	Çelik Boru	2"	Meram
5	Gödene Depo	Ø 600	Çelik Boru	2"	Selçuklu
6	Kosova Mh. Büşra S k.	Ø 200	PE	Ø 63	Selçuklu
7	Horozluhan Mh.Yerlisu Sk.	Ø 450	Çelik Boru	2 "	Selçuklu
8	Horozluhan Mh. Ardışkuşu Sk.	Ø 300	PE	Ø 63	Selçuklu
9	Kosova Mh. Soytürk Sk.	Ø 700	Çelik Boru	2 "	Selçuklu
10	Yazır M h. Büyükşehir C d.	Ø 900	Çelik Boru	2 "	Selçuklu
11	Bosna Hersek Mh. Kampüs Girişi	Ø 400	Çelik Boru	2 "	Selçuklu
12	Horozluhan Mh. İstikamet Cd.	Ø 300	PE	Ø 63	Selçuklu
13	Horozluhan Mh. Ankara Cd.	Ø 450	Çelik Boru	2 "	Selçuklu
14	Kosova Mh. Şükrü Efendi Sk.	Ø 280	PVC	1 "	Selçuklu
15	Kosova Mh.Veysel Karani Cd.	Ø 315	PVC	1 "	Selçuklu
16	Ereğli İlçesi İvriz İsale Hattı	Ø 700	A.Ç.B	2 "	Ereğli
17	Ereğli İlçesi İvriz İsale Hattı	Ø 400	PİK	2 "	Ereğli
18	Yazır Mahallesi Batıhan Sokak	Ø 600	Çelik Boru	Ø 315	Selçuklu
19	Çumra	Ø 2000	Çelik Boru	Ø 63	Çumra
		Toplam		19	Adet






Gerçekleşen Fiziki Su Kayıp Ve Alt Bölge Çalışmaları

Gerçekleşen Fiziki Su Kayıp Ve Alt Bölge Çalışmaları (Adet)		
Fiziki Su Kayıp Tespiti	Yapılan İş (Adet)	
	İçme Suyu Kayıp Tespiti	223
	Tatlı Su Kayıp Testiti	6
	Mor Şebeke Kayıp Tespiti	1
	Abone Hattı Kayıp Tespiti	134
	İç Tesisat Kayıp Tespiti	270
	Gürültü Kaydedici Çalışmaları	50
	Korelatör Çalışmaları	0
	Toplam (Adet)	684
Kamera Çalışmaları	Yapılan İş (Adet)	
	Şebeke Hattı Arıza Tespiti	29
	Abone Hattı Arıza Tespiti	7
	Şebeke (Hat) Boru Tespiti	5
	Abone Hat (Boru) Tespiti	3
	Şebeke Hattı Tıkanıklık Tespiti	10
	Toplam (Adet)	54
Hat (Boru, Kablo) Tespiti	Yapılan İş (Adet)	
	İçme Suyu Hat Tespiti	19
	Tatlı Su Hat Tespiti	0
	İsale Hat Tespiti	1
	Abone Hat Tespiti	26
	Kablo (Elektrik) Tespiti	540
	Kablo (Telekom) Tespiti	20
	Toplam (Adet)	606
Rögar Kapağı, Buşakle, Vana Tespiti	Yapılan İş (Adet)	
	Buşakle Kapağı Tespiti	24
	Vana Tespiti	199
	Toplam	223
Harita İşlemleri	Yapılan İş	
	GPS Ölçümü İçme Suyu Borusu	8
	GPS Ölçümü Abone Şube Yolu Hattı	2
	GPS Ölçümü Şebeke Vanası	3
	Aplikasyon Ölçümü	133
	Toplam (Adet)	146
Alt Bölge Hazırlama Ve Debi-Basınç Ölçümü	Yapılan İş (Adet)	
	Debi-Basınç Ölçüm Yeri Hazırlama	88
	Debi Ölçümü	10
	Basınç Ölçümü	10
	Toplam (Adet)	108
GENEL TOPLAM		1.821

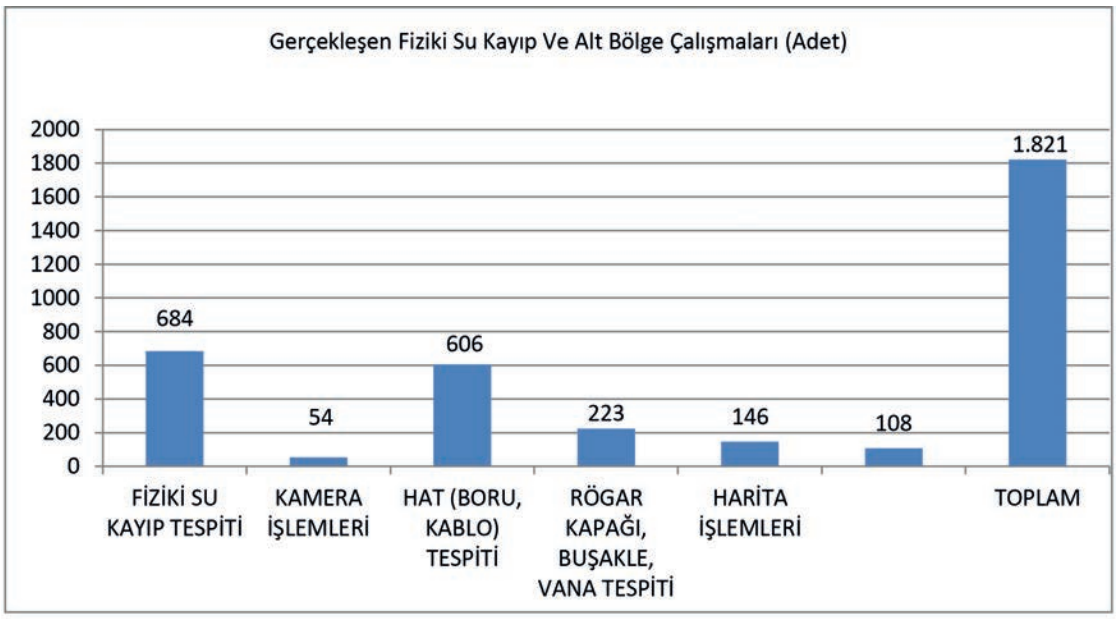

Gerçekleşen Fiziki Su Kayıp ve Alt Bölge Çalışmalar Toplamı


Fiziki Su Kayıp **Tespiti** **(Adet)**	**Kamera** Çalışmaları **(Adet)**	**Hat (Boru, Kablo) Tespiti** **(Adet)**	Rögar Kapağı, Buşakle, **Vana Tespiti** **(Adet)**	**Harita** İşlemleri **(Adet)**	Alt Bölge Oluşturma Ve **Debi**-Basınç Ölçümü **(Adet)**	**Toplam** **(Adet)**
684	54	606	223	146	108	1.821

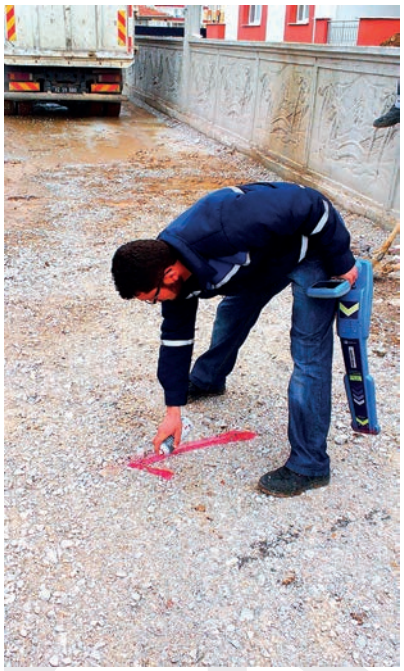






Alt Bölge Oluşturma Çalışması

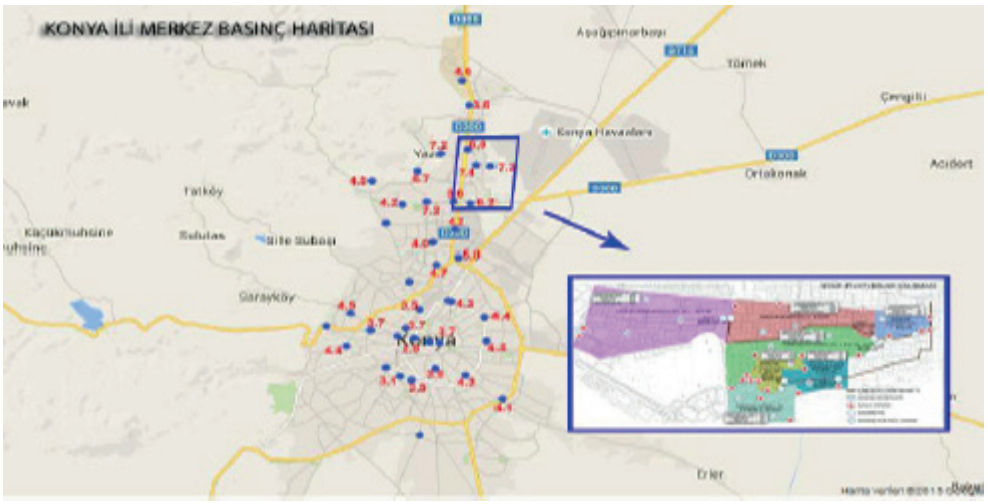

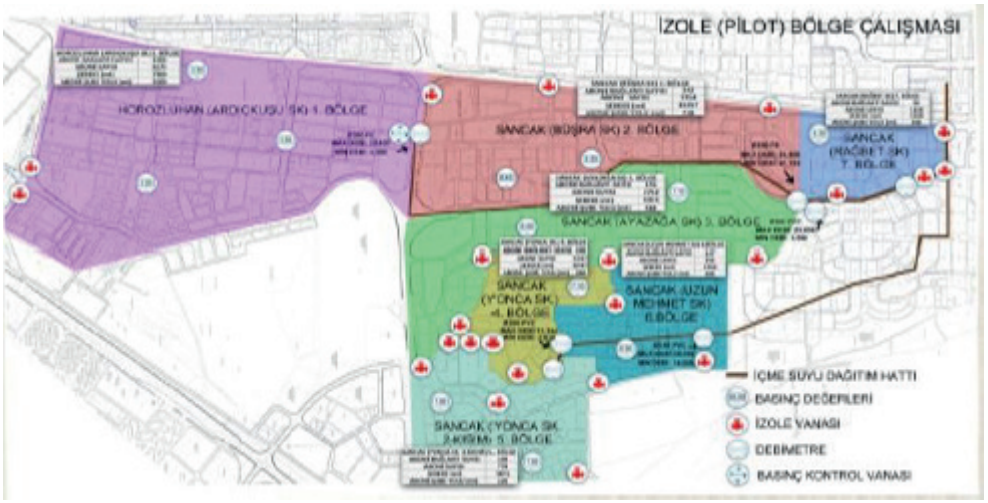


Bütün Bölgeler Genel Toplamı

Bölge Adı	Abone Bağlantı Sayısı (Adet)	Abone Bağlantı Gps Kordinat Sayısı (Adet)	Abone Sayısı (Adet)	Abone Şube Yolu (m)	Ortalama Basınç (Bar)	Şebeke (m)	Şebeke Gps Kordinat Sayısı (Adet)	Vana Sayısı (Adet)	İzole Vanası (Adet)	Basınç Ve Debi Boru Çapı (mm)
Horozluhan (Ardıçkuşu Sk) 1. Bölge	1.068		4.273	3.200	3.90	7800		120	3	Ø 300 PE
Sancak (Büşra Sk) 2. Bölge	242	484	3.714	728	4.90	11.417	407	94	3	Ø 200 PE
Sancak (Ayazağa Sk) 3. Bölge	155	310	2.742	582	5.12	8.315	296	59	5	Ø 280 PVC
Sancak (Yonca Sk.) 4. Bölge	120	240	1.537	336	7.09	6.747	240	40	6	Ø 280 PVC
Sancak (Yonca Sk. 2-Kısım) 5. Bölge	100	200	779	226	6.68	5.871	209	17	5	Ø 90 PE
Sancak (Uzun Mehmet Sk) 6.Bölge	170	340	193	484	5.65	9.750	348	45	3	Ø 315 PVC
Sancak (Rağbet Sk) 7. Bölge	58	116	1.146	206	6.50	5.508	196	17	4	Ø 315 PVC
Kosova Salihdede 8. Bölge	98	196	643	547	6.90	17.789	635	39	5	Ø 280 PVC
Genel Toplam	**2.011**	**1.886**	**1.5027**	**6.309**	**5.84**	**73.197**	**2.331**	**431**	**34**	

Alt Bölge Hazırlama ve Debi-Basınç Ölçüm Miktarları

	Yapılan İş (Adet)	
Alt Bölge Hazırlama Ve Debi- Basınç Ölçümü	Alt Bölge Ve Debi -Basınç Ölçüm Yeri Hazırlama	88
	Debi Ölçümü (Adet)	10
	Basınç Ölçümü (Adet)	10
	Toplam (Adet)	108

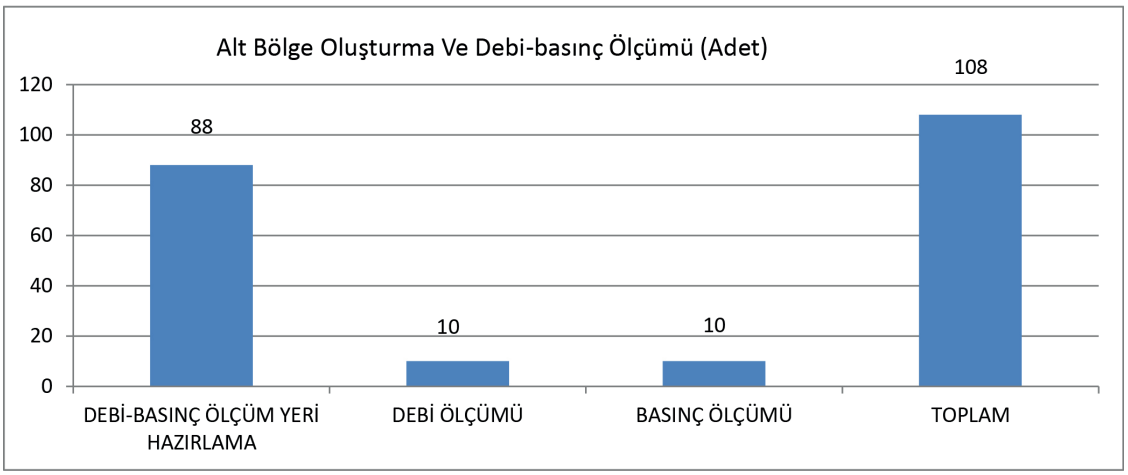








Fiziki Su Kayıp, Hat Tespit, Kamera, Basınç Ve Gürültü Kaydedici Çalışmaları

Fiziki Kayıp Kaçak Arama

	Yapılan İş	Arıza Tespit Edilen (Adet)	Arıza Tespit Edilemeyen (Adet)	Arıza Yok (Adet)	Toplam (Adet)
Fiziki Su Kayıp Tespiti	İçme Suyu Kayıp Tespiti	141	17	65	223
	Tatlı Su Kayıp Tesp iti	6	0	0	6
	Mor Şebeke Kayıp Tespiti	1	0	0	1
	Abone Hattı Kayıp Tespiti	96	16	22	134
	İç Tesisat Kayıp Tespiti	157	18	95	270
	Korelatör Çalışmaları	0	0	0	0
	Toplam (Adet)	401	51	182	634

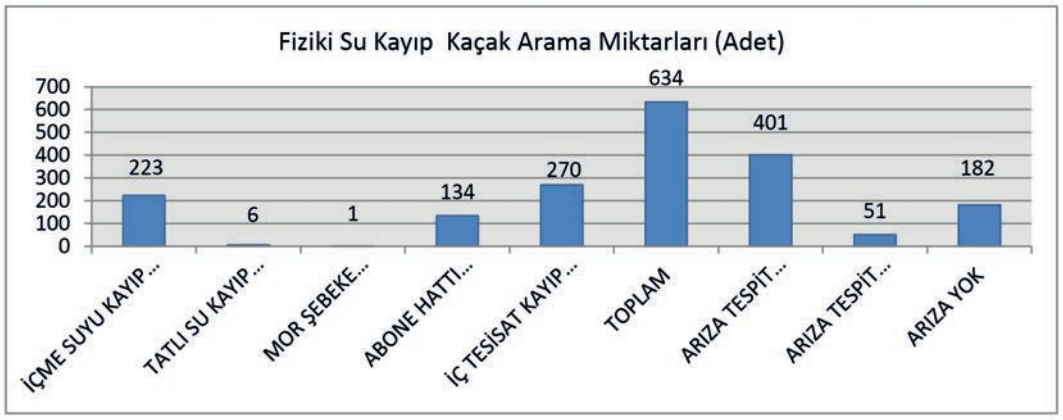


	Yapılan İş (Adet)	
Gürültü Kaydedici	Şebeke (Adet)	50
	Abone (Adet)	0
	Toplam (Adet)	50





Hat (Boru, Kablo) Tespiti

	Yapılan İş (Adet)	
Hat (Boru, Kablo) Tespiti	İçme Suyu Hat Tespiti	19
	Tatlı Su Hat Tespiti	0
	İsale Hat Tespiti	1
	Abone Hat Tespiti	26
	Kablo (Elektrik) Tespiti	540
	Kablo (Telekom) Tespiti	20
	Toplam (Adet)	606

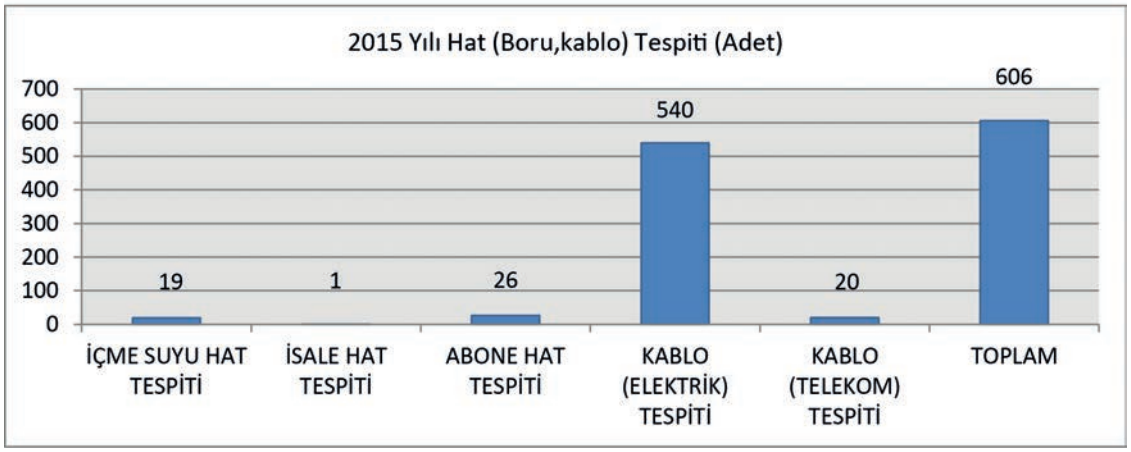






2015 yılı Rögar Kapağı, Buşakle, Vana Tespiti

	Yapılan İş (Adet)	
Rögar Kapağı, Buşakle, Vana **Tespiti**	Buşakle Kapağı Tespiti	24
	Vana Rögar Kapağı Tespiti	199
	Toplam (Adet)	**223**

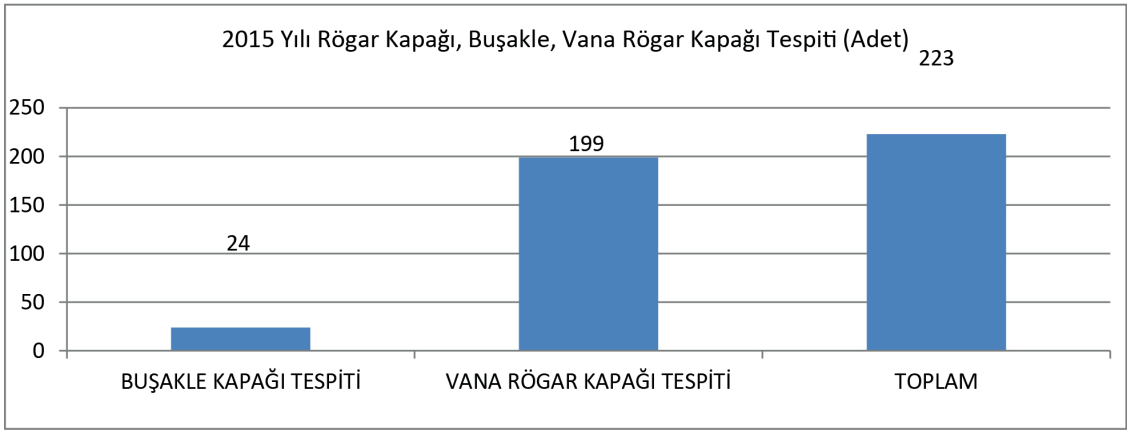





2015 Yılı Kamera İşlemleri

	Yapılan İş (Adet)	
Kamera Çalışmaları	Şebeke Hattı Arıza Tespiti	29
	Abone Hattı Arıza Tespiti	7
	Şebeke (Hat) Boru Tespiti	5
	Abone Hat (Boru) Tespiti	3
	Şebeke Hattı Tıkanıklık Tespiti	10
	Toplam (Adet)	**54**





SU TEMİN VE KAYNAK GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1- Kentin içme ve kullanma suyu temini amacıyla; Yatırım programı dahilinde Toplam olarak 17.198 m. (107 adet) su sondaj kuyusu açımı gerçekleştirilmiştir.

İHALE TÜRÜ	Açık İhale	Doğrudan Temin	KOSKİ	TOPLAM
Metraj (m)	14.739	1.345	1114	17.198



2- Yıl içerisinde açılan kuyulardan su numunesi içme ve kullanmaya suyuna uygun olan 87 adet kuyu işletmeye alınmıştır. İçme suyua uygun olmayan 9 adet kuyu ve su çıkmayan 11 adet kuyu ise işletmeye alınmamıştır





3- İçme ve Kullanma amaçlı açılan sondaj kuyularının şebeke ishale ve elektrik hatları Plan Proje Dairesi Başkanlığı ile ortak çalışma yapılarak projeleri hazırlanmıştır.







4-DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak; İl ve İlçe merkezlerinde açılan içme kullanma amaçlı açılan sondaj kuyularının Yeraltı Suyu Arama Belgesi ve Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi alınmıştır.

T.C.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
DSİ 4.Bölge Müdürlüğü

Form No : 2.7.2.
Belge No : 04.4221A 3278
Belge Tarihi: 01 Ekim 2015
Belge Tipi: B

YERALTISUYU ARAMA BELGESİ

1. **Belge Sahibi** :
T.C. Kimlik Numarası : KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi : Yenişehir Mah. Vatar Cad. No:2/A Selçuklu/KONYA

2. **Teknik Sorumlu** :

a) Adı Soyadı :Ali KARAKOCA
b) Mesleği :Jeoloji Mühendisi
c) Diploma-Oda Sicil No :071208002
d) Adresi. : Yenişehir Mah. Vatar Cad. No:2/A Selçuklu/KONYA

3. **Sondör, Kuyucu, Galerici** :

a) Adı Soyadı :Musa ÖZDEN
b) Mesleği : Sondör
c) Diploma-Oda Sicil No : : 2012-2R 5307
d) Adresi. :Yeni Mah. Karapınar/KONYA

4. **Arama Yapılacak Arazinin :**

a) İli :KONYA
b) İlçesi : Karapınar
c) Beldesi :
d) Mh. veya köyü : Gaziosmanpaşa
e)Yüzölçümü :
f) Koordinatı: :4173583-543244
g) Havza Adı
h) Ova Adı
i)Pafta/Ada/Parsel 1240/12

5. **Kuyunun :**

a) Tipi : DERİN KUYU
b) Delme usulü : ROTARY
c) DSİ No.su :

6. **Galerinin**

a) Kesiti :
b) Açma usulü :

7. **Talep edilen su miktarı :** Ton/gün 802862,4094 Ton/yıl

10.07.2015 tarihli dilekçe ile usulüne uygun olarak yapılan müracaat incelenerek, yukarıda yüzölçümü ve yeri belirtilen alan içerisinde ve yukarıda belirtilen kişilerce yeraltısuyu aramak amacıyla ekli ve onaylı projesine uygun bir adet derinkuyu inşasına sakınca görülmediğinden, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca bir yıl süreli olarak bu arama belgesi verilmiştir.

DSİ 4.Bölge Md.

Yusuf SEYREK
YAS Şube Başmühendisi

ÖNEMLİ
KUYUNUN AÇILIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY İÇERİSİNDE YERALTISUYU KULLANMA BELGESİ BAŞVURUSU YAPILMASI ŞARTTIR AKSİ TAKDİRDE İLGİLİ KUYU YASAYA GÖRE HÜKÜMSÜZDÜR !

O. Nuri AKYÜZ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

YERALTISUYU KULLANMA BELGESİ İSTEME FORMU

Form No :2.7.3.

DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
KONYA

1. Müracaat Sahibi :KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KARYEM-1 KUYUSU)
T.C. Kimlik Numarası :
Adresi : Yenişehir Mah. Vatan cad. No:2/A Selçuklu / KONYA

2. Teknik Sorumlu
a) Adı Soyadı Ali KARAKOCA b) Mesleği : JEOLOJİ MÜHENDİSİ
İmzası:

c) Diploma-Oda Sicil No : 071208002
d) Adresi : Yenişehir Mah. Vatan cad. No:2/A Selçuklu / KONYA
:

3. Sondör, Kuyucu, Galerici:
a) Adı Soyadı :Aşır ÖZDEN İmzası:
b) Mesleği : SONDÖR
c) Diploma Oda-Sicil No 2015-2R-5883
d) Adresi :Yeni Mah. Karapınar/KONYA

4. Kuyu/Galeri Yeri
a) İli : KONYA f) Yüzölçümü : m2
b) İlçesi : KARAPINAR g) Koordinatı : 36 543244 E - 41 73583 N
c) Beldesi : h) Havza Adı : 16/5-f
d) Köy veya Mh : Gaziosmanpaşa Mh. ı) Ova Adı : Emirgazi
e) Kuyunun DSİ No.su 01/10/2015-3278 i) Pafta/Ada/Parsı : 1240/12

5. Kuyu/Galeri Verimi
a) Pompajla : 35 lt/sn g) Artezyen : -
c) Statik Seviye : 39.2 m h) Sayaç Numara : -
c) Dinamik Seviye (pompajc : 41.1 m ı) Kullanma amac : İçme Suyu
d) Tahsis Debisi: : 35 lt/sn
e) Çekilecek su miktarı : 3024 Ton/günde ve 1.103.760 Ton/yılda
f) Çekilecek suyu temine yetecek enerji miktarı : -

Yukarıda yeri ve ekli kütüğünde durumu açıklanan ve ceza makbuzu bulunan suyu kullanmak istiyorum. Bu hususta, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanununun 10 uncu maddesi gereğince tarafıma bir Yeraltısuyu Kullanma Belgesi verilmesini arz ederim.

Tarih:

İmza:




YIL İÇERİSİNDE AÇILAN SU SONDAJ ÇALIŞMALARININ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

SIRA NO	İLÇELER	SONDAJ METRAJI	SONDAJ ADETİ	SONDAJ BEDELİ (₺)
1	Ahırlı	192	1	34.560,00
2	Akören	184	2	4.5276,00
3	Akşehir	1264	6	241.008,00
4	Altınekin	1054	6	209.200,00
5	Beyşehir	974	6	196.616,00
6	Bozkır	509	3	88.566,00
7	Çeltik	880	4	48.720,00
8	Cihanbeyli	280	2	157.520,00
9	Çumra	243	2	47.744,00
10	Derebucak	1387	8	292.900,00
11	Doğanhisar	76	1	13.224,00
12	Emirgazi	144	1	25.056,00
13	Ereğli	607	4	126.256,00
14	Güneysınır	250	2	43.500,00
15	Hadim	818	8	137.161,00
16	Hüyük	308	2	56.112,00
17	Ilgın	140	1	25.760,00
18	Kadınhanı	1950	9	405.400,00
19	Karapınar	1461	10	285.416,00
20	Karatay	987	5	228.752,00
21	Kulu	887	7	184.496,00
22	Meram	1116	6	236.741,00
23	Sarayönü	200	1	36.800,00
24	Selçuklu	252	1	57.960,00
25	Seydişehir	696	4	128.064,00
26	Tuzlukçu	600	3	106.400,00
27	Yunak	346	2	63.664,00





2015 YILINDA AÇILAN İÇME SUYU KUYULARININ İLÇELERE DAĞILIM GRAFİĞİ

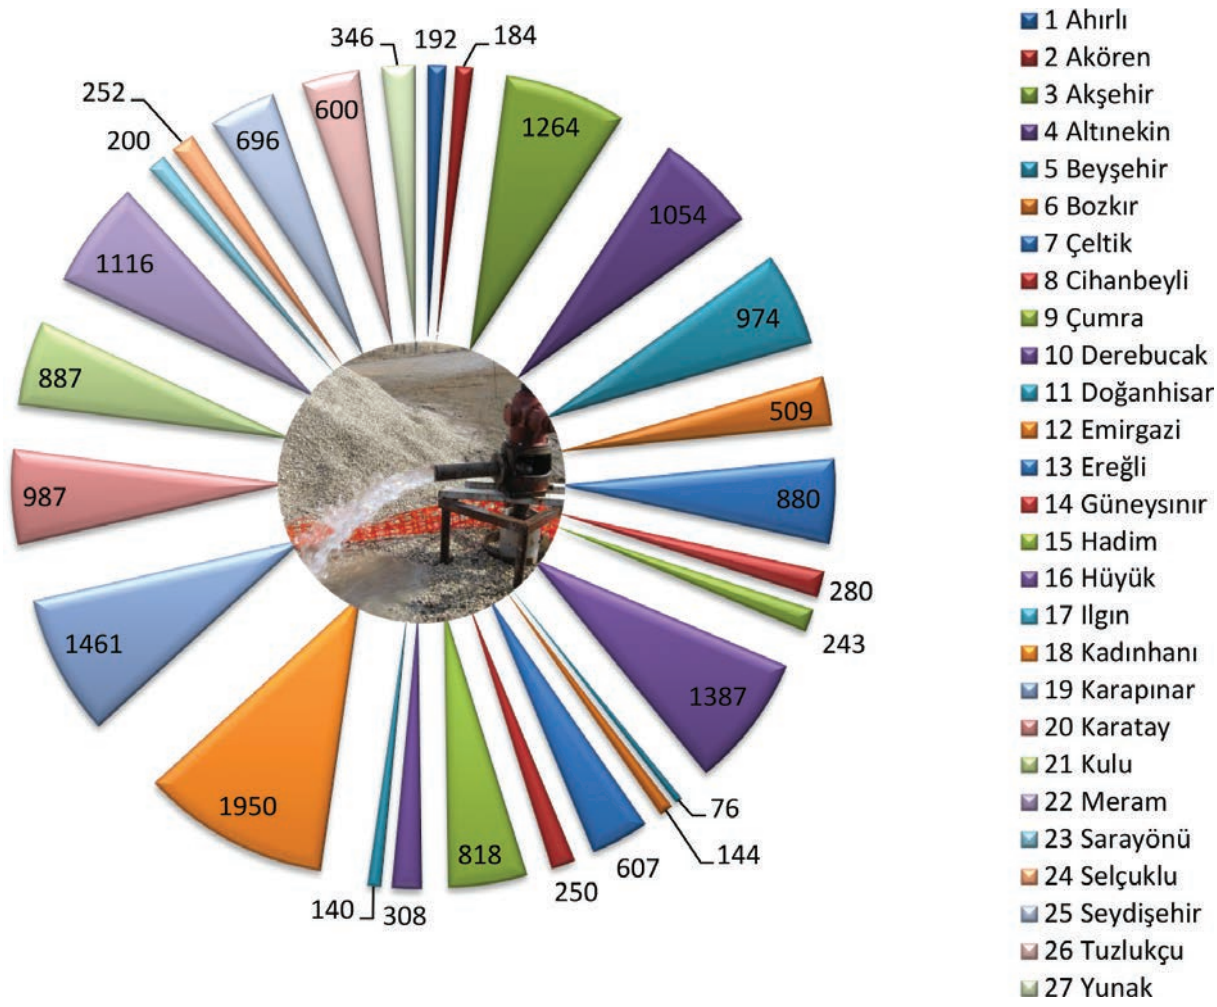












ABONE İŞLERİ

DAİRESİ BAŞKANLIĞI


01.01.2015 – 31.12.2015 TARİHLERİ ARASI SU VE KANALİZASYON MÜRACAAT İŞLEMLERİ

İLÇELER	Su ve Kanalizasyon Müracaat Adedi	Abone Hattı Bağlantısı İçin Tesisat Yaptırma Müsaadesi Verilen Müşteri Sayısı	Kontrolü Ve Muayenesi Yapılan Sayaç Yeri Adedi	Su Abone Hattı Dış Bağlantı Adedi	Kanalizasyon Abone Hattı Dış Bağlantı Adedi	Su ve Kanalizasyon Şebeke Bağlantı Adedi	TOPLAM
SELÇUKLU	2.548	1.349	9.641	351	9.641	259	14.287
MERAM	1.748	970	4.032	331	4.032	202	7.406
KARATAY	1.525	798	6.420	182	6.420	212	9.208
AHIRLI	57	-	-	-	-	-	57
AKÖREN	29	2	3	1	3	-	35
AKŞEHİR	743	3	3	-	3	1	751
ALTINEKİN	265	-	-	-	-	-	266
BEYŞEHİR	963	97	1.054	10	1.054	-	2.125
BOZKIR	458	-	-	75	-	20	571
CİHANBEYLİ	170	24	-	3	-	-	197
ÇELTİK	116	-	-	6	-	-	122
ÇUMRA	410	43	141	3	141	1	599
DERBENT	54	-	-	-	-	1	55
DEREBUCAK	62	2	8	4	8	1	77
DOĞANHİSAR	149	-	-	2	-	-	151
EMİRGAZİ	121	-	-	-	-	-	121
EREĞLİ	220	1	1	-	1	-	222
GÜNEYSINIR	123	-	5	2	5	-	132
HADİM	52	-	1	1	1	1	55
HALKAPINAR	5	-	-	-	-	-	5
HÜYÜK	167	-	-	-	-	-	167
ILGIN	363	-	-	-	-	-	363
KADINHANI	423	-	-	2	-	-	425
KARAPINAR	780	-	-	37	-	61	878
KULU	1.924	-	12	8	12	298	2.242
SARAYÖNÜ	762	1	603	50	603	-	1.419
SEYDİŞEHİR	529	-	-	-	-	-	529
TAŞKENT	159	-	1	-	1	126	286
TUZLUKÇU	440	-	-	-	-	-	440
YALIHÜYÜK	29	-	-	-	-	-	29
YUNAK	695	-	-	-	-	-	695
TOPLAM	**16.089**	**3.290**	**21.925**	**1.068**	**21.925**	**1.183**	**43.915**

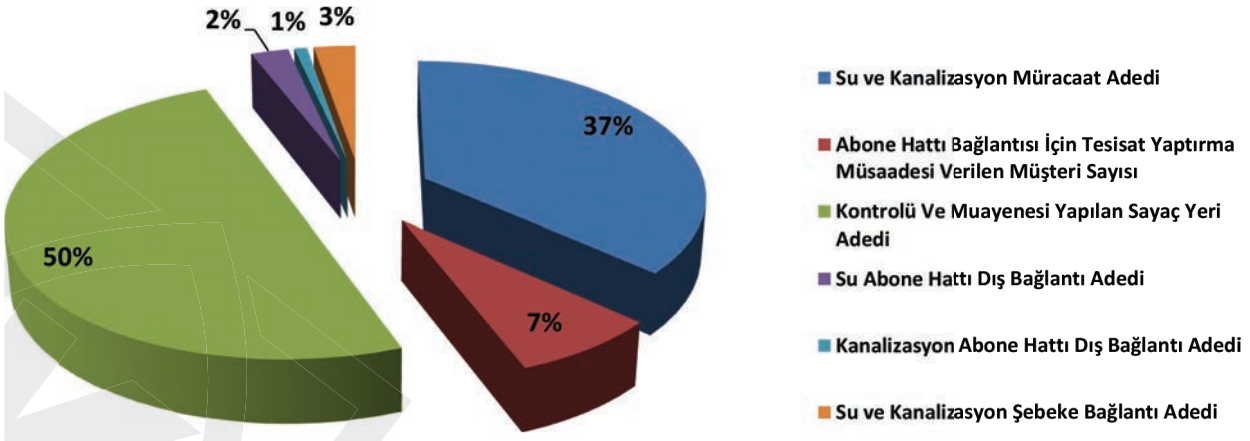


01.01.2015 – 31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA TAHSİL EDİLEN ABONELİK GELİRLERİ

İLÇELER	Su Tesisleri Harcamaları Katılım Payı Bedeli (TL)	Su Abone Hattı Yapım Bedeli (TL)	Kanalizasyon Tesisleri Harcamaları Katılım Payı Bedeli (TL)	Kanalizasyon Abone Hattı Yapım Bedeli (TL)	TOPLAM BEDEL (TL)
SELÇUKLU	1.540.758,78	298.391,82	1.371.440,93	192.925,38	3.403.516,91
MERAM	481.096,91	227.028,06	454.430,82	177.460,27	1.340.016,06
KARATAY	791.391,97	264.564,08	783.363,30	161.035,03	2.000.354,38
AHIRLI	160,00	0,00	270,00	0,00	430,00
AKÖREN	240,00	406,78	0,00	338,98	985,76
AKŞEHİR	61.560,00	813,56	60.347,00	677,96	123.398,52
ALTINEKİN	8.663,72	0,00	8.989,42	0,00	17.653,14
BEYŞEHİR	131.289,00	0,00	42.010,00	338,98	173.637,98
BOZKIR	7.451,90	0,00	3.018,50	0,00	10.470,40
CİHANBEYLİ	38.712,00	0,00	38.721,17	0,00	77.433,17
ÇELTİK	4.320,00	0,00	3.990,00	0,00	8.310,00
ÇUMRA	54.576,90	0,00	53.251,50	0,00	107.828,40
DERBENT	1.421,00	0,00	220,00	0,00	1.641,00
DEREBUCAK	3.620,00	0,00	1.630,00	0,00	5.250,00
DOĞANHİSAR	4.394,98	0,00	3.272,32	0,00	7.667,30
EMİRGAZİ	520,00	0,00	9.704,00	0,00	10.224,00
EREĞLİ	145.239,50	0,00	254.167,10	1.388,35	400.794,95
GÜNEYSINIR	3.219,00	0,00	4.370,00	338,98	7.927,98
HADİM	1.670,00	0,00	1.480,00	0,00	3.150,00
HALKAPINAR	1.870,00	0,00	1.540,00	0,00	3.410,00
HÜYÜK	8.690,00	0,00	6.050,00	0,00	14.740,00
ILGIN	42.381,94	0,00	38.530,03	0,00	80.911,97
KADINHANI	18.915,00	0,00	18.665,00	0,00	37.580,00
KARAPINAR	58.260,00	0,00	87.602,29	0,00	145.862,29
KULU	64.760,04	0,00	84.838,00	76.719,14	226.317,18
SARAYÖNÜ	53.994,00	0,00	52.658,00	0,00	106.652,00
SEYDİŞEHİR	63.438,83	0,00	57.672,00	0,00	121.110,83
TAŞKENT	1.650,00	0,00	1.460,00	0,00	3.110,00
TUZLUKÇU	660,00	0,00	12.312,93	0,00	12.972,93
YALIHÜYÜK	1.210,00	0,00	1.320,00	0,00	2.530,00
YUNAK	3.920,00	0,00	1.430,00	0,00	5.350,00
TOPLAM	**3.600.055,47**	**791.204,30**	**3.458.754,31**	**611.223,07**	**8.461.237,15**

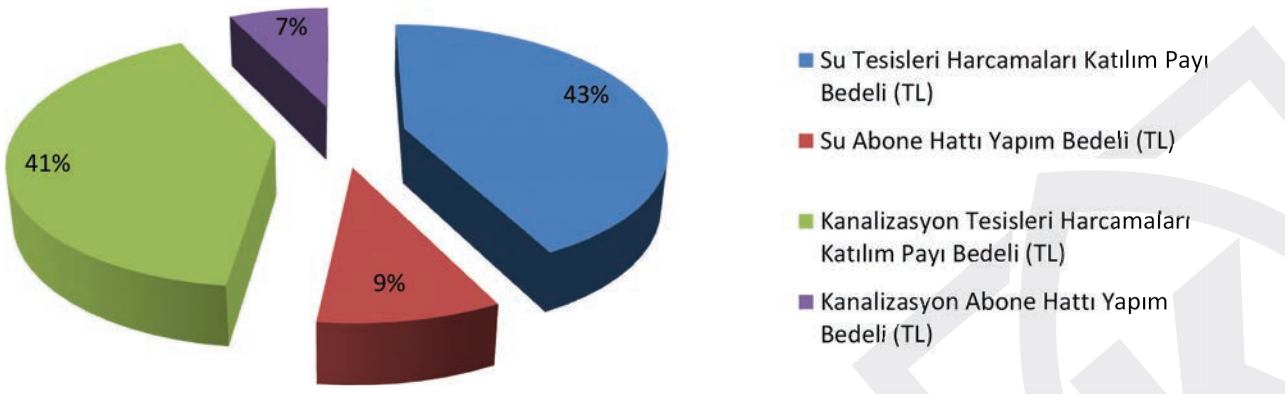

01.01.2015 – 31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME KAYIT, DEVİR VE FESİH İŞLEMLERİ

İLÇELER	Yeni Oluşturulan Abone Sayısı	Sözleşmesi Yapılan Yeni Abone Sayısı	Tahliye ve Tahliye Devir İşlemi Yapılan Abone Sayısı	Tahliyeden Yapılan Kesme Müracaatı Sayısı	TOPLAM İŞLEM SAYISI
SELÇUKLU	13623	14294	31732	23.511	83.160
MERAM	2708	2372	6742	4.674	16.496
KARATAY	5653	4325	6434	4.325	20.737
AHIRLI	38	41	17	3	99
AKÖREN	19	15	50	52	136
AKŞEHİR	952	948	917	105	2.922
ALTINEKİN	91	91	62	86	330
BEYŞEHİR	1400	1299	1568	1.146	5.413
BOZKIR	186	424	126	220	956
CİHANBEYLİ	488	532	485	375	1.880
ÇELTİK	52	61	22	3	138
ÇUMRA	566	558	502	260	1.886
DERBENT	45	45	19	13	122
DEREBUCAK	53	51	44	17	165
DOĞANHİSAR	93	82	92	35	302
EMİRGAZİ	26	29	101	26	182
EREĞLİ	1293	1546	1775	1.238	5.852
GÜNEYSINIR	54	87	72	24	237
HADİM	41	52	168	95	356
HALKAPINAR	32	32	39	8	111
HÜYÜK	136	132	122	19	409
ILGIN	418	389	774	272	1.853
KADINHANI	354	345	142	48	889
KARAPINAR	530	478	454	187	1.649
KULU	887	856	239	58	2.040
SARAYÖNÜ	646	641	194	114	1.595
SEYDİŞEHİR	569	635	1062	609	2.875
TAŞKENT	74	74	40	48	236
TUZLUKÇU	136	131	88	2	357
YALIHÜYÜK	25	24	13	15	77
YUNAK	209	207	48	1	465
TOPLAM	**31.397**	**30.796**	**54.143**	**37.589**	**153.925**

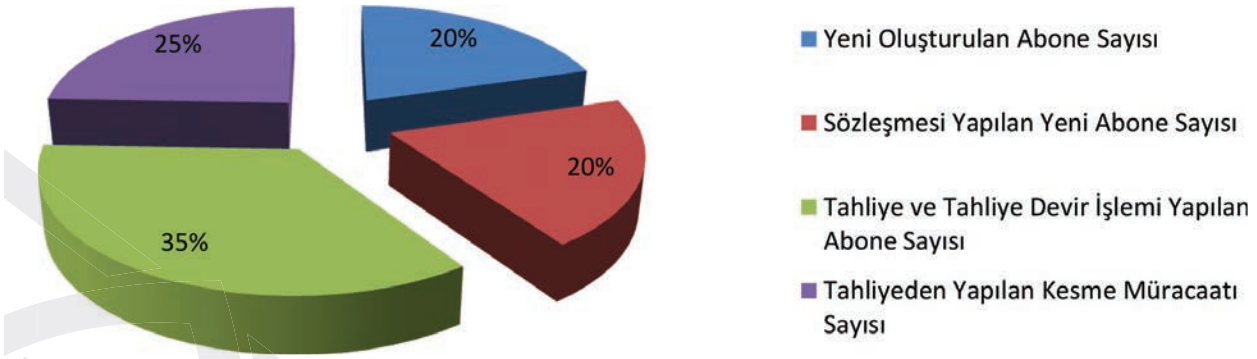

01.01.2015 – 31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN TEMİNAT TAHSİLAT, GÜNCELLEŞTİRME VE İADE İŞLEMLERİ

İLÇELER	Mevcut Teminat Bedeli (TL)	Tahsil Edilen Teminat Bedeli (TL)	İade Edilen Teminat Bedeli (TL)	İade Edilen Teminat Güncelleştirme Farkı Bedeli (TL)
SELÇUKLU	2.984.858,66	4.499.604,32	2.843.436,97	1.207.093,21
MERAM	677.630,89	857.571,80	483.131,49	248.069,74
KARATAY	745.637,17	1.126.982,16	536.980,97	258.048,24
AHIRLI	158,20	989,00	139,00	19,20
AKÖREN	4.078,87	3.561,12	2.266,00	2.692,87
AKŞEHİR	12.185,29	29.363,00	11.795,54	437,47
ALTINEKİN	5.097,15	6.804,00	3.220,00	1.877,15
BEYŞEHİR	80.606,75	163.027,50	78.713,29	2.479,70
BOZKIR	12.000,26	24.918,36	11.870,72	579,52
CİHANBEYLİ	35.929,86	54.154,50	35.672,73	406,95
ÇELTİK	481,00	3.242,00	426,00	55,00
ÇUMRA	12.419,63	33.509,53	12.181,67	472,08
DERBENT	947,22	3.290,00	920,00	27,22
DEREBUCAK	1.038,04	4.861,00	603,00	435,04
DOĞANHİSAR	1.002,48	8.714,50	638,42	391,90
EMİRGAZİ	1.265,50	4.587,00	1.200,00	65,50
EREĞLİ	115.142,09	190.425,57	111.821,42	4.139,79
GÜNEYSINIR	2.468,20	7.023,00	2.392,40	96,60
HADİM	4.350,58	7.934,00	4.172,20	218,78
HALKAPINAR	872,00	3.207,00	872,00	0,00
HÜYÜK	789,93	9.520,00	696,83	144,76
ILGIN	24.651,25	66.120,72	22.230,58	2.464,77
KADINHANI	5.674,95	24.446,00	5.548,89	140,94
KARAPINAR	17.901,79	55.123,00	17.677,00	224,79
KULU	2.763,42	20.532,00	2.719,62	43,80
SARAYÖNÜ	6.981,41	40.010,00	6.912,07	99,34
SEYDİŞEHİR	44.488,50	91.598,00	43.672,90	1.152,54
TAŞKENT	1.297,94	3.427,00	1.143,64	181,58
TUZLUKÇU	357,00	4.447,12	357,00	0,00
YALIHÜYÜK	324,67	1.749,00	314,89	19,56
YUNAK	302,71	3.625,00	298,00	4,71
TOPLAM	**4.803.703**	**7.354.367,20**	**4.244.025,24**	**1.732.082,75**

31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE İLÇELERE VE TÜRLERİNE GÖRE ABONE SAYILARI


İLÇELER	31.12.2014 Tarihi İtibariyle Toplam Abone Sayısı	Mesken Aboneleri	İşyeri Aboneleri	Resmi Daire Aboneleri	İnşaat Aboneleri
SELÇUKLU	186.396	188078	27832	1510	11821
MERAM	103.623	100495	8410	693	4237
KARATAY	85.412	81854	16076	1015	6310
AHIRLI	2.190	2190	38	15	3
AKÖREN	2.864	2844	147	40	11
AKŞEHİR	39.275	39430	4113	226	261
ALTINEKİN	4.351	4357	355	73	95
BEYŞEHİR	33.322	33685	2564	184	868
BOZKIR	14.168	13457	569	110	38
CİHANBEYLİ	21.637	21755	1400	106	170
ÇELTİK	3.827	3818	209	26	16
ÇUMRA	19.999	20186	1127	144	508
DERBENT	2.058	2059	113	24	14
DEREBUCAK	4.852	4828	213	21	45
DOĞANHİSAR	9.217	9227	315	77	29
EMİRGAZİ	3.041	3036	167	32	-
EREĞLİ	50.594	50963	4660	198	1.090
GÜNEYSINIR	4.194	4196	217	37	24
HADİM	5.592	5608	347	74	17
HALKAPINAR	2.502	2519	49	26	14
HÜYÜK	9.156	9180	381	61	108
ILGIN	21.835	21671	1564	170	484
KADINHANI	10.914	10932	707	94	46
KARAPINAR	14.698	14799	1325	133	274
KULU	20.572	20713	968	133	556
SARAYÖNÜ	10.650	10880	721	63	46
SEYDİŞEHİR	28.264	28459	2493	176	363
TAŞKENT	3.150	3152	91	68	15
TUZLUKÇU	2.917	2942	75	31	4
YALIHÜYÜK	942	946	48	19	8
YUNAK	10.297	10362	537	71	13
TOPLAM	**732.509**	**728.621**	**77.831**	**5.650**	**27.488**

31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE İLÇELERE VE TÜRLERİNE GÖRE ABONE SAYILARI

Çevre Sulama Aboneleri	Umumi Yerlere Ait Aboneler	Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Aboneler	Diğer (Sözleşmesiz vb.) Aboneler	Kuyu-Atıksu Aboneleri	2015 Yılında Ulaşılan Toplam Abone Sayısı
6897	2534	625	3295	127	242.719
6330	2471	455	742	115	123.948
1844	1736	325	1353	284	110.797
1	20	5	0	-	2.272
216	9	8	0	-	3.275
27	53	41	400	-	44.551
24	122	5	2	-	5.033
375	113	41	6	-	37.836
164	210	30	3	-	14.581
39	57	4	14	-	23.545
-	36	1	-	-	4.106
96	19	44	-	-	22.124
114	3	-	-	-	2.327
326	65	6	-	-	5.504
85	98	-	6	-	9.837
-	29	-	-	-	3.264
57	5	23	5	-	57.001
123	48	14	1	-	4.660
-	10	7	8	-	6.071
21	2	1	-	-	2.632
259	19	6	4	-	10.018
27	93	9	1187	-	25.205
70	9	9	3	-	11.870
186	188	20	8	-	16.933
3	158	9	1	-	22.541
24	27	6	2	-	11.769
116	60	11	2	-	31.680
165	5	5	-	-	3.501
4	22	-	4	-	3.082
-	10	-	-	-	1.031
-	81	8	105	-	11.177
17.593	**8.312**	**1.718**	**7.151**	**526**	**874.890**

31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE % 50 ORANINDA TENZİLAT UYGULANAN ABONELERİN DAĞILIMI

İLÇELER	Engelli Aboneler		Şehit ve Gazi Aboneleri	
	2014 Yılı Toplam Abone Sayısı	2015 Yılı Toplam Abone Sayısı	2014 Yılı Toplam Abone Sayısı	2015 Yılı Toplam Abone Sayısı
SELÇUKLU	3.272	3492	313	334
MERAM	2.017	2130	180	183
KARATAY	1.451	1548	93	93
AHIRLI	9	11	1	1
AKÖREN	8	8	8	9
AKŞEHİR	60	77	85	86
ALTINEKİN	5	12		
BEYŞEHİR	130	174	233	226
BOZKIR	79	97	13	13
CİHANBEYLİ	74	83	10	11
ÇELTİK	15	13		3
ÇUMRA	159	168	15	15
DERBENT	1	1		
DEREBUCAK	6	10	4	4
DOĞANHİSAR	16	16	11	10
EMİRGAZİ	10	16		1
EREĞLİ	403	464	117	121
GÜNEYSINIR	21	26	4	4
HADİM	18	23	3	4
HALKAPINAR	1	4	1	3
HÜYÜK	10	17	5	5
ILGIN	51	64	11	12
KADINHANI	50	59	8	8
KARAPINAR	81	100	13	12
KULU	61	68	13	12
SARAYÖNÜ	55	63	14	15
SEYDİŞEHİR	117	172	42	40
TAŞKENT	7	8		
TUZLUKÇU	7	12	7	8
YALIHÜYÜK	2	2		
YUNAK	9	10		
TOPLAM	**8.205**	**8.948**	**1.204**	**1.233**

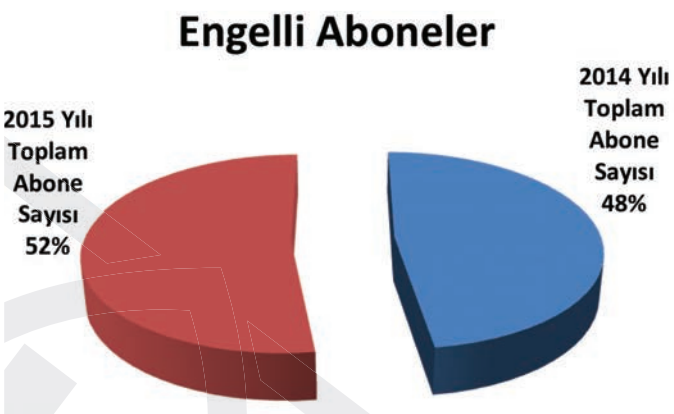



YILLAR İTİBARİYLE VE TÜRLERİNE GÖRE ABONE SAYILARI


ABONE TÜRÜ	2011	2012	2013	2014	2015
Mesken Aboneleri	300.887	312.983	326.482	717.807	728.621
İşyeri Aboneleri	44.066	45.602	47.243	74.291	77.831
Resmi Daire Aboneleri	1.129	1.193	1.253	3.119	5.650
İnşaat Aboneleri	4.936	11.299	16.056	22.331	27.488
Kamu Yar. Faal. Gösteren Aboneler	801	831	951	0	1.718
Çevre Sulama Aboneleri	9.982	11.713	13.135	16.468	17.593
Umumi Yerlere Ait Aboneler	2.503	2.614	2.889	0	8.312
Diğer (Sözleşmesiz vb.)Aboneler	4.905	7.237	9.546	15.818	7.151
TOPLAM ŞEBEKE ABONELERİ	369.209	393.472	417.555	849.834	874.364
Kuyu-Atıksu Aboneleri	553	585	590	534	526
TOPLAM ABONE SAYISI	369.762	394.057	418.145	850.368	874.890

Not: 2014 Yılından İtibaren Abone Sayılarına 6360 Sayılı Kanun Uyarınca Hizmet Alanımıza Dahil Olan İlçe, Belde ve Köy Aboneleri Dahildir.

% 50 ORANINDA TENZİLAT UYGULANAN ABONELERİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI

ABONE TÜRÜ	2011	2012	2013	2014	2015
Engelli Aboneler	3.796	4.576	5.394	8.205	8.948
Şehit ve Gazi Aboneleri	486	516	542	1.204	1.233
TOPLAM ABONE SAYISI	4.282	5.092	5.936	9.409	10.181

Not: 2014 Yılından İtibaren Abone Sayılarına 6360 Sayılı Kanun Uyarınca Hizmet Alanımıza Dahil Olan İlçe, Belde ve Köy Aboneleri Dahildir

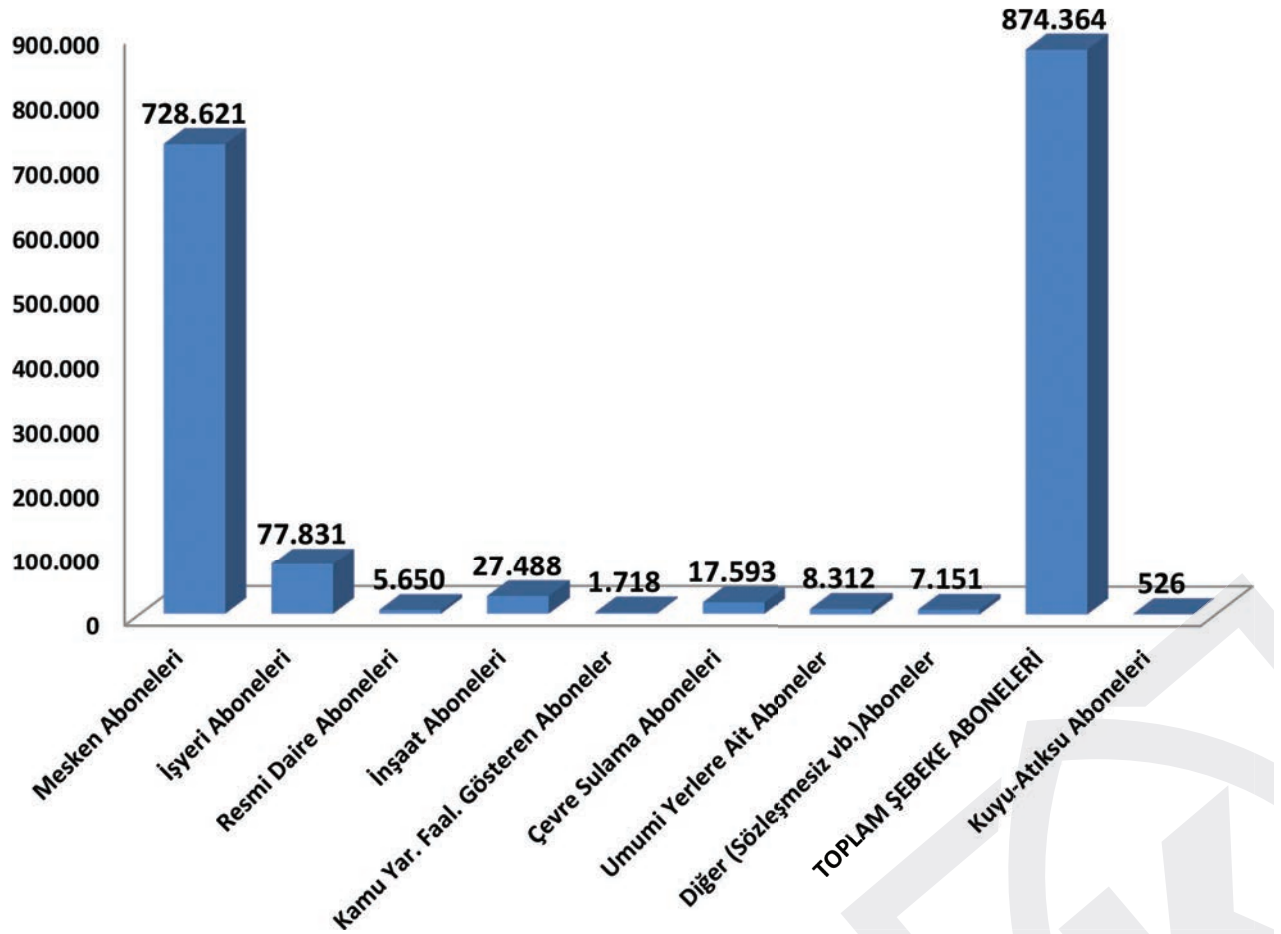

31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE T.C.KİMLİK NO VE İLETİŞİM BİLGİLERİ MEVCUT OLAN ABONE SAYILARI



İLÇELER	TOPLAM ABONE SAYISI	İLETİŞİM ARACI	KAYDI OLAN ABONE SAYISI	TOPLAM ABONE SAYISI İÇİNDEKİ ORANI(%)
MERKEZ İLÇELER	477.464	T.C.KİMLİK NO	376390	78,83%
		CEP TELEFONU	337141	70,61%
		İŞ TELEFONU	60317	12,63%
		EV TELEFONU	140383	29,40%
		E-MAİL	8572	1,80%
DİĞER İLÇELER	397.426	T.C.KİMLİK NO	264753	66,62%
		CEP TELEFONU	114915	28,91%
		İŞ TELEFONU	2360	0,59%
		EV TELEFONU	9237	2,32%
		E-MAİL	576	0,14%
TÜM İLÇELER	874.890	T.C.KİMLİK NO	641.143	73,28%
		CEP TELEFONU	452.056	51,67%
		İŞ TELEFONU	62.677	7,16%
		EV TELEFONU	149.620	17,10%
		E-MAİL	9.148	1,05%

31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE TİP VE MARKALARINA GÖRE ABONELERİMİZDE TAKILI OLAN SU SAYAÇLARININ DAĞILIMI



SAYAÇ TİPİ	ALFAGAS	BAYLAN	CEM	METLAP	TEKSAN	DİĞER	TOPLAM
MEKANİK SU SAYACI	0	323.108	207.885	643	59.944	238.445	830.025
ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI	10.677	9.057	0	1.644	47	1	21.426
VOLÜMETRİK SU SAYACI	0	1.939	0	0	0	0	1.939
PLASTİK SU SAYACI	0	2.359	0	0	0	0	2.359
TOPLAM	10.677	336.463	207.885	2.287	59.991	238.446	855.749

31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE ABONELERİMİZDE TAKILI OLAN SU SAYAÇLARININ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI					
İLÇELER	**MEKANİK SU SAYACI**	**ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI**	**VOLÜMETRİK SU SAYACI**	**PLASTİK SU SAYACI**	**TOPLAM**
SELÇUKLU	227.718	1.729	1.545	1.244	232.236
MERAM	121.124	995	245	520	122.884
KARATAY	103.928	1.004	148	382	105.462
AHIRLI	2.267	0	0	3	2.270
AKÖREN	3.256	0	0	1	3.257
AKŞEHİR	33.855	10.558	0	2	44.415
ALTINEKİN	5.030	0	0	0	5.030
BEYŞEHİR	37.638	1	1	128	37.768
BOZKIR	14.482	0	0	2	14.484
CİHANBEYLİ	23.487	2	0	28	23.517
ÇELTİK	3.880	224	0	0	4.104
ÇUMRA	20.611	1.425	0	11	22.047
DERBENT	2.326	0	0	0	2.326
DEREBUCAK	5.458	1	0	0	5.459
DOĞANHİSAR	9.794	0	0	1	9.795
EMİRGAZİ	3.250	0	0	1	3.251
EREĞLİ	56.856	21	0	3	56.880
GÜNEYSINIR	4.657	0	0	3	4.660
HADİM	6.064	0	0	2	6.066
HALKAPINAR	2.630	0	0	0	2.630
HÜYÜK	10.007	2	0	3	10.012
ILGIN	24.045	1	0	4	24.050
KADINHANI	11.862	1	0	1	11.864
KARAPINAR	16.860	7	0	17	16.884
KULU	19.824	2.665	0	0	22.489
SARAYÖNÜ	11.758	0	0	0	11.758
SEYDİŞEHİR	29.676	1.861	0	3	31.540
TAŞKENT	3.488	8	0	0	3.496
TUZLUKÇU	3.078	0	0	0	3.078
YALIHÜYÜK	1.031	0	0	0	1.031
YUNAK	10.086	920	0	0	11.006
TOPLAM	**830.026**	**21.425**	**1.939**	**2.359**	**855.749**

31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE SAYAÇ TAKMA, SÖKME VE DEĞİŞTİRME SAYILARININ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

İLÇELER	Yeni Takılan Sayaç Adedi	Sökülen Sayaç Adedi	Arıza Vb. Nedenlerle Değiştirilen Sayaç Adedi	Damga Nedeniyle Değiştirilen Sayaç Adedi	Patlak v.b. Nedenlerle Değiştirilen Sayaç Adedi	Fazla Sarfiyattan Dolayı Değiştirilen Sayaç Adedi	Fazla Sarfiyat Nedeniyle İç Tesisat Kontrol ve Su Kaçağı Ölçümü Sayısı	TOPLAM İŞLEM SAYISI
SELÇUKLU	2.071	1.394	1.682	23.402	1.924	382	78	30.933
MERAM	906	585	1.942	7.169	2.002	231	103	12.938
KARATAY	798	804	910	5.665	1.333	218	102	9.830
AHIRLI	7	0	99	0	100	0	4	210
AKÖREN	73	9	635	0	7	4	4	732
AKŞEHİR	952	420	822	0	1.083	53	5	3.335
ALTINEKİN	14	1	280	0	142	14	4	455
BEYŞEHİR	143	104	1.245	0	1.124	22	7	2.645
BOZKIR	74	90	760	294	531	13	4	1.766
CİHANBEYLİ	38	24	647	0	283	13	5	1.010
ÇELTİK	34	3	333	0	107	3	3	483
ÇUMRA	534	33	1.152	0	489	43	4	2.255
DERBENT	1	0	175	0	84	3	11	274
DEREBUCAK	22	3	145	0	271	0	3	444
DOĞANHİSAR	126	14	501	0	348	30	9	1.028
EMİRGAZİ	81	9	439	0	49	22	6	606
EREĞLİ	165	106	1.911	0	480	46	28	2.736
GÜNEYSINIR	38	2	298	3	132	0	4	477
HADİM	66	3	424	0	159	0	3	655
HALKAPINAR	0	0	182	0	40	0	3	225
HÜYÜK	14	5	298	0	671	1	4	993
ILGIN	324	19	1.523	132	767	40	12	2.817
KADINHANI	35	0	602	0	181	1	3	822
KARAPINAR	124	133	2.827	5	330	25	25	3.469
KULU	735	81	2.097	0	430	36	5	3.384
SARAYÖNÜ	75	2	399	0	143	14	4	637
SEYDİŞEHİR	125	118	870	0	995	16	4	2.128
TAŞKENT	4	89	116	0	144	2	3	358
TUZLUKÇU	13	5	82	0	132	13	3	248
YALIHÜYÜK	7	0	50	0	44	1	4	106
YUNAK	261	91	907	0	333	8	6	1.606
TOPLAM	**7.860**	**4.147**	**24.353**	**36.670**	**14.858**	**1.254**	**463**	**89.605**

31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE SAYAÇ TAMİR, TEST VE YERİNDE GİDERİLEN ARIZA İŞLEM SAYILARI

İLÇELER	Yerinde Giderilen Arıza (Cami, Sokak Çeşmesi, wc vb. yerler dâhil) Adedi	Sayaç Yeri Islah Edilen Abone Sayısı	TOPLAM İŞLEM SAYISI
SELÇUKLU	1.171	333	1.504
MERAM	799	285	1.084
KARATAY	765	228	993
AHIRLI	0	0	0
AKÖREN	8	0	8
AKŞEHİR	31	158	189
ALTINEKİN	49	0	49
BEYŞEHİR	61	26	87
BOZKIR	24	24	48
CİHANBEYLİ	19	56	75
ÇELTİK	2	0	2
ÇUMRA	31	176	207
DERBENT	37	0	37
DEREBUCAK	9	0	9
DOĞANHİSAR	40	0	40
EMİRGAZİ	4	9	13
EREĞLİ	25	249	274
GÜNEYSINIR	18	0	18
HADİM	86	1	87
HALKAPINAR	0	0	0
HÜYÜK	59	0	59
ILGIN	169	82	251
KADINHANI	53	172	225
KARAPINAR	25	198	223
KULU	17	36	53
SARAYÖNÜ	11	0	11
SEYDİŞEHİR	50	35	85
TAŞKENT	25	0	25
TUZLUKÇU	6	0	6
YALIHÜYÜK	0	0	0
YUNAK	51	182	233
TOPLAM	**3.645**	**2.240**	**5.885**

İLÇELER	Atölyemizde Tamir Edilen Sayaç Adedi	Sayaç Ayar İstasyonumuzda Teste Tabi Tutulan Sayaç Adedi	TOPLAM İŞLEM SAYISI
MERKEZ VE DİĞER İLÇELER	821	17.408	18.229

31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FAZLA SARFİYAT ŞİKAYET BAŞVURUSU SONUCUNDA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE İNCELENEN SAYAÇLARLA İLGİLİ DÜZENLENEN RAPOR SONUÇLARI


Türkiye Cumhuriyeti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı



İLÇELER	İncelenen Sayaç Adedi	İNCELEME SONUÇLARI	
		Mekanik Hata Görülmedi	Sayaç Numaratörlerine İtimat Edilmez
SELÇUKLU	359	265	91
MERAM	214	160	53
KARATAY	204	155	48
AHIRLI	0	0	0
AKÖREN	2	2	0
AKŞEHİR	15	10	5
ALTINEKİN	10	6	4
BEYŞEHİR	12	11	1
BOZKIR	2	1	1
CİHANBEYLİ	9	6	3
ÇELTİK	1	1	0
ÇUMRA	29	21	8
DERBENT	2	1	1
DEREBUCAK	0	0	0
DOĞANHİSAR	11	9	2
EMİRGAZİ	3	2	1
EREĞLİ	26	15	11
GÜNEYSINIR	0	0	0
HADİM	0	0	0
HALKAPINAR	0	0	0
HÜYÜK	0	0	0
ILGIN	26	16	9
KADINHANI	1	1	0
KARAPINAR	17	12	5
KULU	19	12	7
SARAYÖNÜ	13	11	2
SEYDİŞEHİR	7	6	1
TAŞKENT	0	0	0
TUZLUKÇU	2	1	1
YALIHÜYÜK	0	0	0
YUNAK	1	1	0
TOPLAM	**985**	**725**	**254**

2015 YILI AYLAR İTİBARİYLE SU ÜRETİMİ VE FATURALANDIRMA MİKTARLARI (ŞEHİR MERKEZİ)						
AYLAR	ABONE SAYISI	ÜRETİLEN SU (M^3)	FATURA EDİLEN SU (M^3)	İBADETHANELER (M^3)	TOPLAM TÜKETİLEN SU (M^3)	KAYIP MİKTAR (%)
OCAK	442.387	5.805.331	4.050.270	24.363	4.074.633	29,81
ŞUBAT	443.176	5.248.867	3.486.264	26.206	3.512.470	33,08
MART	444.732	6.032.849	3.784.777	78.773	3.863.550	35,96
NİSAN	446.527	6.306.642	3.951.491	46.986	3.998.477	36,60
MAYIS	447.826	7.453.565	4.440.122	37.042	4.477.164	39,93
HAZİRAN	451.232	7.254.292	5.104.167	60.968	5.165.135	28,80
TEMMUZ	452.204	8.644.718	5.885.965	62.394	5.948.359	31,19
AĞUSTOS	453.921	9.457.722	5.985.023	44.997	6.030.020	36,24
EYLÜL	456.962	8.262.158	6.645.550	78.812	6.724.362	18,61
EKİM	457.327	6.878.256	5.576.207	90.177	5.666.384	17,62
KASIM	458.980	6.385.453	4.480.606	38.965	4.519.571	29,22
ARALIK	461.319	6.121.320	5.135.598	124.460	5.260.058	14,07
TOPLAM		83.851.173	58.526.040	714.143	59.240.183	29,35

6360 sayılı kanunla merkez ilçelere bağlanan mahallelerde üretilen ve fatura edilen m^3 miktarları yukarıdaki tabloda dahil edilmemiştir.

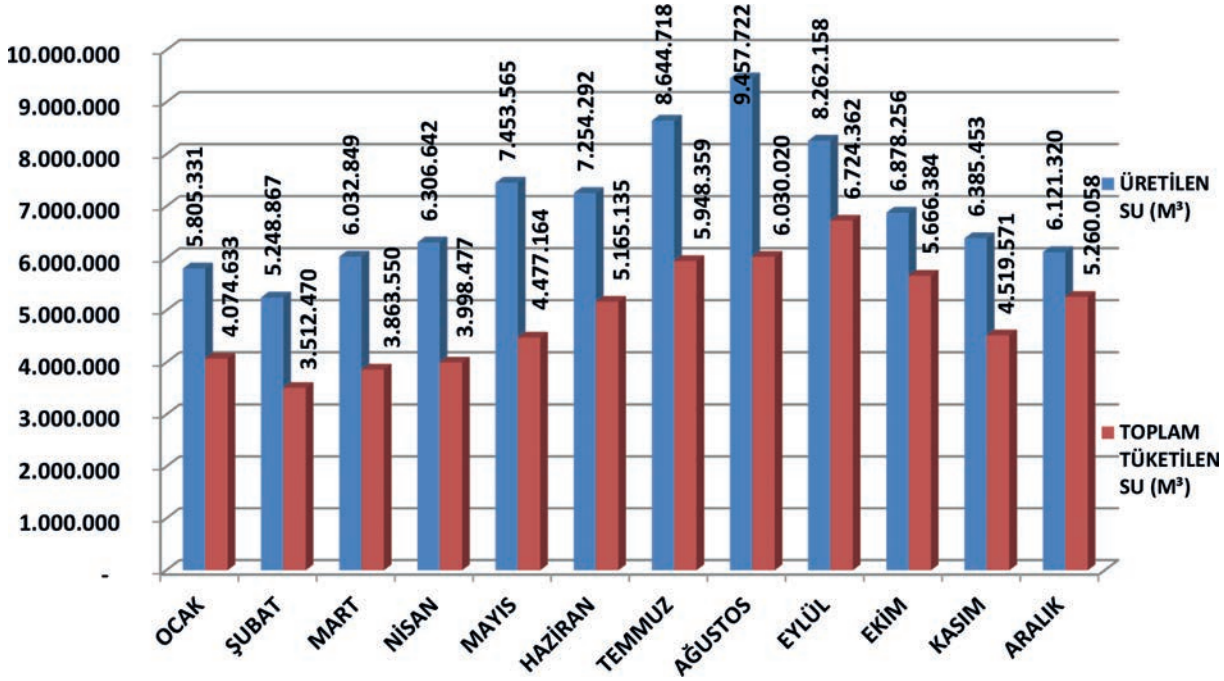


YILLAR İTİBARİYLE SU ÜRETİMİ VE FATURALANDIRMA MİKTARLARI (ŞEHİR MERKEZİ)						
AYLAR	ABONE SAYISI	ÜRETİLEN SU (M^3)	FATURA EDİLEN SU (M^3)	FATURA EDİLMEYEN SU (M^3)	TOPLAM TÜKETİLEN SU (M^3)	KAYIP MİKTAR (%)
2011	369.209	68.616.224	48.932.583	508.095	49.440.678	27,95
2012	393.472	74.791.838	52.493.964	751.972	53.245.936	28,81
2013	417.555	77.181.008	54.370.458	853.277	55.223.735	28,45
2014	441.251	78.598.071	57.719.318	669.040	58.388.358	25,71
2015	461.319	83.851.173	58.526.040	714.143	59.240.183	29,35

2015 YILI AYLAR İTİBARİYLE SU ÜRETİMİ VE FATURALANDIRMA MİKTARLARI (ŞEHİR MERKEZİ)

İLÇELER	ÇALIŞILAN ABONE SAYISI	TAHAKKUK YAPILAN ABONE SAYISI	TAHAKKUK YÜZDESİ (%)
SELÇUKLU	2.642.079	2.386.974	90,34%
MERAM	1.320.917	1.129.088	85,48%
KARATAY	1.153.205	1.014.155	87,94%
MERKEZ TOPLAM	5.116.201	4.530.217	88,55%
AHIRLI	8.657	6.428	74,25%
AKÖREN	26.334	15.228	57,83%
AKŞEHİR	384.438	215.905	56,16%
ALTINEKİN	23.727	17.066	71,93%
BEYŞEHİR	247.875	196.279	79,18%
BOZKIR	81.552	54.476	66,80%
CİHANBEYLİ	94.999	73.615	77,49%
ÇELTİK	26.780	20.275	75,71%
ÇUMRA	141.860	118.850	83,78%
DERBENT	16.221	12.913	79,61%
DEREBUCAK	24.413	14.401	58,99%
DOĞANHİSAR	59.730	43.033	72,05%
EMİRGAZİ	24.346	18.590	76,36%
EREĞLİ	440.056	377.419	85,77%
GÜNEYSINIR	28.412	19.402	68,29%
HADİM	26.943	20.595	76,44%
HALKAPINAR	9.756	6.828	69,99%
HÜYÜK	48.407	29.855	61,67%
ILGIN	175.705	144.969	82,51%
KADINHANI	76.379	53.682	70,28%
KARAPINAR	153.743	120.833	78,59%
KULU	127.138	66.081	51,98%
SARAYÖNÜ	58.614	40.455	69,02%
SEYDİŞEHİR	229.576	169.589	73,87%
TAŞKENT	16.158	12.177	75,36%
TUZLUKÇU	19.861	13.495	67,95%
YALIHÜYÜK	9.053	5.130	56,67%
YUNAK	55.508	34.031	61,31%
BELDE TOPLAM	2.636.241	1.921.600	72,89%
GENEL TOPLAM	7.752.442	6.451.817	83,22%


NOT: Sayaç okuma hizmetleri,Şehir Merkezinde ve İlçelerde 1 aylık, Beldelerde 3 aylık, Köylerde ise 5 aylık dönemler halinde gerçekleşmiştir.

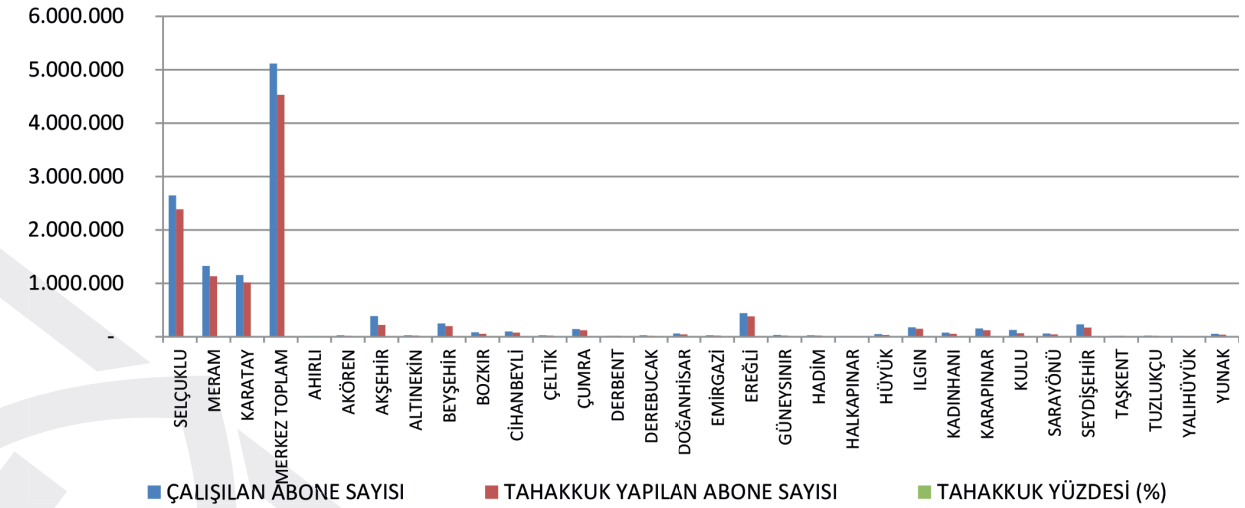

2015 YILI AYLAR İTİBARİYLE SU TÜKETİMİ VE ATIKSU MİKTARLARI (M³) (MERKEZ)


İLÇELER	SU M³	ATIKSU M³
OCAK	4.324.747	4.269.626
ŞUBAT	3.605.943	3.649.054
MART	4.048.216	3.650.322
NİSAN	4.235.248	3.996.178
MAYIS	4.810.572	4.254.174
HAZİRAN	5.358.765	4.192.441
TEMMUZ	6.200.792	4.821.103
AĞUSTOS	6.426.889	5.042.773
EYLÜL	7.110.873	4.632.975
EKİM	6.089.911	4.493.072
KASIM	4.815.994	4.138.937
ARALIK	5.471.489	4.266.493
	62.499.439	51.407.148

6360 sayılı kanunla merkez ilçelere bağlanan mahallelerde üretilen ve fatura edilen m³ miktarları yukarıdaki tabloda dahildir.

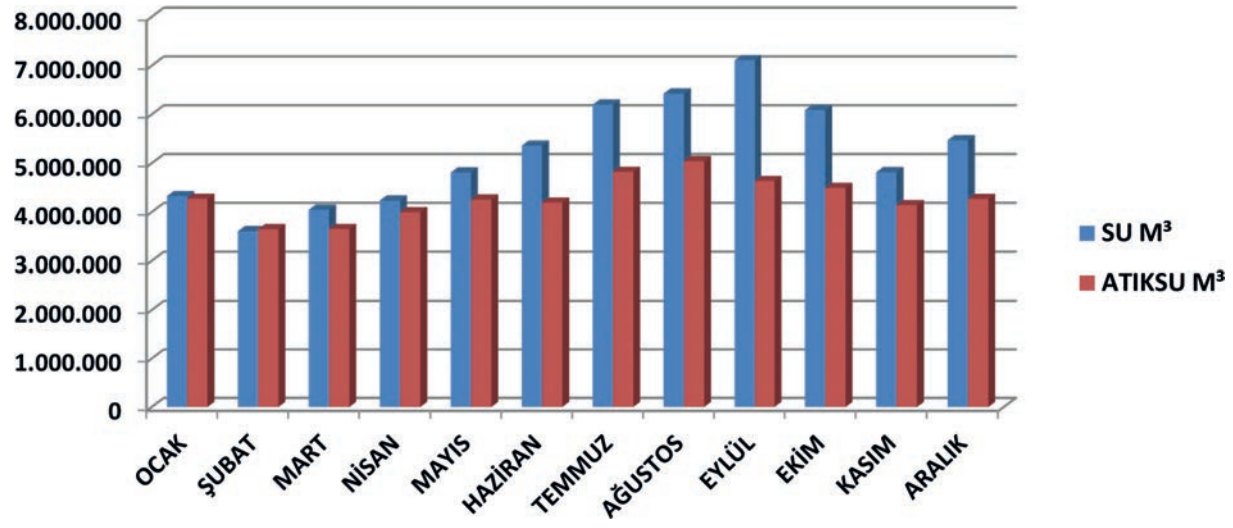


YILLLAR İTİBARİYLE SU TÜKETİMİ VE ATIKSU MİKTARLARI (M³)

	SU M³	ATIKSU M³
2014	58.656.008	48.660.998
2015	62.499.439	51.407.148

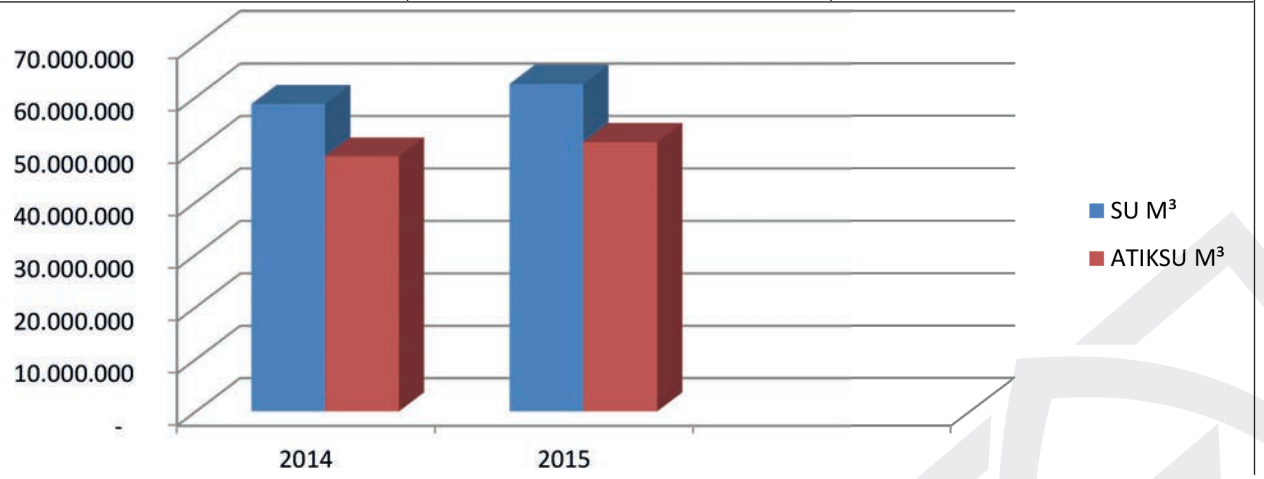


2015 YILI AYLAR İTİBARİYLE SU TÜKETİMİ VE ATIKSU MİKTARLARI (M³) (BÖLGELER)

	SU M³	ATIKSU M³
OCAK	2.951.029	2.340.496
ŞUBAT	2.721.033	1.827.798
MART	3.438.815	2.142.710
NİSAN	3.248.845	2.261.696
MAYIS	3.130.482	2.249.925
HAZİRAN	3.437.983	2.472.324
TEMMUZ	4.236.196	2.875.493
AĞUSTOS	5.560.907	3.386.082
EYLÜL	4.519.535	2.882.159
EKİM	4.517.693	3.224.556
KASIM	4.447.207	2.796.087
ARALIK	3.394.553	2.161.465
	45.604.278	30.620.791

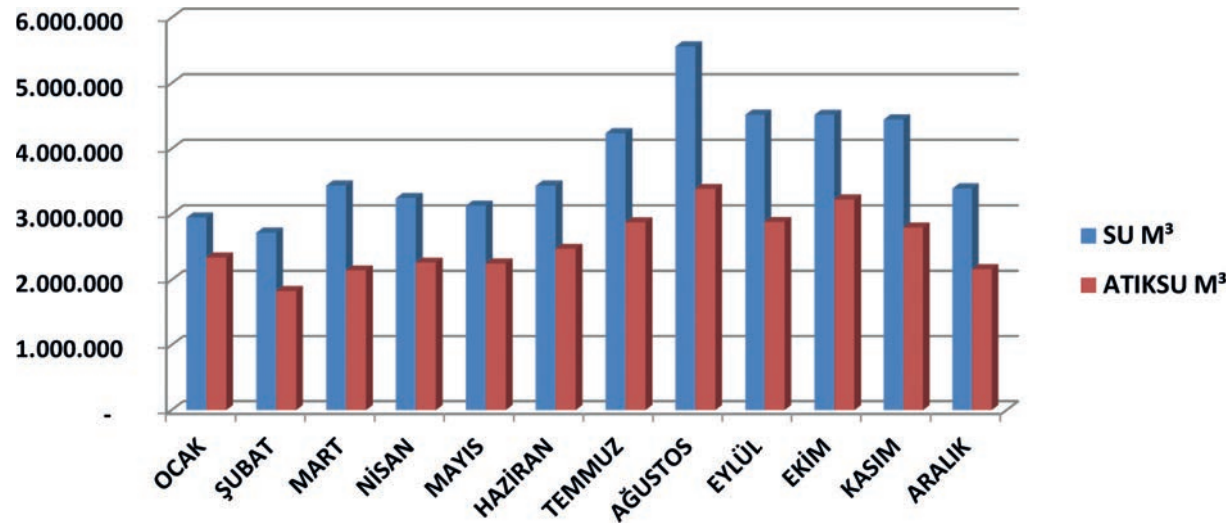

YILLLAR İTİBARİYLE SU TÜKETİMİ VE ATIKSU MİKTARLARI (M³)


	SU M³	ATIKSU M³
2014	37.412.363	25.120.366
2015	45.604.278	30.620.791

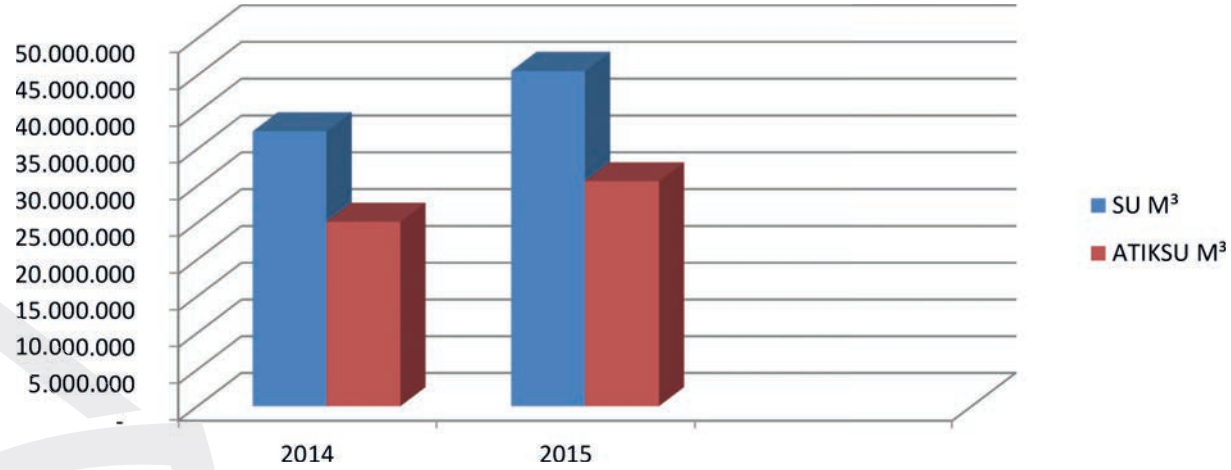


31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE TAHAKKUK - TAHSİLAT MİKTARLARI VE TAHSİLAT YÜZDELERİ

	ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVİR ALINAN BAKAYA (TL))	DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN TAHAKKUK (TL)	TOPLAM TAHAKKUK (TL) (Bakaya + Dönem Tahakkuku)	TOPLAM TAHSİLAT (TL)	BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN BAKAYA	TAHSİLAT YÜZDESİ (%)
2011	13.726.033,38	115.642.573,04	129.368.606,42	118.778.987,74	10.581.696,63	91,81 %
2012	10.581.696,63	135.695.511,34	146.277.207,97	132.527.538,51	13.749.669,46	90,60 %
2013	13.749.669,46	149.001.018,51	162.750.687,97	148.945.425,58	13.805.262,39	91,52 %
2014	45.047.761,35	212.738.937,55	257.786.698,90	200.961.633,93	56.825.064,97	77,96 %
2015	51.738.100,40	256.233.168,16	307.971.268,56	253.571.836,43	54.926.367,85	82,34 %

Not: 1- 31.03.2014 tarihinden itibaren,6360 sayılı Kanun'la hizmet alanımıza dahil olan İlçe, Belde ve Köylerin tahakkuk ve tahsilat miktarları dahil edilmiştir.
2- Fiyatlara KDV ve ÇTV Dahildir

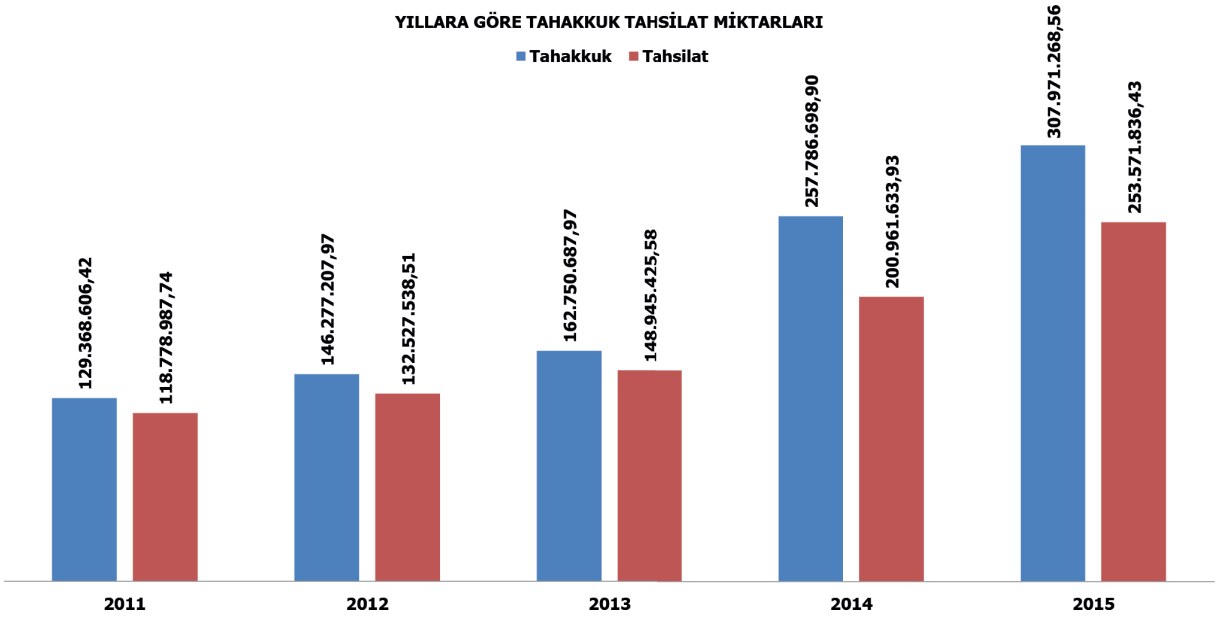

YILLARA GÖRE TAHAKKUK TAHSİLAT MİKTARLARI

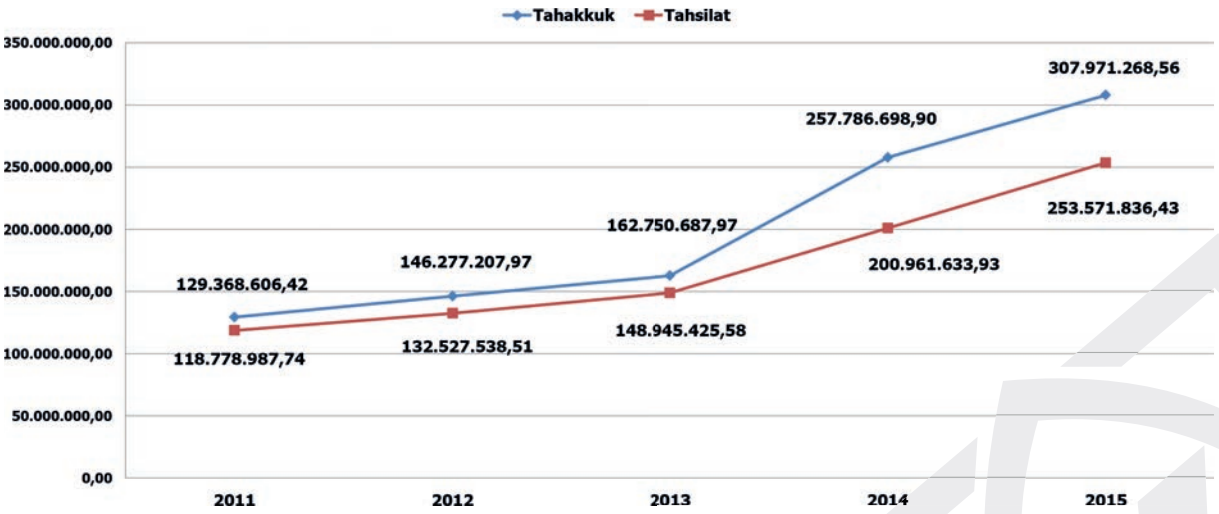

2015 YILI ARALIK AYI ÇAĞRI MERKEZİ BİRİM FAALİYET RAPORU

	ÇAĞRI BİLGİLERİ	ÇAĞRI DETAYI			
GÜNLER	GELEN ARAMA	SU ARIZA	KANAL ARIZA	SAYAÇ İŞLEMLERİ	MÜŞTERİ HİZM.
01.12.2015	668	107	112	35	414
02.12.2015	804	123	108	54	519
03.12.2015	884	139	96	40	609
04.12.2015	793	165	101	38	489
05.12.2015	518	119	73	34	292
06.12.2015	1010	174	50	42	744
07.12.2015	1026	199	136	108	583
08.12.2015	884	181	113	62	528
09.12.2015	736	128	93	44	471
10.12.2015	801	153	107	55	486
11.12.2015	791	135	91	39	526
12.12.2015	549	105	70	38	336
13.12.2015	557	85	71	17	384
14.12.2015	1187	174	140	48	825
15.12.2015	866	113	90	54	609
16.12.2015	738	141	88	50	459
17.12.2015	849	108	75	53	613
18.12.2015	708	117	116	47	428
19.12.2015	491	99	66	36	290
20.12.2015	408	81	71	11	245
21.12.2015	768	118	133	61	456
22.12.2015	621	89	104	39	389
23.12.2015	630	103	103	36	388
24.12.2015	631	108	84	42	397
25.12.2015	733	110	95	42	486
26.12.2015	602	95	82	25	400
27.12.2015	524	105	81	17	321
28.12.2015	805	127	107	57	514
29.12.2015	806	131	107	44	524
30.12.2015	667	80	89	28	470
31.12.2015	889	149	88	77	575
TOPLAM	**22.944**	**3.861**	**2.940**	**1.373**	**14.770**
GENEL TOPLAM	**22.944**	**22.944**			



2015 YILI ÇAĞRI MERKEZİ BİRİM FAALİYET RAPORU

	ÇAĞRI BİLGİLERİ	ÇAĞRI DETAYI			
GÜNLER	GELEN ARAMA	SU ARIZA	KANAL ARIZA	SAYAÇ İŞLEMLERİ	MÜŞTERİ HİZM.
OCAK	27274	4462	2560	1889	18363
ŞUBAT	30796	2533	2304	1638	24321
MART	24393	2843	2937	1704	16909
NİSAN	29794	3715	2749	1608	21722
MAYIS	30926	4545	4000	1475	20906
HAZİRAN	29309	4590	4411	1264	19044
TEMMUZ	37080	6620	3765	1272	25423
AĞUSTOS	37459	6687	3726	1351	25695
EYLÜL	32988	5664	3273	1150	22901
EKİM	29053	4889	3548	1049	19567
KASIM	26289	4048	2998	942	18301
ARALIK	22944	3861	2940	1373	14770
TOPLAM	**358.305**	**54.457**	**39.211**	**16.715**	**247.922**
G.TOPLAM	**358.305**	**358.305**			




DİĞER FAALİYETLERİMİZ

AYLAR	WEB YÖNETİM PANELİNE VERİLEN CEVAP SAYISI	CANLI DESTEK SERVERLE VERİLEN CEVAP SAYISI	TOPLAM
OCAK	80	17	97
ŞUBAT	102	23	125
MART	68	24	92
NİSAN	65	36	101
MAYIS	112	23	135
HAZİRAN	69	30	99
TEMMUZ	51	28	79
AĞUSTOS	80	20	100
EYLÜL	60	24	84
EKİM	102	23	125
KASIM	55	14	69
ARALIK	61	15	76
TOPLAM	905	277	1182


BÖLGE BAZINDA KENDİ EKİPLERİMİZCE YAPILAN YAPIM İŞLERİ (2015 YILI)

Bölge	Müdürlük	Su Yapım (Mt)	Kanal Yapım (Mt)
1	Yunak	13.228	655
2	Kulu	2.800	10.300
3	Cihanbeyli	41.525	2.355
4	Kadınhanı	8.859	881
5	Ilgın	19.201	11.336
6	Akşehir	23.930	3.240
7	Beyşehir	41.412	23.101
8	Seydişehir	5.602	2.121
9	Bozkır	17.031	3.642
10	Çumra	24.885	4.318
11	Karapınar	7.458	250
12	Ereğli	22.682	6.072
Genel Toplam		**228.613**	**68.271**


KENDİ EKİPLERİMİZCE YAPILAN SU YAPIM İŞLERİ

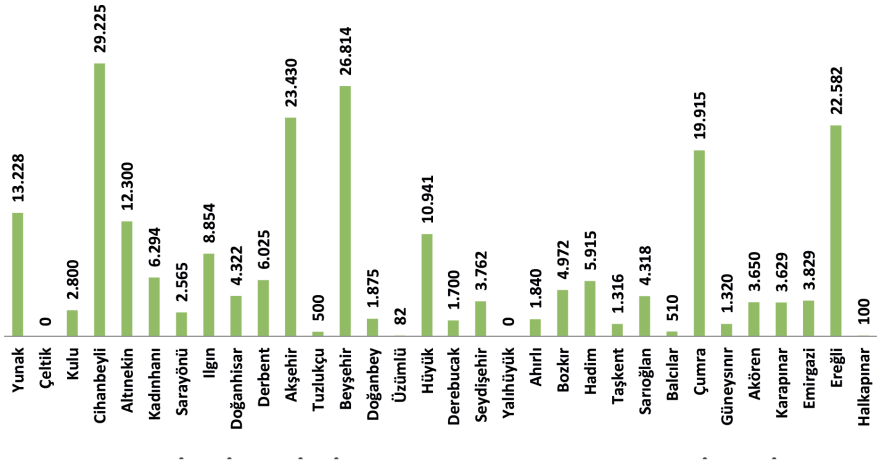

KENDİ EKİPLERİMİZCE YAPILAN KANAL YAPIM İŞLERİ

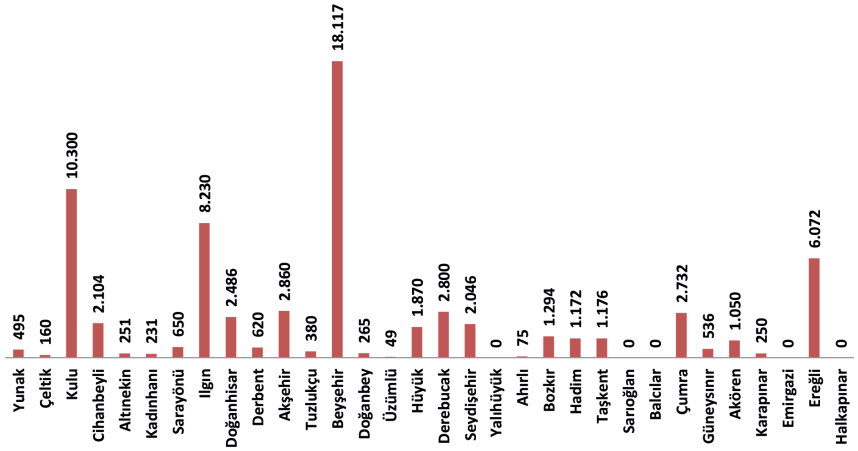


BÖLGE BAZINDA KENDİ EKİPLERİMİZCE YAPILAN İŞLER

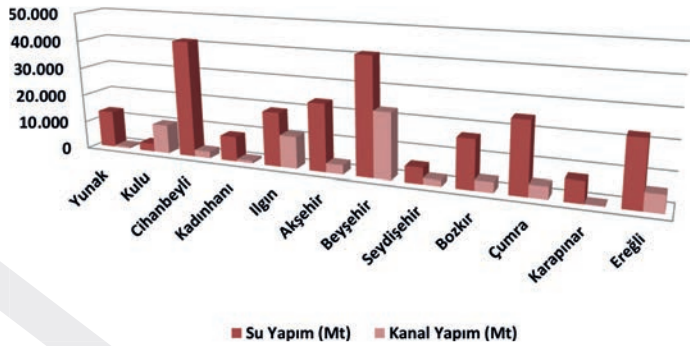


2015 YILI BÖLGELERE GÖRE YILLIK BAZDA SU/KANAL ARIZA RAPORLARI													
ARIZA CİNSİ	Yunak	Kulu	Cihanbeyli	Kadınhanı	Ilgın	Akşehir	Beyşehir	Seydişehir	Bozkır	Çumra	Karapınar	Ereğli	Yıllık Toplam
ŞEBEKE	592	802	920	603	696	455	1.352	703	1.245	916	1.640	1.750	11.674
TATLI SU ŞEBEKE ARIZALARI	0	2	0	6	3	15	72	0	44	14	2	0	158
ABONE ŞUBE YOLU	1.197	1.218	1.231	617	1.550	1.048	2.131	986	751	1.436	23	17	12.205
PARK, YEŞİL ALAN, HİDRANT, VB.	16	4	6	24	91	39	79	114	77	25	18	7	500
TATLI SU ÇEŞMESİ	6	6	5	3	14	14	70	1	33	11	9	8	180
SU AKMIYOR,AZ AKIYOR. HAV.BUL.AKIYOR	16	6	164	90	179	41	49	322	181	92	94	202	1.436
ASILSIZ,YANLIŞ İHBAR VE DİĞER ÇALIŞMALAR	93	2	877	156	186	138	122	40	355	42	86	109	2.206
TOPLAM	1.920	2.040	3.203	1.499	2.719	1.750	3.875	2.166	2.686	2.536	1.872	2.093	28.359


Bölge Bazında Su Arıza Raporları(2015 Yılı)

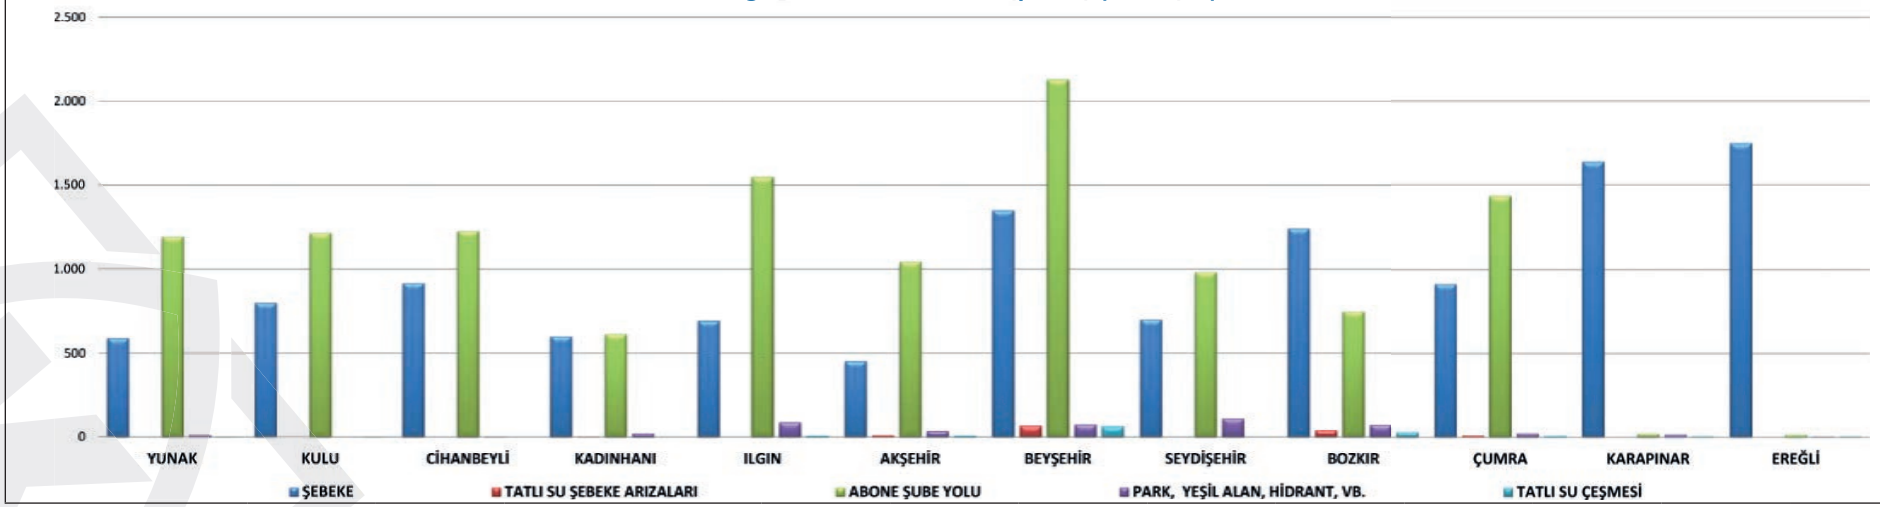

2015 YILI BÖLGELERE GÖRE YILLIK BAZDA SU/KANAL ARIZA RAPORLARI													
YAPIM VE ISLAH ÇALIŞMALARI VB.	YUNAK	KULU	CİHAN-BEYLİ	KADINHANI	ILGIN	AKŞEHİR	BEYŞEHİR	SEYDİŞEHİR	BOZKIR	ÇUMRA	KARAPI-NAR	EREĞLİ	YILLIK TOP-LAM
YAPIM	1	12	175	30	65	11	424	58	120	78	37	43	1.054
ABONE ŞUBE YOLU ÇALIŞMALARI	19	319	111	512	360	200	1.926	566	226	807	137	112	5.295
TOPLAM	20	331	286	542	425	211	2.350	624	346	885	174	155	6.349

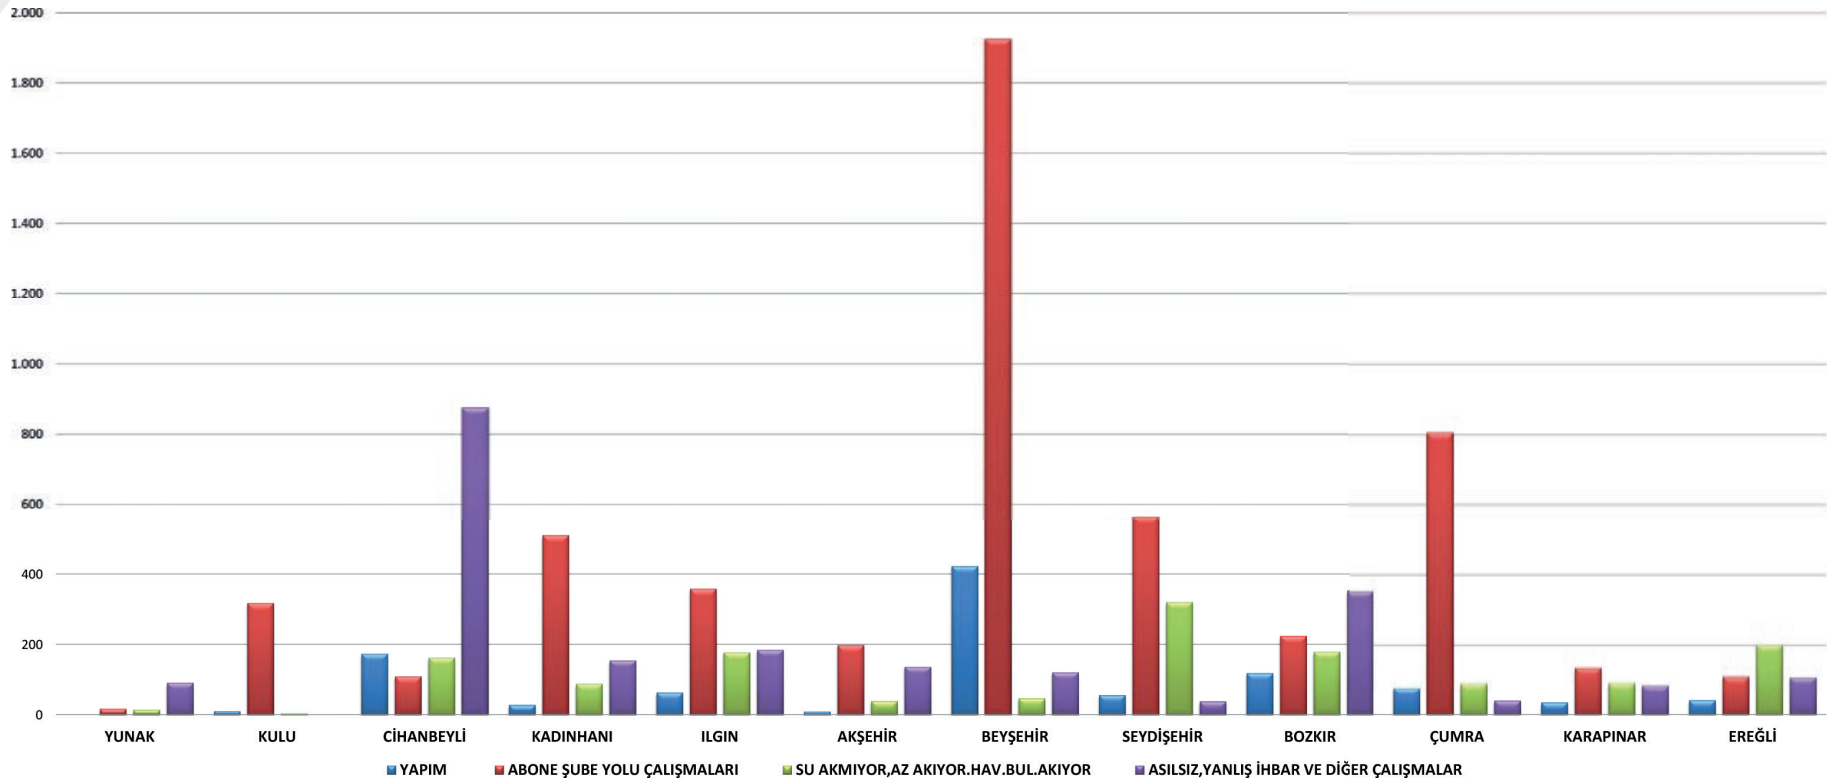

2015 YILI BÖLGELERE GÖRE YILLIK BAZDA SU/KANAL ARIZA RAPORLARI													
KANALİZASYON	Yunak	Kulu	Cihanbeyli	Kadınhanı	Ilgın	Akşehir	Beyşehir	Seydişehir	Bozkır	Çumra	Karapınar	Ereğli	Yıllık Toplam
KANAL ŞEBEKE	72	24	257	401	660	844	743	337	265	338	214	1.678	5.833
KANAL ABONE	91	607	411	218	2.690	226	920	1.796	168	286	135	90	7.638
KUYU ELEKTRİK ÇALIŞMALARI	294	874	1.352	243	1.218	115	363	703	664	1.391	2.222	17	9.456
TOPLAM	457	1.505	2.020	862	4.568	1.185	2.026	2.836	1.097	2.015	2.571	1.785	22.927

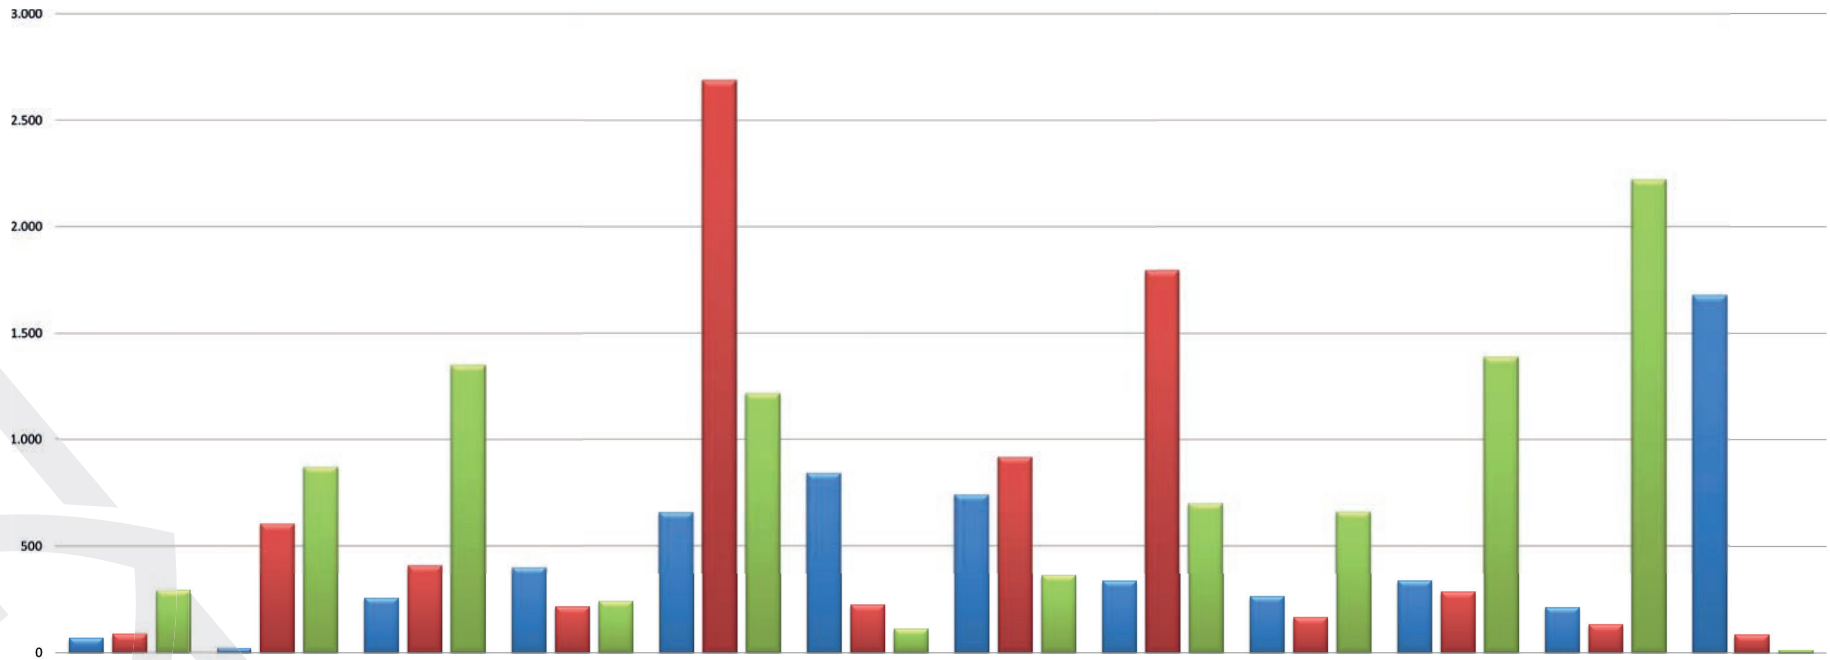



DESTEK HİZMETLERİ

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MALZEME İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ DURUMU	TAKIM TEZGAH DURUMU	BİLGİSAYAR DONANIMI
124 Adet İş Makinası	1 Adet Gaz altı kaynak makinası	4 Adet Laptop
67 Adet Donanımlı Araç	2 Adet Jeneratörlü kaynak makinası	54 Adet Masaüstü bilgisayar
77 Adet Kamyon	3 Adet Trafolu kaynak makinası	25 Adet Yazıcı
50 Adet Ekip Aracı	2 Adet Hava kompresörü	6 Adet Fotokopi makinesi
47 Adet Binek Araç	2 Adet Oksijen kaynak makinası	1 Adet Faks makinesi
24 Adet Seyyar Kompresör	1 Adet Torna tezgahı	61 Adet Telefon makinesi
14 Adet Seyyar kanal temizleme ekipmanı	1 Adet 80 tonluk hidrolik pres	2 Adet Cep telefonu
	1 Adet Kollu matkap tezgahı	1 Adet Baskı makinası
14 adet Motosiklet	1 Adet Demir testeresi	1 Adet Akaryakıt takip otomasyon sistemi
4 Adet Forklift	3 Adet Zımpara ve taşlama makinası	
2 Adet Transpalet		1 Adet Araç takip sistemi,
2 Adet Otobüs	1 Adet Akü şarj cihazı	3 Adet Barkot okuma sistemi.
7 Adet Tır Dorsesi	3 Adet Araç yıkama makinası	
2 Adet Remorklu Tatlı Su Tankeri	2 Adet Havalı gres pompası	
	1 Adet 5 tonluk gezer vinç	
	1 Adet 3 tonluk gezer vinç	
	3 Adet Akaryakıt pompası	
	3 Adet 40 tonluk motorin gömme tankı	
	1 Adet 15 tonluk motorin gömme tankı	
	2 Adet 10 tonluk benzin gömme tankı	
	2 Adet Akaryakıt istasyonu	
	3 Adet Zemin temizleme makinası	
	7 Adet Endüstriyel bulaşık yıkama makinası	
	2 Adet Bulaşık makinası	
	5 Adet Ecolap temizlik makinası	
	5 Adet Çay kazanı	
	3 Adet Ayakkabı cila makinası	
	4 Adet Türk kahve makinası	
	6 Adet Dikey meşrubat soğutucu	
	13 Adet 80 lt su sebili	
	1 Adet 3 tonluk elektronik kantar	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN İHALELER

Bölge	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ
1	ÇUMRA TAHTALI MAH. PAKET ARITMA İŞİ	137.500,00 TL
2	AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI	307.049,70 TL
3	KOLON BORU ALIMI	730.000,00 TL
4	DALĞIÇ POMPA ALIMI	374.775,00 TL
5	YAĞMUR SUYU ROGARLARI VE BAĞLANTI HAT. TEM YAP.	724.500,00 TL
6	ARAÇ KİRALAMA	951.970,00 TL
7	POMPA MONTAJ DEMONTAJ MOTOR SARIMI VE BORU İLAVESİ İŞİ	316.820,00 TL
8	KANALİZASYON ŞEBEKE TEM. VE KAYIP BACALARIN YÜK. İŞİ	542.950,00 TL
9	ÇEVRE DÜZENLEME FİDAN DİKİMİ	486.661,40 TL
10	DALĞIÇ POMPA ALIMI	530.124,00 TL
11	METAL ÜRÜNLERİ ALIMI	2.793.010,00 TL
12	KAUÇUK MLZ. ALIMI	4.033.866,18 TL
13	KOMBİNE KANAL TEM. ARAÇI ALIMI	3.075.000,00 TL
14	SFERO RÖGAR KAPAĞI ALIMI	2.490.000,00 TL
15	FREKANS KONVERTÖRÜ VE SORF STARTEL ALIMI	435.000,00 TL
16	POMPA DEMONTAJ VE MONTAJI VE BORU SARIMI, İLAVESİ	370.400,00 TL
17	RÖGAR KAPAĞI ALIMI	87.250,00 TL
18	OG AG ELEK.PROJESİ ÇİZİMİ	77.400,00 TL
19	SFORO DÖKÜM PRİZ KOLYE	487.054,75 TL
20	PAKET HİDROFOR ALIMI	268.555,00 TL
21	MOTORİN ALIMI	1.798.790,00 TL
22	RÖGAR KAPAĞI ALIMI (21-F)	166.950,00 TL
23	JENARATÖR ALIMI	1.842.000,00 TL
24	PVC PİS SU VE EK PARÇ ALIMI	237.063,50 TL
25	KUYU VE KLOR KABİNİ ALIMI	569.400,00 TL
26	DEBİMETRE VE SENSÖR ALIMI	2.647.000,00 TL
27	ARAÇ ÜSTÜ KAPALI KASA ALIMI	289.800,00 TL
28	KOMBİNE KANAL TEM. ARAÇI ALIMI 7 ADET	2.009.000,00 TL
29	SÜRGÜLÜ VANA VE ÇEKVALF ALIMI	440.500,00 TL
30	ELEKTRİK KABLOSU ALIMI	944.040,00 TL
31	ALT TEMEL DOLGU MLZ. ALIMI	645.187,00 TL
32	BETON BORU VE BACA ELEMANLARI ALIMI	641.825,00 TL
33	GÜNEŞ PANELİ SATIN ALINMASI	468.900,00 TL
34	SU SAYACI ALIMI	2.765.700,00 TL
35	AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI	6.871.521,03 TL
36	KORUGE BORU ALIMI	156.208,00 TL
37	ARAÇ VE İŞ MAK. SİGORTALANMASI İŞİ	126.160,00 TL
38	KORUGE BORU ALIMI	1.230.465,00 TL
39	AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI	138.849,40 TL
40	SODYUM HİPOKLORİD ALIMI	640.000,00 TL
41	ARAÇ KİRALANA	3.370.657,00 TL
42	SAYAÇ SÖKME TAKMA VE ENDEKS OKUMA	2.400.073,00 TL
43	ARAÇ KİRALAMA 21-B	282.930,00 TL
44	ARAÇ KİRALAMA 323 ARAÇ	14.437.379,00 TL
	TOPLAM	**64.340.283,96 TL**

DOĞRUDAN TEMİNLE ALINANLAR

Bölge	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ
1	MAL ALIMI	10.359.503,58 TL
2	HİZMET ALIMI	9.573.969,90 TL
3	TOPLAM	19.933.473,48 TL

AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ





	GİRİŞ	ÇIKIŞ
1- 1 NOLU YEDEK PARÇA AMBARI	14.242.370,67 TL	13.876.515,20 TL
2- 2 NOLU KUYU AMBARI	7.732.064,23 TL	5.878.540,64 TL
3- 3 NOLU SU AMBARI	24.147.430,35 TL	21.643.226,44 TL
4- 4 NOLU SU AMBARI	4.562.035,31 TL	3.539.356,62 TL
5- 5 NOLU DEMİRBAŞ AMBARI	13.338.261,07 TL	149.337,00 TL
6- 10 NOLU AMBAR	117.978,96 TL	2.548.748,95 TL
TOPLAM	**64.140.140,59 TL**	**47.635.724,85 TL**

HURDA AMBARI

PİK HURDASI	233.980 KG
DEMİR VE SAC HURDASI	113.180 KG
ALÜMİNYUM HURDASI	649 KG
LASTİK HURDASI	6.786 KG
KURSUN HURDASI	288 KG
PLASTİK PVC HURDASI	16.497 KG
ELEKTRİK MOTOR HURDASI	45.409 KG

ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ





ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER

- BAŞŞOFÖRLÜK
- ATÖLYE VE TAMİRHANE

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI

ARACIN CİNSİ	TOPLAM (ADET)
KAMYON	77
KAMYONET (EKİP ARACI)	50
TAKSİ – PİKAP-MİNİBÜS	47
DONANIMLI ARAÇLAR	67
İŞ MAKİNALARI	124
SEYYAR HAVA KOMPRESÖRÜ	24
SEYYAR KANAL TEMİZLEME EKİPMANI	14
MOTOSİKLET	14
DORSE-REMORK	9
OTOBÜS	2
FORKLİFT	4
TRANSPALET	2
GENEL TOPLAM	**434**

DEVLET MALZEME OFİSİNDEN YAPILAN ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI ALIMLARI

İŞİN ADI	MİKTARI	ALIŞ BEDELİ
BEKOLODER İŞ MAKİNASI ALIMI	10 ADET	1.846.164,96 TL
FORKLİFT ALIMI	1 ADET	70.687,00 TL
ŞASE KAMYON ALIMI	7 ADET	695.822,40 TL
DAMPERLİ KAMYON ALIMI	5 ADET	803.742,37 TL
KAMYONET ALIMI	2 ADET	146.548,54 TL
LOWBED TIR DORSESİ ALIMI	1 ADET	81.650,10 TL
TOPLAM	**26 ADET**	**3.644.615,37 TL**













İHALE İLE SATIN ALINAN ARAÇLAR

İŞİN ADI	MİKTARI	ALIŞ BEDELİ
KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI ALIMI	3 ADET	3.075.000,00 TL
MİNİ KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI ALIMI	13 ADET	3.910.820,00 TL
ÇEKİLEBİLİR TİP KANAL TEMİZLEME EKİPMANI	14 ADET	835.094,26
TOPLAM	30 ADET	7.820.914,26 TL









Yeni alınan şase kamyonlar üzerine su ve kanal arıza ekipleri için yeni dizayn edilmiş kasa yaptırıldı.

6 adet su arıza ve kanal arıza ekip aracı işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından kasa montaj edilmiş ve teknolojinin yeniliklerinden faydalanılmıştır.









Su depo temizleme ve dezenfeksiyon aracı yaptırıldı.





Tatlısu dağıtım hizmetleri verilmektedir.

- KAYACIK
- AŞAĞIPINARBAŞI
- YUKARIPINARBAŞI
- TÖMEK
- SAKYATAN
- BÜYÜKHAŞLAMA
- KÜÇÜKHAŞLAMA

Mahallelerimize tatlısu dağıtımı yapılmıştır



ATÖLYE VE TAMİRHANE BÖLÜMÜ

- Genel Müdürlüğümüze ait tüm hizmet araçları ve iş makinelerinin tamirlerini en kısa zamanda gidermek, periyodik bakımlarını yapmak ve bütün araçlarımızı faal ve hizmette tutmaktır. Atölye ve Tamirhanemizde 17 personel ile hizmet verilmektedir.
- Motor Postası
- Oto elektrik Postası
- Fren Postası
- Yıkama-Yağlama Postası
- Demirhane atölyesi olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.









MOTOR POSTASINDA


2015 yılı içersinde 1545 adet araç ve iş makinasının motor, şanzuman, difransiyel ve hidrolik sistemleri arızasına müdahele edilerek arızalar giderilmiştir. Araç ve iş makinalarımız faal halde tutulmuştur.





OTO ELEKTRİK POSTASINDA

2015 yılında 1352 adet araç ve iş makinasının oto elektrik arızasına müdahale edilmiş ve faal duruma getirilmiştir.

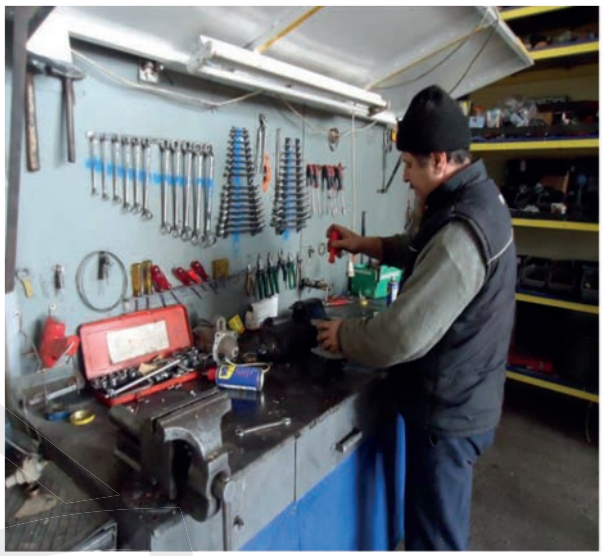



FREN POSTASINDA


2015 yılı içerisine 767adet araç ve iş makinalarımızın fren arızası giderilmiştir.





YIKAMA YAĞLAMA POSTASINDA

2015 yılı içerisinde 499 adet araç ve iş makinalarımızın periyodik bakımı yıkama ve yağlaması yapılmıştır.

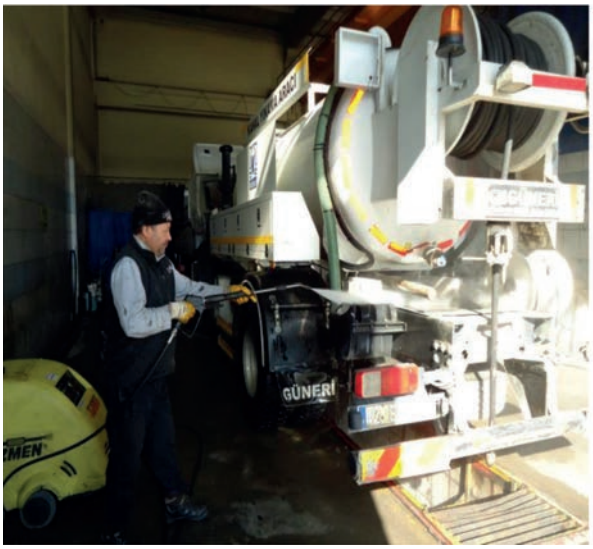



DEMİRHANE ATÖLYESİ

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde araç iş makinesi, çelik boru ve tesislerde bulunan tüm demir aksamının onarımı, tamirlerinin giderilmesi ve kaynak işleri demirhane atölyemiz tarafından yapılmaktadır. 2015 yılında 1145 adet demir işleri arızası ve kaynak işleri yapılmıştır.







DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ





- Genel Müdürlük Hizmet binalarımızın temizliği, bakımı, bina içerisine giren çıkan tüm kişi ve eşyaların takibi ile, eşyaların taşınması, yerleştirilmesi, temizlikte kullanılan malzemelerin temini sağlanmıştır.
- 6360 sayılı kanun ile Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan 12 şube 2015 yılı temizlik malzemesi ve ihtiyaçları tespit edilip ihale edilerek şubelere dağıtımı sağlanmıştır.
- Hizmet binamızda bulunan Berberhanenin takibi yapılmıştır.
- Danışma hizmetleri sağlanmıştır.
- KOSKİ genel müdürlüğüne ait hizmet binaları ve tüm tesislerindeki tüm fotokopi makinelerin periyodik bakım ve tamirleri gerçekleştirilmiştir.
- Fotokopi çekimi, matbu evrakların düzenlenmesi ve çoğaltılması yapılmıştır.
- Tanıtım amaçlı el ilanı, broşür, mektup, gazetelerin odacılar vasıtasıyla dağıtımı yaptırılmıştır.
- Toplantı salonlarının, toplantılara, seminerlere hazır tutulması ile gerekli olan her türlü hizmetleri verilmiştir.
- 2. Kat toplantı salonu yeniden tefriş edilmiştir.
- Asansörlerin temizliği, arızalarının giderilmesi ve bakım işleri yaptırılmıştır.
- Merkez bina insan taşıma asansörü revize edilerek en yeni TSE standartlarına ulaştırılmıştır.
- KOSKİ genel müdürlüğüne ait hizmet binaları ve tüm tesislerindeki radarlı cam kapılar, bariyerler, otomatik demir kapılar, endüstriyel kapıların yıllık tamir ve bakımları gerçekleştirilmiştir.
- Yemeklerin Büyükşehir Yemekhanesinden alınarak, Meram Arif Bilge, Selçuklu, su arıtma, atıksu arıtma Tesisleri Yemekhanesinde servise sunulması, Yemekhanenin hizmete hazır bulundurulması sağlanmıştır.
- KOSKİ genel müdürlüğüne ait hizmet binaları ve tüm tesislerindeki klimaların yıllık bakım ve tamirleri gerçekleşmiştir.
- Yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerin takibi, Daire Başkanları ve diğer yöneticiler ile yapılan toplantılara ait her türlü hizmetin verilmesi sağlanmıştır.
- Misafirhanelerin temizliği, bakımı vb. işleri yapılmıştır.
- Türk Bayrağı, Büyükşehir ve KOSKİ flamalarının temini, temizliği ve asılma işleri yapılmıştır.
- Hizmetlilerin yazlık ve kışlık kıyafetleri temin edilmiştir.

- KOSKİ genel müdürlüğüne ait hizmet binaları ve tüm tesislerindeki kapı isimlik ve levhaların yazılımı ve montajı gerçekleştirilmiştir.
- Binaların ilaçlanması, çiçeklerin bakımı, elektrik, WC, lavabo, musluk, kapı ve pencere arızaları giderilmesi sağlanmıştır.
- Genel Müdürlük hizmet binası ve Arif Bilge hizmet binasında bulunan su sebillerinin takibi ile, çay ocağı hizmetleri ve çay sebilleriyle misafirlere ve personele çay servisi yapılmıştır.
- Genel Müdürlük ve hizmet binalarındaki lavabolardaki hijyenik anti bakteriyel köpük sabun uygulaması devam ettirilmiş olup ilave olarak açık rulo wc kağıdı uygulamasından vazgeçilmiş olup yerine hijyenik kapalı rulo (cimri) sistemine geçilmiştir.
- Genel Müdürlük hizmet binalarındaki perde ve güneşliklerin 1 defa temizlikleri yaptırılmıştır.
- KOSKİ genel müdürlüğüne ait hizmet binaları ve tüm tesislerindeki birimlerin kaşe ihtiyaçları giderilmiştir.
- Merkez, Arif Bilge tesislerinin temizliği yaptırılarak takip edilmiştir.
- Tüm tesislerimizin cam ve çerçeve temizliği özel firmaya periyodik yaptırılmıştır.
- Tüm birimlerin temizlik malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır.
- Tüm birimlerimizdeki halıların yıkatılma işi yaptırılmıştır.
- 4 çay ocağı ve 4 yemekhane için toplam 8 adet endüstriyel yıkama makinası alınarak hijyenik temizliğe geçilmiştir.






SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞİ

- Kurumların periyodik ve yasal olarak yapması gerekli Sivil Savunma Planı, Savaş Hasar Onarım Planları, 24 Saat Çalışma Planı, Sabotajlara Karşı Korunma Planı, Güvenlik ve Koruma Planı, Milli Alarm Planı ve Yangın Planlarında güncellemeler yapılarak KAMP Konya Afet Müdahale Planı ve TAMP Türkiye Afet Müdahale Planı yapılmış, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan toplantı ve seminerlere katılarak yapılan değişiklikler değerlendirilmiştir.

- KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) Görev Talimatı yapılarak valilik ve ilgili birimlerimize gönderilmiştir.

- 23 adet Özel Güvenlik Görevlisi ile Merkez Binamız, Atıksu Arıtma Tesisleri Akyokuş İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Meram Arifbilge Tesisleri, Selçuklu Tesisleri ve Altınapa Barajının 24 saat sürekli güvenliği sağlanmıştır.

- Bina ve tesislerin girişlerine HGS (Hızlı giriş sistemi) ve otomatik kapılar yapılmış bakım ve onarımları yapılarak çalışır durumda tutulmuştur.





- Güvenlikle ilgili raporlar ve kamera kayıtları izlenerek gerekli tedbirler alınmış ve işlemler yapılmıştır.

- Yangın Eğitimi ve Tatbikatı yapılmış olup, yangın tüpleri, yangın muslukları, yangın malzemelerinin periyodik denetim ve kontrolleri yapılmıştır.

- Bina ve tesislerin yangın sistemleri yenilenmiş, elektrik panoları yenilenmiş ve kontrolleri yapılmıştır.

- Özel Güvenlik Görevlisi personelin nöbet çizelgeleri, raporları, özlük hakları, puantajları, yapılması gereken diğer işler ve bunlarla ilgili yazışmalar yapılmıştır.

- Genel Müdürlüğümüz İlçe, Belde ve köylerle ilgili oluşan bölgelerde güvenlikle ilgili kameralar takılarak, yangın sistemleri ve durumlarına görü yangın tüpleri alınarak gerekli yerlere konmuştur.



BİLGİ İŞLEM

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımızın sorumlulukları çerçevesinde daha iyi hizmet üretebilmek, birimlerimizin yada doğrudan abonelerimizin memnuniyetini arttırabilmek adına teknolojiyi yakından takip etmek ve sahip olma bilinciyle ve öz verisi ile hizmet üretmekteyiz.

Bu kapsamda gerek doğrudan geliştirici gerekse hizmet satın alan rollerinde açık kaynak ve entegrasyon esasına dayalı bir mimarı ve teknoloji seçimi yapılarak ileride doğabilecek ihtiyaçların mevcut yapıya kolay entegre edilebilmesi hedeflenmiştir.

Kurumumuzun tüm birimlerinde mevcut olan bilgisayar, yazıcı, telsiz ve telefonların bakım ve onarımı, tüm kurumsal organizasyonların (eğitim, sunum vb.) ses ve görüntü sistemlerinin kurulum hizmetleri verilmektedir.

Ayrıca donanımlardan garanti kapsamı dışında olanların bakımı, teknolojik gelişimlerinin sağlanması, arızalarına yerinde müdahale ya da servise alınmak suretiyle onarımları gibi faaliyetleri bünyemizdeki Donanım Servisi personelimiz gerçekleştirmektedir.

Yönetim bilgi sistemi kapsamındaki mevcut (masaüstü, web, mobil vb.) programların, birimlerin istekleri ya da mevzuat değişlikleri doğrultusunda güncellenmesi, kurumumuzun hizmet alanı gözetilerek teknolojik gelişmeler ışığında yeni projelerin planlanması, yazılımı ve uygulamaya konulması gibi hizmetlerde yine bünyemizdeki yazılım personeli aracılığıyla verilmektedir.



a. Yazılım Faaliyetlerimiz

• Kurumsal Mimari


Kurumumuzun hizmet alanı gözetilerek teknolojik gelişmeler ışığında yeni projelerin planlanması, yazılımı ve uygulamaya konulması, mevcut uygulamaların birimlerden gelen istekler doğrultusunda güncellenmesi gibi hizmetleri bünyemizdeki yazılım personeli aracılığıyla verilmektedir.

Proje de açık standartlar kullanılmıştır. Kurumsal uygulamalar (YBS) web tabanlı, platform bağımsızdır. Java teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir.

Kurumumuzun ihtiyaçlar doğrultusunda genişleyebilir esneklikteki bir yapıya sahip olan Yönetim Bilgi Sistemi hizmet çeşitliliğin arttırılması paralelinde zenginleşmektedir. İlişkisel veri tabanı kullanan sistem, web ara yüzünde çalışarak kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır. Güncel teknik gelişmelerin getirdiği tüm yenilikleri destekleyen sistem içerisinde yeni talepler ve güncellemeler yapılmaktadır.

Yönetim Bilgi Sistemimiz; hızlı, kesintisiz ve farklı platformlardan hizmet sunmanın yanı sıra kaynaklarında verimli kullanımı hedeflenerek dağıtık mimari üzerine bina edilmiştir.

Veri güvenliği için aktif-pasif veri tabanı sunucuları, alternatif uygulama sunucuları ve geriye dönük raporlamalar ve istatistikler için rapor sunucusu aktif olarak hizmet vermektedir.

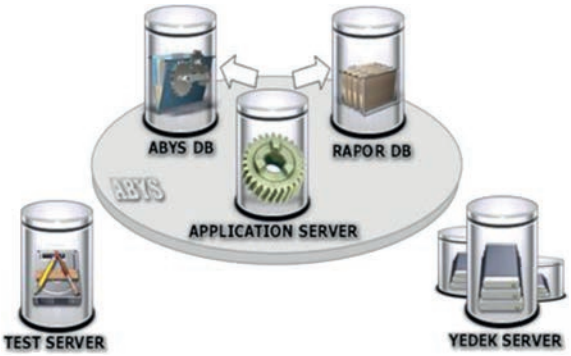

• YBS Sistem Özellikleri

Sistem olabildiğince programlanmış süreçlerden oluşmaktadır. Bu süreçler kullanıcıların müdahalesine gerek duymadan belirli zaman dilimlerinde otomatik tetiklenmektedir.



Kendi iç bünyesindeki yapıların haricinde, Büyükşehir, GSM şirketleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, DASK, e-devlet kapısı gibi dış yapıları da uyumlu bir şekilde kullanmaktadır.

• Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Evrak ve dokümanlarımızın elektronik ortamda takibine yönelik süreç tabanlı bir uygulamadır. Uygulamamıza elektronik imza desteği sağlayabilmek için Kamu Sertifikasyon Merkezinden (KamuSM) talep edilen sertifika entegre edilmiştir. Uyum Değerlendirme süreci tamamlanarak uygulama devreye alınmıştır.

Ayrıca evrak yönetim sistemimizde imzası bulunacak personellerimiz belirlenerek KamuSM" den Nitelikli Elektronik Sertifikalarının oluşturulması için 320 personelimize sertifika talepleri yapıldı. İhtiyaç doğrultusunda da ilave taleplerimiz devam etmektedir.

EBYS „nin devre alınması ile 6360 sayılı yasa kapsamında genişleyen hizmet alanımızda evrak süreci hızlı ve ekonomik hale getirilmiştir.

• Elektronik Vezne - SUMAT

Şehrimizin belli noktalarında hizmete sunmuş olduğumuz SUMAT‟lar üzerinden dönemsel ve vadesi geçmiş su faturaları kredi kartı ile ödenebilmekte, Elektronik Kartlı Sayaç (EKS) kullanan abonelerimiz ise sayaç kartlarına kredi kartı ile ödeme yaparak kontör yükleyebilmektedirler.



6360 sayılı büyükşehir yasası ile birlikte hizmet alanımıza geçen ilçelerimizden Akşehir, Çumra, Seydişehir, Yunak da yüksek oranda Elektronik kartlı su sayacı kullanan abonelerimizin mesai saatleri haricinde avans kontör yükleyebilmeleri için uygulama geliştirilerek hizmet sürekliliği sağlanmıştır. 2015 yılı içerisinde Elektronik veznelerimizden toplamda 3.118.412,97 TL fatura ödemesi ve kart dolumu gerçekleştiren abonelerimizin SUMAT ‟lara olan ilgisi memnuniyet verici seviyededir.

• SMS Bildirimleri

Abonelerime ödenmemiş faturalarını hatırlatmak amacıyla bilgilendirme sms „i otomatik olarak gönderilmektedir. Ayrıca abonelik yada sayaç işlemlerinin sahadaki ekiplerimizce işlem sonucuna yönelik bilgilerin yer aldığı gerek sürece bağlı gerekse ilgili birim personeli tarafından SMS gönderimi yapılmaktadır.

• e-Fatura Bildirimi

Müşterilerimizin elektronik posta adresleri, sicil bilgileri giriş esnasında ve çeşitli güncelleme araçları kullanılarak kayıt altına alınmaktadır. Kayıt altına alınan bu elektronik posta adresleri kullanılarak, müşterilerimize tahakkukları çıktığı gün zamanlanmış görevler kullanılarak gece saatlerinde borç bilgileri mail olarak atılmaktadır. Abonelerimiz her ay düzenli olarak elektronik posta aracılığı ile bilgilendirilmektedir



• Kent Bilgi Sistemi Data Alış Verişi


Kent Bilgi Sistemi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Konya ile ilgili her türlü verinin tutulduğu dev bir projedir. Verilerin sağlıklı olabilmesi için altyapısının sürekli güncellenmesine ihtiyacı vardır. Bu verilerden bir kısmı KOSKİ tarafından toplanan verilerdir. Aynı zamanda KOSKİ‟nin Kent Bilgi Sisteminden alması gereken adres ve ruhsat gibi bilgiler vardır. Karşılıklı bu veri alışveriş ihtiyacından dolayı adres ve bina kodu alt yapımız Kent Bilgi Sistemine uyumlu hale getirilmiştir. İleride yapılacak veri alışverişleri için veri tabanında tüneller ve veri kümeleri oluşturulmuştur.

Ayrıca Bağlı bulunan ilçe ve beldelere ait cadde-sokaklar kentbilgi sistemi ile entegre olarak güncellendi.



• PTT ve Banka Online Tahsilât Sistemi

Bankalarla otomatik ödeme talimatı dışında Ptt ile önceki yıllarda devreye aldığımız gişelerden online ödeme sistemi birkaç banka haricinde diğer bankalarla devre alınmıştır. Bankaların online ödeme sistemine geçişi mükerrer ödeme kaynaklı sorunları ortadan kaldırmıştır.

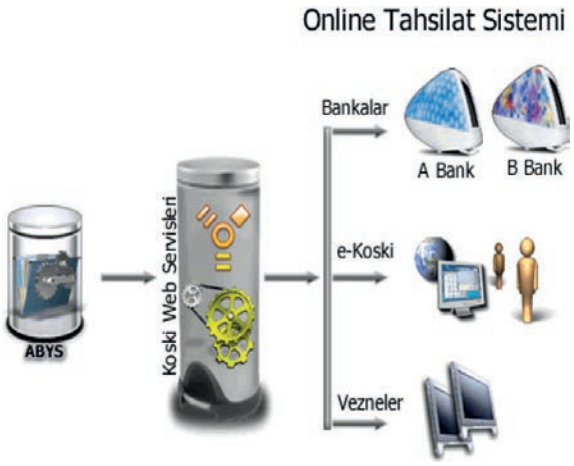

Ayrıca vadesi geçmiş borçların ödemesi online olarak abonelerimizin kendilerine en yakın PTT ve banka gişeleri yada internet siteleri üzerinden yapılabilmektedir.



• EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı)

Yeni yasa ile hizmet alanımıza giren 6 ilçede(Akşehir, Seydişehir, Kulu, Çumra, Yunak, Çeltik) kullanılan 3 farklı firmaya ait Kartlı sayaç kullanılmaktadır. Öncelikle her firmanın farklı kart okuyucu üzerinde işlettiği sistem; kartlı su sayacı üreten firmalarla görüşülerek ortak bir kart okuyucu üzerine toplandı. Bu sayaçların sistemimiz ile uyumlu çalışabilmesi için de mevcut uygulamalarımıza güncellendi.

İlçelerde Eks kullanan abonelerimiz mesai saatleri dışında yada yedek kontörlerini bitirmeleri halinde mağdur olmamaları için avans kontör dolumu yapabilecekleri kiosklar ilçe merkezlerimizdeki hizmet binalarımıza kuruldu. Bu kiosklardaki kart okuyucularda yine tüm EKS lerde çalışabilecek şekilde dizayn edildi.

• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)



Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Uygulaması Kurumumuz 2015 yılında Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) uygulamasına geçmiştir. Artık evraklar ve tebligatlar ilgili kurum, kuruluş ve kişilere "koski@hs01.kep.tr" adresinden KEP adreslerine gönderilmektedir. Elektronik posta ile haberleşmenin taraflar arasında teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli bir şekilde yapılabilmesi için ilave güvenlik hizmetlerine gereksinim duyulduğundan bu ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilen kayıtlı elektronik posta (KEP), elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklidir.

KEP sistemine ilişkin hizmetler Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar tarafından verilmekte olup, bununla beraber Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak tanımlanmıştır. Tebligat Kanununa eklenen 7/A Maddesi kapsamında düzenlenen Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere tebligatlarını elektronik ortamda alma zorunluluğu getirilmiştir.

KEP Sistemi; kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ek olarak; E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği, Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı, Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği, E-postanın iletilme zamanının tespit edilmesi, İçeriğin değişmediğinin garanti edilmesi, Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edilmesi gibi ek özellikler sağlamaktadır.

• Bölge Depozito Giriş ve Rapor Ekranları


Büyükşehir yasasına istinaden kurumumuza bağlanan ilçe, belde ve köy abonelerine ait tarafımıza gönderilmemiş olan depozito bilgileri, bölgedeki sorumlu personeller tarafından gerekli evraklar teslim alınarak (depozito makbuzu v.s.) yapılmış olan ekrandan ABYS sistemimize giriş yapılarak, abonelerin önceden ödemiş oldukları depozito bedelleri kayıt altına almaktadır.



• Metraj Programı

Şimdiye kadar klasik ataşman defterleri ile yapılan metrajlar, yazılımını yaptığımız metraj programı sayesinde Plan Proje Da. Başkanlığının hazırlamış olduğu projelere göre kanalizasyon yapım ekiplerinin uygulamasını yaptığı kanalizasyon hatlarının; ataşman, metraj ve yeşil defter ile birlikte kesin hakediş gerçekleştirilmiştir.


Uygulama üzerinden şebeke ekipmanlarının coğrafi bilgi sistemine hazır altlık teşkil etmesi sağlanmıştır

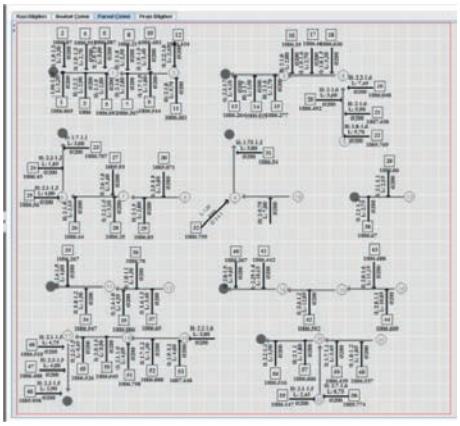

• e-Koski Internet Şubesi

Yeni sisteme göre güncellenen e-Koski online tahsilat sitesi, YBS web servisleri alt yapısını kullanarak işlemini yürütmeye devam etmektedir.

2015 yılı sonu itibarı ile 68.000 üyeye ulaşan sitemiz, hafta içi günlük 41.000 TL ortalama tahsilât yapmaktadır. Günlük tahsil edilen fatura sayısı ortalama 825'dir. 2015 yılı toplam tahsilât tutarı 14.468.522,52TL'dir.




Herhangi bir ek maliyetinin olmaması ve tahsilât yükünden hafifletici rol oynaması e-Koski tahsilât sitesinin önemini artırmaktadır. Abone numarasının yanında kimlik numarası girilerek abonelerimiz borçlarını sorgulayabilmektedir.

2016 yılı itibari ile altyapısını yenilediğimiz e-koski internet şubemizde Abonelik ilk müracaatı, Abone numarası sorgulama, sözleşme yapma, ilişik kesme, bilgi edinme gibi işlemler de kolaylıkla yapılabilecektir.

• Koski İntraweb Portal


Kurumumuza gönderilen epostaların, Genel Müdür'e Mesaj ve Bilgi Edinme Mesajlarının yönetilebildiği bir platformdur. Gelen epostalar görevli personel tarafından ilgili birimlere elektronik ortamda yönlendirilerek daha kısa sürede cevaplanması ve raporlanması sağlanmıştır. Ayrıca basın haber girişi arayüzü bu portalda yeniden tasarlanmış, kullanılabilirliği arttırılmıştır.

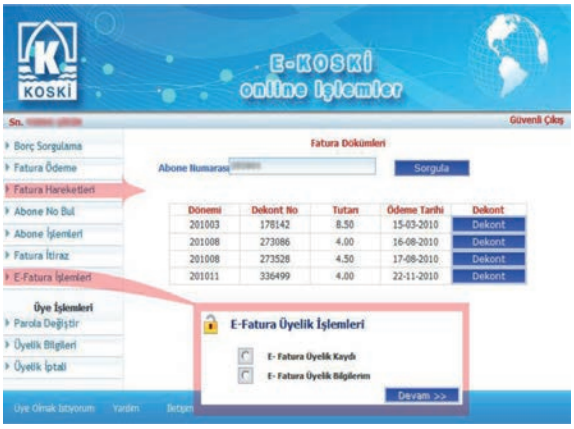

KOSKİ İntraweb aracılığı ile kurum içi haber ve duyurular, personel değerlendirme anketleri, personel istek ve önerileri, eğitim sunuları ve kitap bilgileri, kurum içi canlı yayın oturumları, hızlı erişim linkleri, telefon rehberi, personel mail vb. çalışmalar hizmete sunulmaktadır.

• El Terminalleri Yönetimi

Sayaç okuma işlemlerinde kullandığımız el terminali programı daha verimli kullanabilmek için sürekli güncellenmektedir.
El bilgisayarlarımız okuma bilgilerini online olarak alıp vermektedir. Bu işlemin güvenli bir iletişim ortamında sağlanması ve data transferinin verimli kullanılması içi GSM operatörü ile özel güvenlik ağına(APN) dahil edilmektedir.

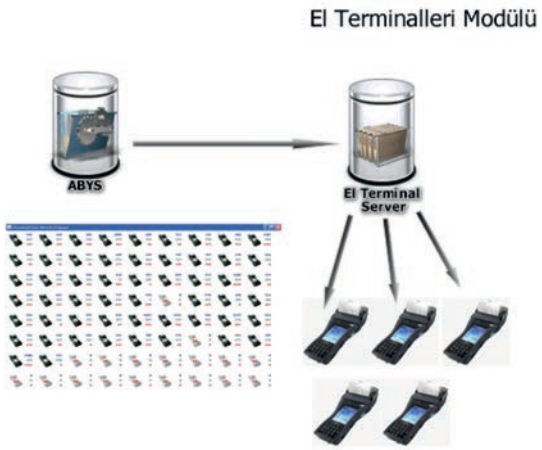


Abonelerimizin eksik bilgilerini tamamlamak amacıyla sahada okunmakta olan aboneye ait adres ve diğer bilgi güncellemeleri, terminaller üzerinden yapılmaktadır.

El Bilgisayarı programı; ilçe belde ve köy aboneliklerinin sayaçlarının daha kolay okunabilmesi, sahadan ihtiyaç olan bilgilerin toplanabilmesi ve bilgisayarların yeni özelliklerinin daha verimli kullanılması için güncellemeler yapılmaktadır.

• Araç Takip Sistemi (Kent Bilgi Sistemi ile Entegreli)

Resmi ve kiralık araç filomuzun takibine yönelik farklı firmalardan satın alınan araç takip kitlerimiz mevcuttur

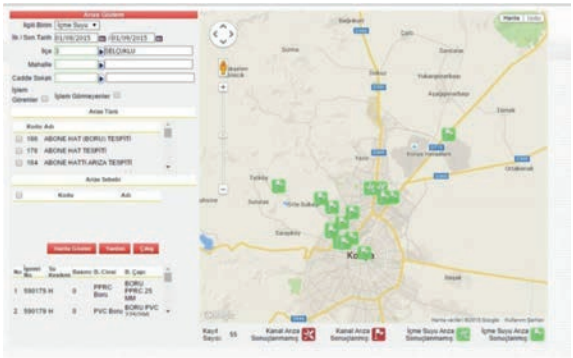

Araç Takip Sistemi, yazılım ekibimiz tarafından Google Maps"den ve Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminin yol ve koordinat alt yapısı kullanılarak geliştirilmiştir. Bu modül sayesinde araçların konumu, anlık durumları ve hızları takip edilebilmektedir.

Hizmet alanımızın genişlemesi ile birlikte ilçelerde bulanan araçların kontrolü için gerekli olan Araç Takip cihazı alımı yapılarak mevcut sistemimize entegre edilmiştir. Halen sistemimiz içerisinde 4 farklı firmaya ait araç takip kiti uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.

• Mobil İş Takip

Yönetim Bilgi Sisteminde Sayaç işleri, Kaçak takip ,içme suyu ve Kanal şebeke vb. işleri sisteme entegre edilen mobil cihaz ve uygulamalarla yürütülmektedir.



Sayaç, kaçak takip ve kontrol iş emirlerinin takibi cep telefonları ile içme suyu ve kanal şebeke iş emirleri ise PDA üzerindeki mobil uygulamalar ile yürütülmektedir.

İş emirleri tüm birimlerin yaptığı işlemler sonucu otomatik olarak oluşturulmakta, gerektiği takdirde manuel olarak da iş emri tanımlanabilmektedir.


Sahadaki ekiplerin konum ve iş yoğunluğu bilgilerine göre otomatik ve manüel olarak iş emri dağılımı yapılabilmektedir.

Dağıtımı yapılan bir iş emri, yoğunluk ve diğer sebepler nedeniyle, tanımlanan ekipten başka bir ekibe yeniden ataması yapılabilmektedir. İş emirleri müteahhit firma ve KOSKİ ekiplerini ayırt edebilmekte, ücretlendirme ve hak ediş işlemlerini, tanımlanan bilgilere göre otomatik olarak yapabilmektedir. Batarya ile çalışan mobil yazıcılar ile müşterilerimize istenilen kâğıt çıktılar verilebilmektedir.

Saha ekipleri tarafından, iş emrinde kullanılan malzemeler adet ve fiyatları ile birlikte tanımlanabilmekte, veriler GSM hattı yolu ile merkeze aktarılarak iş emri sonuçları kayıt altına alınabilmektedir. Kullanılan teknoloji sayesinde en az veri hareketi sağlanarak GSM maliyetleri minimuma indirilmiştir.

• Altyapı Bilgi Sistemi

Altyapı Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemlerinin bir alt koludur. Yerel yönetimler için kentte mevcut olan içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu şebekelerine ait grafik ve grafik olmayan verilerin belli bir düzen içerisinde depolanması, güncelliğinin sağlanması ve yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sistem ile mevcut şebekelere ait güncel bilgiler üzerinden gerekli konumsal analiz ve sorgulamaların yapılması ve istatistikî raporların alınabilmesi sağlanmaktadır.

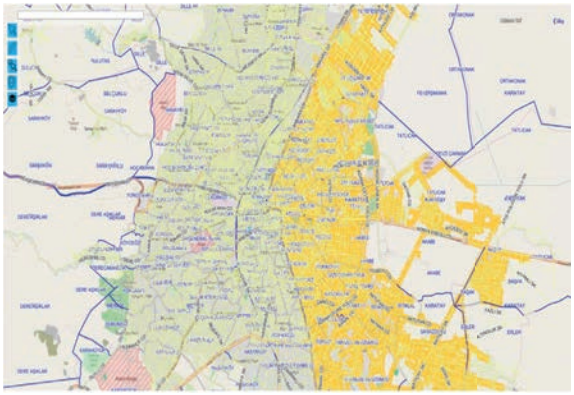


Kurumumuzun mekânsal nitelikli verilerinin toplanması, depolanması, sorgulanması, birimler arasında paylaşımı ve görüntülenmesi amacıyla dağınık olan bilgilerin altyapı bilgi sistemi çatısı altında toplama hedefiyle çalışmalar başlatılmıştır.

Açık kaynak bileşenler kullanılarak sunucu kurulumları yapılmış, merkez ilçelerimize ait kanal şebeke bilgilerinin bir bölümünün aktarımları gerçekleştirilmiştir.

• İlçe Yatırım Analiz

İlgili birimlerimiz tarafından ilçelerde kuyu, su – kanal şebeke ve sayaç işlemlerine yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin izlenebilmesi için yazılım geliştirilmiştir.
Birimlerin yaptıkları işlerinin bir parçası niteliğinde bilgi giriş ekranları tasarlanmıştır.

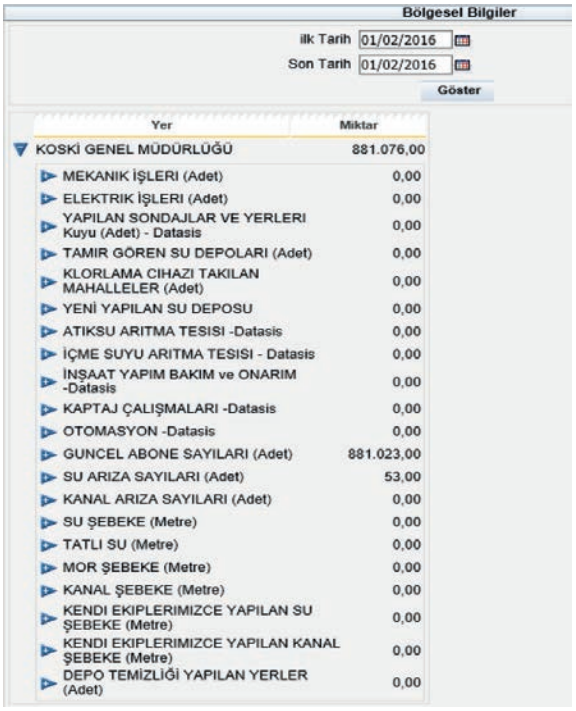


b. Sistem Yönetim Faaliyetlerimiz

• Sunucu Hizmetleri

Otomasyonumuzda hizmet veren toplam 26 adet Ana Sunucu (Server) bulunmaktadır. Bu sunucularımız günün ihtiyacına göre gerek yazılım ve gerekse donanım yönünden güçlü ve güncel hale getirilmektedir.

Kalite standartlarına uygun olarak elimizde mevcut bulunan Unix ve Linux sunucuların sistem yönetimi, kurulumu, bakımı ve yedekleme işlemleri düzenli periyotlarla yapılmaktadır. Windows Terminal Server sistem yapısı periyodik aralıklarla denetlenmekte, oluşan hatalar sistemin aksamasına neden olmadan üzeltilmektedir.

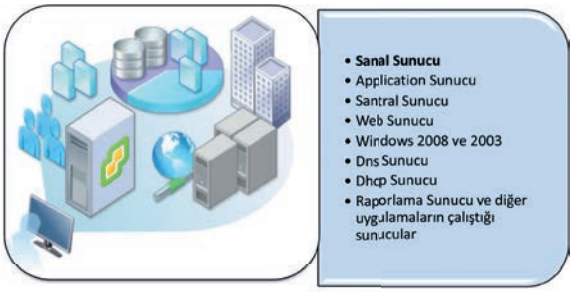



• Network Hizmetleri

Konya merkezde bulunan hizmet birimlerinin iletişim alt yapısı FİBER kablo bağlantısı üzerinde çalışmaktadır. İlçe ve Beldelerde iletişim alt yapısı ADSL üzerinden çalıştırılmaktadır.

Merkez binamızın dışında kalan hizmet binaları

1) Arıtma Tesisleri ile FİBER	2) Selçuklu Su Veznesi ile FİBER
3) Çay Suları ile FİBER	4) Karatay Bel. Su Veznesi ile FİBER
5) Kayalı Park Su Veznesi ile FİBER	6) Selçuklu Tesisleri ile FİBER
7) Atıksu Arıtma Tesisleri ile FİBER	8) Arifbilge Tesisleri ile FİBER
9) Aydınlık Elektronik Vezne ile FİBER	10) Bosna Elektronik Vezne ile FİBER
11) Selçuklu Elektronik Vezne ile FİBER	12)İlçe ve Beldelerde 62 ayrı noktada ADSL

• İnternet Hizmetleri

İnternet"in ve Local ağın daha güvenilir bir şekilde kullanılması ve bu güvenliğin sürekliliği açısından Firewall cihazlarının program güncellemesi düzenli olarak yapılmaktadır. Bölge ve Alt Bölgelerin merkez ile veri alışverişini sağlamak için VPN tünelleri oluşturularak verinin hızlı ve güvenilir şekilde karşılıklı transferi sağlanmaktadır.




• Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)

Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) cihazları alınarak başta merkez olmak üzere Bölge ve Alt Bölgelere montajı yapılmış olup, bu sayede aylık çalışma saatleri dijital ortamlara anlık veri olarak aktarılmakta ve personel giriş çıkışlarının kontrolü sağlanmaktadır.



İlçe ve beldelerde bulunan tesis ve hizmet binalarımızın güvenliğini sağlamak amacı ile ilave analog kamera sistemi montajları yapılarak 7/24 izlenebilmesi ve kayıt altına alınması sağlanmıştır.

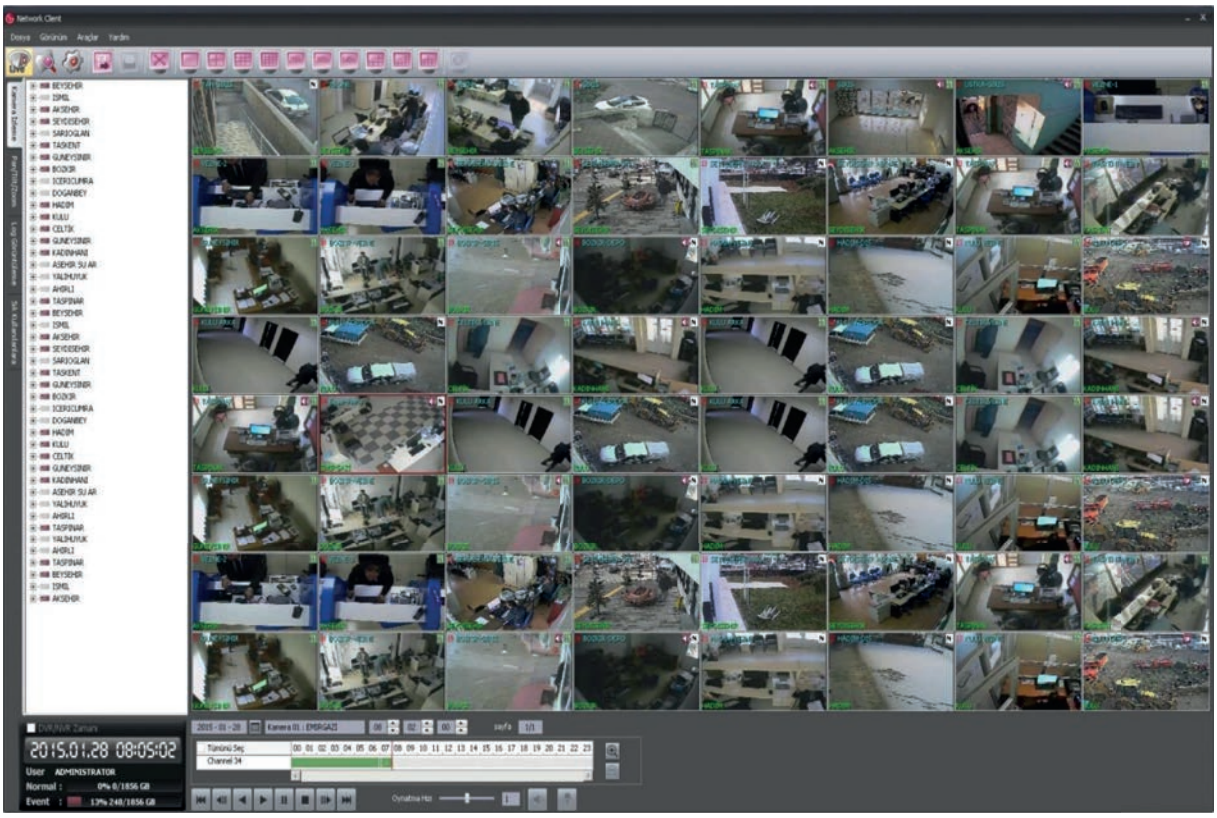

c. İletişim ve Teknik Destek Faaliyetlerimiz

• PC, Laptop, Notebook, Yazıcı, Santral, Çağrı Merkezi, Telsiz, Role, Telefon, PDA, Projeksiyon ve Ses Yayın sistemi cihazlarının talep, bakım kurulum ve onarımları

• Kablo ve kanal çekimi





• Montaj ve sistem kurulumları



• Ses ve görüntü sistem kurulumları



Kurumumuz Network "ünde hizmet vermekte olan Notebook, PC ve bunlara bağlı yazıcı donanımının dağılımı şu şekildedir.

PC DAĞILIM TABLOSU

BİRİMLER	PC	Yazıcı	Notebook	All-İn-One
Genel Müdürlük	3	6	9	
Hukuk Müşavirliği	10	4		
Mali İşl. Da. Bşk.	28	17	2	
Plan Proje Da. Bşk.	47	21	4	
Bilgi İşlem Da. Bşk.	18	4	8	1
İns.Kay.ve Eğt. Da. Bşk.	22	11	1	
Su Tesis. Da. Bşk.	86	44	12	
Kanalizasyon İşl. Da. Bşk.	54	39	8	
Destek Hiz. Da. Bşk.	51	23	2	
Yat. ve İnş. Da. Bşk.	52	29	5	
Abone İşleri Da. Bşk	84	84	6	15
İlçe /Belde	254	217	5	
TOPLAM	709	499	62	16

15 Yılı Bakım - Onarım Tablosu	ADET/mt
PC Bakım ve Sistem Kurulumu	550
Notebook Sistem Kurulumu	40
Yazıcı Tamir ve Bakımı	275
Ana Makinelerin Bakım ve Kurulumu	10
Yenilenen Kablo Metrajı	3500
Yenilenen Kanal Metrajı	500
Muhtelif Telsiz Arızası	20
Muhtelif şarj cihazı ve adaptör arızası	70
Telefon Makine ve Hat arızaları	50
Araç takip cihazı demontaj	40
Bilgisayar Monitör Tamiri	15
Santral Kurulumu	2

Farklı daire başkanlıkları bünyesinde bulunan servislerde, çalışma ömrünü tamamlamış bilgisayarlar teknik personelimiz tarafından belirlenip, donanım ve performans olarak daha güçlü bilgisayarların temin edilip değiştirilmesi ile bu birimlerde hizmete sunulmuştur.



Birimlerden gelen talepler neticesinde laserjet veya fonksiyonlu yazıcılar talep eden servislerde network bağlantısı yapılarak birden fazla kullanıcının bağımsız olarak kullanmasını sağlayacak şekilde hizmete sunulmuştur.



Kurum bünyesinde bulunan muhtelif yazıcılar için 1100 adet kartuş, toner ve şerit alımı yapılmış olup, ilçe ve beldelerde bulunan birimlere dönem içinde yeteri miktarda temini sağlanmıştır




Müşteri Hizmetleri Servisinde bulunan bilgisayarlar kablo karmaşasını ortadan kaldıran estetik görünüm dokunmatik ekran ve geniş çalışma alanı sağlayan yeni tasarım ALL-İN-ONE bilgisayarlar ile değiştirilerek hizmete alınmıştır.




Elektronik kartlı su sayaçlarının kullanıldığı ilçelerde 7/24 hizmet veren KIOSK cihazları bakım ve onarım işlemleri yapılmıştır. Seydişehir ve Yunak ilçelerinde bulunan KİOSK cihazlarının dokunmatik ekranları hassasiyet ve renk kaybından dolayı teknik personelimiz tarafından değiştirilmiştir.




ALO 185 çağrı merkezimizde, il mücavir alanlarının genişlemesi ile artan abone sayısı ve teknoloji kanallarının yaygın olarak kullanılmasından dolayı, Su ve Kanalizasyon hizmeti istek ve şikâyetlerinde daha iyi ve kesintisiz hizmet verebilmek için yazılım ve donanım değişikliği yapılarak Profesyonel bir çağrı merkezi kurulmuş oldu.

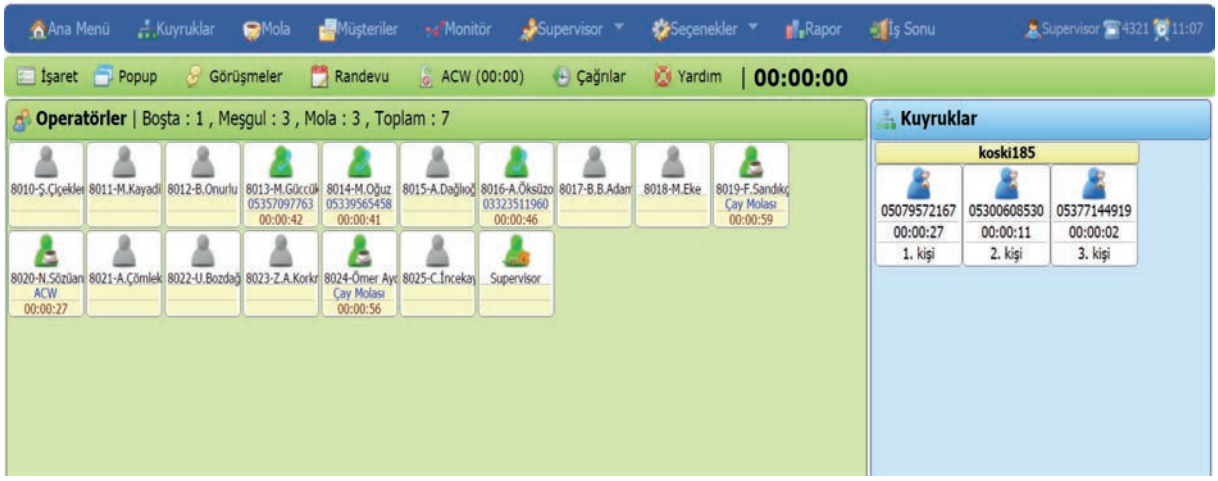

Çağrı Kuyruklarının durumu anlık olarak izlenebilmektedir.

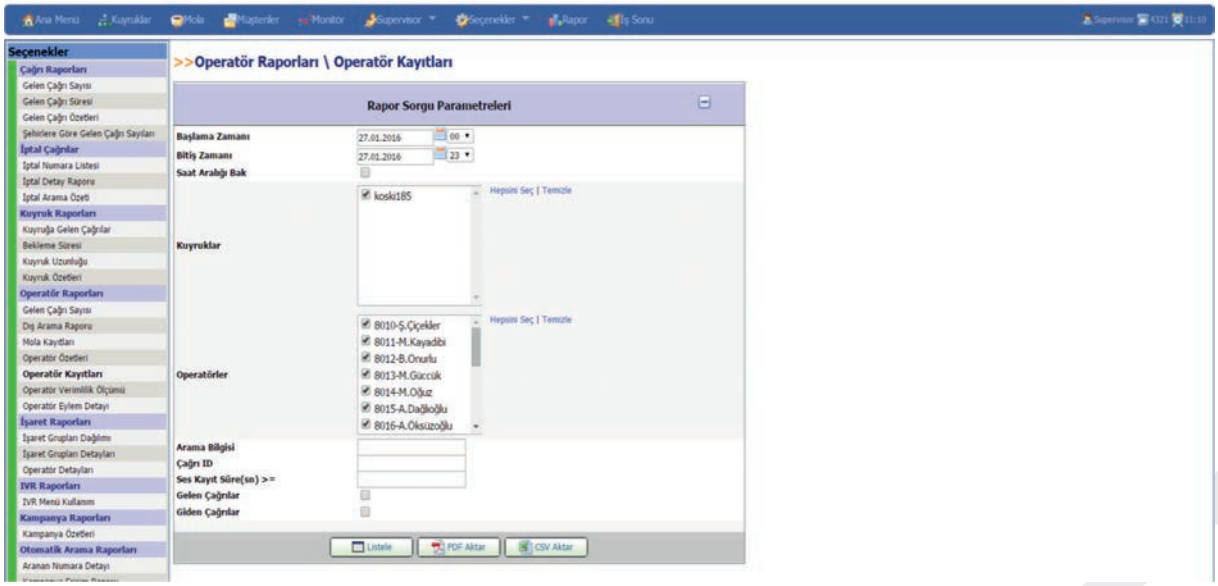

Gelen Giden Arama raporu ve ses kayıtları anlık olarak tutulmaktadır.

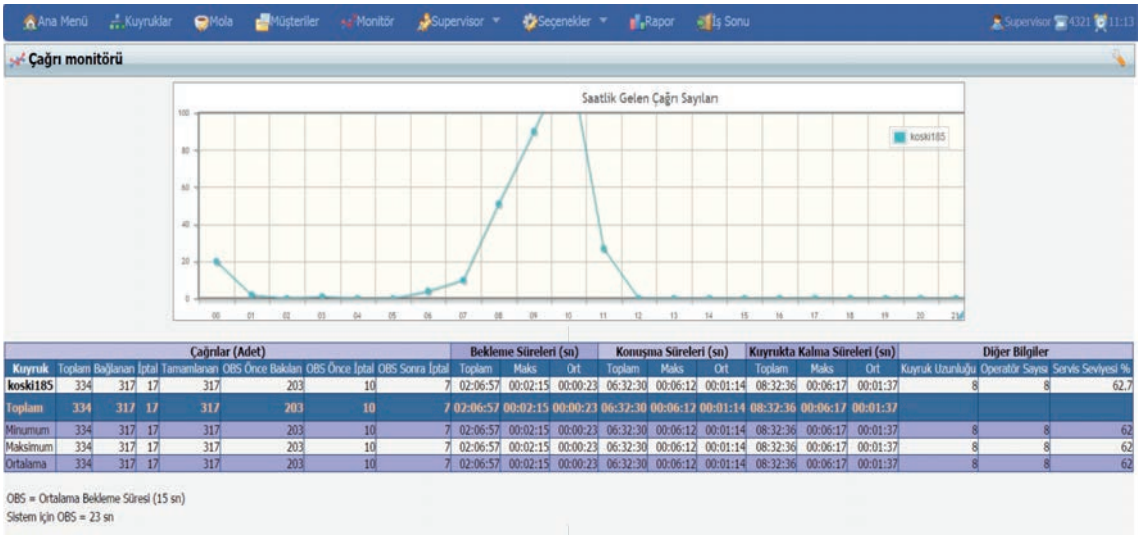

Kuyruk	Çağrılar (Adet)							Bekleme Süreleri (sn)			Konuşma Süreleri (sn)			Kuyrukta Kalma Süreleri (sn)			Diğer Bilgiler		
	Toplam	Bağlanan	İptal	Tamamlanan	OBS Önce Bakılan	OBS Önce İptal	OBS Sonra İptal	Toplam	Maks	Ort	Toplam	Maks	Ort	Toplam	Maks	Ort	Kuyruk Uzunluğu	Operatör Sayısı	Servis Seviyesi %
koski185	334	317	17	317	203	10	7	02:06:57	00:02:15	00:00:23	06:32:30	00:06:12	00:01:14	08:32:36	00:06:17	00:01:37	8	8	62.7
Toplam	**334**	**317**	**17**	**317**	**203**	**10**	**7**	**02:06:57**	**00:02:15**	**00:00:23**	**06:32:30**	**00:06:12**	**00:01:14**	**08:32:36**	**00:06:17**	**00:01:37**			
Minumum	334	317	17	317	203	10	7	02:06:57	00:02:15	00:00:23	06:32:30	00:06:12	00:01:14	08:32:36	00:06:17	00:01:37	8	8	62
Maksimum	334	317	17	317	203	10	7	02:06:57	00:02:15	00:00:23	06:32:30	00:06:12	00:01:14	08:32:36	00:06:17	00:01:37	8	8	62
Ortalama	334	317	17	317	203	10	7	02:06:57	00:02:15	00:00:23	06:32:30	00:06:12	00:01:14	08:32:36	00:06:17	00:01:37	8	8	62

OBS = Ortalama Bekleme Süresi (15 sn)
Sistem için OBS = 23 sn

Çağrı merkezi arama istatistikleri de anlık olarak gözlenebilmektedir.




Ereğli Hizmet biriminde bulunan mevcut telefon alt yapısı kaldırılarak iletişimin ip santral ile network üzerinden gerçekleşmesi sağlandı ve ses kayıt modülü yüklendi.



2000m rakımlı Ağlayançal mevkiinde bulunan Telsiz Merkezinde hava şartlarından dolayı yıkılan anten direklerinin montajı yapıldı. Sistem çalışır hale getirildi



Şahin tepesinde bulunan trunk telsiz merkezinin kaldırılmasından dolayı demontaj işlemleri yapıldı

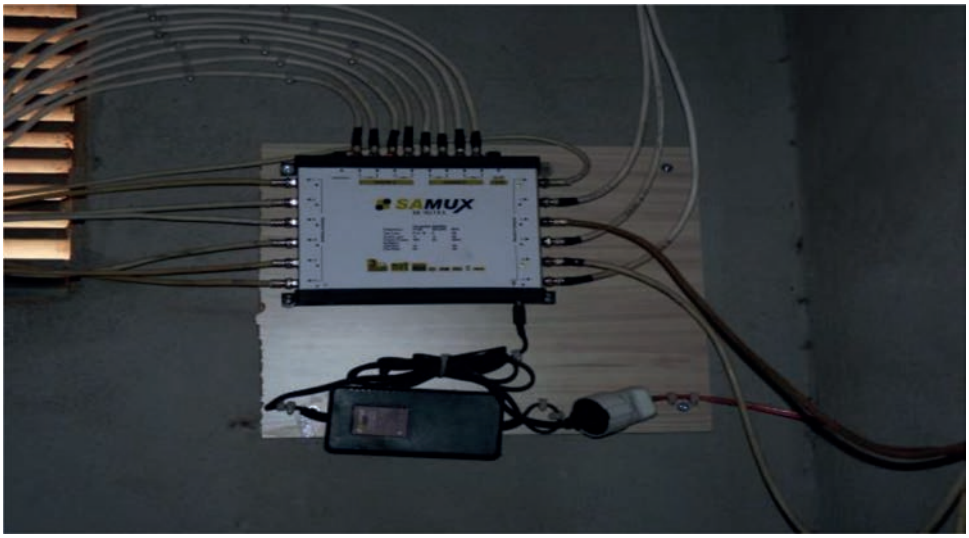

Merkez, Selçuklu, Meram ve Arıtma tesisleri Telefon santralleri numara planı düzenlemeleri yapıldı.

Merkez bina Arif Bilge, Arıtma, Selçuklu Tesisleri ve Atıksu arıtma tesislerinde bulunan Tv santrali değiştirildi ve kablo arızaları giderildi.

• Periyodik Bakımlar

Koski merkez bina, Arif Bilge, Arıtma, Selçuklu Tesisleri ve Atıksu arıtma tesisleri, telefon santralleri aylık periyodik bakımları yapıldı.

Su veznelerinde bulunan yazıcıların periyodik bakımları yapıldı.

Ağlayançal mevkiinde kurulu Telsiz Merkezinde bulunan rölelerin periyodik bakımları yapıldı İlçelerde bulunan telefon santrallerimizin bakım ve kontrolleri yapıldı.
Koski ses sistemi cihazlarının periyodik bakımları yapıldı.
Toplantı salonlarında bulunan projeksiyon cihazlarının periyodik bakımları yapıldı.



KANALİZASYON

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kanal İşletme Şube Müdürlüğümüz, Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, kanalizasyon şebekesine deşarj edilen tüm evsel ve endüstriyel atıksuların çevreye zarar vermeden sıhhi şartlara uygun olarak uzaklaştırılması için kanalizasyon şebekelerinin işletilmesini sağlamak, varsa her türlü arızaları gidermek, bakım, onarımlarını ve temizliklerini yapmak veya yaptırmakla görevlidir. Müdürlüğümüzün 2015 yılı içerisinde yapmış olduğu çalışmalar aşağıda sunulmuştur.

I) KANALİZASYON ŞEBEKESİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

2015 yılı içerisinde kendi ekiplerimizce (kombine kanal açma araçları) 82.745,00 mt. ve ihale etmek suretiyle de 75,525.42 mt. olmak üzere toplam 158.270,42 mt. şebeke temizliği yapılmıştır.





Ayrıca 2 473 adet baca temizliği yapılmıştır. Bunlara ilaveten Aksaray İlinde meydana gelen sel felaketinden sonra Aksaray Belediyesinin talebi üzerine kombine kanal açma araçlarımızla Aksaray İlinde muhtelif ebatlarda 4,600 mt. şebeke ve 42 adet baca temizliği yapılmış, 10 ayrı sokakta meydana gelen ana şebeke arızası giderilerek şebeke normal çalışır hale getirilmiş ve 1 adet parsel bacasının temizliği yapılmıştır. Kanalizasyon şebekelerinin tıkanmaya yol açmadan işletilmesinin sağlanması, baca ve yağmur suyu ızgaralarından çıkan kötü kokuların en aza indirilmesi amacıyla kendi ekiplerimizin çalışmalarına ilaveten kanalizasyon şebekelerinin temizliği ve kayıp bacaların yükseltilmesi işi ihale etmek suretiyle de yaptırılmıştır.

Söz konusu ihalenin	
Yüklenici adı	: Espar Alt Yapı ve Kanal Tem.Sis.A.Ş.
İhale tarihi	: 25.02.2015
İşe başlama tarihi	: 30.03.2015
Sözleşme bedeli	: 542,950.00 TL
İşin bitiş tarihi	: 29.09.2015





Bu iş kapsamında 22.568,44 mt Ø300 mm, 52.491,12 mt Ø400 mm ve 465,86 mt Ø600 mm olmak üzere toplam 75.525,42 mt şebeke temizliği yapılmıştır.

Yine bu iş kapsamında Meram Bölgesinde Karahüyük, Gülbahçe ve Osmangazi Mahallelerinde bulunan sokakların tamamında ve Harmacık Mahallesinde bulunan sokakların büyük bir kısmında kanalizasyon şebekelerinin temizliği yapılarak kanal içi görüntüleri alınmıştır.






Ayrıca, Meram Bölgesinde Karahüyük, Gülbahçe ve Osmangazi Mahallelerinde bulunan sokakların tamamında ve Harmancık Mahallesinde bulunan sokakların büyük bir kısmında kayıp bacaların yerleri tespit edilerek 855 adet baca zemin seviyesine yükseltilmiştir.






2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında aylara göre yapılan temizlik çalışmaları aşağıda kıyaslanmıştır.

	2007 YILI (Mt)	2008 YILI (Mt)	2009 YILI (Mt)	2010 YILI (Mt)	2011 YILI (Mt)	2012 YILI (Mt)	2013 YILI (Mt)	2014 YILI (Mt)	2015 YILI (Mt)	Genel Toplam
OCAK	8.778	8.451	10.101	6.870	21.191	14.227	11.558	9.536	3.866	
ŞUBAT	5.582	10.588	11.643	5.760	23.973	8.248	11.412	9.648	7.635	
MART	7.618	17.242	14.539	11.956	23.685	13.644	16.949	11.538	6.052	
NİSAN	6.168	18.949	14.998	14.769	17.400	15.506	17.638	8.588	7.757	
MAYIS	5.220	15.997	15.423	13.734	18.368	22.398	18.715	8.758	6.691	
HAZİRAN	7.298	25.611	13.535	17.112	21.940	15.767	15.295	12.850	9.176	
TEMMUZ	8.454	13.984	15.716	13.440	15.235	14.494	13.702	11.279	7.853	
AĞUSTOS	1.850	10.876	10.702	8.203	14.599	14.192	7.902	8.515	6.138	
EYLÜL	4.366	9.180	13.512	11.245	16.382	18.106	11.906	10.525	1.700	
EKİM	6.815	9.253	12.019	10.739	14.026	14.516	10.776	11.385	11.777	
KASIM	8.128	8.350	11.678	11.971	15.568	17.108	13.271	8.629	7.465	
ARALIK	5.444	8.467	11.698	16.679	17.535	14.257	10.964	10.762	6.635	
Ekiplerimizle	75.721	156.948	155.564	142.478	219.902	182.463	160.088	126.015	82.745	1301.92
İhale İle	---	6.000	35.000	38.000	50.000	75.000	75.000	78.166	75.525	432.691
TOPLAM	75.721	162.948	190.564	180.478	269.902	257.463	235.088	204.181	158.270	1734.61

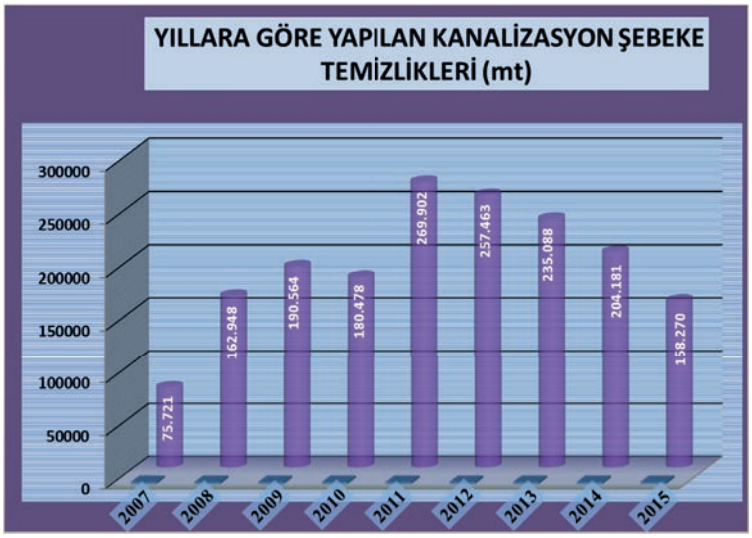

II) YAĞMURSUYU RÖGARLARI VE BAĞLANTI HATLARININ TEMİZLİĞİ



Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarihli toplantısında alınan 548 nolu karar ile "Bugüne kadar Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin sorumluluğu altında olan yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi işinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, KOSKİ ve İlçe Belediyeleri ile ortak hizmet projesi olarak yapılmasına, bahse konu işin icrasının kendi mevzuat hükümlerine göre KOSKİ tarafından yapılmasına/yaptırılmasına, proje maliyetlerinin kendi sorumluluk alanları itibariyle Büyükşehir ve İlçe Belediyelerince karşılanmasına, ortak hizmet projesinin usul ve esaslarının taraflar arasında düzenlenecek bir protokolle belirlenmesine" karar verilmiştir.

Bu karar gereğince Büyükşehir Belediyesi ile Merkez İlçe Belediyeleri (Selçuklu, Meram, Karatay) ile 12.12.2011 tarihinde protokol yapılmış olup, 2012, 2013,2014 yıllarında olduğu gibi 2015 yılında da Genel Müdürlüğümüz tarafından söz konusu iş ihale edilerek rögar temizlikleri yapılmıştır.



Söz konusu ihalenin	
Yüklenici adı	Nezirhan İnşaat Altyapı Taş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İhale tarihi	09.02.2015
İşe başlama tarihi	20.03.2015
Sözleşme bedeli	724,500.00 TL
İşin bitiş tarihi	01.12.2015



Rögar temizlikleri üç ekiple kombine türü kanal açma araçlarıyla yapılmıştır. Yağmursuyu rögarlarının hazneleri temizlendikten sonra bağlantı hatları da ayrıca basınçlı suyla temizlenerek, varsa tıkanıklıkları giderilmiştir. Yağışlı havalarda cadde ve sokaklara biriken sulardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu temizlik çalışmalarına Genel Müdürlüğümüzce gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Bu iş kapsamında;
Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki cadde ve sokaklarda bulunan 13093 adet, Meram Belediyesinin sorumluluğundaki cadde ve sokaklarda bulunan 22417 adet, Karatay Belediyesinin sorumluluğundaki cadde ve sokaklarda bulunan 16859 adet,
Ve Selçuklu Belediyesinin sorumluluğundaki cadde ve sokaklarda bulunan 21447 adet olmak üzere toplam 73816 adet yağmursuyu rögarı tespit edilerek temizlenmiştir.
Ayrıca 3866 adet yağmursuyu rögarları ikinci kez temizlenmiş olup, bu iş kapsamında toplam 77682 adet ve ekiplerimizce de 1366 adet olmak üzere genelde 79048 adet yağmursuyu rögarlarının temizliği yapılmıştır.

Bu iş kapsamında 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında ihale ile yapılan çalışmalar tablo halinde aşağıda belirtilmiştir.

	TESPİT EDİLEN YAĞMURSUYU RÖGAR SAYISI (ADET)				TEMİZLENEN YAĞMURSUYU RÖGAR SAYISI (ADET			
YILLAR	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	9990	11670	12237	13093	21039	18546	20228	16677
MERAM BELEDİYESİ	18086	21759	21617	22417	21013	22176	21617	22553
SELÇUKLU BELEDİYESİ	17949	19674	21129	21447	18846	19674	21129	21457
KARATAY BELEDİYESİ	16174	20518	21180	16859	19456	21005	21446	16995
TOPLAM	62199	73621	76163	73816	80354	81401	84420	77682



2015 YILI İLÇELERE GÖRE TEMİZLENEN IZGARA SAYISI VE MAHSUPLAŞILAN PARASAL TUTARLAR

AYLAR	IZGARA SAYISI (ADET)					MAHSUPLAŞILAN MİKTAR (TL)				
	BÜYÜKŞEHİR	MERAM	SELÇUKLU	KARATAY	TOPLAM	BÜYÜKŞEHİR	MERAM	SELÇUKLU	KARATAY	TOPLAM (TL)
20 Mart 30 Nisan (38 Günlük)	10942	608	0	1234	**12784**	149,729.46	8,319.82	0.00	16,885.96	**174,935.24**
01 Mayıs 31 Mayıs (29 Günlük)	1769	2852	2010	2408	**9039**	26,586.28	42,862.67	30,208.26	36,189.80	**135,847.01**
01 Haziran 30 Haziran (28 Günlük)	344	1984	3169	3876	**9373**	4.919,43	28,372.54	45,318.84	55,429.41	**134,040.22**
01 Temmuz 31 Temmuz (26 Günlük)	18	3150	2853	2966	**8987**	246.11	43,068.47	39,007.73	40,552.72	**122,875.03**
01 Ağustos 31 Ağustos (27 Günlük)	20	2981	3178	3046	**9225**	282.56	42,114.90	44,898.07	43,033.21	**130,328.74**
01 Eylül 30 Eylül (23 Günlük)	0	2538	2602	2576	**7716**	0.00	39,361.63	40,354.20	39,950.97	**119,666.80**
01 Ekim 31 Ekim (32 Günlük)	0	6308	4008	631	**10947**	0.00	84,540.83	53,715.86	8,456.76	**146,713.45**
01 Kasım 30 Kasım (27 Günlük)	3584	2132	3637	258	**9611**	47,035.67	27,979.92	47,731.23	3,385.94	**126,132.76**
TOPLAMLAR	**16677**	**22553**	**21457**	**16995**	**77682**	**228,799.51**	**316,620.78**	**301,234.19**	**243,884.77**	**1,090,539.25**

III) KANAL ABONE HATTI ÇALIŞMALARI

Kanalizasyon arıza ekiplerimizce 2015 yılı içerisinde;
- 262.00 mt. Eğitim kurumları,
- 251.00 mt. İbadethane ve dini eğitim kurumları,
- 176.50 mt. Sokak Çeşmesi tahliyesi
- 88.50 mt. Resmi kurum ve kuruluşlar
- 2,962.50 mt. Diğerleri (Mesken,işyeri vb.) olmak üzere toplam 3 740,50 mt. abone hattı yenilenmiş veya yeniden bağlantısı yapılmıştır.

Ayrıca 1.323 adet abone tamiratı yapılmıştır.



IV) KANALİZASYON ŞEBEKE YAPIMI

Kanal arıza ekiplerimiz ile 2015 yılında Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda ;

Ø 200'lük 222, 00 mt.
Ø 300'lük 986, 00 mt.
Ø 400'lük 996, 00 mt. olmak üzere, Toplam 2 204,00 mt. şebeke yapılmıştır.





V) KANAL AÇMA ARAÇLARI İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR




Kanal açma araçları ile 2015 yılında;
- 5.704 adet kanal şube yolu arızası ücreti mukabilinde giderilmiştir.
- 777 adet kanal abone hattı arızası giderilmiştir.
- 1.366 adet yağmur suyu rögar bağlantı hattı arızası giderilmiştir.
- 393 adet ibadethane ve dini eğitim kurumlarına ait kanal şube yolu arızası giderilmiştir.
- 283 adet tatlısu çeşmesi, umumi wc vs. kanalizasyon bağlantı hattı arızası giderilmiştir.

- 150 adet resmi kurumlara ait arızalar giderilmiştir.
- 38 adet eğitim kurumlarına ait arızalar giderilmiştir.
- 3.356 noktada ise şebeke doluluğu yada kanal abone hattında tamirat yapılması için kanal arıza ekiplerimize bildirilmiştir.
- 1.983 adet arızaya müdahale edilebilmesi için kanal şube yolu kontrol bacasının açılıp tekrar bildirilmesi yönünde bilgi verilmiştir.
- 460 adet arıza mahalline intikal edilmiş olup, arızayı abone kendi imkânlarıyla giderdiğinden dolayı ekiplerimiz arızaya müdahale etmeden ayrılmışlardır.
- 1.167 ayrı noktada çalışma yapan kanal arıza ekiplerinin yanında (kanal abone hattı tamiratı yada ana şebeke arızası) gerekli çalışma yapılmıştır.



- 2.005 adet arıza mahalline intikal edilmiş olup, arıza iç tesisatta olduğundan dolayı arızaya müdahale edilmemiş ve ilgiliye gerekli bilgi verilmiştir.
- 399 adet arıza mahalline de ulaşılmış olup, arıza mahallinde arıza sahibi bulunamadığından dolayı arızaya müdahale edilememiştir.

Kanal açma araçlarımızca toplam 18.081 arıza ihbar noktasına intikal edilmiştir

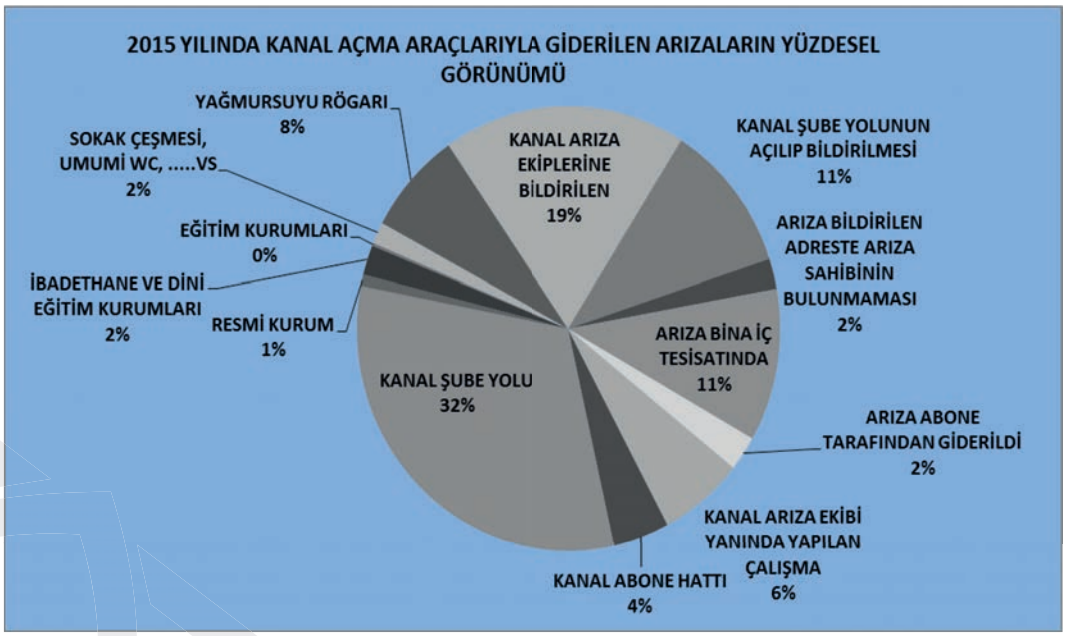

Kanal açma araçlarıyla 2014 ve 2015'te yapılan çalışmalar aylara göre tablo halinde aşağıda sunulmuştur.


2014 YILI YAPILAN KANALİZASYON ARIZALARI (AYLARA GÖRE)

KANALİZASYON ARIZALARI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
Kanal abone hattı arızası	76	61	46	49	46	59	56	66	89	107	50	43	**748**
Kanal şube yolu arızası	496	414	402	428	500	464	420	508	569	520	401	485	**5.607**
Resmi kurumlar	12	14	16	19	17	22	9	15	26	13	14	13	**190**
İbadethane ve dini eğitim kurumları	25	30	23	34	25	37	38	32	41	33	22	23	**363**
Eğitim kurumları	10	7	6	4	7	3	0	0	3	4	9	7	**60**
Sokak çeşmesi,umumi wc….vs	25	33	33	44	46	33	18	42	22	32	22	22	**372**
Yağmursuyu rögarı	257	115	309	322	190	356	302	265	539	289	120	250	**3.314**
Kanal açma araçları tarafından kanal arıza ekiplerine bildirilen	340	160	171	164	324	468	192	233	739	406	176	208	**3581**
Kanal şube yolunun açılıp bildirilmesi	185	137	153	163	191	213	189	235	242	205	154	169	**2236**
Arızanın bildirildiği adreste arıza sahibi bulunamadı	28	8	10	19	22	38	17	25	100	43	17	33	**360**
Abone tarafından tesisatçıya yaptırılacak	191	125	156	125	206	203	183	196	222	220	158	174	**2158**
Kanal şube yolu arızası abone tarafından giderildi	63	45	30	43	68	58	33	55	70	52	41	33	**591**
Kanal açma aracının kanal arıza ekibi yanında yaptığı çalışma	106	89	84	91	131	117	83	100	106	104	60	87	**1.158**
TOPLAM ARIZA SAYISI	**1814**	**1238**	**1439**	**1505**	**1773**	**2071**	**1539**	**1772**	**2768**	**2028**	**1244**	**1547**	**20738**

2015 YILI YAPILAN KANALİZASYON ARIZALARI (AYLARA GÖRE)

KANALİZASYON ARIZALARI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
Kanal abone hattı arızası	44	31	51	51	88	80	74	69	94	69	71	55	**777**
Kanal şube yolu arızası	442	361	452	462	530	480	459	461	496	541	510	510	**5.704**
Resmi kurumlar	2	7	11	8	23	29	16	5	14	12	15	8	**150**
İbadethane ve dini eğitim kurumları	20	16	28	35	37	32	73	34	40	28	24	26	**393**
Eğitim kurumları	1	1	9	3	5	0	2	1	0	9	3	4	**38**
Sokak çeşmesi,umumi wc….vs	12	17	32	22	33	22	4	32	38	19	24	28	**283**
Yağmursuyu rögarı	77	64	108	86	139	156	66	174	101	139	149	107	**1.366**
Kanal açma araçları tarafından kanal arıza ekiplerine bildirilen	150	147	198	180	546	621	258	259	246	381	196	174	**3.356**
Kanal şube yolunun açılıp bildirilmesi	127	131	154	153	179	196	174	199	160	174	149	187	**1.983**
Arızanın bildirildiği adreste arıza sahibi bulunamadı	10	28	19	19	63	76	27	22	28	45	32	30	**399**
Abone tarafından tesisatçıya yaptırılacak	189	181	165	133	183	148	180	169	179	138	161	179	**2.005**
Kanal şube yolu arızası abone tarafından giderildi	30	38	40	19	37	52	44	49	34	38	42	37	**460**
Kanal açma aracının kanal arıza ekibi yanında yaptığı çalışma	65	85	114	70	95	94	111	111	102	123	86	111	1.167
TOPLAM ARIZASI SAYISI	**1.169**	**1.107**	**1.381**	**1.241**	**1.958**	**1.986**	**1.488**	**1.585**	**1.532**	**1.716**	**1.462**	**1.456**	**18.081**

2007-2008–2009–2010–2011–2012-2013-2014-2015 YILLARI TOPLAM KANALİZASYON ARIZALARI (ADET)									
KANALİZASYON ARIZALARI	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Kanal abone hattı arızası	654	430	632	582	583	708	620	748	777
Kanal şube yolu arızası	7.229	7.434	7.350	7.003	6.754	5.986	5.676	5.607	5.704.
Resmi Kurumlar	369	257	346	407	339	333	231	190	150
İbadethane ve dini eğitim kurumları	401	384	399	445	305	341	380	363	393
Eğitim Kurumları	152	95	148	143	104	99	57	60	38
Sokak çeşmesi, umumi wc….vs	355	343	357	434	307	327	335	372	283
Yağmursuyu rögarı	638	439	725	842	1.305	1.794	1.772	3.314	1.366
Kanal açma araçları tarafından kanal arıza ekiplerine bildirilen	1.221	1.460	1.582	1.513	1.882	2.257	2.352	3.581	3.356
Kanal şube yolunun açılıp bildirilmesi	3.288	3.511	2.444	2.248	2.406	2.186	1.809	2.236	1.9883
Arızanın bildirildiği adreste arıza sahibi bulunamadı	--	--	396	342	365	385	312	360	399
Abone tarafından tesisatçıya yaptırılacak	--	--	1.682	1.838	1.718	2.310	2.251	2.158	2.005
Kanal şube yolu arızası abone tarafından giderildi	1191	1.840	590	468	586	759	547	591	460
Kanal açma aracının, kanal arıza ekibi yanında yaptığı çalışma	860	880	822	780	993	1.024	990	1.158	1.167
TOPLAM ARIZA SAYISI (ADET)	**16.358**	**17.073**	**17.473**	**17.045**	**17.647**	**18.509**	**17.332**	**20.738**	**18.081**

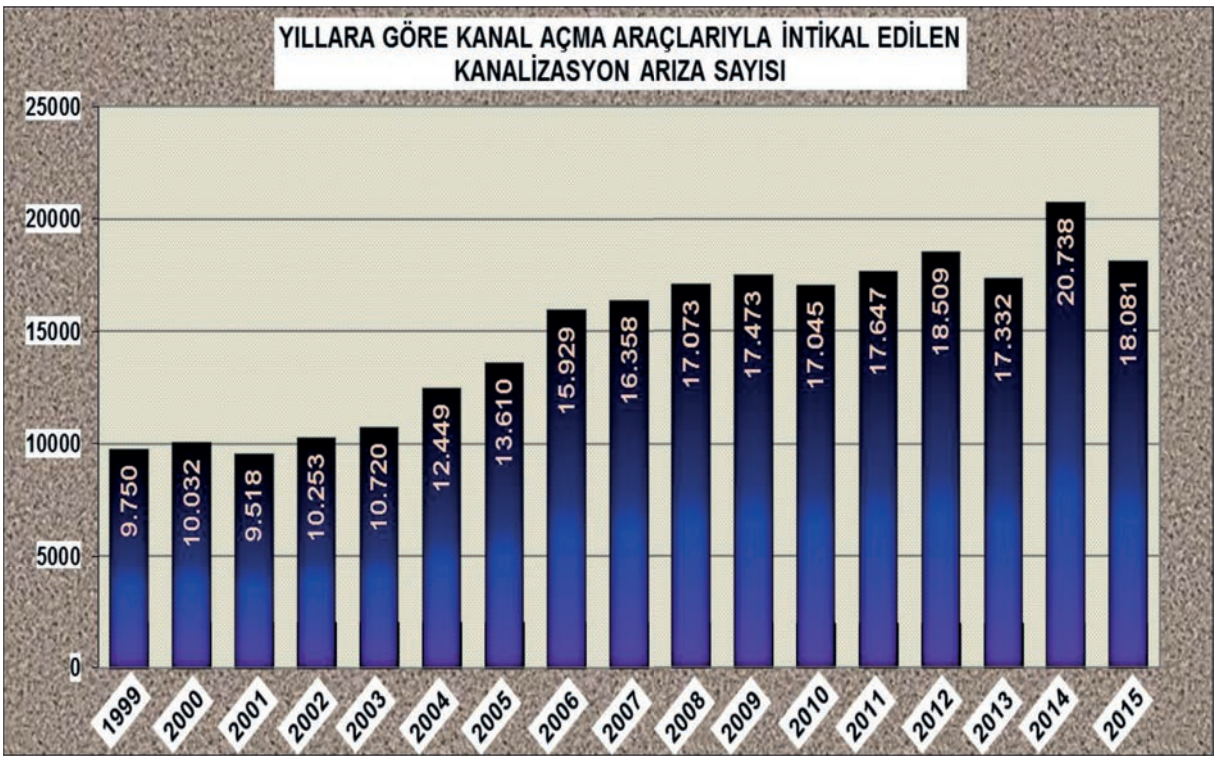

Kanal Şube yolu arızalarının giderilmesinden;


AYLAR	GELİR(TL)
OCAK	46,946.30
ŞUBAT	38,650.31
MART	50,475.50
NİSAN	51,504.30
MAYIS	54,204.90
HAZİRAN	50,668.40
TEMMUZ	46,810.40
AĞUSTOS	46,810.40
EYLÜL	51,825.80
EKİM	58,770.20
KASIM	55,490.90
ARALIK	55,169.40

olmak üzere toplam 607,326.81 TL gelir sağlanmıştır.
Ayrıca kanal arıza ekiplerimizce ve kanal açma araçlarımızla muhtelif tamir ve temizleme çalışmaları karşılığında merkez ilçelerde 18,008.79 TL, 6360 sayılı kanunla merkeze bağlanan ilçelerde yapılan çalışmalar karşılığında ise 3,319.15 TL gelir sağlanmıştır.

VI) BACA YÜKSELTME İŞLERİ

2015 yılında ekiplerimizle 2.870 adet ve müteahhit tarafından da 855 adet olmak üzere toplam olarak 3.725 adet muayene bacası yol kotuna yükseltilmiştir.
Ayrıca ekiplerimizce de;

- 2.222 adet muayene baca kapağı değiştirilmiştir.
- 56 adet yeni baca yapılmıştır.
- 85 adet parsel bacası yapılmıştır.

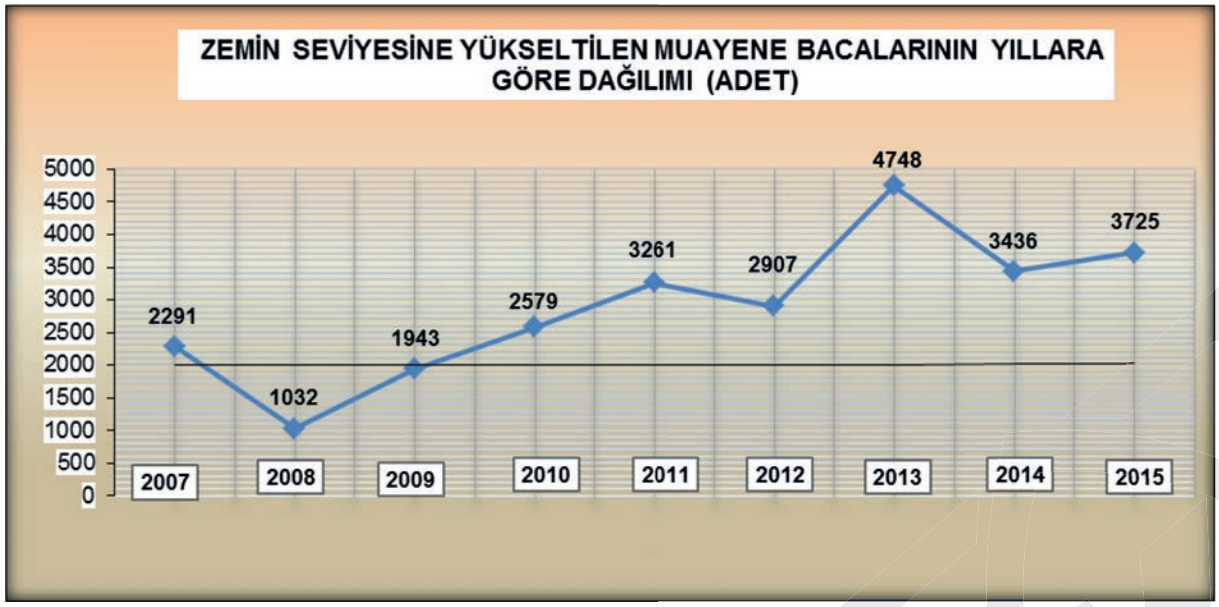





VII) KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI

Kanal Görüntüleme aracı ile 2015 yılında toplam 9.453 mt. kanal içi görüntüleme işi yapılmıştır.





VIII) KANAL ARIZA EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR

2015 YILI AYLAR	İLÇELER	KANAL ARIZA EKİPLERİ İLE 2015 YILINDA YAPILAN ARIZA İŞLERİ								
		ARIZA YERİNDE YAPILAN İŞLEM		ARIZA NEDENİ						
		Giderilen kanal abone hattı arızası	Giderilen ana şebeke arızası	Belediyeler	Telekom	Tedaş	Gaznet	Diğerleri	Yeni yapılan parse baca sayısı	Gösterilen şebeke veya baca yeri
OCAK	S	31	27	11	1	0	1	45	6	11
	K	33	17	5	0	1	0	44	2	2
	M	30	9	2	0	0	0	37	0	8
ŞUBAT	S	29	26	12	0	0	2	41	0	17
	K	31	19	3	0	1	1	45	0	9
	M	32	12	5	0	0	1	38	0	15
MART	S	33	36	16	0	0	0	53	1	80
	K	37	21	9	0	0	2	47	5	2
	M	54	34	24	0	0	1	63	3	3
NİSAN	S	26	20	9	0	0	3	34	2	45
	K	24	22	7	0	0	1	38	1	0
	M	32	20	6	0	0	2	44	1	3
MAYIS	S	48	50	29	0	0	2	67	2	53
	K	38	31	23	0	0	0	46	2	0
	M	38	27	19	0	0	1	45	1	9
HAZİRAN	S	46	44	39	0	0	6	45	8	35
	K	30	31	27	0	0	1	33	5	5
	M	45	30	32	0	0	3	40	2	9
TEMMUZ	S	46	35	34	0	0	2	45	2	23
	K	38	23	21	0	0	0	40	0	7
	M	37	22	19	0	0	2	38	1	3
AĞUSTOS	S	32	28	39	0	0	4	17	3	23
	K	19	7	11	0	0	0	15	0	7
	M	45	19	24	0	0	3	37	5	4
EYLÜL	S	39	22	21	0	0	2	38	0	21
	K	39	11	12	0	0	0	38	1	2
	M	38	15	17	0	0	1	35	0	6
EKİM	S	49	35	32	0	0	1	51	5	22
	K	50	21	20	0	0	0	51	0	3
	M	35	26	25	0	0	4	32	2	7
KASIM	S	36	27	15	0	0	3	45	5	22
	K	40	12	11	0	0	0	41	8	7
	M	26	24	23	0	0	1	26	1	5
ARALIK	S	32	28	22	0	0	0	38	7	22
	K	34	21	16	0	0	1	38	3	9
	M	51	25	15	0	0	2	59	1	11
TOPLAM	S	447	378	279	1	0	26	519	41	374
	K	413	236	165	0	2	6	476	27	53
	M	463	263	211	0	0	21	494	17	83
GENEL TOPLAM		**1323**	**877**	**655**	**1**	**2**	**53**	**1489**	**85**	**510**

2015 Yılında kanalizasyon arıza ekiplerimizce 1323 adet kanal abone hattı arızası, 877 adet ana şebeke arızası giderilmiş (Toplam ana şebeke arızası 1176 adet olup, bunun 299 adedi kanal açma araçlarıyla, 877 adedi de kanal arıza ekiplerimizce giderilmiştir.) ve 85 adet parsel bacası yapılmıştır. Ayrıca 510 ayrı noktada kanalizasyon şebeke güzergahı veya baca yeri tespiti yapılmıştır.













IX) MERKEZDE GÖREV YAPAN EKİPLERİMİZİN, 6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GÖREV ALANIMIZA DÂHİL OLAN İLÇE, BELDE VE KÖYLERDE YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

BÖLGELER▼		ŞUBE YOLU ARIZASI	ABONE HATTI ARIZASI	İBADETHANE, DİNİ EĞİTİM KURUMLARI	EĞİTİM KURUMLARI	RESMİ KURUMLAR	ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLEN	EKİP YANINDA YAPILAN ÇALIŞMA	ŞUBE YOLUNUN AÇILIP BİLDİRİLMESİ	ARIZA İÇ TESİSATTA	YAĞMURSUYU RÖGARI	ŞEBEKE TEMİZLİĞİ (MT.)	ANA ŞEBEKE ARIZASI	BACA TEMİZLİĞİ	ZEMİN SEVİYESİNE AYARLANAN BACA	DEĞİŞTİRİLEN KAPAK	KANAL GÖRÜNTÜLEME (MT.)	ELDE EDİLEN GELİR
2. BÖLGE	**KULU**	**3**	1				1		1			2060	1	106			1901	2572,00
ALT BÖLGE	YENİCEOBA								1			1300	1	33				
	KOZANLI																	
TOPLAM		**3**	**1**				**1**		**2**			**3360**	**2**	**139**			**1901**	**2572,00**
3. BÖLGE	**CİHANBEYLİ**				1							910	2	25				
ALT BÖLGE	ALTINEKİN									1								
	TAŞPINAR																	
TOPLAM					**1**					**1**		**910**	**2**	**25**				
4. BÖLGE	**KADINHANI**											1235	3	74				
ALT BÖLGE	SARAYÖNÜ											430	11	47	35	35		
	LADİK																	
TOPLAM												**1665**	**14**	**121**	**35**	**35**		
5. BÖLGE	**ILGIN**											2690	2	94			42	
ALT BÖLGE	DOĞANHİSAR											650		5			236	
	DERBENT																	
TOPLAM												**3340**	**2**	**99**			**278**	
6. BÖLGE	**AKŞEHİR**		1									1305		89			275	
ALT BÖLGE	REİS (ÇAKILLAR)																	
	TUZLUKÇU											1700		15				
TOPLAM			**1**									**3005**		**104**			**275**	
7. BÖLGE	**BEYŞEHİR**											7900	1	111			1541	
ALT BÖLGE	DEREBUCAK																	
	HÜYÜK								1			2900		20			255	
	DOĞANBEY																	
	ÜZÜMLÜ																	
TOPLAM									**1**			**10800**	**1**	**131**			**1796**	
8. BÖLGE	**SEYDİŞEHİR**			1								4410		94			250	
ALT BÖLGE	AHIRLI											340	1	13				
TOPLAM				**1**								**4750**	**1**	**107**			**250**	
9. BÖLGE	**BOZKIR**											1150	1	11				
ALT BÖLGE	HADİM																	
	TAŞKENT / BALCILAR																	
	SARIOĞLAN																	
TOPLAM												**1150**	**1**	**11**				
10. BÖLGE	**ÇUMRA**	**1**				1	2	1		1	140	3680	17	192				128,6
ALT BÖLGE	GÜNEYSINIR						2					450	4	81				618,55
	AKÖREN		2						1			780	3	73				
TOPLAM		**1**	**2**			**1**	**4**	**1**	**1**	**1**	**140**	**4910**	**24**	**346**				**747,15**
11. BÖLGE	**KARAPINAR**												2					
ALT BÖLGE	EMİRGAZİ																	
	İSMİL				1							200		4				
TOPLAM					**1**							**200**	**2**	**4**				

TÜM BÖLGELER	İNTİKAL EDİLEN ABONE ARIZASI	ANA ŞEBEKE		BACA KAPAK İŞLERİ			KANAL GÖRÜNTÜLEME İŞİ	ELDE EDİLEN GELİR TOPLAMI
		YAPILAN TEMİZLİK (MT.)	GİDERİLEN ARIZA	TEMİZLENEN BACA	YÜKSELTİLEN BACA	DEĞİŞEN KAPAK		
GENEL TOPLAM	**164**	**34.090,00**	**49**	**1.087**	**35**	**35**	**4.500,00**	**3.319,15**

Merkezdeki ekiplerimiz tarafından bölgelerde toplam 164 adet abone arızası, 34.090,00 mt. muhtelif çapta kanalizasyon şebekesi temizliği, 49 adet ana şebeke arızası, 1087 adet baca temizliği, 35 adet baca zemin seviyesine yükseltilmesi, 35 adet baca kapağı değiştirilmesi, 4.500,00 mt. kanal içi görüntüleme işleri yapılmıştır.

ATIKSU KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Atıksu Kontrol Şube Müdürlüğümüz, endüstriyel nitelikli atıksuları olan işletmelerin atıksu karakteristiklerini kanalizasyon şebekesi deşarj standartlarına indirdikten sonra kanalizasyon şebekesine vermelerini sağlamaktadır. Çalışmalarımız endüstriyel atıksu kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atıksu oluşumu hakkında veri toplanması ve bu verilerin ışığında endüstriyel atıksu kirliliğinin denetim altına alınması hedeflenmektedir. Denetimler "KOSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca ön arıtma/ arıtma tesisi kurması gereken işletmelerin arıtma tesisi projelerini onaylamak, yönetmelikte belirtilen standartları sağlayan işletmelere Bağlantı Kalite kontrol Ruhsatı düzenlemek, verilen bu belge ile işletmeyi takibe almak, belirli periyotlarla numune almak ve analiz ettirmek, ön arıtma/ arıtma şartı olmayan ve deşarj standartlarını sağlamayan işletmelere KÖP(Kirlilik Önlem Payı) tahakkukunu başlatmak faaliyetleri de yürütülmektedir.



Şekil 1. Kimyasal arıtma karıştırma ünitesi



Şekil 2. Süt endüstrisi koagülasyon- flakülasyon ünitesi



Şekil 3. Et Entegre Atıksu Arıtma Tesisi Ön Arıtma

Yandaki belirtilen faaliyet tablosunda;

- Kanalizasyon şebekesine deşarj standartları sağlayan 166 adet işletmeye, gerekli denetim ve çıkışlarından alınan atıksu numuneleri sonucunda Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı düzenlenmiştir.
- Endüstriyel atıksuyu olmayan 94 adet işletmeye kanal bağlama izin belgesi düzenlenmiştir.
- Atıksu veya diğer konular hakkında İdaremizin görüşü talep eden işletmelere veya kurumlara bilgi verilmesi amacıyla 111 yazışma yapılmıştır.
- İşletmelerden kaynaklanan proses atıksularının deşarj standartlarına indirilerek verilmesi amacıyla kurulması planlanan atıksu arıtma tesislerinden 2 tanesine atıksu arıtma tesis proje onayı belgesi verilmiştir.

2015 Yılı Faaliyetleri	
Bağlantı kalite Kontrol Ruhsatı	166
Kanal Bağlama	94
Görüş veya uyarı yazıları	111
Proje onay	2
Ön arıtma tesisi	15
Atıksu arıtma tesisi	2
Numune Alma	87
Kirlilik Önlem Payı	2
Kaçak Bağlantı (Çardak vs.)	13
Toplam Denetim	502

- İşletmelerden Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Belgesi düzenlenen veya atıksularının karakterizasyonunu tespit etmek amacıyla 87 adet numune alınmıştır.
- Önemli Kirletici kaynağı olmayıp, deşarj standartlarını sağlamayan 2 adet işletmeye Kirlilik Önlem Payı tahakkuku başlatılmıştır.
- Kaçak bağlantı yapan çardakların denetimi yapılarak 13 adet çardağın bağlantıları iptal edilmiştir.
- Tüm işletmelerden ve çardaklardan kaynaklanan atıksuların yerinde tespit edilmesi amacıyla 502 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

1- SEKTÖREL BAZDA YAPILAN DENETİMLER

1.1. Süt ve Süt Ürünleri İşletmeleri

Süt işletmelerinden kaynaklanan atıksuların herhangi bir tedbir alınmadan kanalizasyon şebekesine verilmeleri durumunda; kanalizasyon şebekelerinin ve merkezi atıksu arıtma tesisinin işletilmesine olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu kapsamda, atıksu arıtma tesisi yaptırılan 5 adet büyük süt endüstrisine belirli aralıklarda denetimler yapıldı. Küçük süt endüstrilerini ise ön arıtma ve KÖP uygulanarak atıksu deşarjına izin verildi.

1.2. Un ve Makarna İşletmeleri

Bu işletmelerin atıksularında buğday yıkama silolarından kaynaklanan yüksek oranda kapçık, askıda katı madde ve organik yük gelmesi ile kanalizasyon şebekelerinde tıkanma, koku ve merkezi atıksu arıtma tesisinin kum tutucu, biyolojik arıtım vb. ünitelerinde aşırı yükleme sorunlarına neden olmaktadır. Bu kapsamda, atıksu arıtma tesisi yaptırılan 4 adet işletmeye belirli periyotlarda denetim yapıldı.

1.3. Tahin- Helva İşletmeleri

Bu sektörden kaynaklanan atıksularda yüksek konsantrasyonlarda katı madde ve kirlilik yükleri içermektedir. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmelere gerekli önlemler aldırılarak KÖP mukabilinde atıksunları kanalizasyon şebekesine deşarj edilmektedir. 8 adet işletme bu kapsamda değerlendirilmiş olup, denetimler devam etmektedir.

1.4. Et ve Et Ürünleri İşletmeleri

Bu tür işletmelerden kaynaklanan atıksuların yönetmelikte belirtilen standart değerlerde deşarj yapmalarını sağlamak amacıyla 2015 yılında 4 adet işletmede atıksu arıtma tesisi bulunmakta olup, denetlemeler yapılmaktadır. Ayrıca, 2 adet işletmeye atıksu arıtma tesisi proje onayı yapılmıştır.

1.5. İşletmelere Ait Yemekhaneler

Yönetmeliklerde evsel atıksu sınıfında kabul edilen yemek fabrikası, lokanta ve pastane gibi işletmelerden kaynaklanan atıksuların herhangi bir tedbir alınmadan deşarj edilmeleri durumunda, kanalizasyon şebekelerinde tıkanma, koku vb. problemlere neden olmaktadır.Bu tür olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kent merkezinde faaliyet gösteren işletmelerde denetim çalışmalarına devam edilmekte ve bu tür işletmelerin yemekhanelerin kaynaklanan yemek artıkları, yağ vb. atıkların tutulması için yağ tutucu ünitesi yaptırılmıştır. Bu kapsamda, 15 adet işletmeye yağ tutucu yaptırılmıştır.

1.6. Yün-Halı Yıkama İşletmeleri

Yün ve halı yıkama işletmelerinden kaynaklanan atıksularda kıl, yün vb. maddelerin kanalizasyon şebekesinde tıkanmalara, kanalizasyon işletmesinde ve atıksu arıtma tesislerinin ızgara ünitesinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu kapsamda, 36 işletme olup, gerekli denetim işleri yapılmaktadır.

1.7. Plastik Geri Dönüşüm İşletmeleri

Plastik geri dönüşüm tesislerinden kaynaklanan atıksuların kanalizasyon hatlarında ve merkezi atıksu arıtma tesisinde sorunlara neden olmaktadır. Atıksu oluşan ve ön arıtma yapan 5 adet işletme denetlendi.

1.8. Galvanizleme İşletmeleri

Bu işletmelerden kaynaklanan atıksuların herhangi bir tedbir alınmadan kanalizasyon şebekesine verilmesi durumunda şebekede korozyona sebep olmakta, ayrıca merkezi atıksu arıtma tesisinde toksik etkilere sebep olmaktadır. Bu kapsamda 9 adet işletme incelendi.

1.9. Petrol İstasyonları ve Oto Yıkamalar

Bu tür işletmelerin kanal bağlantılarından önce tedbirler sayesinde kum, mil, yağ vb. atıkların tutulmasıyla şebekelerin korunması sağlanmıştır. 146 adet işletme bu kapsamda değerlendirilerek denetlemeler yapıldı.

1.10. Çardaklar

Kanalizasyon şebekesine kaçak bağlantı yapan çardakların tespit edilerek, bağlantılarının iptal edilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda, belirli bölgeler denetlenmiş 13 adet çardağa uyarı uyarı yapılarak bağlantıları iptal edilmiştir.

2- PROJE ONAYLARI

Ön arıtma / arıtma tesisi kurması gereken işletmeler kuracakları arıtma sistemlerine ait projelerini onaylamak üzere İdaremize sunmaktadır. Bu kapsamda, 2 adet atıksu arıtma tesisi proje onayı yapılmıştır.

3-NUMUNE ALMA

Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin ön/ arıtma arıtma tesislerinin çıkışından periyodik olarak numuneler alınarak analizleri yapılmış ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmiştir. İşletmelerden 87 adet numune alınmıştır.



Şekil 4. İşletmelerden numune alınması işlemi

4- KÖP UYGULAMASI

Yönetmelikte belirtilen deşarj standartlarını sağlamayan işletmelere KÖP uygulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2015 yılında 2 adet işletmeye yönetmelikler gereği KÖP (Kirlilik Önlem Payı) tahakkuku başlatılmış olup, toplam 154 adet işletmeden 415.070,99 TL gelir elde edilmiştir.

5- GELİR DURUMU

Atıksu Kontrol Şube Müdürlüğü olarak 2 başlıkta gelir kazanılmaktadır. Bunlar, KÖP payı ve BKKR belge ücretidir. 2015 yılı içerisinde 51.861 TL BKKR belge ücretinden 415.070,99 TL „de KÖP tahakkukundan olmak üzere toplam 466.931,99 TL gelir elde edilmiştir.

Gelir Tablosu (TL)	
Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı	51.861
KÖP	415.070,99
Toplam	466.931,99

6 - İLÇELER BAZINDA DENETİM

6360 sayılı kanun gereği ilçeler bazında yapılan denetimlerde bölgede bulunan, işletmelerin kanalizasyon şebekesine atıksu deşarjları incelenerek şebeke işletmesi ve atıksu arıtma tesisinde oluşabilecek olumsuz etkilerini azalmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, aşağıdaki tabloda gidilen ilçeler ve yapılan denetim sayıları verilmiş olup, toplamda 95 noktaya, 190 denetim yapılarak proseslerinden kaynaklanan atıksuların kanalizasyon şebekesine uygun deşarjı sağlanmıştır.

GİDİLEN İLÇE	Denetime Gidilme Sayısı	Denetleme Sayısı
Güneysınır	1	1
Çeltik	1	1
Akşehir	7	17
Beyşehir	13	32
Bozkır	1	1
Cihanbeyli	4	5
Çumra	9	16
Doğanhisar	2	4
Ereğli	15	42
Hadim	1	1
Ilgın	8	14
Karapınar	1	1
Sarayönü	11	14
Seydişehir	5	13
Taşkent	1	1
Yunak	1	1
Hüyük	4	4
Kadınhanı	4	7
Kulu	6	14
Altınekin	1	2
Toplam	95	190

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan faaliyetler aşağıda özetlenmiştir. Daire Başkanlımız bünyesinde bulunan atıksu arıtma tesislerinin proses tipleri ve mevcut durumları tabloda gösterilmiştir.

Proses Tipi	Mevcut	İnşaat	Proje	Toplam
Biyolojik	11	5	10	26
Stabilizasyon Havuzu	6	1	-	7
Yapay Sulak Alan	35	9	-	44
İnfiltrasyon	1	-	-	1
Elektroflokülasyon	1	-	-	1
Toplam	54	15	10	79

Tablo 1. Atıksu Arıtma Tesisleri

ARITMA ÇAMURU VE ÇEVRE İZİNLERİ

Konya atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan arıtma çamurları için Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında toprak ıslahı amaçlı "Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi" 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınmış ve izin kapsamı 2015 yılında da genişletilerek, toplam 2.750.000 m2 toprak ıslahı ve tarımsal alanda arıtma çamuru uygulaması yapılmıştır.
Başarakavak ve Tepekent Atıksu Arıtma Tesisleri için Çevre İzinleri ve Kulu Atıksu Arıtma Tesisi için Geçici Faaliyet Belgesi alınmıştır. Bozkır, Yunak ve Tuzlukçu Atıksu Arıtma Tesisleri için çevre izin süreçleri başlatılmıştır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Braunschweig Teknik Üniversitesi (Almanya), Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokole göre "Farklı Bekletme Süreleri ve Farklı Sıcaklıklarda Çürütücülerin Gaz Verimlerinin İncelenmesi" konusunda Braunschweig Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan konteyner içerisindeki çürütücü reaktörlerinin Konya Atıksu Arıtma Tesisinde arıtma çamuru ile çalışması tamamlanmıştır. Konteyner içerisindeki çürütücü reaktörlerinin işletilmesi tarafımızca yapılmış olup, elde edilen verilerin değerlendirme aşaması devam etmektedir.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Arıtma Çamurlarının Parabolik Oluk Tipi Güneş Kollektörleri ile Susuzlaştırılması" projesi kapsamında arıtma çamuru numuneleri ile pilot tesiste deney çalışmaları başlatılmış olup, elde edilen veriler değerlendirilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı"na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Konya Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtma çamurlarının mera arazilerinin ıslahında kullanılabilirliğinin incelenmesi amacıyla "Erozyona Uğramış Mera Alanlarında Arıtma Çamurunun Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi" projesinin uygulama çalışmalarına Karapınar bölgesinde başlanılmış olup, araştırma süreçleri devam etmektedir.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Su ve atıksu konularında bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımını amaçlayan "Türk-Alman Su Günleri"nin beşincisi Genel Müdürlüğüz ile "German Water Partnership" tarafından Konya"da düzenlendi. Şube Müdürlüğümüz tarafından organize edilen programa ulusal ve uluslararası düzeyde 193 katılımcı iştirak etmiştir.
2015 yılı içerisinde Konya, Antalya, İstanbul, Tekirdağ ve Ankara illerinde düzenlenen sempozyum ve eğitim faaliyetlerine Atıksu Arıtma Tesisi personeli olarak katılım gerçekleştirildi. İşletme tecrübeleri katılımcılar ile paylaşılarak ilgili konularda sunumlar gerçekleştirildi.
Yurtdışında ise Almanya ve Mısır ülkelerinde düzenlenen uluslararası sempozyumlarda bildiri ve sunumlarla katılım gerçekleştirilmiş ve tesislerde teknik incelemelerde bulunulmuştur.

KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ


Müdürlüğümüz tarafından işletilen atıksu arıtma tesislerinden en büyük kapasiteli tesis olan Konya Atıksu Arıtma Tesisine ilişkin işletme bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Giriş ve çıkış suyu kalitesi

2015 yılında Konya AAT'de 61.640.883 m3 atıksu arıtımı gerçekleştirilmiştir. 2012 yılından itibaren arıtılan atıksu debileri ve 2015 yılı giriş ve çıkış suyu kalitesine ait değerler aşağıda verilmiştir.

Yıllara Göre Arıtılan Atıksu Miktarları (m³/yıl)	
2011	55.922.250
2012	56.407.886
2013	57.313.080
2014	58.198.440
2015	61.640.883

Tablo 3. Yıllara göre arıtılan atıksu miktarları

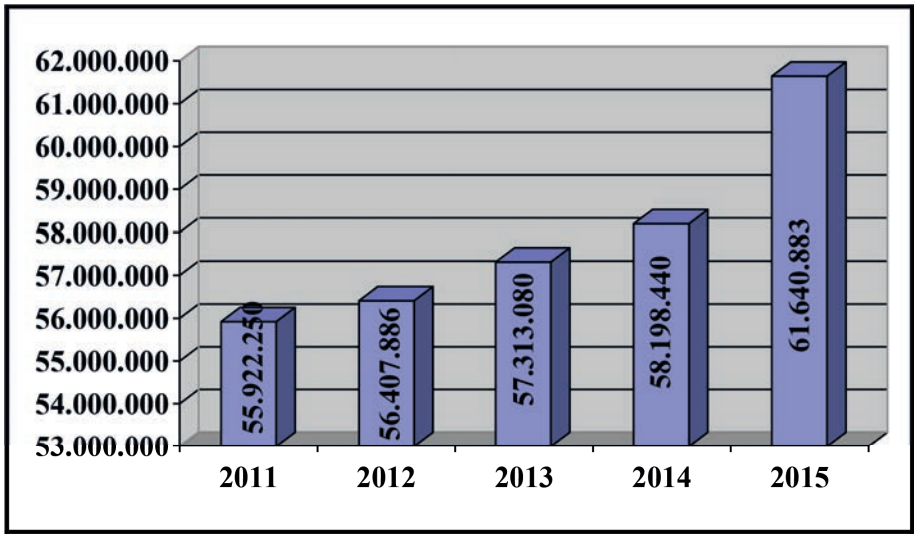

Grafik 1. Yıllara göre arıtılan atıksu miktarları

Konya Atıksu Arıtma Tesisinde 2015 yılında parametreler bazında işletme verimleri aşağıdaki tabloda aylık ortalamalar halinde verilmiştir.

	AKM (mg/l)			BOI (mg/l)			KOI (mg/l)		
Standart	40			40			120		
Aylar	Giriş	Çıkış	Arıtma Verimi (%)	Giriş	Çıkış	Arıtma Verimi (%)	Giriş	Çıkış	Arıtma Verimi (%)
Ocak	393	33	92%	447	28	94%	916	85	91%
Şubat	536	34	94%	479	30	94%	965	96	90%
Mart	505	30	94%	427	27	94%	888	98	89%
Nisan	516	28	95%	461	26	94%	932	77	92%
Mayıs	601	28	95%	506	26	95%	1.018	71	93%
Haziran	626	13	98%	475	15	97%	991	48	95%
Temmuz	434	14	97%	419	14	97%	828	59	93%
Ağustos	470	10	98%	418	14	97%	837	45	95%
Eylül	640	12	98%	555	16	97%	1.116	50	96%
Ekim	455	13	97%	415	16	96%	833	47	94%
Kasım	538	16	97%	527	21	96%	1.062	62	94%
Aralık	482	12	97%	506	16	97%	1.038	51	95%
Ortalama	516	20	96%	470	21	95%	952	66	93%


Tablo 4. Konya Atıksu Arıtma Tesisi giriş ve çıkış suyu kalitesi



Şekil 1. Konya Atıksu Arıtma Tesisi

• Biyogaz ve Elektrik Üretimi

Atıksu arıtımından kaynaklanan arıtma çamurlarının stabilizasyonu amacıyla uygulanan anaerobik çamur çürütme prosesi sonrası ortaya çıkan biyogazın kojenerasyon ünitesinde işleme tabi tutulması sonucunda, 2015 yılında toplam 9.853.218 kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Tesisin elektrik tüketimi ise toplam 17.983.61 kWh olarak gerçekleşmiş ve elektrik geri dönüşüm oranı %55 olarak gerçekleşmiştir.

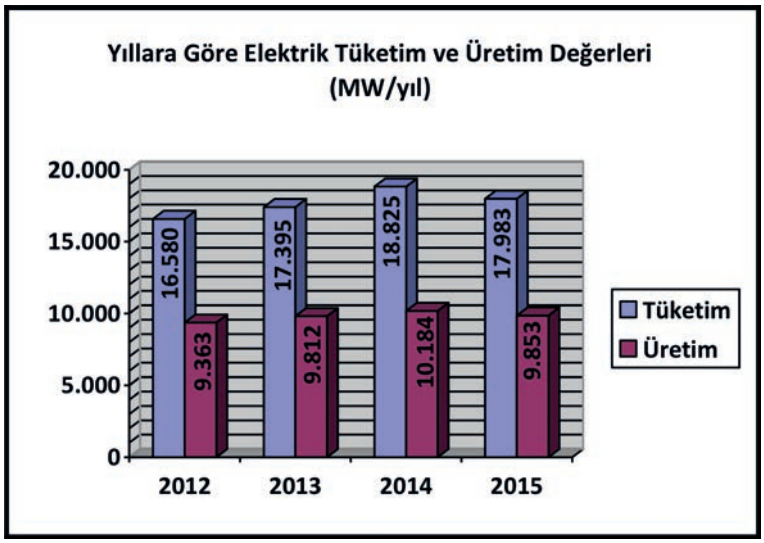

Grafik 2. Yıllara göre elektrik üretim ve tüketim değerleri

Konya AAT yıllara göre elektrik tüketim, üretim ve geri dönüşüm oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2015 yılında biyogazdan üretilen elektrik enerjisine karşılık 3.847.704,12 TL"lik gelir elde edilmiştir. Ayrıca 2014 yılında Konya, Kulu ve Çamlık Atıksu Arıtma Tesisleri için 1.520.000 TL elektrik teşvik bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınmıştır.

Yıl	Tüketilen Elektrik (kWh/yıl)	Üretilen Elektrik (kwh/yıl)	Elektrik Geri Dönüşüm Oranı (%)
2012	16.579.946	9.362.663	55
2013	17.394.587	9.811.800	59
2014	18.825.466	10.183.972	54
2015	17.983.061	9.853.218	55

Tablo 5. Konya Atıksu Arıtma Tesisi enerji durumu

• Arıtılmış Atıksu Geri Kazanım Tesisi (Mor Şebeke)

Konya Atıksu Arıtma Tesisi"nde arıtılmış atıksuların geri kazanımı, 2012 yılında işletmeye alınan 3.600 m3/gün kapasiteli ileri bir arıtma teknolojisi ile geri kazanılan arıtılmış atıksular ile kısıtlanmış yeşil alan sulamasında kullanılmasına devam edilmektedir. 2015 yılı içerisinde yeşil alan sulaması için toplam 141.992 m3 arıtılmış su üretilerek, yaklaşık 3.216.000 m2"lik bir alanın sulaması gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı içerisindeki yağış ortalamasının önceki yılların yağış ortalamalarına oranla fazla olduğundan dolayı, Büyükşehir Park ve Bahçeler Müdürlüğünce talep edilen sulama suyu miktarına paralel arıtılmış atıksu üretimi gerçekleştirilmiştir.

Yıllar	Geri Kazanılmış Atıksu Miktarı (m^3/sezon)
2012	185.082
2013	384.000
2014	188.651
2015	141.992

Tablo 6. Yıllara göre geri kazanılan atıksu miktarları



Şekil 2. Arıtılmış Atıksu Geri Kazanım Tesisi

• Arıtma Çamurlarının Kompostlaştırılması

Konya Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan stabilize arıtma çamurlarının tarımsal alanda gübre olarak kullanılabilmesi için bir fizibilite çalışması başlatılmıştır. Bu kapsamda; Konya Atıksu Arıtma Tesisinde oluşan arıtma çamurlarının park, bahçe ve organik atıklar ile birlikte kompostlaştırma prosesinde hammadde olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi ve ilgili yönetmeliklere uygun kompost tesisinin kurulması için fizibilite raporu ve avan projelerini içeren çalışmalara başlanılmıştır. Atıksu Arıtma sahasında pilot tesisi kurularak deneme çalışmaları devam etmektedir.



Şekil 3. Kompostlaştırma için yapılan pilot tesis çalışmaları

İşin Adı	Atıksu arıtma tesisi arıtma çamurlarının kompostlaştırılması fizibilitesi işi
İşe Başlama Tarihi	11.12.2015
Sözleşme Bedeli	30.000 TL
Yüklenici Firma	Alyanak Mühendislik Taahhüt Tic.
İşin Süresi	100 gün

Tablo 7. Kompostlaştırma işi ihale bilgileri

• İLÇE VE MAHALLELERDE YAPILAN FAALİYETLER

30.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında hizmet alanımıza giren yeni yerleşim yerlerine ait Atıksu Arıtma Tesislerinin de işletilmesine başlanmıştır. Atıksuların arıtılması için bazı yerleşim yerlerine atıksu arıtma tesisi proje ve yapım çalışmalarına 2015 yılı içerisinde de devam edilmiş olup, yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

• Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi

Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Akşehir Su ve Atıksu Projesi" 4 bileşenden (Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Yapımı, İçmesuyu Temini Projesi Yapımı, Teknik Yardım ve Süpervizörlük Hizmeti, Ekipman Temini) oluşmakta olup toplam bütçesi yaklaşık 23.000.000 Avro "dur.

Bu projenin bir bileşeni olan 15.102 m3/gün kapasiteli Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi ve 36 km"lik kanalizasyon şebekesinin ihalesi yapılarak Yüklenici firma olan Arbiogaz Çevre Tek.İnş.San.Tic.A.Ş- Acciona Aqua S.A.U (Türk-İspanyol) Ortak Girişimi ile 28.12.2015 tarihinde 10.454.281,24 Avro bedelle sözleşme imzalanmıştır. Projenin bu kısmının 670 gün içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Projenin "Teknik Yardım ve Süpervizörlük Hizmeti" ihalesi yapılmış olup ihale değerlendirme süreci devam etmektedir. Ayrıca bu kapsamda Akşehir içme suyu temini projesi Genel Müdürlüğümüz tarafından uluslararası ihale kanunlarına uygun şekilde hazırlanmış olup, 2016 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihale edilmesi planlanmaktadır.

Projenin toplam finansmanın %85"i AB hibesinden, geriye kalan kısmı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır.

Son teknoloji ekipmanların kullanılacağı tesis, İleri Biyolojik Arıtım (Azot-Fosfor giderimli proses) yapacak şekilde tasarım yapılmıştır. Tesis yapımı tamamladıktan sonra işletmesi de Genel Müdürlüğümüzce yapılacak olan Akşehir Atıksu Arıtma Tesisinde atıksular çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılacak ve arıtılmış atıksular sulama amaçlı kullanılabilecektir. Ayrıca, Akşehir ilçesinden kaynaklanan atıksuların ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygun bir şekilde arıtılması ile Akşehir Gölü ve çevresinde oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçilerek, bölgede ekolojik açıdan olumlu etkiler yapacaktır.

Tesis Adı	Nüfus (kişi)	Debi (m3/gün)	Proses Tipi
Akşehir	63.543	15.102	İleri Biyolojik

Tablo 8. Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi bilgileri

Sözleşme bedeli	10454.281,24 €
Müşavir firma	-
Yüklenici Firma	Arbiogaz Çevre Tek.İnş.San.Tic.A.Ş- Acciona Aqua S.A.U (Türk-İspanyol) Ortak Girişimi
İşin süresi	670
Sözleşme tarihi	28.12.2015

Tablo 9. Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi ihale bilgileri

6360 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunundan önce hizmet alanımızda bulunan Konya, Başarakavak, Tepekent ve Yükselen Atıksu Arıtma Tesislerinin (AAT) işletilmesine devam edilmektedir.

• Akören Atıksu Arıtma Tesisi

İller Bankası tarafından stabilizasyon havuzu olarak inşa edilmiş ve 2010 yılında işletmeye alınmıştır.
İdare ve kontrol binası, ızgara yapısı, giriş terfi istasyonu, kum tutucu ve anaerobik havuz, fakültatif havuz ve çamur lagünü ünitelerinden oluşan tesisin kapasitesi 632 m3/gün'dür. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.




• Altınekin Atıksu Arıtma Tesisi

Doğal arıtma olarak Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇK) tarafından 2010 yılında inşa edilmiştir.
Genel Müdürlüğümüzce Proses eksikliklerin giderilmesine ve bitki ekimine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.




• Kadınhanı Atıksu Arıtma Tesisi

Stabilizasyon havuzu olarak İller Bankası tarafından inşa edilmiş ve 2001 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Çamlı Atıksu Arıtma Tesisi

İl Özel İdaresi tarafından Doğal Atıksu Arıtma Tesisi olarak inşa edilerek 2004 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin çevre çitinin tamiri ve sazlıkların kesilmesine yönelik çalışmalar planlanmaktadır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Çakıllar Atıksu Arıtma Tesisi

Çakıllar Belediyesi tarafından projesi özel bir firmaya yaptırılarak Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan) olarak 2008 yılında inşa edilmiştir. Tesis fosseptik çukuru ve 2 adet bitki havuzundan oluşmaktadır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Değirmenköy Atıksu Arıtma Tesisi

Değirmenköy atıksu arıtma tesisi Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan) olarak İl Özel idaresi tarafından inşa edilerek 2010 yılında işletmeye alınmıştır. Foseptik çukuru ve 1 adet bitki havuzundan oluşmaktadır.
Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Bayavşar Atıksu Arıtma Tesisi
Bayavşar Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"ndan proje ve hibe desteği alınarak 2000 kişilik Doğal Atıksu Arıtma Tesisi(Yapay Sulak Alan) olarak 2010 yılında ihale edilerek fosseptik havuzu ve 2 adet bitki havuzunun inşaatı tamamlanmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Avdancık Atıksu Arıtma Tesisi
İl Özel İdaresi tarafından Doğal Atıksu Arıtma Tesisi olarak 2006 yılında inşa edilerek 2007 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Karahisar Atıksu Arıtma Tesisi
İl Özel İdaresi tarafından Doğal Atıksu Arıtma Tesisi olarak 2008 yılında inşa edilerek 2008 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Günyüzü Atıksu Arıtma Tesisi
Günyüzü Belediyesince Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden Günyüzü-Yapalı- Taşpınar Doğal Arıtma Tesisi proje ve hibe desteği alınarak inşa edilmiş ve 2012 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Konakkale Atıksu Arıtma Tesisi
Konakkale Belediyesi tarafından İlbank A.Ş. „den alınan kredi ile Doğal Atıksu Arıtma Tesisi(Yapay Sulak Alan) olarak 2010 yılında ihale edilerek fosseptik havuzu ve 1 adet bitki havuzunun inşaatı tamamlanmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Kemer Atıksu Arıtma Tesisi
İl Özel İdaresi tarafından Doğal Atıksu Arıtma(Yapay Sulak Alan) Tesisi olarak inşa edilerek 2008 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• İvriz 1 Atıksu Arıtma Tesisi
İvriz1 atıksu arıtma tesisi Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan) olarak İl Özel idaresi tarafından inşa edilerek 2012 yılında işletmeye alınmıştır. Foseptik çukuru ve 1 adet bitki havuzundan oluşmaktadır. 250 kişilik kapasitesi vardır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• İvriz 2 Atıksu Arıtma Tesisi
İvriz2 atıksu arıtma tesisi Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan) olarak İl Özel idaresi tarafından inşa edilerek 2012 yılında işletmeye alınmıştır. Foseptik çukuru ve 1 adet bitki havuzundan oluşmaktadır. 500 kişilik kapasitesi vardır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Kapaklı Atıksu Arıtma Tesisi
Kapaklı atıksu arıtma tesisi 2000 yılında Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan) olarak inşa edilmiştir.
Foseptik çukuru ve 1 adet bitki havuzundan oluşmaktadır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Bulcuk Atıksu Arıtma Tesisi
Bulcuk atıksu arıtma tesisi Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan) olarak inşa edilmiştir. Foseptik çukuru ve 1 adet bitki havuzundan oluşmaktadır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Beykonak Atıksu Arıtma Tesisi
Beykonak Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"ndan proje ve hibe desteği alınarak 2000 kişilik Doğal Atıksu Arıtma Tesisi(Yapay Sulak Alan) olarak 2011 yılında ihale edilerek fosseptik havuzu ve 4 adet bitki havuzunun inşaatı tamamlanmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Avdan Atıksu Arıtma Tesisi
İl Özel İdaresi tarafından Doğal Atıksu Arıtma(Yapay Sulak Alan) Tesisi olarak inşa edilerek 2012 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Çobankaya Atıksu Arıtma Tesisi
İl Özel İdaresi tarafından Doğal Atıksu Arıtma (Yapay Sulak Alan) Tesisi olarak inşa edilerek 2012 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Büyükoba Atıksu Arıtma Tesisi
İl Özel İdaresi tarafından Doğal Atıksu Arıtma (Yapay Sulak Alan) Tesisi olarak inşa edilerek 2013 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Meydanlı Atıksu Arıtma Tesisi
İl Özel İdaresi tarafından Doğal Atıksu Arıtma Tesisi olarak inşa edilerek 2013 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Kökez Atıksu Arıtma Tesisi
İl Özel İdaresi tarafından Doğal Atıksu Arıtma Tesisi olarak inşa edilerek 2006 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Çavdar Atıksu Arıtma Tesisi
İl Özel İdaresi tarafından Doğal Atıksu Arıtma Tesisi olarak inşa edilerek 2008 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Yeşilyurt Atıksu Arıtma Tesisi
İl Özel İdaresi tarafından Doğal Atıksu Arıtma Tesisi olarak inşa edilerek 2003 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Kızılören Atıksu Arıtma Tesisi
Kızılören Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"ndan proje ve hibe desteği alınarak 2000 kişilik Doğal Atıksu Arıtma Tesisi (Yapay Sulak Alan) olarak 2013 yılında ihale edilerek fosseptik havuzu ve 1 adet bitki havuzunun inşaatı tamamlanmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Selahattin Atıksu Arıtma Tesisi
Selahattin atıksu arıtma tesisi Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan) olarak İl Özel idaresi tarafından 2005 yılında inşa edilerek 2006 yılında işletmeye alınmıştır. Foseptik çukuru ve 1 adet bitki havuzundan oluşmaktadır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Karaağaç Atıksu Arıtma Tesisi
İl Özel İdaresi tarafından Doğal Atıksu Arıtma Tesisi olarak inşa edilerek 2013 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Bayat Atıksu Arıtma Tesisi
İl Özel İdaresi tarafından Doğal Atıksu Arıtma Tesisi olarak inşa edilerek 2013 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir

• Yükselen Atıksu Arıtma Tesisi
Yükselen atıksu arıtma tesisi, yüzeyaltı atıksu infiltrasyon sistemine göre, tasarım debisi 65 m3/gün olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında yaptırılmıştır.
Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Meydan Atıksu Arıtma Tesisi
İl Özel İdaresi tarafından Doğal Atıksu Arıtma(Yapay Sulak Alan) Tesisi olarak inşa edilerek 2012 yılında işletmeye alınmıştır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Kuran Atıksu Arıtma Tesisi

Kuran atıksu arıtma tesisi Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan) olarak İl Özel idaresi tarafından 2005 yılında inşa edilerek 2008 yılında işletmeye alınmıştır. Foseptik çukuru ve 1 adet bitki havuzundan oluşmaktadır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Gökçehüyük Atıksu Arıtma Tesisi

Gökçehüyük atıksu arıtma tesisi Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan) olarak İl Özel idaresi tarafından 1994 yılında inşa edilerek 1995 yılında işletmeye alınmıştır. Foseptik çukuru ve 1 adet bitki havuzundan oluşmaktadır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

• Başarakavak Atıksu Arıtma Tesisi

Konyanın içme suyu kaynağı olan Altınapa barajını korumak için yapılan ve Başarakavak mahallesinden kaynaklanan atıksuların arıtımı ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde yapılmaktadır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

Tesis Adı	Nüfus (kişi)	Debi (m3/gün)	Proses Tipi
Başarakavak	2.000	300	İleri Biyolojik

Tablo 10. Başarakavak Atıksu Arıtma Tesisi bilgileri



Şekil 4. Başarakavak Atıksu Arıtma Tesisi

• Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisi

İller Bankası tarafından yaptırılarak 2005 yılında işletmeye alınarak Beyşehir Belediyesine teslim edilmiş ve 2008 yılından itibaren atıl durumda bırakılmıştır. Tesis mevcut haliyle çalıştırılmaz halde olduğundan, tesisin yeniden çalışır hale getirilmesi amacıyla revizyon işine ait ihale gerçekleştirilmiş ve revizyon işine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Tesis Adı	Nüfus (kişi)	Debi (m3/gün)	Proses Tipi
Beyşehir	55.000	11.143	İleri Biyolojik

Tablo 11. Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisi bilgileri

İşin Adı	Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon İşi
İşe Başlama Tarihi	25.03.2015
Sözleşme Bedeli	2.520.000,00TL
Yüklenici Firma	Detay Arıtma Sis. San. Tic. Ltd. Şti.

Tablo 12. Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisi ihale bilgileri



Şekil 5. Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisi

Beyşehir Arıksu Arıtma Tesisinde 2015 yılında aşağıdaki işler tamamlanmıştır.
1. Penstock tipi kapaklar motorlu hale getirildi.
2. Dekantör ve ön arıtma ünitelerine gezer vinç sistemi yapıldı.
3. Vana, çekvalf vs. parçalarının %70"i monte edildi.
4. Izgara konveyörleri ve kum sistemi ekipmanları monte edildi.
5. Giriş terfi ve gerdevir pompa tamirleri ve montajları tamamlandı.
6. Çökeltme tankları savak perde ve köpük tutucu montajları ile sıyırıcı köprü tamir ve bakımları tamamlandı.
7. Önçökeltme çamur pompa istasyonu ve dekantör ünitesi ekipman teminleri ile borulaması tamamlandı.
8. 1 adet traktör temini yapıldı.
9. Hidrofor, su deposu ve su kuyusu temini ve montajı, borulaması tamamlandı.
10. Yoğunlaştırma havuzu tamir ve bakım işleri tamamlandı.
11. Havalandırma havuzu ve çürütücü aeratör tamir ve bakımları tamamlandı.
12. İdari bina ısıtma sistemi tamamlandı.
13. Atölye ekipmanlarının %80"i temin edildi.
14. AG panoları sahaya getirildi.
15. Kablo dağıtım sistemleri montajı yapıldı.
16. Kablo çekimine başlandı.
17. Havuzların beton tamir harçları tamamlandı.
18. Tesisteki kalıp, demir ve beton işleri tamamlandı.
19. Çatılar ve olukların tadilatları yapıldı.
20. Binaların demir kapı ve pencereleri boyandı.

• Bozkır Atıksu Arıtma Tesisi

İlbank A.Ş. tarafından yaptırılan , Bozkır İlçe merkezi, Sorkun, Dereköy, Çağlayan, Yüksekokul, Üçpınar mahallelerindeki toplam 42.235 kişiye hizmet verecek olan 3.000 m3/gün kapasiteli tesisin kuru kabulü 24.10.2014 tarihinde yapılmıştır. 2015 yılı içerisinde İlbank kontrolünde işletmeye alınmıştır. 2015 yılı içerisinde tesisin işletme kontrollüğü İlbank A.Ş. ile ortak yürütülmektedir. Yüklenici zorunlu 1 yıllık işletme süresi sonunda tesisin işletilmesi tarafımızca yapılacaktır.

Tesis Adı	Nüfus (kişi)	Debi (m3/gün)	Proses Tipi
Bozkır	42.235	3.000	İleri Biyolojik

Tablo 13. Bozkır Atıksu Arıtma Tesisi bilgileri



Şekil 6. Bozkır Atıksu Arıtma Tesisi

• Cihanbeyli Atıksu Arıtma Tesisi

Modüler bir şekilde dizayn edilen Cihanbeyli atıksu arıtma tesisi Elektroflokülasyon yöntemiyle atıksu arıtmını gerçekleştirmektedir. 2014 yılında "Cihanbeyli İlçe Merkezinden Kaynaklanan Atıksuların Arıtılması İşi" hizmet ihalesi kapsamında ihale edilen tesiste 2015 yılında toplam 692.358 m3 atıksu arıtımı gerçekleştirilmiş ve buna karşılık 865.447,50 TL hakediş düzenlenmiştir. Yapılan ihale ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.



Şekil 7. Cihanbeyli Atıksu Arıtma Tesisi

İşin Adı	Cihanbeyli İlçe Merkezinden Kaynaklanan Atıksuların Arıtılması İşi
İhale Tarihi	19.09.2014
İşe Başlama Tarihi	22.10.2014
Sözleşme Bedeli	1.368.750 TL
İşin Süresi	730 gün
Yüklenici Firma	KOÇOĞLU İNŞAAT SANAYİ TARIM ve HAYVANCILIK TİC. A.Ş.

Tablo 14. Cihanbeyli Atıksu Arıtma Tesisi ihale bilgileri

• Cihanbeyli, Derebucak, Yeniceoba ve Hotamış Atıksu Arıtma Tesisleri Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

Cihanbeyli İlçe Merkezine hizmet verecek olan Cihanbeyli Atıksu Arıtma Tesisi, Derebucak İlçe Merkezine hizmet verecek olan Derebucak Atıksu Arıtma Tesisi, Cihanbeyli İlçesi Yeniceoba, Bulduk, Kütükuşağı ve Kuşca Mahallelerine hizmet verecek olan Yeniceoba Atıksu Arıtma Tesisi, Karapınar İlçesi Hotamış ve İslik Mahallelerine hizmet verecek olan Hotamış Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projeleri hazırlanması işi için 21.10.2015 tarihinde ihale yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

İşin Adı	Cihanbeyli, Derebucak, Yeniceoba, Hotamış AAT Uygulama Projesi Hazırlama İşi
İşe Başlama Tarihi	24.11.2015
Sözleşme Bedeli	182.000,00 TL
Yüklenici Firma	Arbiotek Çevre Çözümleri Arge Çevre Lab.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti
İşin Süresi	180 Gün

Tablo 15. Cihanbeyli-Derebucak-Yeniceoba-Hotamış Atıksu Arıtma Tesisleri proje ihalesi bilgileri

Tesis Adı	Nüfus (kişi)	Debi (m3/gün)	Proses Tipi
Cihanbeyli	25.550	4.500	İleri Biyolojik
Derebucak	2.878	400	İleri Biyolojik
Yeniceoba	14.430	1.800	İleri Biyolojik
Hotamış	4.233	400	Biyolojik

Tablo 16. Cihanbeyli-Derebucak-Yeniceoba-Hotamış Atıksu Arıtma Tesisleri proje bilgileri

• Çamlık Atıksu Arıtma Tesisi

Çamlık Belde Belediyesi tarafından yaptırılan Çamlık atıksu arıtma tesisi 31.03.2014 tarihinden itibaren kanun gereği Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanına girmiştir. Çamlık mahallesinden kaynaklanan atıksuların arıtımı ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde yapılmaktadır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

Tesis Adı	Nüfus (kişi)	Debi (m3/gün)	Proses Tipi
Çamlık	2.000	300	İleri Biyolojik

Tablo 17. Çamlık Atıksu Arıtma Tesisi bilgileri



Şekil 8. Çamlık Atıksu Arıtma Tesisi

• Ereğli Atıksu Arıtma Tesisi

6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra hizmet alanımıza giren Ereğli Atıksu Arıtma Tesisinin bugüne kadar herhangi bir bakım ve temizlik çalışması yapılmadığından dolayı tesis verimli bir şekilde işletilememiştir. 2015 yılında tarafımızca yapılan bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında 2 adet anaerobik stabilizasyon havuzlarından 139.682 m3 hacimli bir tanesi boşaltılmış olup, çamur temizliği tamamlanarak tesisin işletilmesine devam edilmiştir. 18.050 ton çamur tesisten uzaklaştırılmıştır.



Şekil 9. Ereğli Atıksu Arıtma Tesisi

İşin Adı	Ereğli Atıksu Arıtma Tesisi Anaerobik havuz çamur temizliği işi
İşe Başlama Tarihi	10.09.2015
Sözleşme Bedeli	36.000 TL
Yüklenici Firma	Levent İnş. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti
İşin Süresi	20 Gün

Tablo 18. Ereğli Atıksu Arıtma Tesisi havuz temizliği ihale bilgileri

• Gökpınar Atıksu Arıtma Tesisi

İlbank A.Ş. tarafından yaptırılan, Gökpınar mahallesindeki toplam 3.800 kişiye hizmet verecek olan 1.1 m³ /gün kapasiteli tesisin kuru kabulü 11.09.2015 tarihinde yapılmıştır. 2015 yılı içerisinde İlbank kontrolünde işletmeye alınmıştır. 2015 yılı içerisinde tesisin işletme kontrollüğü İlbank A.Ş. ile ortak yürütülmektedir. Yüklenici zorunlu 1 yıllık işletme süresi sonunda tesisin işletilmesi tarafımızca yapılacaktır.

Tesis Adı	Nüfus (kişi)	Debi (m3/gün)	Proses Tipi
Gökpınar	3.800	1.000	İleri Biyolojik

Tablo 19. Gökpınar Atıksu Arıtma Tesisi bilgileri



Şekil 10. Gökpınar Atıksu Arıtma Tesisi

• Gölyazı ve Tuzyaka Atıksu Arıtma Tesisleri

Cihanbeyli İlçesi Gölyazı Mahallesi ve Kulu İlçesi Tuzyaka Mahallesinden kaynaklanan atıksuların arıtılması için İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projeleri için ihaleler yapılmış ve proje çalışmaları tamamlanmıştır. ÖÇK alanında bulunan bu yerlere kurulacak olan ileri biyolojik prosesli atıksu arıtma tesisleri ile tuz gölü ve çevresinde oluşacak kirliliğin önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.

İşe Başlama Tarihi	16.10.2015
Sözleşme Bedeli	25.000,00 TL
Yüklenici Firma	Sartes Müh.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti
İşin Süresi	45 Gün


Tablo 20. Gölyazı ve Tuzyaka Atıksu Arıtma Tesisleri proje ihalesi bilgileri

Tesis Adı	Nüfus (kişi)	Debi (m3/gün)	Proses Tipi
Gölyazı	4.100	400	İleri Biyolojik
Tuzyaka	3.700	400	İleri Biyolojik

Tablo 21. Gölyazı ve Tuzyaka Atıksu Arıtma Tesisleri proje bilgileri

• Güneysınır Atıksu Arıtma Tesisi

Bakım, tadilat çalışmaları kapsamında Güneysınır Atıksu Arıtma Tesisinde elektrik panoları tamir edilmiş ve anaerobik anaerobik havuzlardan 1 tanesi boşaltılarak içerisindeki çamur temizliği Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce tamamlanarak tesisin işletilmesine devam edilmektedir.

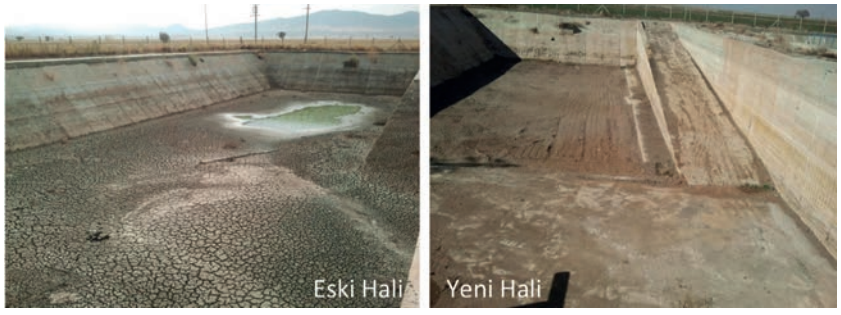

Şekil 11. Güneysınır Atıksu Arıtma Tesisi

• Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi

Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi stabilizasyon havuzu olarak 1980 tarihinde işletmeye alınmıştır. 2 adet stabilizasyon havuzu mevcuttur. Tesisin havuzlarının çamur temizliği en son 2000 yılında yapılmış olup, 2004 yılından itibaren tesis havuzlarda biriken çamurlar temizlenmediğinden atıl durumda kalmıştır. Havuzların temizliği tamamlanmıştır. 48.500 TL harcama yapılmıştır. Toplam 10.980 ton çamur tesisten uzaklaştırılmıştır.

İşin Adı	Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi Anaerobik havuz çamur temizliği işi
İşe Başlama Tarihi	16.10.2015
Sözleşme Bedeli	48.500 TL
Yüklenici Firma	Levent İnş. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti
İşin Süresi	20 Gün

Tablo 22. Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi çamur temizliği işi ihale bilgileri



Şekil 12. Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi

• Kulu Atıksu Arıtma Tesisi

Tuz Gölü havzasında bulunan Kulu Atıksu Arıtma Tesisi hasas alanların korunması amacıyla Bakanlık tarafından 1 aylık periyotlarda izlenmektedir. Bu kapsamda her ay tesis giriş ve çıkış suyundan 24 saatlik kompozit numune akredite laboratuvar tarafından İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü gözetiminde alınmaktadır. Ayrıca alıcı ortama deşarj öncesi ve sonrası belirlenen noktalardan anlık numuneler alınmaktadır. 2015 yılı içerisinde 2.234.895 m3 atıksu arıtımı gerçekleştirilen tesis ileri biyolojik tip atıksu arıtma tesisidir.

Tesis Adı	Nüfus (kişi)	Debi (m3/gün)	Proses Tipi
Kulu	53.800	15.000	İleri Biyolojik

Tablo 23. Kulu Atıksu Arıtma Tesisi bilgileri

Kulu Atıksu Arıtma Tesisine ait 2015 yılı verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Parametre	Giriş	Çıkış	Verim (%)	Standart
AKM (mg/l)	140	10	93	35
KOİ (mg/l)	300	18	94	125
BOİ (mg/l)	170	8	95	25
TN (mg/l)	49	13	73	15
TP (mg/l)	5	1,8	64	2

Tablo 24. Kulu Atıksu Arıtma Tesisi giriş ve çıkış suyu kalitesi



Şekil 13. Kulu Atıksu Arıtma Tesisi

• Ortakaraören-Akkise Atıksu Arıtma Tesisi

Ahırlı, Yalıhüyük İlçeleri ile Ortakaraören ve Akkise mahallerinden kaynaklanan atıksuların arıtılması için ileri biyolojik AAT proje ihalesi yapılmış ve proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım ihalesi 29.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen tesisin, 01.09.2015 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, harfiyat işleri, havuz kazıları, temel betonları, AAT sahasına ulaşım yolu ile havuz perdeleri tamamlanmıştır. Tesiste kullanılacak ekipmanların onayı verilmiş olup, temin süreci başlamıştır.

Eşdeğer Nüfus	10.000 kişi
Debi	1.000 m3/gün
Arıtma Tipi	İleri Biyolojik
İşin Adı	Ortakaraören-Akkise Ortak Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
İşe Başlama Tarihi	01.09.2015
Sözleşme Bedeli	1.375.000,00TL
Yüklenici Firma	STS Arıtma Sistemleri Ahmet SARAL
İşin Süresi	300 Gün

Tablo 25. Ortakaraören-Akkise Atıksu Arıtma Tesisi ihale bilgileri



Şekil 14. Ortakaraören-Akkise Atıksu Arıtma Tesisi

• Sarayönü, Hüyük ve Derbent Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

Sarayönü İlçe Merkezi ile Ladik, Kurşunlu ve Ertuğrul Mahallelerine hizmet verecek olan Sarayönü Atıksu Arıtma Tesisi, Derbent İlçe Merkezine hizmet verecek olan Derbent Atıksu Arıtma Tesisi, Hüyük İlçe Merkezi ile Mutlu, İlmen, Çavuş, Pınarbaşı ve Suludere Mahallelerine hizmet verecek olan Hüyük Atıksu Arıtma Tesisinin uygulama projeleri hazırlanması işi için 06.03.2015 tarihinde ihale yapılmış olup, projeler tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan proje onayı alınmıştır.

İşin Adı	Sarayönü-Derbent-Hüyük AAT Uygulama Projesi Hazırlama İşi
İşe Başlama Tarihi	08.04.2015
Sözleşme Bedeli	123.350,00 TL
Yüklenici Firma	Mena Yapı Tas.ve Tic.Ltd.Şti
İşin Süresi	100 Gün

Tablo 26. Sarayönü, Hüyük ve Derbent Atıksu Arıtma Tesisleri proje hazırlama ihalesi bilgileri

Tesis Adı	Nüfus (kişi)	Debi (m3/gün)	Proses Tipi
Sarayönü	18.534	5.952	İleri Biyolojik
Hüyük	7.428	1.000	İleri Biyolojik
Derbent	2.633	400	İleri Biyolojik

Tablo 27. Sarayönü, Hüyük ve Derbent Atıksu Arıtma Tesisleri proje bilgileri

Hüyük Atıksu Arıtma tesisinin SUKAP kapsamında yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi için İlbank A.Ş."ye projeler ve diğer dökümanlar teslim edilmiştir. İlbank A.Ş. tarafından da onaylanan projenin yapım ihalesi 2016 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır. Sarayönü ve Derbent Atıksu Arıtma Tesislerinin yapım ihaleleri ise 2016 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

• Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi

Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Seydişehir Su ve Atıksu Projesi" için 14.04.2014 tarihinde kurulan "Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı Yapım İşi Değerlendirme Komitesi"ne Genel Müdürlüğümüzce 2 asil 1 yedek üye görevlendirilmesi yapılmıştır. 21.04.2014 tarihinde yapım işleri sözleşmesi imzalandı. 25.12.2014 tarihinde ise operasyonel antlaşma imzalandı ve proje uygulama biriminde görev alacak kişiler Genel Müdürlüğümüzce belirlenerek bildirilmiştir. Proje bedeli 4.578.000 Euro olup %85"i AB tarafından geri kalanı ise yerel kaynaklardan karşılanacaktır. Yüklenici ve müşavir firmalara 23.02.2015 tarihinde yapılan yer teslimi ile çalışmalar başlamıştır. İşin yapım süresi 610 gün olup, tesisin yapımının bu süre içerisinde tamamlanması planlanmıştır.

Debi	10.248 m3/gün
Hizmet verilecek bölgeler	Seydişehir
Sözleşme bedeli	4.578.000 €
Müşavir firma	EGIS-WYG-TEMPO
Yüklenici Firma	MPE Mühendislik İnşaat Taahhüt Ve Dış Ticaret A.Ş.
İşin süresi	610 gün
İşe başlama tarihi	23.02.2015

Tablo 28. Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi bilgileri



Şekil 15. Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi

2015 yılı içerisinde yüklenici tarafından sunulan projeler Bakanlık, Genel Müdürlüğümüz ve müşavir firma tarafından incelenerek gerekli onaylar verilmiştir. Proje kapsamında; idari ve atölye binaları, terfi istasyonu, Bio-P tankı, havalandırma havuzları, son çökeltme ünitelerinin kazı ve betonarme imalatları büyük ölçüde tamamlanmıştır. başlanılmış ve iş kapsamında bulunan 7.500 m'lik ana kollektör hattı inşaatının %30"u tamamlanmıştır. Tesiste kullanılacak mekanik ekipmanlarının bir kısmına onay verilmiştir. Malzeme temin sipariş işleri devam etmekte olup, işin yaklaşık % 18'i tamamlanmıştır.

• Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi

Konya kentinin içme suyu kaynağı olan Altınapa barajını korumak için yapılan ve Tepekent mahallesinden kaynaklanan atıksuların arıtımı ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde yapılmaktadır. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

Tesis Adı	Nüfus (kişi)	Debi (m3/gün)	Proses Tipi
Tepekent	5.000	300	İleri Biyolojik

Tablo 29. Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi bilgileri



Şekil 16. Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi

• Tuzlukçu Atıksu Arıtma Tesisi

İller Bankası 6. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen Tuzlukçu biyolojik AAT"nin yapımı tamamlanarak 02.09.2014 tarihinden itibaren tarafımıza teslim edilmiştir. Bu tarihten itibaren tesisin işletilmesi tarafımızca yapılmaktadır.

Tesis Adı	Nüfus (kişi)	Debi (m3/gün)	Proses Tipi
Tuzlukçu	8.543	550	İleri Biyolojik

Tablo 30. Tuzlukçu Atıksu Arıtma Tesisi bilgileri



Şekil 17. Tuzlukçu Atıksu Arıtma Tesisi

• Yunak Atıksu Arıtma Tesisi

İlbank A.Ş. tarafından yaptırılan , Yunak İlçe merkezinde 23.110 kişiye hizmet verecek olan 1.950 m3/gün kapasiteli tesisin 17.06.2015 tarihinde KOSKİ ve İlbank A.Ş. personeli ile birlikte geçici kabulü yapılmıştır. Tesisin işletme kontrollüğü İlbank A.Ş. ile Genel Müdürlüğümüz tarafından ortak yürütülmektedir. Yüklenici zorunlu 1 yıllık işletme süresi sonunda tesisin işletilmesi tarafımızca yapılacaktır.

İşin Adı	Yunak Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
İhale Tarihi	10.09.2013
İşe Başlama Tarihi	21.10.2013
Sözleşme Bedeli	7.074.175 TL
Yüklenici Firma	Esen İnşaat
İşin Süresi	605 Gün
Kuru kabul tarihi	17.06.2015

Tablo 31. Yunak Atıksu Arıtma Tesisi bilgileri



Şekil 18. Yunak Atıksu Arıtma Tesisi

• Zengen Atıksu Arıtma Tesisi

Ereğli İlçesi Zengen mahallesinden kaynaklanan atıksuların arıtılması için Paket AAT proje ihalesi yapılmış ve proje çalışmaları tamamlanmıştır. Küçük Zengen'e kurulacak mobil terfi istasyonu ile bölgede oluşan atıksular Büyük Zengen'e kurulacak atıksu arıtma tesisine iletilecektir. Arıtılan atıksuların deşarj edilecek alıcı ortam olmadığından dolayı arıtılmış atıksuların depolanması için lagünler projelendirilmiştir. Yapım ihalesi 11.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen Zengen atıksu arıtma tesisinin yer teslimi 09.12.2015 tarihinde yapılmıştır. İçme suyu hattı, enerji nakil hattı yapım işleri tamamlanmış, ekipman onayları verilmiştir. 2016 yılı içerisinde yapım işleri tamamlanarak tesisin işletmeye alınması planlanmaktadır.

İşin Adı	Zengen Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi Hazırlama İşi
İşe Başlama Tarihi	03.07.2015
Sözleşme Bedeli	30.900,00 TL
Yüklenici Firma	Arbiotek Çevre Çözümleri Arge Çevre Lab.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti
İşin Süresi	30 Gün

Tablo 32. Zengen Atıksu Arıtma Tesisi proje ihalesi bilgileri

Eşdeğer Nüfus	2.000 kişi
Debi	400 m3/gün
Arıtma Tipi	Paket Arıtma
İşin Adı	Zengen Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
İşe Başlama Tarihi	25.03.2015
Sözleşme Bedeli	544.000,00TL
Yüklenici Firma	Armasan Arıtma Mad.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.
İşin Süresi	210 Gün

Tablo 33. Zengen Atıksu Arıtma Tesisi yapım ihalesi bilgileri

• Zincirlikuyu Atıksu Arıtma Tesisi

Zincirlikuyu Belde Belediyesi tarafından yaptırılan Zincirlikuyu atıksu arıtma tesisi 31.03.2014 tarihinden itibaren kanun gereği Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanına girmiştir. Zincirlikuyu mahallesinden kaynaklanan atıksuların arıtımı Yapay Sulak Alan metodu ile gerçekleştirilmektedir. Tesisin ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlarda işletilmesine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.



Şekil 19. Zincirlikuyu Atıksu Arıtma Tesisi

• TERFİ MERKEZLERİ

6360 sayılı Kanun ile Genel Müdürlüğümüz sorumluluğuna geçen 48 adet terfi merkezi için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kapsamında gerekli önlemler alınarak bakım ve tadilatları gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde meydana gelen mekaniksel ve elektriksel arızalara ekiplerimiz tarafından en kısa sürede müdahale edilerek arızalar giderilmiştir. 2015 yılı içerisinde terfi merkezlerinde oluşan toplam 82 arızaya müdahale edilmiştir.

Sıra No	Bulunduğu İlçe	Tesis Adı
1	Akşehir	Akşehir Atakent Atıksu Terfi Merkezi
2	Akşehir	Akşehir TM-1 Atıksu Terfi Merkezi
3	Akşehir	Akşehir TM-2 Atıksu Terfi Merkezi
4	Akşehir	Akşehir TM-3 (hastane) Atıksu Terfi Merkezi
5	Cihanbeyli	Kuşça TM-1 Atıksu Terfi Merkezi
6	Cihanbeyli	Yeniceoba Atıksu Terfi Merkezi
7	Cihanbeyli	Tavşançalı Atıksu Terfi Merkezi
8	Çumra	Çumra TM-1 Atıksu Terfi Merkezi
9	Çumra	Çumra TM-2 Atıksu Terfi Merkezi
10	Çumra	Çumra TM-3 Atıksu Terfi Merkezi
11	Çumra	Çumra TM-4 Atıksu Terfi Merkezi
12	Çumra	İçeriçumra TM-5 Atıksu Terfi Merkezi
13	Çumra	Çumra TM-6 Atıksu Terfi Merkezi
14	Çumra	Alibeyhüyüğü Atıksu Terfi Merkezi

Sıra No	Bulunduğu İlçe	Tesis Adı
15	Çumra	Okçu Atıksu Terfi Merkezi
16	Çumra	Güvercinlik-1 Atıksu Terfi Merkezi
17	Çumra	Güvercinlik-2 Atıksu Terfi Merkezi
18	Çumra	Karkın TM-1 Atıksu Terfi Merkezi
19	Çumra	Karkın TM-2 Atıksu Terfi Merkezi
20	Çumra	Karkın TM-3 Atıksu Terfi Merkezi
21	Çumra	Yenisu Atıksu Terfi Merkezi
22	Ereğli	Kutören Atıksu Terfi Merkezi
23	Ereğli	Belkaya Mobil Atıksu Terfi Merkezi
24	Ereğli	Hortu Atıksu Terfi Merkezi
25	Ereğli	Ereğli Namık Kemal Atıksu Terfi Merkezi
26	Ereğli	Zengen Atıksu Terfi Merkezi
27	Kadınhanı	Kadınhanı TM-1 Atıksu Terfi Merkezi
28	Kadınhanı	Kolukısa Atıksu Terfi Merkezi
29	Karapınar	Karapınar Atıksu Terfi Merkezi
30	Karapınar	Yeşilyurt Atıksu Terfi Merkezi
31	Karapınar	İslik Mobil Atıksu Terfi Merkezi
32	Karapınar	Hotamış Mobil Atıksu Terfi Merkezi
33	Karatay	TM1 Atıksu Terfi Merkezi
34	Karatay	Ovakavağı Atıksu Terfi Merkezi
35	Karatay	İsmil Atıksu Terfi Merkezi
36	Karatay	Tüyap Atıksu Terfi Merkezi
37	Kulu	Zincirlikuyu TM-1 Atıksu Terfi Merkezi
38	Kulu	Zincirlikuyu TM-2 Atıksu Terfi Merkezi
39	Kulu	Kulu Atıksu Terfi Merkezi
40	Kulu	Beşkardeş Atıksu Terfi Merkezi
41	Meram	Karadiğin TM-1 Atıksu Terfi Merkezi
42	Meram	Karadiğin TM-2 Atıksu Terfi Merkezi
43	Meram	Karadiğin TM-3 Atıksu Terfi Merkezi
44	Meram	Çayırbağı Atıksu Terfi Merkezi
45	Sarayönü	Gözlü Atıksu Terfi Merkezi
46	Selçuklu	Küçükmuhsine Atıksu Terfi Merkezi
47	Selçuklu	Güvenç Atıksu Terfi Merkezi
48	Selçuklu	KOP Atıksu Terfi Merkezi

Tablo 34.Terfi merkezleri listesi

• Terfi merkezlerine Tabela ve Telçit Yaptırılması

İSG kurallarına uygun olmayan terfi merkezlerinin ilgili yönetmeliklere uygun güvenlik tedbirlerinin sağlanması için 31 adet terfi merkezine tabela ve uyarı levhası ile 9 adet terfi merkezine ve 1 adet yapay sulak alana telçit ve kapı yaptırılmıştır.

İşin Adı	Terfi merkezlerine telçit ve kapı yaptırılması işi
İşe Başlama Tarihi	18.08.2015
Sözleşme Bedeli	29.044 TL
Yüklenici Firma	Levent İnş. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti
İşin Süresi	60 Gün

Tablo 35. Terfi merkezlerine telçit ve kapı yapılması işi ihale bilgileri

Telçit yaptırılan tesislerin listesi aşağıda verilmiştir.

Sıra No	İlçesi	Mahallesi
1	Akşehir	Merkez
2	Akşehir	Atakent
3	Cihanbeyli	Yeniceoba
4	Cihanbeyli	Kuşca
5	Çumra	İçeri Çumra
6	Çumra	Alibeyhüyüğü
7	Ilgın	Kapaklı (YSA)
8	Kadınhanı	Kolukısa
9	Kulu	Tavşançalı
10	Kulu	Zincirlikuyu/Adalı Mahallesi
11	Kulu	Zincirlikuyu/ Yunak Mahallesi

Tablo 36. Telçit yapılan terfi merkezleri listesi

İşin Adı	Terfi merkezlerine tabela ve uyarı levhası yaptırılması işi
İşe Başlama Tarihi	26.09.2015
Sözleşme Bedeli	13.955 TL
Yüklenici Firma	Çınar Medya Dijital Baskı Turizm Organizasyon Ve Reklam Ltd. Şti.
İşin Süresi	45 gün

Tablo 37. Terfi merkezlerine tabela ve uyarı levhası yapılması işi ihale bilgileri

Tabela ve uyarı levhası yaptırılan tesislerin listesi aşağıdadır.

Sıra No	İlçesi	Mahallesi	Tanıtım Levhası	Uyarı Levhası
1	Akşehir	Akşehir Atakent Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	-
2	Akşehir	Akşehir TM-1 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
3	Akşehir	Akşehir TM-2 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	-
4	Cihanbeyli	Kuşça TM-1 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	-
5	Cihanbeyli	Yeniceoba Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	-
6	Cihanbeyli	Zincirlikuyu TM-1 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	-
7	Cihanbeyli	Zincirlikuyu TM-2 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	-
8	Cihanbeyli	Tavşançalı Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	-
9	Çumra	Çumra TM-1 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
10	Çumra	Çumra TM-2 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
11	Çumra	Çumra TM-3 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
12	Çumra	Çumra TM-4 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
13	Çumra	İçeriçumra TM-5 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	-
14	Çumra	Çumra TM-6 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
15	Çumra	Alibeyhüyüğü Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	-
16	Çumra	Okçu Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
17	Çumra	Güvercinlik-1 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
18	Çumra	Güvercinlik-2 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
19	Ereğli	Kutören Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
20	Ereğli	Belkaya Mobil Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
21	Ereğli	Hortu Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
22	Kadınhanı	Kadınhanı TM-1 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	-
23	Kadınhanı	Kolukısa Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	-
24	Karapınar	Karapınar Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
25	Karapınar	Yeşilyurt Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
26	Karapınar	İslik Mobil Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
27	Karapınar	Hotamış Mobil Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
28	Karatay	TM1 Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
29	Kulu	Kulu Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
30	Kulu	Beşkardeş Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
31	Selçuklu	Küçükmuhsine Atıksu Terfi Merkezi	1 Adet	4 Adet
TOPLAM			31 Adet	80 Adet

Tablo 36. Telçit yapılan terfi merkezleri listesi



Şekil 20. Terfi Merkezleri

• BAKIM VE TADİLATI YAPILACAK OLAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra hizmet alanımıza giren fakat gerekli bakım ve tadilat işleri yapılmadığından dolayı işletilemeyen AAT‟lerin devreye alınması çalışmalarına başlanılmıştır. Bu kapsamda 67 adet AAT‟nin bakım ve tadilat işlerine yönelik teknik şartnamelerin hazırlanmıştır. I.Etap çalışmaları kapsamında 13 adet Yapay Sulak Alan Prosesli Atıksu Arıtma Tesislerinin (Altınekin İlçesi, Ilgın İlçesi Avdan, Bulcuk, Büyükoba, Çobankaya, Kapaklı, Kadınhanı İlçesi Çavdar, Kökez, Meydanlı, Kulu İlçesi Zincirlikuyu, Cihanbeyli İlçesi Günyüzü ve Seydişehir İlçesi Kuran, Gökçehüyük) bakım ve onarımı için ihale çalışmalarının son aşamasına gelinmiştir. Bu tesislerin 2016 yılı içerisinde bakım ve onarım ihalesinin yapılarak çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.

• LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Müdürlüğümüz tarafından işletilen atıksu arıtma tesislerinin daha verimli işletilmesi amacıyla tesislerden periyodik numuneler alınarak Müdürlüğümüze bağlı atıksu laboratuvarında analizleri yapılmaktadır.

Atıksuda bulunan ağır metal analizlerinin yapılması için ICP cihazı temin edilmiş ve analizler yapılmaya başlanmıştır.

Atıksu laboratuvarında fiziksel (AKM, TKM, UKM, SKM, Sıcaklık), kimyasal (KOİ, TN, TP, NO3- N, NH4-N) ve bakteriyolojik (BOİ, Fekal koliform tayini, Toplam Koliform tayini, mikroskobik inceleme) analizler yapılmaktadır. 2015 yılı içerisinde laboratuvarda Konya Atıksu Arıtma Tesisinden alınan numuneler için 37.272 adet ve ilçe ve mahallelerde bulunan atıksu arıtma tesislerinden alınan numuneler için ise 2.044 adet olmak üzere toplam 39.316 adet analiz gerçekleştirilmiştir.



İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



• Çalışanların maaşları her ay düzenli bir şekilde tahakkuk yapılarak, ödemelerin yapılması için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmiş, ayrıca personele bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmiş ve maaş bordroları web ortamında yayınlanmıştır.



• Doğum, ölüm ve evlenme yardımı almaya hak kazanan personelin tahakkuk işlemleri yapılarak, ödemelerin yapılabilmesi için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
• İşçi ikramiyelerinin tahakkuku yapılarak, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ödenmesi sağlanmıştır.
• İcra Dairelerince, haklarında icra takibi başlatılan personelin icra takip işlemleri yapılmış, ilgili dosyalarına ödenmesi için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
• 2015 yılı içerisinde üst öğrenim bitiren memurların intibakları yapılmıştır.
• Sendika üyesi memur ve işçilere ait listeler ilgili mercilere gönderilmiştir.



• Memur personelin yan ödeme, özel hizmet tazminatı ile ilgili cetveller ilgili mevzuat gereği tanzim edilmiş ve Valilik Makamından onay alınarak, yürürlüğe konulmuştur.
• Memur statüsünde çalışan personelin yıllık terfi işlemleri yapılmış, mevzuat gereği kesilen emeklilik kurum karşılığı, şahıs emekli keseneği, artış keseneği, geçmiş hizmet borçlanma kesenekleri kesilip Kesenek Bilgi Sistemine işlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu"na gönderilmiştir.
• Memur personelin 2015 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu (HİTAP) hizmet takip programına hizmet ve terfi bilgileri girilmiştir.
• Memurların nakil işlemleri yapılmış, İşe Giriş Bildirgeleri Kamu Görevlileri Sigortalı Tescil Girişi sistemine girilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiştir.
• Yurtiçi ve yurtdışı geçici göreve giden personelin harcırah tahakkuku yapılarak ilgililere ödenmesi için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
• Çalışanların mesai takipleri yapılmıştır.
• Çalışanların yıllık ve diğer sosyal izinleri ile ilgili işlemler yapılmıştır.
• Memur ve işçilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, 2015 yılında verilmesi gerekli mal ve aile beyannameleri alınmıştır.
• 2015 yılında Hizmet Alım İhalesi İşinin hak edişleri, her ay düzenlenmiş ve bu işlerde çalışan firma elemanlarının özlük, ücret ve sosyal haklarının takibi yapılmıştır.
• 2016 yılı için 875 kişilik Hizmet Alım İhalesi yapılmıştır.
• Türkiye İstatistik Kurumuna ait İşgücü ve Sanayi istihdam anketleri düzenlenerek gönderilmiştir.
• 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesine göre "Tam Zamanlı Sözleşmeli" statüde çalışmak üzere 4 adet Sözleşmeli personelin işlemleri yapılmıştır.
• Emekliliği gelen memur ve işçilerin emeklilik işlemleri yapılmış, kıdem tazminatı tahakkuku yapılarak ilgililere ödenmesi için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
• 2015 yılı sonu itibariyle İdaremizde 493 memur, 479 işçi, 4 sözleşmeli personel ve 993 firma personeli çalışmaktadır.

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ :

•KOSKİ Genel Kurulunun mutat toplantıları için gerekli ilanlar, yasal yöntemler ve İdaremizin web sayfası aracılığı ile yapılmış, ayrıca toplantı günü ve gündem konuları Genel Kurul Üyelerine cep telefonu mesajı (SMS) ve e-mail ile tebliğ edilmiştir..



• 2015 yılında KOSKİ Genel Kuruluyla ilgili Genel Kuruldan komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için komisyonun toplanması organize edilmiş, komisyondan çıkan raporların Genel Kurul Toplantısında görüşülmesi sağlanmıştır.



• KOSKİ Genel Kurulunda, toplam 13 adet Genel Kurul kararı alınmıştır. Alınan kararlar ilgili birimlere intikali sağlanmıştır.

• Genel Kurul görüşmelerinde ve komisyonda alınan kararlar ile, Genel Kurul Karar Özetleri Web sayfamızda ilan edilmiştir.



• Yönetim Kurulunun görüşeceği konularla ilgili gündemler hazırlanarak, Yönetim Kurulu üyelerine duyurusu yapılmış, 2015 yılında Yönetim Kurulumuzda 232 adet karar alınmış ve alının kararların ilgili birimlere intikali sağlanmıştır.



• Muhtelif konularda, 37 adet tamim yayınlanmıştır.
• Genel Müdürlüğümüzün muhtelif birimlerine ait 47 adet ihale dosyası teslim alınmış, ihale saatinde ihale komisyonlarına teslim edilmiştir.
• Dışarıdan gelen 9.514 adet evrakın kaydı yapılmış ve ilgili birimlere intikali sağlanmıştır.
• Çalışanlara ait gelen postalardan uygun olanlar birimimizce teslim alınarak, ilgililere ulaşması sağlanmıştır.
• 6427 adet giden evrak çıkışı yapılmış, bazıları postaya verilerek bazıları da gerekli yerlere zimmetle bizzat teslim edilmiştir.

EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:

• Su Tasarrufu konusunda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla 2007 yılında başlatılan çalışmalara 2015 yılı içinde de devam edilmiş, düzenlenen programlarla 1404 öğrenciye eğitim verilmiştir.



• Suyun önemine dikkat çekmek ve su kullanımında bilinçli davranmak amacıyla yürütülen KOSKİ Bayrağı projesi kapsamında başvuru yapan okullar arasında başarılı olan 11 okula KOSKİ Bayrağı verilmiştir. KOSKİ Bayrağı alan okul sayısı 44'e yükselmiştir.



• Çalışanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kurum kütüphanesine 450 adet güncel ve aktüel nitelikte kitap alınmıştır. Bu sayede personelin kütüphaneden daha fazla yararlanması sağlanmıştır.
• Aylık periyotlar halinde giriş kattaki tanıtım standında güncel ve aktüel nitelikte kitaplar teşhir edilmiştir.



• Ortaöğretim ve üniversiteden 194 öğrenciye, iş hayatına hazırlamak amacıyla Kurumumuzda yaz stajı yapma imkânı sağlanmıştır.
• Çalışanlarımızın dayanışma, kaynaşma ve motivasyonunu artırmak amacıyla Tropikal Kelebek Bahçesi ve Bilim Merkezi"ne gezi programı düzenlenmiştir.



• 2015 Yılı içerisinde, Mevzuat Eğitimi, Kişisel Gelişim Eğitimi, Teknik Eğitimi ve Yönetim Eğitimi olmak üzere 34 adet hizmet içi eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimler ana başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir.







2015 Yılı İçerisinde Yapılan Eğitim Konu Başlıkları :

- TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (Temel)
- İş Makinaları Operatörlüğü (Vinç)
- İş Makineleri Operatörlüğü (Bekoloder)
- OG, AG Pano Motor Bağlantısı
- TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (İç Tetkik)
- Çevre Görevlisi (Vize)
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi
- Endeks Okuma ve Tahakkuk İşleri
- İş Makinaları Operatörlüğü (Forklift)
- KYS Uygulamaları Bilgilendirme
- Kamu İç Denetçileri
- Gemi Sevk ve İdare
- Yangın Eğitimi ve Tatbikatı
- İlkyardım- Kişisel Koruyucuların Kullanımı- Özsaygı- İletişim
- Afet ve Acil Durum
- İş Sağlığı ve Güvenliği (merkez 1)
- EKAT Temel
- Kanalizasyon ve Pompa İstasyonlarında Biriken Gazlara Karşı Alınacak Tedbirler
- Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi
- Takım Çalışması ve Motivasyon
- Stres Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Bölgeler)
- Empati
- Etkin Dinleme ve Anlama
- Kurumsal İşleyiş ve Bilgilendirme
- TS EN ISO/IEC 17025 İç Denetçi
- Zorlu Müşterilerle Başa Çıkma
- Diksiyon
- İş Sağlığı ve Güvenliği (merkez 2)
- Başarılı İtiraz Karşılama Yöntemleri
- TS EN ISO/IEC 17025 Standardı
- Hijyen
- Görgü Kuralları
- Netcad



HUKUK

MÜŞAVİRLİĞİ

• Müşavirliğimize 888 adet evrak gelmiş olup, bunun 698 adedinin davalarla ve icralarla ilgili olduğu anlaşılmıştır. Evrak kayıt defterine kayıtlı 190 adet evrakın ise, diğer yazışmalar ve mütalaalarla ilgisi olduğu tespit edilmiştir.

• Müşavirliğimizden 237 adet evrak çıkarılmış olup, bunların 153 adedinin davalar ve icralarla, 84 adedinin de diğer yazışma ve mütalaalarla ilgisi olduğu tespit edilmiştir.

• 1 Kasım – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında 341 adet icra takibi yapılmıştır. Toplam 1450 adet aktif icra dosyası mevcuttur (Merkez ilçelerdeki dosyalardır).

• 33 adedi idareye, 164 adedi de idareden olmak üzere, toplam 197 adet dava ikame edilmiştir.

• 122 adet suç duyurusu evrakı hazırlanarak savcılık işlemi gerçekleştirilmiştir.

Geçmiş yıllardan gelenlerle birlikte 2015 yılı içerisinde açılmış olan davalardan 46 adedi aleyhe, 137 adedi lehe olmak üzere toplam 183 adet dava neticelenmiştir. 138 adedi temyiz aşamasında olmak üzere 294 adet dosya derdest bulunmaktadır. Kesinleşmiş olup da işi biten dosyalar, hıfza kaldırılmıştır.

• 2015 yılı içerisinde icra dosyalarından 63.206,81-TL,

• 6552 sayılı Kanun gereğince yapılandırma kapsamında 134.445,53.-TL,

• İcra takibi yapılmadan 20.534,47.-TL,

• Yeni katılan ilçe ve mahallelerden idaremize devredilen aktif icra dosyalarından 111.836,02.-TL,

Olmak üzere toplam 330.022,83.-TL tahsil edilmiş ve idaremiz veznelerine yatırılmıştır.



MALİ HİZMETLER

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bağlı bulunduğumuz 5018 sayılı yasanın amir hükümleri doğrultusunda bütçemizin tespit edilen değerleri üzerinden gelir ve gider dengesi oluşturulmuş, harcamaların bütçede belirlenen fasıllarına uygun olarak yapılması, gerek görüldüğü zamanlarda yetkiler doğrultusunda fasıllar arasında gerekli aktarmalar yapılmıştır.
İlgili defter ve kayıtlarını tanzim etmek suretiyle idarenin, menkul, gayrimenkul, gelir ve giderlerinin muhasebesi de muntazaman tarafımızdan tutulmuştur.
Malzeme ve hizmet alınan firmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına bunun yanında muhtelif nedenlerle mevzuat gereği ödeme yapılması gereken vatandaşlara ve kurum çalışanlarına gereken ödemeler yapılmıştır.
Yine yıl içerisinde Genel Müdürlüğümüze ait her türlü vergi, resim ve harçlarla, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken prim ve sair kanuni kesintileri zamanında ödenmiş, idari bina ve tesisleri ile taşınmazlarına ait yangın hasar vs. gibi her türlü sigorta işleri de takip edilmiştir.
Günlük tahsilât işlemlerimiz ile ödemelerimiz takip edilmiş ve gerektiği doğrultuda mahsup işlemleri günü gününe yapılmıştır.
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla (18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) genel şart revize edilerek Kamunun hizmetine sunulmuştur.
Genel Müdürlüğümüzden diğer Kamu Kurumlarınca istenen Sayıştay, Hazine Müsteşarlığı ve TÜİK başta olmak üzere aylık ve üçer aylık olarak düzenlenen veri ve mali tablolar ilgili kurumlara gönderilmiştir.
Yıllara ait stratejik plan, performans, faaliyet raporları ve İç Kontrol Eylem Planı hazırlanarak yasal raporlamalar yapılır. Yapılan yasal Raporlamalarımızın bir kısmını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.



İç Kontrol Eylem Planı

Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Kamu İç Kontrol Standartları hakkında Yönetmelik, Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla (18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) genel şart belirlenmiş bulunmaktadır. Kamu İç Kontrol Standartları uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte belirlenmiştir. KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde yayınlanarak uygulamaya konulmuştur.



Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, Maliye Bakanlığından 17/03/2006 Tarihli 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsayan bu yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

KOSKİ Genel Müdürlüğü" de anılan yönetmelik gereği Strateji ve Mali Hizmetler Müdürlüğü"nce hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunu 15/05/2015 tarih ve 5 nolu Genel Kurul kararıyla kabul edildi. 375 sayfadan oluşan Faaliyet Raporu, KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2014 yılındaki tüm faaliyetlerinin özetini oluşturan kapsamlı bir kaynaktır.



2016 Performans Programı

Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Maliye Bakanlığından 05/07/2008 Tarihli 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsayan bu yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

9 uncu Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. KOSKİ Genel Müdürlüğü, anılan yönetmelik gereği Strateji ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü"nce hazırlanan 2016 Performans Programını 14/12/2015 tarihli Genel Kurul kararıyla kabul ederek yürürlüğe koydu. 131 sayfadan oluşan Performans Programı KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2016 yılındaki Performans Hedeflerini ve Kriterlerini ihtiva eder.



2015 – 2019 Stratejik Plan:

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından 26/05/2006 Tarihli 26179 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsayan bu yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

KOSKİ Genel Müdürlüğü" de anılan yönetmelik gereği Strateji ve Mali Hizmetler Müdürlüğü"nce hazırlanan 2015 – 2019 Stratejik Planını 30/09/2014 tarihli Genel Kurul kararıyla kabul ederek yürürlüğe koydu. 64 sayfa ve eklerinden oluşan Stratejik Plan, KOSKİ Genel Müdürlüğünün önümüzdeki 5 yıllık sürecin Planlanması ve Projeksiyonunu içerir

Vezne tahsilâtları:

Daire Başkanlığımıza bağlı Merkez veznemizden tüm tahsilât işlemleri yapılmış olup su tahsilât veznelerimiz de kesintisiz hizmet vermiştir.

Merkez su veznelerimiz, Selçuklu Belediyesindeki veznemiz, Karatay Belediyesindeki veznemiz ve Kayalıpark veznelerimizden su tahsilâtları düzenli olarak yapılmıştır.





Kurum anlaşmalı bankalarla otomatik ödeme talimatı, gişe tahsilatı ve bankaların web sayfaları aracılığıyla su tahsilat işlemlerini gerçekleştirmiştir.

14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile birlikte Kurumumuzun hizmet alanına 28 İlçe, 169 belde ve 579 adet köy bağlanmıştır. Bu kapsamda hizmet kalitesini koruyarak ve müşteri memnuniyeti odaklı; beldeler için 32 adet, ilçeler için 35 adet yeni vezne ile çalışmalarımız sürdürülmüştür.






Bankalarla yapılan sözleşmeler gereği;

ING Bank, Halk Bankası, Tekstilbank, Türk Ekonomi Bankası, Albaraka Türk, Kuveyt Türk, HSBC, Şekerbank, Türkiye Finans, Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Finansbank ile online tahsilatlara başlanmıştır. Bununla beraber; Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank ve Denizbank ile offline olarak tahsilatlara devam edilmektedir.

İnternet üzerinden tahsilât:



www.koski.gov.tr internet sitemizden müşterilerimizin evlerinden ve işyerlerinden yaptıkları fatura borç sorgulama ve ödemeleri rahatlıkla gerçekleştirilmiştir.

PTT tahsilâtları:

Tüm PTT şubelerinden tahsilât işlemleri Online yapılabilmektedir.
SUMAT; Su Faturası Ödemesi Ve Kartlı Sayaç Kontör Dolum Cihazı



Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü abonelerinin daha
rahat hizmet almalarını sağlayacak, su faturası tahsilatı ve elektronik kartlı sayaç dolumu yapabilen, 7 gün 24 saat hizmet veren SUMAT isimli cihazları şehrin 5 ayrı noktasında hizmete aldı.



6 - YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEM

KOSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili izleme ve değerlendirmelerini 3-6-9 ve 12 aylık periyotlarla İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülmek üzere "Yatırım Projeleri çalışma ve iş programı" raporu ve "Yatırımcı kuruluş dönem raporu" şeklinde hazırlamaktadır. Ayrıca yapılan faaliyetler, Genel Müdür başkanlığında her on beş günde bir daire başkanları toplantılarında görüşülmekte ve performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Bütçe rakamlarının gerçekleşmeleri aylık mizanlarla takip edilmekte yılsonunda ise kesin hesap işlemleri olarak kesin mizan hazırlanmakta ve bilânço çıkarılmaktadır. Yıllar ve aylar itibariyle mukayeseler yapılarak süreç takip edilmektedir.

II – AMAÇ VE HEDEFLER

A – İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ (STRATEJİK AMAÇLAR)

2015 – 2019 YILLARI ARASI ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK AMAÇ 1
DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK
STRATEJİK AMAÇ 2
SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.
STRATEJİK AMAÇ 3
SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK.
STRATEJİK AMAÇ 4
SU-ATIKSU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARINI ARTIRMAK.
STRATEJİK AMAÇ 5
PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE MOTİVASYONUNU ARTIRMAK.
STRATEJİK AMAÇ 6
SU VE KANALİZASYON ALTYAPI ŞEBEKELERİNİN TESİSİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ.
STRATEJİK AMAÇ 7
ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI ve SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ.
STRATEJİK AMAÇ 8
MAVİ TÜNELDEN ŞEHRE İÇME SUYUNUN GETİRİLMESİ.
STRATEJİK AMAÇ 9
İÇME SUYU VE KANALİZASYON YATIRIM VE HİZMETLERİNİN SAĞLANMASINDA MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖZETİLECEKTİR.
STRATEJİK AMAÇ 10
6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN HER NOKTADA SU VE KANAL HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ SUNULMASI.

2015 – 2019 YILLARI ARASI ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1	DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK
Stratejik Hedef 1.1	Konya Merkez Kanalizasyon İhtiyacının Karşılanması.
Stratejik Hedef 1.2	2015 Yılından itibaren Konya merkez içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayacak Bağbaşı Barajı ile ileriki yıllarda yine aynı amaçla kullanılacak Bozkır ve Avşar Baraj Havzalarında Koruma Bantları oluşturularak 5 yıl içerisinde gerekli tedbirleri almak.
Stratejik Hedef 1.3	Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon şebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi.
Stratejik Hedef 1.4	Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla hizmet alanımız içerisinde yer alan ilçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması.
Stratejik Hedef 1.5	Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla mahallelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması.
Stratejik Hedef 1.6	Kanalizasyon sistemi birleşik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerinin temizlenmesi.
Stratejik Hedef 1.7	Yeşil alanlarının geri dönüşüm suyu (mor şebeke) ile sulanması.
Stratejik Hedef 1.8	Atıksu arıtma tesisi ,terfi merkezi, fosseptik projelerinin yaptırılması. Çevre sağlığının korunması ve kirliliğin önlenmesi
Stratejik Hedef 1.9	Taşkın kanalı, dere, drenaj kanalları ıslah proje çalışmalarının yapılması Çevre kirliliğinin önlenmesi, park bahçe çalışmaları ve yağmursuyu taşkınlarının önlenmesi
Stratejik Hedef 1.10	Sulama suyu şebeke yapım işi.
Stratejik Hedef 1.11	Yağmur sularını kontrol altına almak için açık kanal yapılması.
Stratejik Hedef 1.12	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması.
Stratejik Hedef 1.13	Konya Merkez, taşra ilçeler ve bağlı mahallelerde bulunan kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği yapmayan ve kullanışlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi.
Stratejik Hedef 1.14	Kurumumuzun artan enerji ihtiyacını karşılamak için en uygun yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak. Kurumun sorumluluk alanında yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılarak en uygun olanlarını tespit ederek bu konuda çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 1.15	Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin tespiti ve satışı.
Stratejik Hedef 1.16	Hurda ambarının yeni yerine taşınmasının sağlatılması.
STRATEJİK AMAÇ 2.	**SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.**
Stratejik Hedef 2.1	Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması.
Stratejik Hedef 2.2	Gelişen ve büyüyen şehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi
Stratejik Hedef 2.3	İl merkezi dışında bulunan 28 ilçe ile bunlara bağlı mahallelere tatlısu çeşmelerinin yapılması.
Stratejik Hedef 2.4	Su Kalitesi ve Gıda Güvenliği şartlarının yerine getirilmesi ile ilgili çalışan birimlere katkı sağlamak amacıyla on-line kalite izleme sistemi kurulmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 2.5	Ar-Ge faaliyetleri yaparak oluşan ihtiyaçları karşılayabilecek yeni ürün, yeni hizmet ve yenilikçi teknolojilerin kurumumuza kazandırılması.
Stratejik Hedef 2.6	AB projeleri, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları vb. Kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak.
Stratejik Hedef 2.7	Kurumsal performansımızın arttırılması yönünde çalışanlarımızın motivasyon, aidiyet, proje üretme kapasitelerinin geliştirilmesi Ar-Ge çalışmalarına katılımlarını sağlamak.

Stratejik Hedef 2.8	Hizmet sınırlarımızın genişlemesi sebebiyle, su ve kanal işlerinde gelişen teknolojiden faydalanarak ,halkımıza kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için Araç ve iş makinelerin alınması.
Stratejik Hedef 2.9	Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik gelişmelere uygun hale getirilecektir.
Stratejik Hedef 2.10	Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.11	Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.12	Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin tek noktadan verilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.13	ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 2.14	Su ve atıksu faturalarının hatasız düzenlenmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.15	Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza işlemlerinin en hızlı şekilde yapılabilmesi için çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 2.16	Su sayaçlarının daha hassas ölçümünü sağlamak için çalışma yapmak.
Stratejik Hedef 2.17	Elektronik Vezne Sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmet ağının genişletilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.18	Yeni Çağrı Merkezinin donanım ve yazılım alt yapısının kurulması.
Stratejik Hedef 2.19	Tüm saha çalışmalarını mobil uygulamalarla desteklemek.
Stratejik Hedef 2.20	Network altyapısının yenilenmesi ve yeni lisans alımlarını sağlamak.
Stratejik Hedef 2.21	Kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışması ve ıslah çalışmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon şebekelerin temizlenmesi.
Statejik Hedef 2.22	Konya Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ekonomik işletilmesi.
Statejik Hedef 2.23	İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi.
Statejik Hedef 2.24	İdareye karşı açılan veya idare tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak.
Statejik Hedef 2.25	İçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması.
Statejik Hedef 2.26	Altınapa Baraj Gölünden alınan suyun kalitesinin artırılması.
Statejik Hedef 2.27	Genel Müdürlük Hizmet Binası için uygun bir yer seçimi ve Projesinin uygulamasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 3.	**SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK**
Stratejik Hedef 3.1	Sınırlı olan su kaynaklarını korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak
Stratejik Hedef 3.2	Sağlıklı ve kaliteli su temininde sürekliliği sağlamak
Stratejik Hedef 3.3	Konya Şehir Merkezinde kayıtlı olan toplam abone sayısı içindeki arızadan sayaç değiştirme oranını azaltmak.
Stratejik Hedef 3.4	Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının yenileriyle değiştirilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 3.5	Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını artırmak.
Stratejik Hedef 3.6	Konya Şehir Merkezinde yer alan ve atıksu abonelik kaydı bulunan, ancak, sayaçsız olarak su kullanılan özel kuyuların tamamına sayaç takılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 3.7	Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 3.8	Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği bölgelerde kaçak su kontrolü yapmak.
Stratejik Hedef 3.9	Doğal çevreyi koruma ve su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere “Suyu Bilinçli Kullanma” eğitim semineri verilmesi.

STRATEJİK AMAÇ 4	**SU-ATIKSU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARINI ARTIRMAK**
Stratejik Hedef 4.1	Su ve Atıksu tahakkuk oranını % 5 artırmak.
Stratejik Hedef 4.2	Su ve Atık su tahsilat oranını % 5 oranında artırmak
Stratejik Hedef 4.3	Tahsilat işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde uygulamasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 5	**PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE MOTİVASYONUNU ARTIRMAK.**
Stratejik Hedef 5.1	Kurumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlamak için yönetim sistemlerinin etkinleştirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması. Yönetim sistemlerine ait programda yer alan "Cihaz yönetim sistemi modülü, İç müşteri şikayetleri modülü, Aksiyon modülü, İSG risk değerlendirme modülü ve Çevre boyutları ve etkileri modüllerinin ilgili birimlere eğitimlerinin verilerek etkinleştirilmesinin sağlanması.
Stratejik Hedef 5.2	Kalite yönetim sistemi kapsamında merkez birimlerinde proses yönetimine geçilmesi.
Stratejik Hedef 5.3	Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili 2015-2016-2017-2018-2019 yıllarında en az birer eğitim faaliyeti gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 5.4	Personelin eğitimini sağlamak; kültür, bilgi, tecrübe ve motivasyonunu artırmak.
Stratejik Hedef 5.5	Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli kitap alarak, kütüphanenin fiziki ortamını iyileştirmek.
Stratejik Hedef 5.6	Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.
Stratejik Hedef 5.7	Sayaç teknolojileri konusundaki gelişmeleri izleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 6	**SU VE KANALİZASYON ALTYAPI ŞEBEKELERİNİN TESİSİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ**
Stratejik Hedef 6.1	Konya merkez kanalizasyon sistemini ıslah projesi yapılarak ve 2050 yılı projeksiyonunun görülmesi
Stratejik Hedef 6.2	Vatandaşlardan ve kurumlardan gelen taleplerin değerlendirilerek kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanması.
Stratejik Hedef 6.3	Konya Merkezde Kanalizasyon Şebekelerinin Yenilenmesi.
Stratejik Hedef 6.4	Konya Merkez Su Şebeke Islah İşi
Stratejik Hedef 6.5	Yeni açılan cadde ve sokaklarda su şebekesinin yapılması
Stratejik Hedef 6.6	Yeni açılan kuyu ve depoların. terfi ve isale hatlarının yapılması
STRATEJİK AMAÇ 7	**ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI ve SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ**
Stratejik Hedef 7.1	Beş yıl içerisinde sayısal olmayan su ve kanalizasyon şebekesinin %50'sinin sayısallaştırılması
Stratejik Hedef 7.2	Su ve kanalizasyon altyapı tesisleri ile ilgili toplanacak verilerin aktarılacağı veritabanı programının satın alınması
Stratejik Hedef 7.3	Su ve kanalizasyon altyapı tesisleri ile ilgili toplanan Verilerin Akıllı Veriye Dönüştürülmesi
STRATEJİK AMAÇ 8	MAVİ TÜNELDEN ŞEHRE İÇME SUYUNUN GETİRİLMESİ
Stratejik Hedef 8.1	Mavi Tünelden Konya Şehir Merkezine İçme ve Kullanma Suyu Verilmesi
Stratejik Hedef 8.2	İçme suyu projesine uygun olarak oluşturulan basınç bölgelerine yeterli suyu ulaştırmak
Stratejik Hedef 8.3	Konya Şehir Merkezine içme suyu temin edilen kuyuların büyük bir kısmının devre dışı bırakılarak suyun tamamının Arıtma Tesislerinden karşılanmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 8.4	Mavi Tünel İsale ve Terfi Hatları İşlerinin yapılmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 9	İÇME SUYU VE KANALİZASYON YATIRIM VE HİZMETLERİNİN SAĞLANMASINDA MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖZETİLECEKTİR.
Stratejik Hedef 9.1	İçme Suyu ve Kanalizasyon Tarifelerinin Güncellenmesi
STRATEJİK AMAÇ 10	6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN HER NOKTADA SU VE KANAL HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ SUNULMASI.
Stratejik Hedef 10.1	İlçe ve mahallelerde kaliteli içme suyunun temini ve dağıtım hususunda çalışma yapılması (6360 sayılı kanun gereği)
Stratejik Hedef 10.2	28 ilçede KOSKİ hizmet binalarının yaptırılması
Stratejik Hedef 10.3	6360 Sayılı Kanuna göre devredilecek 12 bölgemize 2015 yılı içerisinde 5 bölge ambarlarının kurulması,2016 yılı içerisinde 4 bölge ambarının kurulması,2017 yılında 3 bölge ambarının kurulması, 2018 yılında 6 üst bölgenin temsilciliklerine yoğunluk durumuna göre cep ambarlarının kurulması, 2019 yılında kalan 6 üst bölgenin temsilciliklerine yoğunluk durumuna göre cep ambarlarının kurulmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 10.4	6360 sayılı Kanunla birlikte hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde, abonelerimize hizmet eden su sayaçları ile ilgili bilgileri güncellemek.
Stratejik Hedef 10.5	6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde sayaçların kurumumuzun kontrolü altında olmasını sağlamak için gerekli çalışmalar yapmak

B – TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

KALITE POLİTİKAMIZ,

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yasal mevzuatlar çerçevesinde sürekli iyileştirirken; Müşterilerimize en etkin ve güvenilir şekilde ürün ve hizmet sunmak

ÇEVRE POLİTİKAMIZ,

Çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirip gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre birakmak, tükenebilir doğal kaynaklarimizi en etkin şekilde kullanmak

IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ,

Çalişanlarimiz ile çevremizdekilere güvenli ve sağlikli çalişma ortami oluşturup, kaza risklerini en aza indirmek

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZDIR.

İçme ve kullanma suyumuzun kaynağından son kullanıcıya ulaşana kadar güvenli bir şekilde üretimi, arıtımı, depolanması ve dağıtımını sağlıklı koşullarda yapmak

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A – PERFORMANS BİLGİLERİ / Performans Sonuçları Tablosu

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2015 YILI		
PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME TABLOSU		HEDEFLENEN (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	ORAN %
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		88.510.000,00	85.497.382,00	96
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		15.025.000,00	12.770.678,00	85
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		73.485.000,00	72.726.704,00	99
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	HEDEFLENEN	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
Adet	Rüzgâr enerjisi ile elektrik üretim sistemi araştırma ve ölçüm faaliyetleri	1	1	100,00
TL		250.000,00	142.677,00	57,07
Adet	100 kuyunun yer altına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi çalışması	100	320	320,00
TL		850.000,00	800.000,00	94
Adet	Altınapa Baraj Gölünde bulunan mevcut su alma yapısının "kademeli su alma sistemi" ne dönüştürülmesi	1	0	0,00
TL		250.000,00	0,00	0,00
Adet	200 adet kuyuda soft starter ve frekans konvertörü montajı yapılması	200	190	95,00
TL		575.000,00	513.300,00	89
Adet	350 adet kuyuda debimetre montajı yapılması	350	350	100,00
TL		3.200.000,00	3.123.460,00	98
Adet	14 adet yatay milli pompanın yenilenmesi	14	14	100,00
TL		600.000,00	600.000,00	100,00
metre	40.000 metre sondaj yapılması	40.000,00	17.198,00	43,00
TL		4.300.000,00	3.522.872,00	82

Adet	10 adet jeneratör temin ve tesisi yapılması	10	10	100,00
TL		2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
Adet	150 tesiste telemetri, RTU, telsiz, GPRS cihazlarıyla SCADA sistemi kurulması	150	150	100,00
TL		1.000.000,00	799.909,00	80
Adet	Online klor izleme sisteminin kurulması	750	0	0,00
TL		700.000,00	0	0,00
Adet	2015 yılında Su Kalite ve Kontrol laboratuvarına 1 adet ICP MS cihazının alınması	1	1	100,00
TL		500.000,00	468.460,00	94
STRATEJİK AMAÇ	**1. DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK**			
PERFORMANS HEDEF	**1.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması**			
MÜDÜRLÜK	**Otomasyon Şube Müdürlüğü**			
FAALİYET	1.1.1 2015 yılında gerekli ölçüm ve testlerin sonuçlarına göre yatırım kararı alınması ve Konya Bölgesi RES ihalesine girilmesi ile, 2016 yılında projelendirilmesi, 2017-2019 yıllarında rüzgar türbinleri montajı yapılacaktır.			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılına kadar tüketilen elektrik enerjisinin % 80'inin rüzgar enerjisi ile üretilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	HEDEFLENEN	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
PROJELER	PROJE ADI			
Adet	Rüzgar enerjisi ile elektrik üretim sistemi araştırma ve ölçüm faaliyetleri	1,00	1,00	100,00
TL		250.000,00	142.677,00	57,07
PERFORMANS HEDEF	**1.2 Konya Merkez, taşra ilçeler ve bağlı mahallelerde bulunan kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği yapmayan ve kullanışlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi**			
MÜDÜRLÜK	**Mekanik ve Elektrik İşleri Şube Müdürlüğü**			
FAALİYET	1.2.1 2015 yılında 100 kuyu, 2016 yılında 100 kuyu, 2017 yılında 100 kuyu, 2018 yılında 50 kuyu ve 2019 yılında 50 kuyunun yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla (PVC kabin) yenilenmesi			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılına kadar 400 kuyunun yer altına alınması veya modern mimari yapılarla (PVC kabin) yenilenmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	HEDEFLENEN	GERÇEKLEŞEN	ORAN %

PROJELER	PROJE ADI			
Adet	2015 yılında 100 kuyunun yer altına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi çalışması	100,00	320,00	320,00
TL		850.000,00	800.000,00	160,00
PERFORMANS HEDEF	**1.3 Altınapa Baraj Gölünden alınan suyun kalitesinin artırılması**			
MÜDÜRLÜK	**İçme Suyu Arıtma Tesisleri ve Su Kalite Kontrol Laboratuvar Şube Müdürlüğü**			
FAALİYET	1.3.1 2015 yılında Altınapa Baraj Gölünde bulunan mevcut su alma yapısının "kademeli su alma sistemi" ne dönüştürülmesi			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılı sonunda Kademeli su alma sistemi ile su kalitesinin tat ve koku açısından iyileştirilmesi, çözünmüş oksijen miktarının ise %10 artırılması.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	HEDEFLENEN	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
PROJELER	PROJE ADI			
Adet	Altınapa Baraj Gölünde bulunan mevcut su alma yapısının "kademeli su alma sistemi" ne dönüştürülmesi	1,00	0,00	0,00
TL		250.000,00	0,00	0,00
STRATEJİK AMAÇ	**2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE HIZ, KALİTE VE TASARRUF SAĞLAMAK**			
PERFORMANS HEDEF	**2.1 Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması**			
MÜDÜRLÜK	**Otomasyon Şube Müdürlüğü**			
FAALİYET	2.1.1 2015-2019 yılları arasında her yıl yeni açılan ilave tesislere ve ilçelerimizde yolverici ihtiyacı olan 200 kuyuya softstarter ve frekans konvertörü montajı yapılmasıı			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılmış kuyu, depo ve pompa istasyonu tesislerimizdeki pompalara ve ilçelerimizde bulunan yolverici ihtiyacı olan 1000 adet kuyuya softstarter ve frekans konvertörü montajı yapılarak %5 enerji tasarrufu sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	HEDEFLENEN	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
PROJELER	PROJE ADI			
Adet	2015 yılında 200 adet kuyuda soft starter ve frekans konvertörü montajı yapılması	200,00	190,00	95,00
TL		575.000,00	513.300,00	89
MÜDÜRLÜK	**Otomasyon Şube Müdürlüğü**			

FAALİYET	2.1.2 2015-2019 yılları arasında her yıl yeni açılan ilave tesislere ve ilçelerimizde bulunan 500 adet kuyuya debimetre montajı yapılması			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılmış kuyulara ve ilçelerimizde bulunan toplam 1500 adet kuyuya debimetre montajı yapılarak üretim miktarının %95 doğru olarak ölçülmesinin sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	HEDEFLENEN	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
PROJELER	PROJE ADI			
Adet	2015 yılında 350 adet kuyuda debimetre montajı yapılması	350,00	350,00	100,00
TL		3.200.000,00	3.123.460,00	98
MÜDÜRLÜK	**Mekanik ve Elektrik İşleri Şube Müdürlüğü**			
FAALİYET	2.1.3 2015 yılında 14 adet, 2016 yılında 13 adet, 2017 yılında 12 adet, 2018 yılında 11 adet, 2019 yılında 10 adet yatay milli pompanın yenilenmesi			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılına kadar pompa istasyonlarındaki ekonomik ömrünü tamamlamış 60 adet yatay milli pompanın, daha verimli yeni pompalarla değiştirilerek arıza, bakım ve enerji maliyetlerinde %10 tasarruf sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	HEDEFLENEN	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
PROJELER	PROJE ADI			
Adet	2015 yılında 14 adet yatay milli pompanın yenilenmesi	14,00	14,00	100,00
TL		600.000,00	600.000,00	100,00
PERFORMANS HEDEF	**2.2 Gelişen ve büyüyen şehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi**			
MÜDÜRLÜK	**Su Temin ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü**			
FAALİYET	2.2.1 2015 yılında 40.000 metre, 2016 yılında 35.000 metre, 2017 yılında 30.000 metre, 2018 yılında 20.000 metre, 2019 yılında 20.000 metre sondaj çalışması yapılarak yeni kuyu açılması ve mevcut kuyuların yenilenmesi			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılı sonuna kadar 145.000 metre sondaj yapılarak ihtiyaç olan bölgelerde yeni kuyu açılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış kuyuların yenilenmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	HEDEFLENEN	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
PROJELER	PROJE ADI			
Adet	2015 yılında 40.000 metre sondaj yapılması	40.000,00	17.198,00	43,00
TL		4.300.000,00	3.522.872,00	82

MÜDÜRLÜK	**Su Temin ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü**			
FAALİYET	2.2.2. 2015 yılında 10 adet tesise, 2016 yılında 3 adet tesise, 2017 yılında 3 tesise, 2018 yılında 3 tesise, 2019 yılında 3 tesise jeneratör temin ve tesisi yapılması			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılının sonu kadar 22 adet pompa istasyonu ve terfi merkezinde elektrik kesintilerinden etkilenmemek için jeneratör temin ve tesisinin sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	HEDEFLENEN	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
PROJELER	PROJE ADI			
Adet	2015 yılında 10 adet tesise jeneratör temin ve tesisi yapılması	10,00	10,00	100,00
TL		2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
STRATEJİK AMAÇ	**3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK**			
PERFORMANS HEDEF	**3.1 Sınırlı olan su kaynaklarını korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak**			
MÜDÜRLÜK	**Otomasyon Şube Müdürlüğü**			
FAALİYET	3.1.1. Konya Merkez ve ilçelerimizde SCADA sistemi olmayan; 2015 yılında 150 tesiste, 2016 yılında 150 tesiste, 2017 yılında 200 tesiste, 2018 yılında 200 tesiste, 2019 yılında 300 tesiste telemetri, RTU, telsiz, radyomodem, GPRS cihazları vasıtasıyla SCADA sistemi kurularak otomatik olarak çalışır vaziyete getirilmesinin sağlanması			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılına kadar 1000 tesiste otomatik kumanda ve kontrol sistemleri yapılarak, kayıp ve kaçakların % 3 azaltılması, % 3 enerji tasarrufu, % 10 zaman tasarrufu sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	HEDEFLENEN	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
PROJELER	PROJE ADI			
Adet	2015 yılında 150 tesiste telemetri, RTU, telsiz, radyomodem, GPRS cihazları vasıtasıyla SCADA sistemi kurulması	150,00	150,00	100,00
TL		1.000.000,00	799.909,00	80
PERFORMANS HEDEF	**3.2 Sağlıklı ve kaliteli su temininde sürekliliği sağlamak**			
MÜDÜRLÜK	**İçme Suyu Arıtma Tesisleri ve Su Kalite Kontrol Laboratuvar Şube Müdürlüğü**			
FAALİYET	3.2.1. 2015 yılında 750 noktada, 2016 yılında 300 noktada, 2017 yılında 150 noktada online klor izleme sisteminin kurulması			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2017 yılına kadar İl mülki sınırları dahilindeki yerleşim bölgelerinde sıvı klor tank seviyesi ve klor pompası arızalarının online tespiti ve izlemesi için 1200 noktada gerekli sistemin kurulması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	HEDEFLENEN	GERÇEKLEŞEN	ORAN %

PROJELER	PROJE ADI			
Adet	2015 yılında noktada online klor izleme sisteminin kurulması	750,00	0,00	0,00
TL		700.000,00	0,00	0,00
MÜDÜRLÜK	**İiçme Suyu Arıtma Tesisleri ve Su Kalite Kontrol Laboratuvar Şube Müdürlüğü**			
FAALİYET	3.2.2. 2015 yılında Su Kalite ve Kontrol Laboratuvarına 1 adet ICP MS cihazının alınması			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Civa (Hg) konsantrasyonunda 1 mg/L değerinin altında okuma yapılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	HEDEFLENEN	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
PROJELER	PROJE ADI			
Adet	2015 yılında Su Kalite ve Kontrol Laboratuvarına 1 adet ICP MS cihazının alınması	1,00	1,00	100,00
TL		500.000,00	468.460,00	94

YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2015 YILI					
PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME TABLOSU		**HEDEFLENEN (TL)**		**GERÇEKLEŞEN (TL)**		**ORAN %**	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		160.275.000,00		158.990.089,00		99	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		156.215.000,00		154.933.079,00		99	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.060,000,00		4.057.010,00		99	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	**Birim**		**Birim**		**%**	
	2015 yılında Gömme su depoları,. Terfi merkezleri ve diğer inşaat işlerinin yapılması. Merkez muhtelif ve taşra muhtelif çeşitli bakım, tamir ve inşaat işlerinin yapılması.	Yapılması Planlanan İhale Sayısı 9		Yapılan İhale Sayısı 3		33	
STRATEJİK AMAÇ	**1. DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK**						
STRATEJİK HEDEF	1.1 İçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması. Yapılması İstenilen, çeşitli inşaat işlerinin ve su depolarının projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde bitirilmesi. 1.3 Taşra hizmet binalarının yaptırılması						
TANIMLAR		2015 YILI HEDEFLENEN		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	**İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**						
FAALİYET	1.1.1 Gömme su depolarının yapılması 1.3.1 Programa alınan Taşra hizmet binalarının yaptırılması						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yıllık yapımı hedeflenen depoların inşaat işlerinin tamamının yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TL	Birim	TL	Birim %	%
Adet	Yapılması İstenilen depoların, inşaat işlerinin projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde yapımının tamamlanması	Adet	17.250.000,00	Adet	16.955.924,54	100	98

PROJELER	PROJE ADI	Birim	TL	Birim	TL	Birim %	%
	Gömme su depoları inşaat işlerinin yapılması, Merkez muhtelif ve taşra muhtelif çeşitli bakım, tamir ve inşaat işlerinin yapılması.	Adet	17.250.000,00	Adet	16.955.924,54	100	98
PROJELER	PROJE ADI	Birim	km	Birim	TL	Birim %	%
Km	2015 yılında 620 km. Kanalizasyon şebekesi yapılması	620.000,00		572.365,95		92	
STRATEJİK AMAÇ	**1. DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK**						
STRATEJİK HEDEF	**1.1** 2015 yılında 620 km. Kanalizasyon şebekesi yapılması						
TANIMLAR		2015 YILI HEDEFLENEN		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	**KANAL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**						
FAALİYET	1.2.1 2015 yılında 600.000,00 mt yeni kanalizasyon şebekesi döşenmesi 2015 yılında 20.000,00 mt eski kanalizasyon şebekesinin ıslahı						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında 620 km Kanalizasyon şebekesi yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TL	Birim	TL	Birim %	%
Km	620 km Kanalizasyon şebekesi yapılması	620	85.465.000,00	572.362,95	84.750.521,76	92	99
PROJELER	PROJE ADI	Birim	TL	Birim	TL	Birim %	%

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim (mt)		Birim (mt)		%	
Km	2015 yılında 495 km. Su şebekesi yapılması	495.000,00		475.747,00		96	
STRATEJİK AMAÇ	1. DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK						
STRATEJİK HEDEF	1.2 2015 yılında 495 km. Su şebekesi yapılması						
TANIMLAR		2015 YILI HEDEFLENEN		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	1.2.1 2015 yılında Su şebekesi yapılması 1.2.2 Yıllık 5.000,00 mt geri dönüşüm şebeke hattının yapılması 1.2.3 Yıllık 20.000,00 mt kuyu toplama ve isale hattının yapılması 1.2.4 Su Şebekelerinde yıllık 40.000,00 mt eski borunun yeni PE Borularla değiştirilmesi 1.2.5 Yıllık 100.000,00 mt yeni su şebekesinin PE borularla döşenmesi 1.2.6 Yıllık 250.000,00 mt yeni su şebekesinin PE ve duktil borularla döşenmesi 1.2.7 Çay suları için 20.000,00 mt. hat yapılması. 1.2.8 Mavi Tünel İsale ve Terfi Hatları İşlerinin yapılması.						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında 495 km Su şebekesi yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TL	Birim	TL	Birim %	%
Km	495 km Su şebekesi yapılması	495	53.500.000,00	475,747	53.226.632,70	96	99
PROJELER	PROJE ADI	Birim	TL	Birim	TL	Birim %	%
	495 km Su şebekesi yapılması	495	53.500.000,00	475,747	53.226.632,70	96	99

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2015 YILI					
PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME TABLOSU		HEDEFLENEN (TL)		GERÇEKLEŞEN (TL)		ORAN %	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		20.074.000,00		19.299.977,92		96	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-					
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		20.074.000,00		19.299.977,92		96	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	**2015 – Birim**		**2015 – Birim**		**%**	
%	2015 yılında vezne tahsilâtlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.	100		80		80	
%	2015 yılında su tahsilatların da banka online tahsilatlarını artırmak	18		14		78	
%	2015 yılında Elektronik Vezne Sistemi sayılarının arttırılması	10		5		50	
STRATEJİK AMAÇ	**2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.**						
PERFORMANS HEDEF	**2.1 2015 YILINDA VEZNE TAHSİLATLARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK.**						
TANIMLAR	**HEDEFLER**	HEDEFLENEN		GERÇEKLEŞEN		DEĞERLENDİRME	
MÜDÜRLÜK	MUHASEBE ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	2.1.1 2015 yılında vezne tahsilatların da müşteri memnuniyetini arttırmak.						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında vezne tahsilâtlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TL	Birim	TL	Birim	%
%	2015 yılında vezne tahsilâtlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.	100		80		80	
PROJELER	PROJE ADI			2015 – Adet/ %		2015	
	2015 yılında vezne tahsilâtlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.			100		80	
PERFORMANS HEDEF	**2.2 2015 YILINDA SU TAHSİLATLARINDA BANKALARDA ONLİNE TAHSİLATA GEÇMEK.**						
TANIMLAR	**HEDEFLER**			GERÇEKLEŞEN		DEĞERLENDİRME	

MÜDÜRLÜK	**MUHASEBE ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ**	HEDEFLENEN					
FAALİYET	2.2.1 2015 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak.						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	Adet	Birim	Adet	Birim	%
%	2015 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak	18		14		78	
PROJELER	PROJE ADI			2015 – Adet/ %		2015	
	2015 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak	18		14		78	
PERFORMANS HEDEF	**2.3 ELEKTRONİK VEZNE SİSTEMLERİNİN SAYILARININ ARTIRILMASI**						
TANIMLAR	**HEDEFLER**	HEDEFLENEN		GERÇEKLEŞEN		DEĞERLENDİRME	
MÜDÜRLÜK	**MUHASEBE ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ**						
FAALİYET	2.3.1 Elektronik Vezne Sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmet ağının artırılması						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Elektronik Vezne Sistemi sayılarının arttırılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TL	Birim	TL	Birim	%
Modül		10		5		50	
PROJELER	PROJE ADI			2015 – Adet/ %		2015	
	Elektronik Vezne Sistemlerinin sayılarının artırılması	10		5		50	

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2015 YILI		
PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME TABLOSU		**HEDEFLENEN (TL)**	**GERÇEKLEŞEN (TL)**	**ORAN %**
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.335.000,00 TL	1.530.752,00 TL	35
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.080.000,00 TL	1.488.422,00 TL	36
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		255.000,00 TL	42.330,00 TL	16
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2015 – Birim**	**2015 BİRİM**	**2015 BİRİM**
1. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	Genel Müdürlük binası projesinin yaptırılması	60.000,00 TL	18.880,00	31
2. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	İdarenin ihtiyaç duyduğu su projelerinin yaptırılması	710.000,00 TL	169.791,00	24
3. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için kamulaştırma yapılması	1.300.000,00 TL	75.589,00	5
4. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	İdarenin ihtiyaç duyacağı yerlerde zemin etütlerinin yaptırılması	135.000,00 TL	132.252,00	98
5. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	Konya'nın içme kullanma suyu revize projenin yaptırılması	60.000,00 TL	0,00	-
6. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	İçmesuyu Arıtma Projelerinin yaptırılması	50.000,00 TL	17.770,00	35
7. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	Hizmet alanında İdarenin ihtiyaç duyduğu depo ve terfi binası projelerinin yaptırılması	100.000,00 TL	50.000,00	50
8. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	Hizmet alanında Orman Müdürlüğünden alınan orman izin bedellerinin ödenmesi	50.000,00 TL	15.811,00	32
9. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	Mera arazilerine yapılacak tesis, şebeke vb. yatırımlar için ot ve diğer bedellerin ödenmesi	100.000,00 TL	4.718,00	5
10. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	Şebeke döşemelerinde meydana gelebilecek hasarların ödenmesi	150.000,00 TL	113.956,00	76
11. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması	100.000,00 TL	50.000,00	50
12. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	Havzalarda altyapı çalışmaları ve kirliliğin önlenmesi amacıyla proje çalışmaları yaptırılması	215.000,00 TL	212.389,00	99
13. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	Konya Merkez İlçeleri kanalizasyon ıslah projesi 2050 yılı fizibilite raporunun	100.000,00 TL	32.252,00	32

	yaptırılması			
14. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve fosseptik yapısı projelerinin yaptırılması	75.000,00 TL	70.000,00	93
15. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	Dere, Taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yaptırılması	75.000,00 TL	70.000,00	93
16. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin yaptırılması	100.000,00 TL	85.247,00	85
17. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	Etüt ve proje çalışmaları kapsamında tescil ve tahsislerin yaptırılması	15.000,00 TL	15.000	100
18. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması	100.000,00 TL	0,00	-
19. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	Proje çalışmaları için yazılım programlarının alınması	100.000,00 TL	0,00	-
20. 2015 Bütçe ödenek Miktarı	Kurum bünyesinde araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması/yaptırılması	485.000,00 TL	354.767,00	73
	TOPLAM	**4.080.000,00**	**1.488.422,00**	**36**
STRATEJİK AMAÇ	**1. DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK**			
PERFORMANS HEDEF	**1.1 Genel Müdürlük binası projesinin yaptırılması**			
TANIMLAR	HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.1.1 Proje Çizimi		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında Genel Müdürlük binası için projesinin tamamlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 – TL	2015 – TL	2015 –%
%	2015 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.	60.000,00 TL	18.880,00 TL	31,00%
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	Genel Müdürlük binası için proje yaptırılması	60.000,00 TL	18.880,00 TL	31,00%
PERFORMANS HEDEF	**1.2 İdarenin ihtiyaç duyduğu su projelerinin yaptırılması**			
TANIMLAR	HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.2.1 Proje Çizimi		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME

PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında ihtiyaç duyulan alanlara su kanal depo bina vb. projeleri yapılacaktır			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 – TL	2015 – TL	2015 –%
%	2015 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	710.000,00 TL	169.791,00 TL	24
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	Diğer proje yapım işleri	710.000,00 TL	169.791,00 TL	24
PERFORMANS HEDEF	**1.3 İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için kamulaştırma yapılması.**			
TANIMLAR	HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
FAALİYET	1.3.1 İhtiyaç duyulan yerlerin kamulaştırılması			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında kamulaştırma yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 – TL	2015 – TL	2015 –%
%	2015 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	1.300.000,00 TL	75.589,00 TL	5
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	İhtiyaç duyulan yerlerin kamulaştırma yapılması	1.300.000,00 TL	75.589,00 TL	5
PERFORMANS HEDEF	**1.4 İdarenin ihtiyaç duyacağı yerlerde zemin etütlerinin yaptırılması**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.4.1 İhtiyaç duyulan su depoları ve terfi hatlarının yapımı için zemin etütlerinin yaptırılması			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında su depoları ve terfi hatları için zemin etüdü yaptırılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar	135.000,00 TL	132.252,00 TL	98
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	Su deposu ve terfi hatları zemin etüdü yapılması	135.000,00 TL	132.252,00 TL	98

PERFORMANS HEDEF	**1.5 Konya'nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.5.1 Konya'nın içme kullanma suyu revize projesi yapılacaktır			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında proje çizimleri yapılacaktır.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	60.000,00 TL	0,00 TL	-
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	İçme kullanma suyu revize projesi	60.000,00 TL	0,00 TL	-
PERFORMANS HEDEF	**1.6 İçme suyu arıtma projelerinin yaptırılması**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.6.1 İçme suyu rıtma projelerinin yaptırılması			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında arıtma tesisi projelerinin yaptırılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.	50.000,00 TL	17.770,00 TL	35
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	Arıtma Tesisi Projesi	50.000,00 TL	17.770,00 TL	35
PERFORMANS HEDEF	**1.7 Hizmet alanında idarenin ihtiyaç duyduğu depo ve terfi binası projelerinin yaptırılması**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.7.1 Depo ve terfi binalarının projelerinin yaptırılması			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında depo ve terfi binaları için proje yaptırılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 yılında bütçeden ayrılan ödenek miktarı kadar.	100.000,00 TL	50.000 TL	50
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%

	Depo ve Terfi binası projesi	100.000,00 TL	50.000 TL	50
PERFORMANS HEDEF	**1.8 Hizmet alanında Orman Müdürlüğünden alınan orman izin bedellerinin ödenmesi**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.8.1 Orman izin bedellerinin düzenlenmesi			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında Orman izin bedellerinin ödenmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 yılında bütçeden ayrılan ödenek miktarı kadar	50.000,00 TL	15.811,00 TL	32
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	Orman izni	50.000,00 TL	15.811,00 TL	32
PERFORMANS HEDEF	**1.9 Mera arazilerine yapılacak içmesuyu yatırımları için ot ve diğer bedellerin ödenmesi**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.9.1 Mera arazilerine yapılacak içmesuyu yatırımları için ot ve diğer bedellerin ödenmesi			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında mera arazilerine ot ve diğer bedellerin ödenmesi			
PERFORMENS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 Yılında bütçeden ayrılan ödenek miktarı kadar	100.000,00 TL	4.718,00 TL	5
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	Mera arazileri ot ve diğer bedellerin ödenmesi	100.000,00 TL	4.718,00 TL	5
PERFORMENS HEDEF	**1.10 Şebeke döşemelerinde meydana gelebilecek hasarların ödenmesi**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.10.1 İçme suyu şebeke döşemelerinde meydana gelebilecek hasarların ödenmesi			
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ	2015 yılı İçme suyu şebeke döşemelerinde meydana gelebilecek hasarların ödenmesi			
PERFORMANS	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%

GÖSTERGELERİ				
%	2015 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	150.000,00 TL	113.956,00 TL	76
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	İçme suyu şebeke hatlarında meydana gelen hasarların ödenmesi	150.000,00 TL	113.956,00 TL	76
PERFORMENS HEDEF	**1.11 İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.11.1 Proje Çizimi			
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında ihtiyaç duyulan kanal projelerinin yapılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	100.000,00 TL	50.000,00 TL	50
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması	100.000,00 TL	50.000,00 TL	50
PERFORMENS HEDEF	**1.12 Havzalarda altyapı çalışmaları ve kirliliğin önlenmesi amacıyla proje çalışmaları yaptırılması**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.12.1 Havzalarda altyapı ve kirliliğin önlenesi için proje yapmak			
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında havzalarda altyapı ve kirliliğn önlenmesine yönelik projeler yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	215.000,00 TL	212.389,00 TL	99
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	Havzalarda altyapı çalışmaları ve kirliliğin önlenmesi amacıyla proje çalışmaları yapılması	215.000,00 TL	212.389,00 TL	99
PERFORMENS HEDEF	**1.13 Konya Merkez İlçeleri kanalizasyon ıslah projesi 2050 yılı fizibilite raporunun yaptırılması**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			

FAALİYET	1.13.1 Konya merkez ilçe kanalizasyon ıslah proje ve 2050 fizibilite raporunun yaptırılması			
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında Konya Merkez ilçelerde kanal ıslah proje ve 2050 fizibilite raporunun yapılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	100.000,00 TL	32.252,00 TL	32
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	Konya Merkez İlçeleri Kanalizasyon ıslah projesi 2050 fizibilite raporunun yaptırılması	100.000,00 TL	32.252,00 TL	32
PERFORMENS HEDEF	**1.14 İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve fosseptik yapısı projelerinin yaptırılması**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.14.1 İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi ve foseptik yapısı projelerin yaptırılması			
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında Kanalizasyon terfi ve foseptik yapısı projelerinin yaptırılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	75.000,00 TL	70.000,00 TL	93
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	İdarenin İhtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve foseptik yapısı projelerinin yaptırılması	75.000,00 TL	70.000,00 TL	93
PERFORMENS HEDEF	**1.15 Dere, Taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yaptırılması**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.15.1 Dere Taşkın kanalı Drenaj kanalı ıslah projelerin yaptırılması			
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında dere taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerin yaptırılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	75.000,00 TL	70.000,00 TL	93
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	Dere, Taşkın Kanalı, Drenaj Kanalı Islah	75.000,00 TL	70.000,00 TL	93

	Projelerinin yaptırılması			
PERFORMENS HEDEF	**1.16 Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin yaptırılması**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.16.1 Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin yaptırılması			
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Yaptırılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	100.000,00 TL	85.247,00 TL	85
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Yaptırılması	100.000,00 TL	85.247,00 TL	85
PERFORMENS HEDEF	**1.17 Etüt ve proje çalışmaları kapsamında tescil ve tahsislerin yaptırılması**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.17.1 Etüt ve Proje çalışmalarında tescil ve tahsislerin yaptırılması			
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında Etüt ve Projelerin Tescil ve Tahsislerinin yaptırılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	15.000,00 TL	15.000,00 TL	100
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	Etüt ve Proje Çalışmaları Kapsamında Tescil ve Tahsislerin Yaptırılması	15.000,00 TL	15.000,00 TL	100
PERFORMENS HEDEF	**1.18 Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması**			
TANIMLAR	HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.18.1 Ölçme aletleri ve donanımların alınması			
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında İhtiyaç duyulan Ölçme aletlerinin alınması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	100.000,00 TL	0,00 TL	-

PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	Ölçme aletleri ve donanımların alınması	100.000,00 TL	0,00 TL	-
PERFORMENS HEDEF	**1.19 Proje çalışmaları için yazılım programlarının alınması**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET	1.19.1 Proje çalışmaları için yazılım programlarının alınması			
PERFORMENS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında İhtiyaç duyulan proje yazılım programlarının alınması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	100.000,00 TL	0,00 TL	-
PROJELER	PROJE ADI	2015- TL	2015-TL	2015-%
	Proje Çalışmaları İçin Yazılım Programlarının alınması	100.000,00 TL	0,00 TL	-
PERFORMANS HEDEF	**1.20 Kurum bünyesinde araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması/yaptırılması**			
TANIMLAR	HEDEFLER		GERÇEKLEŞEN	DEĞERLENDİRME
MÜDÜRLÜK	Ar-Ge ve Kalite Şube Müdürlüğü			
FAALİYET	**1.20.1 Araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmaları yapılması/ yaptırılması**			
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmalarına devam edilecektir			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	2015- TL	2015-TL	2015-%
%	2015 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	485.000,00 TL	354.767,00 TL	73
PROJELER	**PROJE ADI**	2015- TL	2015-TL	2015-%
	Tüm Ar-Ge faaliyetleri	485.000,00 TL	354.767,00 TL	73

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2015 YILI		
PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME TABLOSU		HEDEFLENEN (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	ORAN %
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		49.965.000,00	41.371.394,90	83
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		20.700.000,00	17.139.403,91	83
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		29.265.000,00	24.231.990,99	83
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	**Birim**	**Birim**	**%**
TON	Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması.	50 TON	42,52	85
TON	Pik hurdalarının pik kapakla takas ederek değerlendirilmesi.	100 TON	0	0
TL	Su ve kanalizasyon hattında kullanılacak beton boru, prefabrik baca elemanı ve roğar kapağı alınacaktır.	3.000.000,00 TL.	1.722.578,46	57
TL	Araç ve makine parkının kapasitesi genişletilmesi ve araç ile iş makinelerinin modernize edilmesi.	10.500.000,00 TL.	8.684.677,61	83
TL	Sıhhi tesisat giderleri(PVC,PE,PPRC,koriger ve galvaizli boru ile ekparçaları ve dalgıç pompa vb malzeme, ,hırdavat malzemesi,alt temel dolgu ve filler dolgu malzemesi alımı, muhtelif çapta beton boru ve rogar kapağı alımı.)	7.000.000,00 TL.	6.712.848,44	96
TL	Kauçuk ve plastik ürün alımları	100.000,00 TL.	4.950,31	5

TL	Metal ürünleri alımları	100.000,00TL.		14.349,09		14	
ADET	Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik gelişmelere uygun hale getirilerek daha faal çalışması sağlanacaktır.	300 ADET		250		83	
ADET	Hizmet bölgelerine ambarlar kurulup, barkot sistemine geçilmesi işlemi yapılacaktır.	5 ADET		12		240	
ADET	Hurda ambarının yeni yerine taşınması işlemi yapılacaktır.	1 ADET		1		100	
STRATEJİK AMAÇ	**1. DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK**						
PERFORMANS HEDEF	**1.1.** Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri , kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin tespiti ve satışı.						
TANIMLAR		2015 YILI HEDEFLENEN		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	**AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**						
FAALİYET	1.1.1 Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması.						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında 50 ton hurda malzeme satışı yapılarak gelir elde edilmesi sağlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TON	Birim	TON	Birim / %	TON/ %
%	Hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması.		50		42,52		85,04
PROJELER	PROJE ADI	Birim	TON	Birim	TON	Birim / %	TON / %
	Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması.		50		42,52		85,04
PERFORMANS HEDEF	**1.2.** Hurda ambarında biriken pik hurdalarını, pik kapak karşılığı takas edilmesi						
TANIMLAR		2015 YILI HEDEFLENEN		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	**AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**						
FAALİYET	1.2.1 Pik hurdalarının pik kapakla takas ederek değerlendirilmesi.						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Hurdalıkta biriken pik hurdalarını, pik kapak karşılığı takas edilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TON	Birim	TON	Birim / %	TON / %
%	Hurdalıkta biriken pik hurdalarını, pik kapak		100		0		0

	karşılığı takas edilmesi						
PROJELER	PROJE ADI	Birim	TON	Birim	TON	Birim / %	TON / %
	Hurdalıkta biriken pik hurdalarını, pik kapak karşılığı takas edilmesi		100		0		0
PERFORMANS HEDEF	**1.3.** Su ve kanalizasyon hattında kullanılacak beton boru, prefabrik baca elemanı ve roğar kapağı alınacaktır.						
TANIMLAR		2015 YILI HEDEFLENEN		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	**MALZEME İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**						
FAALİYET	1.3.1 Su ve kanalizasyon hattında kullanılacak beton boru, prefabrik baca elemanı ve roğar kapağı alınacaktır.						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bütçede ön görülen ödenek miktarı kadar						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
%	2015 yılında Su ve kanalizasyon hattının genişletilmesinde ve yenilenmesinde kullanılacak malzemeler temin edilecektir.		3.000.000.00		1.722.578,46		57
PROJELER	PROJE ADI	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
	2015 yılında araç ve makina parkının kapasitesi genişletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş makineleri yenilenerek modernize edilecektir.		3.000.000.00		1.722.578,46		57
PERFORMANS HEDEF	**1.4.** Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi için metal ürünleri alımları .						
TANIMLAR		2015 YILI HEDEFLENEN		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	**MALZEME İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**						
FAALİYET	1.4.1 Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi için malzeme ikmali (Metal ürünleri alımları)						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
%	Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesinde metal ürünleri alımı		100.000.00		14.349,09		14
PROJELER	PROJE ADI	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
	Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve		100.000.00		14.349,09		14

	genişletilmesinde metal ürünleri ikmali.						
PERFORMANS HEDEF	**1.5.** Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi için kauçuk ve plastik ürün alımları						
TANIMLAR		2015 YILI HEDEFLENEN		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	**MALZEME İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**						
FAALİYET	1.5.1.Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi için kauçuk ve plastik ürün ikmali.						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
%	Su ve kanalizasyon tesisi yenilenmesi ve genişletilmesinde kauçuk ve plastik ürün alımı		100.000,00		4.950,31		5
PROJELER	PROJE ADI	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
	Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi için kauçuk ve plastik ürün ikmali.		100.000,00		4.950,31		5
PERFORMANS HEDEF	**1.6** Hurda ambarının yeni yerine taşınmasının sağlatılması .						
TANIMLAR		2015 YILI HEDEFLENEN		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	**AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**						
FAALİYET	1.6.1 Hurda ambarının yeni yerine taşınması işlemi yapılacaktır.						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	1 adet						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	ADET	Birim	ADET	Birim / %	ADET / %
%	Hurda ambarının yeni yerine taşınması işlemi yapılacaktır.		1		1		100
PROJELER	PROJE ADI	Birim	ADET	Birim	ADET	Birim / %	ADET / %
	Hurda ambarının yeni yerine taşınması işlemi yapılacaktır.		1		1		100
STRATEJİK AMAÇ	**2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.**						
PERFORMANS HEDEF	**2.1** Araç ve makine parkının kapasitesi küçültülerek araç ve iş makinelerinin modernize edilmesi.						
TANIMLAR		**2015 YILI**		**2015 YILI**		**2015 YILI**	

MÜDÜRLÜK	**ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**	HEDEFLENEN		GERÇEKLEŞEN		DEĞERLEME	
FAALİYET	2.1.1 Yeni araç ve iş makineları alınması.						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Hareketli işmakinası ve araç alımı (12 adet kazıcı yükleyici işmakinası, 12 adet kombine kanal temizleme aracı,15 adet kamyon (damperli), 13 adet kamyon (ekip aracı), 2 adet kamyon (su tankerli) satın alınacaktır.)						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
%	2015 yılında araç ve makina parkının kapasitesi genişletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş makineleri yenilenerek modernize edilecektir.		10.500.000.00		8.684.677,61		83
PROJELER	PROJE ADI	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
	2015 yılında araç ve makina parkının kapasitesi genişletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş makineleri yenilenerek modernize edilecektir.		10.500.000.00		8.684.677,61		83
PERFORMANS HEDEF	**2.2** Sıhhi tesisat malzeme ikmali sağlanması (PVC, PE, PPRC, koriger ve galvanizli boru ile ek parçaları ve dalgıç pompa vb. malzeme , hırdavat malzemesi, alt temel dolgu ve filler dolgu malzemesi alımı, muhtelif çapta beton boru ve rögar kapağı alımı.)						
TANIMLAR		2015 YILI HEDEFLENEN		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	**MALZEME İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**						
FAALİYET	2.2.1 Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi için malzeme ikmali						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
%	Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesinde malzeme alımı		7.000.000.00		6.712.848,44		96
PROJELER	PROJE ADI	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
	Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesinde malzeme ikmali		7.000.000.00		6.712.848,44		96
PERFORMANS HEDEF	**2.3** Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik gelişmelere uygun hale getirilecektir.						
TANIMLAR		**2015 YILI**		**2015 YILI**		**2015 YILI**	

MÜDÜRLÜK	ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	HEDEFLENEN		GERÇEKLEŞEN		DEĞERLEME	
FAALİYET	2.3.1 Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik gelişmelere uygun hale getirilerek daha faal çalışması sağlanacaktır.						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	300 adet aracın takip ve yönlendirme sistemi geliştirilmesi gerçekleştirilecektir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	ADET	Birim	ADET	Birim / %	ADET / %
%	Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik gelişmelere uygun hale getirilerek daha faal çalışması sağlanacaktır.		300		250		83,33
PROJELER	PROJE ADI	Birim	TL	Birim	ADET	Birim / %	ADET / %
	Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik gelişmelere uygun hale getirilerek daha faal çalışması sağlanacaktır.		300		250		83,33

PERFORMANS HEDEF	**2.4** 6360 Sayılı Kanuna göre devredilecek 12 bölgemizden yoğunluğu olan 5 bölgeye ambarlarının kurulması ve barkot sistemine geçilmesi sağlanacaktır.						
TANIMLAR		2015 YILI HEDEFLENEN		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	2.4.1 Hizmet bölgelerine ambarlar kurulup, barkot sistemine geçilmesi işlemi yapılacaktır.						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında 12 Bölgenin 5 adedine ambarlar kurulup, barkot sistemine geçilmesi işlemi yapılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	ADET	Birim	ADET	Birim / %	TL / %
%	Hizmet bölgelerine ambarlar kurulup, barkot sistemine geçilmesi işlemi yapılacaktır.		5		12		240
PROJELER	PROJE ADI	Birim	ADET	Birim	ADET	Birim / %	TL / %
	Hizmet bölgelerine ambarlar kurulup, barkot sistemine geçilmesi işlemi yapılacaktır.		5		12		240

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2015 YILI			
PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME TABLOSU		HEDEFLENEN (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	ORAN %	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		14.916.000,00	12.486.728,99	83,71	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.571.441,00	3.534.475,83	98,96	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		11.344.559,00	8.952.253,16	78,91	
STRATEJİK AMAÇ	**2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE HIZ, KALİTE VE TASARRUF SAĞLAMAK**				
PERFORMANS HEDEF	**2.1. Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesini sağlamak.**				
TANIMLAR		**HEDEFLER**			
MÜDÜRLÜK	**ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**2.1.1.** İnternet aracılığıyla su müracaat, abone kayıt ve abonelik kapatma işlem sayılarının 2015 yılından itibaren artırılmasıyla ilgili çalışmalara başlanılacaktır.				
	2.1.2. Web mail ve canlı destek aracılığıyla yapılan işlem sayılarının 2015 yılından itibaren artırılmasıyla ilgili çalışmalara başlanılacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İnternet aracılığıyla, su müracaat, abone kayıt ve abonelik kapatma işlem sayıları ile web mail ve canlı destek aracılığıyla yapılan bir önceki yıla ait toplam işlem sayısının, 2015 yılında % 3, 2016 yılında % 5, 2017 yılında % 7, 2018 yılında % 10, 2019 yılında % 15 oranında artırılması sağlanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	İnternet aracılığıyla, su müracaat, abone kayıt ve abonelik kapatma işlem sayıları ile web mail ve canlı destek aracılığıyla yapılan bir önceki yıla ait toplam işlem sayısının, 2015 yılında % 3 oranında artırılması sağlanacaktır.	3	-	5,15	100
PROJELER	**PROJE ADI**	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesini sağlamak.	-	-	-	-
PERFORMANS HEDEF	**2.2. Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.**				
TANIMLAR		**HEDEFLER**			
MÜDÜRLÜK	**ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**2.2.1.** 01.01.2015 tarihinden itibaren müşterilerimizden T.C Kimlik numarası talep edilmeye devam edilecektir.				

	2.2.2. 01.01.2015 tarihinden itibaren, kendi adına kaydı bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerle ve 6360 sayılı Yasa ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerdeki tüm su ve atıksu aboneleri ile KOSKİ Genel Müdürlüğü olarak abonelik sözleşmesi yapılacaktır.				
	2.2.3. Abonelik adres ve telefon bilgileri güncellenecektir.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Toplam abone sayısına göre kayıtlı olan ve Şehir Merkezinde % 86 seviyesinde olan T.C Kimlik numarası oranının, 2015 yılından itibaren her yıl %2 oranında artırılması, 6360 sayılı Kanunla hizmet alanımıza yeni dahil olan İlçelerde ise, %60 seviyesinde olan T.C. Kimlik Numarası oranının, 2015 yılında Şehir Merkeziyle aynı orana yükseltmesi ve bu oranın takip eden her yıl % 2 oranında artırılması sağlanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015 %	Gerçekleşme - %
%	Toplam abone sayısına göre kayıtlı olan ve Şehir Merkezinde % 86 seviyesinde olan T.C Kimlik numarası oranının, 2015 yılında %2 oranında artırılması sağlanacaktır.	2	-	1	% 50
PROJELER	PROJE ADI	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015 %	Gerçekleşme - %
%	Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.	2	-	1	%50
PERFORMANS HEDEF	**2.3. Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin tek noktadan verilmesini sağlamak.**				
TANIMLAR		**HEDEFLER**			
MÜDÜRLÜK	**MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**2.3.1.** Karatay, Selçuklu ve yeni açılacak müşteri hizmetleri şubelerinde su-kanal müracaat işlemlerinin yapılmasına başlanacaktır.				
	2.3.2. Merkez hizmet binamızda, tüm su ve atıksu abonelik hizmetlerinin tek noktadan verilmesi sağlanacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında Karatay, Selçuklu ve yeni açılacak müşteri hizmetleri şubelerinde su-kanal müracaat işlemlerinin yapılması ile Merkez hizmet binamızda, tüm su ve atıksu abonelik hizmetlerinin tek noktadan verilmesine başlanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	2015 yılında Karatay, Selçuklu ve yeni açılacak müşteri hizmetleri şubelerinde su-kanal müracaat işlemlerinin yapılması ile Merkez hizmet binamızda, tüm su ve atıksu abonelik hizmetlerinin tek noktadan verilmesine başlanacaktır	100	-	100	100
PROJELER	PROJE ADI	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin tek noktadan verilmesini sağlamak.	100	-	100	100
STRATEJİK HEDEF	**2.4. ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak.**				
TANIMLAR		**HEDEFLER**			

MÜDÜRLÜK	**MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**2.4.1.** Müşterilerimizin tüm talep ve şikayetlerinin iletilmesinde ALO 185 Çağrı Merkezini kullananların sayısı artırılacaktır.				
	2.4.2. ALO 185 Çağrı Merkezine yapılan başvuruların sonuçlarının müşteriye SMS veya telefonla bildirilmesine 2015 yılında başlanacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Müşterilerimizin tüm talep ve şikayetlerinin iletilmesinde ALO 185 Çağrı Merkezini kullananların sayısı, bir önceki yıla göre, 2015 yılında % 10, 2016 yılında %10, 2017 yılında %10, 2018 yılında %10, 2019 yılında ise %10 oranında artırılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	Müşterilerimizin tüm talep ve şikâyetlerinin iletilmesinde ALO 185 Çağrı Merkezini kullananların sayısı, bir önceki yıla göre, 2015 yılında %10 oranında artırılacaktır.	10	-	29,97	100
PROJELER	**PROJE ADI**	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak.	10	-	29,97	100
PERFORMANS HEDEF	**2.5. Su ve atıksu faturalarının hatasız düzenlenmesini sağlamak.**				
TANIMLAR	**HEDEFLER**				
MÜDÜRLÜK	**TAHAKKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**2.5.1.** Su ve atıksu abonelerine düzenlenen faturalarla ilgili yapılan düzeltme ve tenzil işlem sayısı azaltılacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Su ve atıksu abonelerine düzenlenen faturalarla ilgili yapılan düzeltme ve tenzil işlem sayısı bir önceki yıla göre, 2015 yılında %5, 2016 yılında %10, 2017 yılında %10, 2018 yılında %10, 2019 yılında %10 azaltılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	Su ve atıksu abonelerine düzenlenen faturalarla ilgili yapılan düzeltme ve tenzil işlem sayısı bir önceki yıla göre, 2015 yılında %5 azaltılacaktır.	5	-	0	%0
PROJELER	PROJE ADI	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	Su ve atıksu faturalarının hatasız düzenlenmesini sağlamak.	5	-	0	%0
PERFORMANS HEDEF	**2.6. Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza işlemlerinin en hızlı şekilde yapılabilmesi için çalışmalar yapmak.**				
TANIMLAR	**HEDEFLER**				
MÜDÜRLÜK	**SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**2.6.1.** Su açma, sayaç takma ve yerinde arıza (vana, rakor vb.) giderilme işlemlerinin 24 saat içerisinde sonuçlandırılması sağlanacaktır.				

	2.6.2. Su kesme, sayaç değiştirme ve sayaç sökme faaliyetleriyle ilgili oluşturulan iş emirlerinin en fazla 2 gün içerisinde sonuçlandırılması sağlanacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 ve takip eden yıllarda, su açma, sayaç takma ve yerinde arıza (vana, rakor vb.) giderilme işlemlerinin 24 saat içerisinde, su kesme, sayaç değiştirme ve sayaç sökme faaliyetleriyle ilgili oluşturulan iş emirlerinin ise en fazla 2 gün içerisinde sonuçlandırılması sağlanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	2015 ve takip eden yıllarda, su açma, sayaç takma ve yerinde arıza (vana, rakor vb.) giderilme işlemlerinin 24 saat içerisinde, su kesme, sayaç değiştirme ve sayaç sökme faaliyetleriyle ilgili oluşturulan iş emirlerinin ise en fazla 2 gün içerisinde sonuçlandırılması sağlanacaktır.	100	-	100	% 100
PROJELER	PROJE ADI	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza işlemlerinin en hızlı şekilde yapılabilmesi için çalışmalar yapmak.	100	-	100	% 100
PERFORMANS HEDEF	**2.7. Su sayaçlarının daha hassas ölçümünü sağlamak için çalışma yapmak.**				
TANIMLAR		**HEDEFLER**			
MÜDÜRLÜK	**SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**2.7.1.** Mevcut sayaç atölye alanımız revize edilerek, yeni bir sayaç ayar istasyonu daha kurulması sağlanacaktır.				
	2.7.2. Abonelerin su tüketim profiline uygun çapta su sayaçlarının kullanılması sağlanacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Kurulan sayaç ayar istasyonu sayısı, 2015 yılında 1 adet, 2016 yılında 1adet artırılacak ve 2015 yılından itibaren abonelerin su tüketim profiline uygun çapta su sayaçlarının kullanılmasıyla ilgili çalışmaya başlanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	Kurulan sayaç ayar istasyonu sayısı, 2015 yılında 1 adet artırılacak ve 2015 yılından itibaren abonelerin su tüketim profiline uygun çapta su sayaçlarının kullanılmasıyla ilgili çalışmaya başlanacaktır.	100	-	0	0 %
PROJELER	**PROJE ADI**	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	Su sayaçlarının daha hassas ölçümünü sağlamak için çalışma yapmak.	100	-	0	0 %

PERFORMANS HEDEF	**2.8. Sayaç teknolojileri konusundaki gelişmeleri izleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.**				
TANIMLAR		**HEDEFLER**			
MÜDÜRLÜK	**SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**2.8.1.** Sayaç teknolojileri konusunda ulusal/uluslararası programlara katılım gerçekleştirilecektir.				
	2.8.2. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesini, çalışanın performansını, bilgi ve deneyiminin artırılmasını sağlamak amacıyla, hizmet alanımızla ilgili, Mevlana Kalkınma Ajansı, A.B. Bakanlığı Ulusal Ajans gibi hibe projelerinin sunulduğu kurumlara proje hazırlanacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015-2019 yılları arasında her yıl, sayaç teknolojileri konusunda düzenlenen fuar ve eğitim programlarından en az 1 programa katılım sağlanacak, ayrıca, 2016 yılında 1 ve 2018 yılında 1 olmak üzere 2 adet hibe içeren proje hazırlanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	2015 yılında, sayaç teknolojileri konusunda düzenlenen fuar ve eğitim programlarından en az 1 programa katılım sağlanacaktır.	100	-	100	% 100
PROJELER	**PROJE ADI**	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	Sayaç teknolojileri konusundaki gelişmeleri izleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.	100	-	0	0
PERFORMANS HEDEF	**2.9. 6360 sayılı Kanunla birlikte hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde, abonelerimize hizmet eden su sayaçları ile ilgili bilgileri güncellemek.**				
TANIMLAR		**HEDEFLER**			
MÜDÜRLÜK	**SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**2.9.1.** Yönetim Bilgi Sisteminde, abonelere hizmet eden su sayaçları ile ilgili bilgiler yıllar bazında güncellenecektir.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında %20, 2016 yılında %20, 2017 yılında % 20,2018 yılında %20, 2019 yılında %20 abonenin sayaç bilgisi güncellenecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	2015 yılında %20 abonenin sayaç bilgisi güncellenecektir.	20	-	20	100
PROJELER	**PROJE ADI**	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	6360 sayılı Kanunla birlikte hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde, abonelerimize hizmet eden su sayaçları ile ilgili bilgileri güncellemek.	20	-	20	100
STRATEJİK AMAÇ	**3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK**				
PERFORMANS	**3.1. Konya Şehir Merkezinde kayıtlı olan toplam abone sayısı içindeki arızadan sayaç değiştirme oranını azaltmak.**				

HEDEF					
TANIMLAR		**HEDEFLER**			
MÜDÜRLÜK	**SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**3.1.1.** Toplam abone sayısı içerisindeki arızadan sayaç değiştirme oranı, her yıl bir önceki yıla göre %10 azaltılacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Toplam abone sayısı içerisindeki arızadan sayaç değiştirme oranı 2015 yılında %10, 2016 yılında %10, 2017 yılında %10, 2018 yılında %10, 2019 yılında %10 azaltılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	Toplam abone sayısı içerisindeki arızadan sayaç değiştirme oranı 2015 yılında %10 azaltılacaktır.	10	-	8,51	85,11
PROJELER	PROJE ADI	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	Konya Şehir Merkezinde kayıtlı olan toplam abone sayısı içindeki arızadan sayaç değiştirme oranını azaltmak.	10	-	8,51	85,11
PERFORMANS HEDEF	**3.2. Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının yenileriyle değiştirilmesini sağlamak.**				
TANIMLAR		**HEDEFLER**			
MÜDÜRLÜK	**SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**3.2.1.** Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara göre, su sayaçlarında 10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçların, daha hassas sayaçlarla değiştirilmesi sağlanacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında 50.000, 2016 yılında 55.000, 2017 yılında 60.000, 2018 yılında 65.000, 2019 yılında 70.000 adet su sayacı değiştirilecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 Adet	2015 TL	2015 Adet	2015 TL
%	2015 yılında 50.000 adet su sayacı değiştirilecektir.	50.000	2.008.000,00	62.540	2.511.606,40
PROJELER	PROJE ADI	2015 Adet	2015 TL	2015 Adet	2015 TL
%	Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının yenileriyle değiştirilmesini sağlamak.	50.000	2.008.000,00	62.540	2.511.606,40
PERFORMANS HEDEF	**3.3. Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını artırmak.**				
TANIMLAR		**HEDEFLER**			
MÜDÜRLÜK	**SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**3.3.1.** Resmi ve sivil aboneliklerimize takılan Elektronik Kartlı Su Sayacı sayısının artırılması hususunda çalışma yapılacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında 3.300 adet, 2016 yılında 3.600 adet, 2017 yılında 4000 adet, 2018 yılında 4.500 adet, 2019 yılında 5.000 adet elektronik kartlı su sayacı takılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 Adet	2015 TL	2015 Adet	2015 TL
Adet	2015 yılında 3.300 adet elektronik kartlı	3.300	1.563.441,00	2.159	1.022.869,43

	su sayacı takılacaktır.				
PROJELER	PROJE ADI	2015 Adet	2015 TL	2015 Adet	2015 TL
Adet	Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını artırmak.	3.300	1.563.441,00	2.159	1.022.869,43
STRATEJİK AMAÇ					
PERFORMANS HEDEF	**3.4. 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde sayaçların kurumumuzun kontrolü altında olmasını sağlamak için gerekli çalışmalar yapmak**				
TANIMLAR		**HEDEFLER**			
MÜDÜRLÜK	**SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**3.4.1.** Sayaçların koruma altında olmasını sağlamak için arızalı, patlak, damga ile değişim vb. nedenlerle sökülecek sayaçlar ile kullanılır durumda olan sayaçlara rakor emniyet kilidinin takılarak mühür teli ile sabitlenmesi sağlanacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yönetim Bilgi Sisteminde, abonelere hizmet eden su sayaçlarından, 2015 yılında %20, 2016 yılında %20, 2017 yılında % 20, 2018 yılında %20, 2019 yılında %20 aboneye ait su sayacına rakor emniyet kilidi takılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	Yönetim Bilgi Sisteminde, abonelere hizmet eden su sayaçlarından, 2015 yılında %20 aboneye ait su sayacına rakor emniyet kilidi takılacaktır.	20	-	8,82	44,10
PROJELER	PROJE ADI	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
	6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde sayaçların kurumumuzun kontrolü altında olmasını sağlamak için gerekli çalışmalar yapmak	20	-	8,82	44,10
PERFORMANS HEDEF	**3.5. Konya Şehir Merkezinde yer alan ve atıksu abonelik kaydı bulunan, ancak, sayaçsız olarak su kullanılan özel kuyuların tamamına sayaç takılmasını sağlamak.**				
TANIMLAR		**HEDEFLER**			
MÜDÜRLÜK	**TAHAKKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**3.5.1.** İşyeri aboneliklerinde tespit edilen ve sayaçsız olarak su kullanılan 87 adet özel kuyunun tamamına sayaç takılması gerçekleştirilecektir.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İşyeri aboneliklerinde tespit edilen ve sayaçsız olarak su kullanılan 87 adet özel kuyunun 2015 yılında 27 adet, 2016 yılında 30 adet, 2017 yılında 30 adedine sayaç takılması sağlanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	2015 yılında 27 adet sayaç takılması sağlanacaktır.	27	-	30	100
PROJELER	PROJE ADI	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
	Konya Şehir Merkezinde yer alan ve atıksu abonelik kaydı bulunan, ancak, sayaçsız olarak su kullanılan özel kuyuların tamamına sayaç takılmasını sağlamak.	27	-	30	100

PERFORMANS HEDEF	**3.6. Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak.**				
TANIMLAR		**HEDEFLER**			
MÜDÜRLÜK	**SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**3.6.1.** Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla, Şehir Merkezinde ve 6360 Sayılı Kanunla hizmet alanımıza dahil olan tüm yerlerde, su kullanımları kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesi sağlanacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Çalışmanın 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	Çalışmanın 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır.	100	-	100	100
PROJELER	PROJE ADI	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
	Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak.	100	-	100	100
PERFORMANS HEDEF	**3.7. Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği bölgelerde kaçak su kontrolü yapmak.**				
TANIMLAR		**HEDEFLER**			
MÜDÜRLÜK	**ALACAK TAKİP İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**3.7.1.** Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği bölgelerde bulunan 55.000 adet abonelikte kaçak su kontrolü yapılacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında, 9.000, 2016 yılında 10.000, 2017 yılında 11.000, 2018 yılında 12.000, 2019 yılında 13.000 adet abonelikte kaçak su kontrolü yapılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 ADET	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	2015 yılında, 9.000 adet abonelikte kaçak su kontrolü yapılacaktır.	9.000	-	0	0
PROJELER	PROJE ADI	2015 ADET	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
	Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği bölgelerde kaçak su kontrolü yapmak.	9.000	-	0	0
STRATEJİK AMAÇ	**4. SU-ATIKSU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARINI ARTIRMAK**				
PERFORMANS HEDEF	**4.1. Su ve Atık su tahakkuk oranlarını % 5 oranında artırmak**				

TANIMLAR	**HEDEFLER**
MÜDÜRLÜK	**TAHAKKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**
FAALİYET	**4.1.1.** 2015 yılından itibaren tahakkuk yapılma oranı, her yıl, bir önceki yıla göre %1 artırılacaktır.
PERFORMANS	2015 yılında %1, 2016 yılında %1, 2017 yılında %1, 2018 yılında %1, 2019 yılında %1 oranında artırılacaktır.

ÖLÇÜTÜ					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
%	2015 yılı sonuna kadar tahakkuk yapılma oranı %1 oranında artırılacaktır.	1	-	1,55	100
PROJELER	PROJE ADI	2015 %	2015 TL	Gerçekleşen 2015	Gerçekleşme - %
Adet	Su ve Atık su tahakkuk oranlarını % 5 oranında artırmak	1	-	1,55	100
PERFORMANS HEDEF	**4.2. Su ve Atık su tahsilat oranlarını % 5 oranında artırmak**				

TANIMLAR	**HEDEFLER**				
MÜDÜRLÜK	**ALACAK TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**				
FAALİYET	**4.2.1.** 2015 yılından itibaren tahsilat oranı, her yıl, bir önceki yıla göre %1 artırılacaktır.				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında %1, 2016 yılında %1, 2017 yılında %1, 2018 yılında %1, 2019 yılında %1 oranında artırılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 %	2015 TL	Adet	TL
Adet	2015 yılı sonuna kadar tahsilât yapılma oranı %1 oranında artırılacaktır.	1	-	4,38	100
PROJELER	PROJE ADI	2015 %	2015 TL	Adet	TL
Adet	Su ve Atık su tahsilat oranlarını % 5 oranında artırmak	1	-	4,38	100

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2015 YILI			
PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME TABLOSU		**HEDEFLENEN (TL)**		**GERÇEKLEŞEN (TL)**	**ORAN %**
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**2.970.000,00**		1.362.436,00	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**1.570.000,00**		126.265,00	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**1.400.000,00**		1.236.171,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	**2015 – Birim**			
	Elektronik Vezne Sistemlerinin(SUMAT) geliştirilmesi ve yeni vezne kurulması	**Adet**			
	Tüm saha çalışmalarını mobil uygulamalarla desteklemek	**Modül**			
	Yeni Çağrı Merkezi donanım ve yazılım alt yapısının kurulması	**Modül**			
	Network ve güvenlik altyapısının yenilenmesi	**Modül**			
STRATEJİK AMAÇ	**2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE HIZ, KALİTE VE TASARRUF SAĞLAMAK**				
PERFORMANS HEDEF	**2.1 Elektronik Vezne Sistemlerinin Hizmet Ağının Genişletilmesi**				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ				
FAALİYET	2.1.1 Elektronik Vezne Sistemlerinin(SUMAT) geliştirilmesi ve kurulması				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 Yılı içerisinde 10 adet Elektronik Vezne kurulması			Gerçekleşme	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 – Adet/ %	2015 – TL	**%**	**TL**
Adet	7/24 çalışan Elektronik Vezne Sistemleri hizmet ağının genişletilmesi ve kurulması.	100	1.000.000,00-TL	0	-
PROJELER	PROJE ADI	2015 – Adet/ %	2015 – TL		
	Elektronik Vezne Sistemlerinin Hizmet	100	-	0	-

	Ağının Genişletilmesi				
PERFORMANS HEDEF	**2.2 Tüm saha çalışmalarının mobil uygulamalarla desteklenmesi**				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ				
FAALİYET	Tüm saha çalışmalarını mobil uygulamalarla desteklemek				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 Yılı içersinde Tüm saha çalışmalarını mobil uygulamalarla desteklemek			Gerçekleşme	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 – Adet/ %	2015 – TL	**%**	**TL**
Modül	Mobil uygulama yazılımlarını kendi personellerimizle gerçekleştirmek.	100	-	70	-
				Gerçekleşme	
PROJELER	PROJE ADI	2015 – Adet/ %	2015 – TL	**%**	**TL**
	2015 Yılı içerisinde Tüm saha çalışmalarını mobil uygulamalarla desteklemek	100	-	70	-
PERFORMANS HEDEF	**2.3 Yeni Çağrı Merkezi donanım ve yazılım alt yapısının kurulması**				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ				
FAALİYET	Yeni Çağrı Merkezi donanım ve yazılım alt yapısının kurulup mevcut sisteme entegrasyonun yapılması				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 Yılı içerisinde yeni Çağrı Merkezi donanım ve yazılım alt yapısının kurulup mevcut sisteme entegrasyonun yapılması			Gerçekleşme	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 – Adet/ %	2015 – TL	**%**	**TL**
Modül	185 Çağrı merkezine gelen aramaların çağrı merkezi operatörlerine düşmesi ve raporlamalar konusunda daha profesyonel çözüm sağlamak	100	100.000,00-TL	36	36.000,00-TL
PROJELER	PROJE ADI	2015 – Adet/ %	2015 – TL		
	Yeni Çağrı Merkezi donanım ve yazılım alt yapısının kurulması	100	100.000,00TL	100	36.000,00-TL

PERFORMANS HEDEF	**2.4 Network ve güvenlik sistemleri altyapısının yenilenmesi**				
TANIMLAR		HEDEFLER			
MÜDÜRLÜK	DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ				
FAALİYET	Network aktif cihazlarının ve alt yapısının yenilenmesi				
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılı içerisinde mevcut Network aktif cihazlarının ve alt yapısının yenilenmesi			Gerçekleşme	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2015 – Adet/ %	2015 – TL	**%**	**TL**
Modül	Veri hızı ve bilgi güvenliği açısından gerekli olan aktif network cihazlarının, güvenlik cihazlarının ve alt yapısının yenilenmesi	100	470.000,00-TL	20	90.265,28-TL
PROJELER	PROJE ADI	2015 – Adet/ %	2015 – TL		
	Network ve güvenlik sistemleri altyapısının yenilenmesi	100	470.000,00-TL	20	90.265,28-TL

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		2015 YILI					
PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME TABLOSU		HEDEFLENEN (TL)		GERÇEKLEŞEN (TL)		ORAN %	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		780.000,00		217.229,31		28	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-		-		-	
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		780.000,00		217.229,31		28	
STRATEJİK AMAÇ	**2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.**						
PERFORMANS HEDEF	**2.1. İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNDE HUKUKA UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI, UYUŞMAZLIKLARIN ADLİ VE İDARİ MERCİLERDE ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜMLENMESİ**						
TANIMLAR	**HEDEFLER**	HEDEFLENEN		GERÇEKLEŞEN		DEĞERLENDİRME	
MÜDÜRLÜK	**HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**						
FAALİYET	2.1.1 Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge, genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması 2.1.2 Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması 2.1.3 İcra takibi ve davalarla ilgili (dava açılması, icra takibi yapılması, cevap, cevaba cevap delil bildirme, duruşma ve keşiflere katılmak Temyiz ve mürafa gibi) süreçlerin takibi ve tamamlanmasını sağlamak . 2.1.4 İcra tahsil oranlarını artırmak						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 Yılında Hukuk Müşavirliğimize ulaşan dava dosyalarını etkin bir şekilde çözüme ulaştırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TL	Birim	TL	Birim	%
%		100		70		70	

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2015 YILI					
PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME TABLOSU		HEDEFLENEN (TL)		GERÇEKLEŞEN (TL)		ORAN %	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		122.915,000,00		104.628,339,13		85	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		335.000,00		74.047,55		22	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**Birim**		**Birim**			
Kişi	1.000 kişiye **"Suyu Bilinçli Kullanma"** eğitim semineri verilmesi	1.000		1404		140	
Saat	Personelin yılda en az kişi başı bir saat hizmet içi eğitimden geçirilmesi	1.00		0,36		60	
Adet	Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 450 adet kitap alarak, kütüphanenin fiziki ortamını iyileştirmek.	450		450		100	
Adet	Yılda en az bir defa sosyal veya kültürel etkinlik yapmak	1		1		100	
STRATEJİK AMAÇ	**1. DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK**						
PERFORMANS HEDEF	**1.1.** Doğal çevreyi koruma ve su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacıyla ilk ve ortaöğretim öğrencilerine **"Suyu Bilinçli Kullanma"** eğitim semineri verilmesi						
	TANIMLAR	**2015 YILI HEDEFLENEN**		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	1.1.1. Su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacıyla ilk ve ortaöğretim öğrencilerine **"Suyu Bilinçli Kullanma"** eğitim semineri verilmesi						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	En az 1.000 kişiye **"Suyu Bilinçli Kullanma"** eğitim semineri verilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
Kişi	En az 1.000 kişiye **"Suyu Bilinçli Kullanma"** eğitim semineri verilmesi	1.000	0	1404	0	140	0
PROJELER	**PROJE ADI**	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
	En az 1.000 kişiye **"Suyu Bilinçli Kullanma"** eğitim semineri verilmesi	1.000	0	1404	0	140	0

STRATEJİK AMAÇ	**5. PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE MOTİVASYONU ARTIRMAK.**						
PERFORMANS HEDEF	**5.1** Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi, tecrübe ve motivasyonu artırmak.						
	TANIMLAR	2015 YILI HEDEFLENEN		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	5.1.1 Personelin hizmet içi eğitimden geçirilmesi.						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Personelin yılda en az kişi başı bir saat hizmet içi eğitimden geçirilerek, motivasyon ve verimini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
Saat	Personelin yılda en az kişi başı bir saat hizmet içi eğitimden geçirilmesi	1.00	150.000,00	0,36	64.327,55	60	42
PROJELER	**PROJE ADI**	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
	Personelin yılda en az kişi başı bir saat hizmet içi eğitimden geçirilmesi	1.00	150.000,00	0,36	64.327,55	60	42
PERFORMANS HEDEF	**5.2.** Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 450 adet kitap alarak, kütüphanenin fiziki ortamını iyileştirmek.						
	TANIMLAR	2015 YILI HEDEFLENEN		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	5.2.1. Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 450 adet kitap alarak, kütüphanenin fiziki ortamını iyileştirmek.						
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif kitap alımı						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
Adet	Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 450 adet kitap alarak, kütüphanenin fiziki ortamını iyileştirmek.	450	120.000,00	450	9.720,00	100	0,08
PROJELER	**PROJE ADI**	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
	Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 450 adet kitap alarak, , kütüphanenin fiziki ortamını iyileştirmek	450	120.000,00	450	9.720,00	100	0,08
PERFORMANS HEDEF	5.3. Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.						
	TANIMLAR	2015 YILI HEDEFLENEN		2015 YILI GERÇEKLEŞEN		2015 YILI DEĞERLEME	
MÜDÜRLÜK	EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYET	5.3.1. Personel için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.						

PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yılda en az bir defa sosyal veya kültürel etkinlik yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
Adet	Personel için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	1	65.000,00	1	0	100	0
PROJELER	**PROJE ADI**	Birim	TL	Birim	TL	Birim / %	TL / %
	Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	1	65.000,00	1	0	100	0

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI		2015 YILI		
PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME TABLOSU		**HEDEFLENEN (TL)**	GERÇEKLEŞEN **(TL)**	**ORAN %**
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		19.200.000,00 TL	14.791.869,93 TL	77
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		7.200.000,00 TL	3.761.999,22 TL	52
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		12.000.000,00 TL	11.029.870,71 TL	92
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	Birim	%
Km	2015 yılında 190 km Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.	190 km	158,27 km	83
Adet	2015 yılında 77.000 adet Yağmursuyu rögarları ve bağlantı hatları temizlenecektir.	77.000 ad.	77.682 ad.	101
Adet	2015 yılında 250 adet Atıksu deşarjı yapan endüstrilerin denetimi yapılacaktır.	250 ad.	382 ad.	152
Kw/h	2015 yılında Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılacak elektrik enerjisinin %54'ünü tesiste üretilecek biyogazdan karşılanması	%54	%54,79	101
Adet	2015 yılında ilçelere 3 adet Atıksu Arıtma Tesisleri yapılacaktır.	3 ad.	Yapım işleri devam etmektedir.	57
TL	2015 yılında mahallelere 10.000.000 TL'lik Atıksu Arıtma Tesisleri yapılacaktır.	5.000.000 TL	2.271.540,12 TL	45
STRATEJİK AMAÇ	**1.**DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK			
PERFORMANS HEDEF	1. Kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışması ve ıslah çalışmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon şebekelerin temizlenmesi.			
	2. Kanalizasyon sistemi birleşik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi			
	3. Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon şebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi			
	4. Konya Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ekonomik işletilmesi.			
	5. Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla ilçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması			
	6. Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla mahallelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması			
TANIMLAR		HEDEFLER		

MÜDÜRLÜK	KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Stratejik Hedef 1.3	Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon şebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi.						
FAALİYET	1.3.1 Kanalizasyon şebekesi temizlenmesi 1.3.2 Yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi	**2015 YILI HEDEFLENEN**		**2015 YILI** GERÇEKLEŞEN		**2015 YILI** DEĞERLEME	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında 190 km Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir. 2015 yılında 77.000 adet Yağmursuyu rögarları temizlenecektir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TL	Birim	TL	Birim %	%
Km	2015 yılında 190 km Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.	190 km	1.000.000,00	158,27 km	635.549,10	83,30	63
Adet	2015 yılında 77.000 adet Yağmursuyu rögarları temizlenecektir.	77.000 Ad.	1.200.000,00	77.682 ad.	854.910,00	100,88	71
PROJELER	PROJE ADI	Birim	TL		TL	Birim %	%
	Kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışması ve ıslah çalışmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon şebekelerin temizlenmesi.	190 km	1.000.000,00	158,27 km	635.549,10	83,30	63
	Kanalizasyon sistemi birleşik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi	77.000 Ad.	1.200.000,00	77.682 ad.	854.910,00	100,88	71
TANIMLAR		HEDEFLER					
MÜDÜRLÜK	ATIKSU KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Stratejik Hedef 1.4	Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla hizmet alanımız içerisinde yer alan ilçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması						
FAALİYET	1.4.1. Atıksu deşarjı yapan endüstrilerin denetimlerini yapmak.	**2015 YILI HEDEFLENEN**		**2015 YILI** GERÇEKLEŞEN		**2015 YILI** DEĞERLEME	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2015 yılında 250 adet Atıksu deşarjı yapan endüstrilerin denetimi yapılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TL	Birim	TL	Birim %	%
Adet	2015 yılında 250 adet Atıksu deşarjı yapan endüstrilerin denetimi yapılacaktır.	250 ad.	-	382 ad.	-	152,80	-
PROJELER	PROJE ADI	Birim	TL		TL	Birim %	%
	Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon şebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi.	250 ad.	-	382 ad.	-	152,80	-
TANIMLAR		HEDEFLER					
MUDURLUK	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Stratejik Hedef 1.6	Kanalizasyon sistemi birleşik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerinin temizlenmesi						

FAALIYET	1.6.1. Konya Atıksu Arıtma Tesisinde üretilen biyogazın veriminin artırılması ile tesiste kullanılan elektrik enerjisi maliyetinin azaltılması.	2015 YILI HEDEFLENEN			2015 YILI GERÇEKLEŞEN			2015 YILI DEĞERLEME	
	1.6.2. İlçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması								
	1.6.3. Mahallelere 5 yıl içerisinde 30.000.000 TL'lik Atıksu Arıtma Tesisleri yapılması								
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İşletmede kullanılan elektrik enerjisinin 2015 yılında %54'ünün biyogazdan karşılanması.								
	İlçelere 2015 yılında 3 adet Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması								
	Mahallelere 2015 yılında 10.000.000 TL'lik Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	Birim	TL		Birim	TL		Birim %	%
Kw/h	İşletmede kullanılan elektrik enerjisinin 2015 yılında %54'ünün biyogazdan karşılanması.	%54			%54,79			101	
Adet	**İlçelere 2015 yılında 3 adet Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması**	3 ad.			Yapım işleri devam ediyor			%57	
TL	**İlçelere 2015 yılında 10.000.000 TL'lik Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması**	5.000.000 TL			2.271.540,12 TL			45	
PROJELER	PROJE ADI	Birim	TL		Birim	TL		Birim %	%
	Konya Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ekonomik işletilmesi	%54			%54,79			101	
	İlçelere Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması	3 ad.			Yapım işleri devam ediyor			%57	
	Mahallelere Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması	5.000.000 TL			2.271.540,12 TL			45	

B – MALİ BİLGİLER / Mali Tablolar

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
AKTİF				2013	2014	2015
1			**DÖNEN VARLİKLAR**	**91.659.770,32**	**167.029.099,74**	**197.193.929,48**
1	**0**		**Hazır Değerler**	**6.347.464,10**	**12.290.004,28**	**3.994.634,21**
1	0	0	Kasa Hesabi	32.762,48	42.380,22	48.975,36
1	0	2	Banka Hesabi	6.067.112,34	12.014.826,26	3.527.620,61
1	0	3	Verilen Cekler Ve Gonderme Emirleri He	0,00	0,00	175.003,32
1	0	5	Döviz Hesabi	87.212,01	0,00	0,00
1	0	8	Diğer Hazir Değerler Hesabi	0,00	37.144,71	42.407,68
1	0	9	Banka Kredi Kartlarindan Alacaklar Hes	160.377,27	195.653,09	200.627,24
1	**2**		**Faaliyet Alacakları**	**12.440.813,94**	**29.830.790,36**	**45.525.435,99**
1	2	1	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi	11.375.649,06	28.639.363,91	44.197.983,00
1	2	6	Depozito	1.065.164,88	1.191.426,45	1.327.452,99
1	**3**		**Kurum Alacakları**	**49.334.507,89**	**89.397.501,63**	**87.816.671,06**
1	3	2	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar H	49.334.507,89	89.397.501,63	87.816.671,06
1	**4**		**Diğer Alacaklar**	**5.033.671,71**	**1.104.398,72**	**723.608,72**
1	4	0	Tahsilinde Butceye Gelir Kaydedilecek	5.033.671,71	1.104.398,72	723.608,72
1	**5**		**Stoklar**	**9.366.281,64**	**17.096.252,57**	**26.337.339,56**
1	5	0	İlk Madde Ve Malzemeler	9.366.281,64	17.096.252,57	26.337.339,56
1	**6**		**Ön Ödemeler**	**657.259,71**	**977.622,61**	**973.194,88**
1	6	2	Bütçe Dişi Avans Ve Krediler Hesabi	590.086,47	977.622,61	973.194,88
1	6	5	Mahsup Dönemine Aktarilan Avans Ve Kre	67.173,24	0,00	0,00
1	**9**		**Diğer Dönen Varlıklar**	**8.479.771,33**	**16.332.529,57**	**31.823.045,06**
1	9	0	Devreden Katma Deger Vergisi Hesabi	8.479.771,33	16.332.529,57	31.823.045,06
2			**DURAN VARLİKLAR**	**276.224.899,14**	**496.656.120,37**	**636.692.766,93**
2	**4**		**Mali Duran Varlıklar**	**1.091.245,10**	**1.341.245,10**	**5.351.245,10**
2	4	0	Mali Kuruluşlara Yatirilan Sermayeler	576.245,10	576.245,10	576.245,10
2	4	1	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatir	515.000,00	765.000,00	4.775.000,00
2	**5**		**Maddi Duran Varlıkları**	**274.971.646,73**	**495.314.875,27**	**631.341.521,83**
2	5	0	Arazi Ve Arsalar Hesabi	38.919.949,02	39.496.947,74	39.572.537,00
2	5	1	Yeralti Ve Yerustu Duzenleri Hesabi	415.604.785,66	635.878.282,54	782.557.853,27
2	5	2	Binalar Hesabi	7.801.673,30	11.643.136,94	11.708.095,94
2	5	3	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi	73.770.383,17	85.173.696,28	89.625.072,00
2	5	4	Taşitlar Grubu	6.715.279,38	12.426.559,09	20.132.100,21
2	5	5	Demirbaşlar Grubu	4.847.013,84	7.811.237,45	8.508.746,87
2	5	7	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)	-272.687.437,64	-297.114.984,77	-320.762.883,46
2	6	0	Haklar Hesabi	2.175.061,78	2.359.495,85	2.550.599,68
2	6	8	Birikmis Amortismanlar Hesabi (-)	-2.175.061,78	-2.359.495,85	-2.550.599,68
2	**9**		**Diğer Çeşitli Duran Varliklar**	**162.007,31**	**0,00**	**0,00**
2	9	4	Elden Çikarilacak Stoklar Ve Maddi Dur	364.445,06	0,00	0,00
2	9	9	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)	-202.437,75	0,00	0,00
AKTİF TOPLAM				**367.884.669,46**	**663.685.220,11**	**833.886.696,41**
9			**NAZİM HESAPLAR**	**18.163.488,10**	**60.812.130,91**	**507.888.190,97**

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
PASİF				2013	2014	2015
3			**KİSA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR**	**11.887.601,85**	**51.919.031,46**	**91.133.884,98**
3	**0**		**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**391.377,00**	**10.457.996,08**	**16.178.396,04**
3	0	0	Banka Kredileri Hesabi	0,00	10.066.619,08	15.787.019,04
3	0	3	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabi	391.377,00	391.377,00	391.377,00
3	**1**		**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**1.257.542,54**	**1.366.293,12**	**2.498.295,27**
3	1	0	Cari Yilda Ödenecek Diş Mali Borçlar H	1.257.542,54	1.366.293,12	2.498.295,27
3	**2**		**Faaliyet Borçları**	**5.400.041,15**	**21.173.998,89**	**49.668.215,41**
3	2	0	Bütçe Emanetleri Hesabi	5.400.041,15	21.173.998,89	49.668.215,41
3	**3**		**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.303.635,22**	**4.078.478,54**	**7.407.459,66**
3	3	3	Emanetler Hesabi	1.303.635,22	4.078.478,54	7.407.459,66
3	**6**		**Ödenecek Vergi Ve Diğer**	**2.086.887,22**	**4.306.262,69**	**3.862.131,22**
3	6	0	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi	890.301,49	1.631.267,98	1.999.731,41
3	6	1	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri H	152.200,10	748.890,89	718.688,61
3	6	2	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adin	825.166,63	1.643.341,40	954.865,36
3	6	3	Kamu İdareleri Paylari Hesabi	219.219,00	282.762,42	188.845,84
3	**7**		**Kidem Tazminati Karşiliği Hesabi**	**1.114.613,20**	**1.300.206,31**	**300.292,75**
3	7	2	Kidem Tazminati Karşiliği Hesabi	1.114.613,20	1.282.456,06	265.602,75
3	7	9	Diğer Borç Ve Gider Karşiliklari Hesab	0,00	17.750,25	34.690,00
3	**8**		**Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabi**	**333.505,52**	**9.235.795,83**	**11.219.094,63**
3	8	1	Gider Tahakkuklari Hesabi	333.505,52	9.235.795,83	11.219.094,63
4			**UZUN VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR**	**61.059.728,80**	**253.053.953,25**	**338.027.641,05**
4	**0**		**Uzun Vadeli Iç Mali Borçlar**	**6.653.409,00**	**162.403.903,11**	**208.781.504,74**
4	0	0	Banka Kredileri Hesabi	0,00	156.141.871,11	202.910.849,74
4	0	3	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabi	6.653.409,00	6.262.032,00	5.870.655,00
4	**1**		**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**16.128.836,94**	**16.157.343,83**	**17.761.330,69**
4	1	0	Diş Mali Borçlar Hesabi	16.128.836,94	16.157.343,83	17.761.330,69
4	**3**		**Diğer Borçlar**	**32.597.305,55**	**38.625.377,10**	**51.434.900,64**
4	3	0	Alinan Depozito Ve Teminatlar Hesabi	32.597.305,55	38.625.377,10	51.434.900,64
4	**7**		**Kidem Tazminati Karşiliği Hesabi**	**4.768.970,21**	**22.928.294,12**	**40.091.096,70**
4	7	2	Kidem Tazminati Karşiliği Hesabi	4.768.970,21	22.928.294,12	40.065.546,70
4	7	9	Diğer Borç Ve Gider Karşiliklari Hesab	0,00	0,00	25.550,00
4	**8**		**Gelecek Yıllara Ait Gelirler**	**911.207,10**	**12.939.035,09**	**19.958.808,28**
4	8	1	Gider Tahakkuklari Hesabi	911.207,10	12.939.035,09	19.958.808,28
5			**ÖZ KAYNAKLAR**	**294.937.338,81**	**358.712.235,40**	**404.725.170,38**
5	**0**		**Net Değer-Sermaye**	**169.620.283,79**	**204.420.471,31**	**219.688.014,84**
5	0	0	Net Değer Hesabi	169.620.283,79	204.420.471,31	219.688.014,84
5	**7**		**Geçmiş Yillar Olumlu Faaliyet Sonuçlar**	**92.394.491,91**	**118.042.529,79**	**139.536.872,40**
5	7	0	Geçmiş Yillar Olumlu Faaliyet Sonuçlar	92.394.491,91	118.042.529,79	139.536.872,40
5	**9**		**Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabi**	**32.922.563,11**	**36.249.234,30**	**45.500.283,14**
5	9	0	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabi	32.922.563,11	36.249.234,30	45.500.283,14
PASİF TOPLAM				**367.884.669,46**	**663.685.220,11**	**833.886.696,41**
9			**NAZİM HESAPLAR**	**18.163.488,10**	**60.812.130,91**	**507.888.190,97**

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 2015

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI				**350.600.415,40**
03			**TEŞEBBÜS MÜLKİYET GELİRLERİ**	**246.438.115,85**
03	**01**		**MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ**	**245.854.900,82**
03	01	01	MAL SATIŞ GELİRLERİ	2.045.671,87
03	01	02	HİZMET GELİRLERİ	243.809.228,95
03	**06**		**KİRA GELİRLERİ**	**583.215,03**
03	06	01	TAŞINMAZ KİRALARI	59.987,28
03	06	02	TAŞINIR KİRA GELİRLERİ	523.227,75
03	**09**		**DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**	**0,00**
03	09	09	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00
04			**ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR**	**57.427,93**
04	**04**		**KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARD.**	**57.427,93**
04	04	01	CARİ	57.427,93
05			**DİĞER GELİRLER**	**104.104.871,62**
05	**01**		**FAİZ GELİRLERİ**	**3.924.670,64**
05	01	04	TAKİPTEKİ KURUM ALACAK FAİZLERİ	3.901.611,95
05	01	09	DİĞER FAİZLER	23.058,69
05	**02**		**KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR**	**81.317.019,46**
05	02	02	VERGİ RESİM VE HARÇ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR	73.619.386,27
05	02	04	KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI	7.697.633,19
05	**03**		**PARA CEZALARI**	**2.818.249,48**
05	03	09	DİĞER PARA CEZALARI	2.818.249,48
05	**09**		**DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER**	**16.044.932,04**
05	09	01	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	16.044.932,04
06			**SERMAYE GELİRLERİ**	**0,00**
06	**02**		**TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ**	**0,00**
06	02	03	STOK SATIŞ GELİRLERİ	0,00
08			**ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR**	**0,00**
08	**01**		**YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR**	**0,00**
08	01	05	MAHALLİ İDARELERDEN	0,00
			RED VE İADELER	
03			TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET	**-7.263,46**
05			TAŞINIR KİRALARI	**-4.261,60**
A) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI				**350.588.890,34**
BÜTÇE GİDER FAZLASI (B-A)				**-89.667.723,26**

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			**440.256.613,60**
01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**56.097.000,96**
01	01	MEMURLAR	23.649.295,98
01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	188.545,21
01	03	İŞÇİLER	32.220.739,77
01	04	GEÇİCİ PERSONEL	38.420,00
01	05	DİĞER PERSONEL	0,00
02		**SOSYA GÜVENLİK KURUMLARI GİDERLERİ**	**9.739.226,01**
02	01	MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	3.247.441,55
02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	28.379,40
02	03	İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	6.463.405,06
03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**159.477.991,88**
03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	15.221.646,58
03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	69.141.012,97
03	03	YOLLUKLAR	182.348,91
03	04	GÖREV GİDERLERİ	1.786.806,76
03	05	HİZMET ALIMLARI	64.577.351,59
03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	60.389,74
03	07	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİD.	3.279.503,72
03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.228.931,61
04		**FAİZ GİDERLERİ**	**10.662.854,78**
04	02	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	10.319.251,67
04	03	DIŞ BORÇ FAİZ ÖDEMELERİ	343.603,11
05		**CARİ TRANSFERLER**	**4.472.149,38**
05	01	GÖREV ZARARLARI	742.076,11
05	03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARA YAPILAN TRANS.	1.626.942,77
05	08	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.103.130,50
06		**SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ**	**195.797.390,59**
06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	9.062.280,78
06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	219.796,66
06	03	GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	107.266,52
06	04	GAYRİMENKUL MAL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA GİDER.	94.469,26
06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	179.542.717,90
06	07	MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	6.770.859,47
07		**SERMAYE TRANSFERLERİ**	**4.010.000,00**
07	01	**YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ**	**4.010.000,00**
B) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			**440.256.613,60**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU									YIL : 2015
HESAP KODU	YARD. HES.KD.		GİDERİN TÜRÜ	GİDERİN TUTARI	HESAP KODU	YARD. HES.KD.		GELİRİN TÜRÜ	GELİRİN TUTARI
630			**GİDERLER HESABI**	**290.530.616,99**	**600**			**GELİRLER HESABI**	**336.030.900,13**
630	**1**		**Personel Giderleri**	**72.216.542,04**	**600**	**3**		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**242.067.360,78**
630	1	1	Memurlar	**23.649.295,98**	600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	241.484.253,52
630	1	2	Sözleşmeli Personel	**187.687,02**	600	3	6	Kira Gelirleri	583.107,26
630	1	3	İşçiler	**48.341.139,04**	**600**	**4**		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**75.712,46**
630	1	4	Geçici Personel	**38.420,00**	600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	**75.712,46**
630	1	5	Diğer Personel	**0,00**	**600**	**5**		**Diğer Gelirler**	**88.423.432,69**
630	**2**		**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**	**9.739.226,01**	600	5	1	Faiz Gelirleri	3.799.931,04
630	2	1	Memurlar	3.247.441,55	600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	81.144.928,41
630	2	2	Sözleşmeli Personel	28.379,40	600	5	3	Para Cezaları	2.769.516,21
630	2	3	İşçiler	6.463.405,06	600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	709.057,03
630	**3**		**Mal Ve Hizmet Alım Giderleri**	**113.441.867,62**	**600**	**11**		**Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri**	**5.464.394,20**
630	3	1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	2.442.851,05	600	11	**5**	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Fark	0,00
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	51.197.048,32	600	11	6	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Azalışlar	1.255.301,22
630	3	3	Yolluklar	182.348,91	600	11	8	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimlerinden Kaynaklanan	2.370.262,41
630	3	4	Görev Giderleri	1.785.778,63	600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.838.830,57
630	3	5	Hizmet Alımları	53.135.652,47					
630	3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	60.061,95					
630	3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım	1.221.858,54					
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	3.416.267,75					
630	**4**		**Faiz Giderleri**	**20.038.281,57**					
630	4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	19.752.501,21					
630	4	3	Dış Borç Faiz Giderleri	285.780,36					
630	**5**		**Cari Transferler**	**9.326.299,70**					
630	5	1	Görev Zararları	742.076,11					
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	6.481.093,09					

			Yapılan			
630	5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.103.130,50		
630	**7**		**Sermaye Transferleri**	**0,00**		
630	**11**		**Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri**	**5.597.792,05**		
630	11	1	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan	5.597.792,05		
630	**13**		**Amortisman Giderleri**	**25.744.836,98**		
630	13	1	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	25.553.733,15		
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman	191.103,83		
630	**14**		**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	**33.823.728,04**		
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	226.685,54		
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim	28.727,49		
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	1.022.388,43		
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	7.604.356,26		
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	169.631,48		
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	264.089,86		
630	14	7	Yiyecek	32.635,29		
630	14	8	İçecek	37.610,00		
630	14	10	Zirai Maddeler	2.781,44		
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	5.344.959,90		
630	14	13	Yedek Parçalar	15.681.751,52		
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	236.528,35		
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	21.450,00		
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	3.059.517,93		
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	90.614,55		
630	20		Silinen Alacaklardan	243.423,50		
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	358.619,48		
			(A) GİDERLER TOPLAMI	**290.530.616,99**	**(B) GELİRLER TOPLAMI**	**336.030.900,13**


FAALİYET KARI (B-A)	**45.500.283,14**
FAALİYET ZARARI (B-A)	**0,00**

GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ			2015
Gelir Kodları	GELİR TÜRLERİ	GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ	GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Su Hiz.İlişkin Gelirler)	301.070.00,00	246.438.115,85
	Şartname, Basili Evrak, Form Satış Gelirleri	60.000,00	23.368,82
	Diğer Mal Satış Gelirleri	480.000,00	2.022.303,05
	Avukatlık Vekalet Ücret Gelirleri	120.000,00	34.073,90
	Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	55.000,00	60.786,30
	Esenlik Hizmetleri (Atıksu Gelirleri)	75.000.000,00	46.722.476,06
	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	225.000.000,00	196.991.892,69
	Lojman Kira Gelirleri	50.000,00	59.987,28
	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	5.000,00	0,00
	Taşınır Kira Gelirleri	300.000,00	523.227,75
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	250.000,00	57.427,93
	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar (Çevre Bakanlığı)	250.000,00	57.427,93
5	Diğer Gelirler	116.525.000,00	104.104.871,62
	Takipteki Kurum Alacak Faizleri	1.500.000,00	3.901.611,95
	Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.000.000,00	0,00
	Mevduat Faizleri	1.500.000,00	23.058,69
	Merkezi idare Vergi Gel. Alın. Pay.(İller Bankası Payı)	90.000.000,00	73.619.386,27
	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	5.000.000,00	3.885.774,43
	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	5.000.000,00	3.811.858,76
	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	400.000,00	2.818.249,48
	Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	50.000,00	206.421,37
	Irat Kaydedilecek Teminat Mektupları	50.000,00	0,00
	Para Farkları	25.000,00	361,67
	Kişilerden Alacaklar	12.000.000,00	15.838.149,00
6	Sermaye Gelirleri	361.000,00	0,00
	Lojman Satış Gelirleri	1.000,00	0,00
	Taşınır Satış Gelirleri	100.000,00	0,00
	Taşıt Satış Gelirleri	60.000,00	0,00
	Stok Satış Gelirleri	200.000,00	0,00
8	Alacaklardan Tahsilat	100.000,00	0,00
	Bağlı İdarelerden	100.000,00	0,00
9	Red ve İadeler (-)	0,00	-11.525,06
	Hizmet Gelirleri	0,00	-11.525,06
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI		418.306.000,00	350.588.890,34
			FİNANSMAN GERÇEKLEŞMESİ
1	İÇ BORÇLANMA	58.667.697,00	28.684.822,75
1	İÇ BORÇLANMA GERİ ÖDEMESİ	-392.000,00	-20.262.385,60
2	DIŞ BORÇLANMA	0,00	0,00
2	DIŞ BORÇ GERİ ÖDEMESİ	-1.581.697,00	-2.003.034,63
3	BANKA MEVCUTLARI	10.000.000,00	12.247.624,06
FİNANSMAN TOPLAMI		66.694.000,00	18.667.026,58
BÜTÇE TOPLAMI		485.000.000,00	369.255.916,92

GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ			2015
Gider Kodları		GİDER TÜRLERİ	GİDER BÜTÇESİ TAHMİNİ	GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ
01		PERSONEL GİDERLERİ	70.117.700,00	56.097.000,96
01	01	MEMURLAR	25.175.200,00	23.649.295,98
01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	762.500,00	188.545,21
01	03	İŞÇİLER	44.120.000,00	32.220.739,77
01	04	GEÇİCİ PERSONEL	60.000,00	38.420,00
01	05	DİĞER PERSONEL	0,00	0,00
02		SOSYA GÜVENLİK KURUMLARI GİDERLERİ	13.166.300,00	9.739.226,01
02	01	MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	3.470.000,00	3.247.441,55
02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	92.300,00	28.379,40
02	03	İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	9.604.000,00	6.463.405,06
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	169.063.000,00	159.477.991,88
03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	22.050.000,00	15.221.646,58
03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	64.992.000,00	69.141.012,97
03	03	YOLLUKLAR	815.000,00	182.348,91
03	04	GÖREV GİDERLERİ	1.609.000,00	1.786.806,76
03	05	HİZMET ALIMLARI	71.619.000,00	64.577.351,59
03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	150.000,00	60.389,74
03	07	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİD.	3.947.000,00	3.279.503,72
03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.880.000,00	5.228.931,61
03	09	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.000,00	0,00
04		FAİZ GİDERLERİ	10.450.000,00	10.662.854,78
04	02	İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	10.000.000,00	10.319.251,67
04	03	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	450.000,00	343.603,11
05		CARİ TRANSFERLER	4.438.000,00	4.472.149,38
05	01	GÖREV ZARARLARI	433.000,00	742.076,11
05	03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARA YAPILAN TRANS.	1.755.000,00	1.626.942,77
05	08	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.250.000,00	2.103.130,50
06		SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	201.765.000,00	195.797.390,59
06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	7.465.000,00	9.062.280,78
06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	250.000,00	219.796,66
06	03	GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	230.000,00	107.266,52
06	04	GAYRİMENKUL MAL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA GİDER.	310.000,00	94.469,26
06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	187.760.000,00	179.542.717,90
06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERELRİ	5.750.000,00	6.770.859,47
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000.000,00	4.010.000,00
07	01	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000.000,00	4.010.000,00
09		YEDEK ÖDENEKLER	15.000.000,00	0,00
09	01	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	1.000.000,00	0,00
09	02	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00
09	06	YEDEK ÖDENEK	14.000.000,00	0,00
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	485.000.000,00	440.256.613,60

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ GZFT ANALİZİ





Güçlü Yönler

- İdarenin müstakil bütçeli ve ekonomik açıdan güçlü bir finansmana sahip olması
- Birimler arasında koordinasyonun ve iletişimin çabuk sağlanması
- Güçlü ve modern bir Atıksu Arıtma Tesisine sahip olunması
- Kurumun genelinde konusunda deneyim kazanmış personel bulunması
- Personelin öz verili çalışması ve işine özen göstermesi
- Kanalizasyon ve su arıza ekiplerinin tecrübeli ve gerekli donanımlara sahip olması neticesinde arızalara en kısa sürede ulaşarak müdahalede bulunması.
- Yöneticilerin ve personelin eğitimli ve kendini geliştirmeye açık olması
- Kurumun güçlü ve köklü bir geçmişe sahip olması
- Yasa ve yönetmeliklere titizlikle uyulması
- Kurumun bütün kamu ve kuruluşları ile işbirliği içinde olması
- Teknolojik düzey ve çalışma ortamının iyi olması
- Alt yapı hizmetlerinin genelde tamamlanmış olması
- Personeller arası saygı, sevgi ve hoşgörü olgusunun olması
- İşlerin hızlı ve zamanında yapılması
- Bilgisayar altyapısının güçlü olması
- Malzeme ikmalinde hızlı olunması.
- Personelimize ait maaş, ikramiye ve benzeri ödemelerin zamanında yapılması.
- Kombine kanal açma ve temizleme araçları ile temizlenen şebekelerin kanal içi görüntüleme aracı ile izlenerek yapılan temizliğin kontrol edilebilmesi
- Şebekelerin temizlenmesinden dolayı ıslah çalışmalarının ve arızaların azaltılması.
- Araç filosunun zengin olması
- Acil ve beklenmeyen işler için kurumun kendi tamirhane servisinin olması.
- Kanal abone hatlarının itme sistemli görüntüleme cihazı ile kontrol edilerek arızalı kısım noktasal olarak tespit edilebilmektedir.
- Kurumumuza ait makine parkında yeterli miktarda araç, iş makinesi ve ekipmanların olmasından dolayı işlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi.
- Çalışanların İdareyi temsil etme çabası.





Zayıf Yönler

- Altyapıya ait sayısallaştırma bilgilerinin yetersiz oluşu.
- Vatandaşlarımız tarafından mesken ve endüstriyel kanalizasyon deşarjlarının bil sizce yapılması
- Geçmişteki kanal abone bağlantılarının usulüne uygun olarak yapılmamış olması
- Kanalizasyon muayene baca kapaklarının zemin altında bulunması
- Bazı projelerin hayata geçirilmesinde Birimler arası koordinasyonun zayıf olması.
- Coğrafi hizmet alanının geniş olması.
- Kanalizasyon sisteminin birleşik sistem olması.
- Belediyelere bağlı olarak planlanan yatırım programlarımızdaki bazı projelerin ilgili belediyelerce yapılmaması nedeniyle uygulanamaması.
- Sosyal tesis ve aktivitelerin eksikliği

Fırsatlar

- Sanayinin gelişmiş olması
- Coğrafi yapının gelişmeye uygun olması
- Abonelerimizin kurumumuza güven duymaları
- Şehrin mevcut içme suyu ve kanalizasyon projelerinin revize edilmesi ve eksik yerlerin projelerinin tamamlanması
- Diğer illere göre su ve kanalizasyon hizmetlerine karşı, şehrimiz halkının daha duyarlı olması.
- Hizmet içi ve Mesleki teknik eğitim programlarının artırılması
- Bilgisayar gibi demirbaş malzemelerin ihtiyaca göre arttırılarak modernleştirilmesi
- Mevcut ve yeni yeşil alanlarda kentin yapısına uygun daha az suya ihtiyaç duyan bitki türlerinin tercih edilmesi
- İçme suyu havzalarında yapılan Ağaçlandırma çalışmaları projelendirilip artarak devam etmesi
- Şehrin düzenli ve planlı yerleşimi
- Yerel yönetim anlayışının gelişmesi
- İdaremizin mali yönden herhangi bir sorununun bulunmaması
- Kurumumuzun teknolojiye açık olması ve teknolojinin imkanlarından maksimum şekilde faydalanması
- Büyük projelerin kurum içinde planlanarak Sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımının sağlanması
- Suyun tasarruflu kullanılması ve sulama sistemleri hakkında tasarruf için danışmanlık hizmeti verilmesi

Tehditler

- Orman alanlarının az oluşu
- Birleşik sistem olarak çalışan mevcut kanalizayon şebekesine her yıl yeni bağlantıların dahil edilmesiyle şebekenin yükü artmaktadır. Ayrıca şiddetli yağışlarda kanalizasyon şebekelerindeki doluluktan dolayı geri tepmeler nelup,problemin boyutunu artırmaktadır.
- Altyapı çalışması yapan kurum ve kuruluşların çalışmaları esnasında kanalizasyon şebekelerine vermiş oldukları tahribatı bildirmemeleri sonucu oluşan arızaların yolun üst yapısının tamamlandıktan sonra ortaya çıkmasından dolayı yapılan tamiratların yol kaplamasına zarar vermesi.
- Endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine kontrolsüz deşarj edilmesi neticesinde, Konya Atıksu Arıtma tesisinde işletme maliyetinin artmasına ve arıtılmış su kalitesinin olumsuz etkilenmesi.
- Verimli tarım arazilerinin sanayi yatırımları için kullanılması
- Çevre kirliliği (Su, hava, toprak)
- Konya'daki yağış rejiminin düzensiz ve yağışın az olması, belirlenen su kaynaklarında verim düşüklüğüne ve bu da gelecekte su sıkıntısı yaşanması ihtimalini ortaya çıkarması.

T.C. KO S K İ

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Konya / 2015

İsmail Selim UZBAŞ
Genel Müdür

T.C. KO S K İ

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2015 yılı Faaliyet Raporunun "III/B- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Konya / 2015

Mustafa KARATAŞ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı V.
