2016 Yılı Faaliyet Raporu

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Elektronik örneğini

www.buski.gov.tr

adresinde bulabilirsiniz.



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ

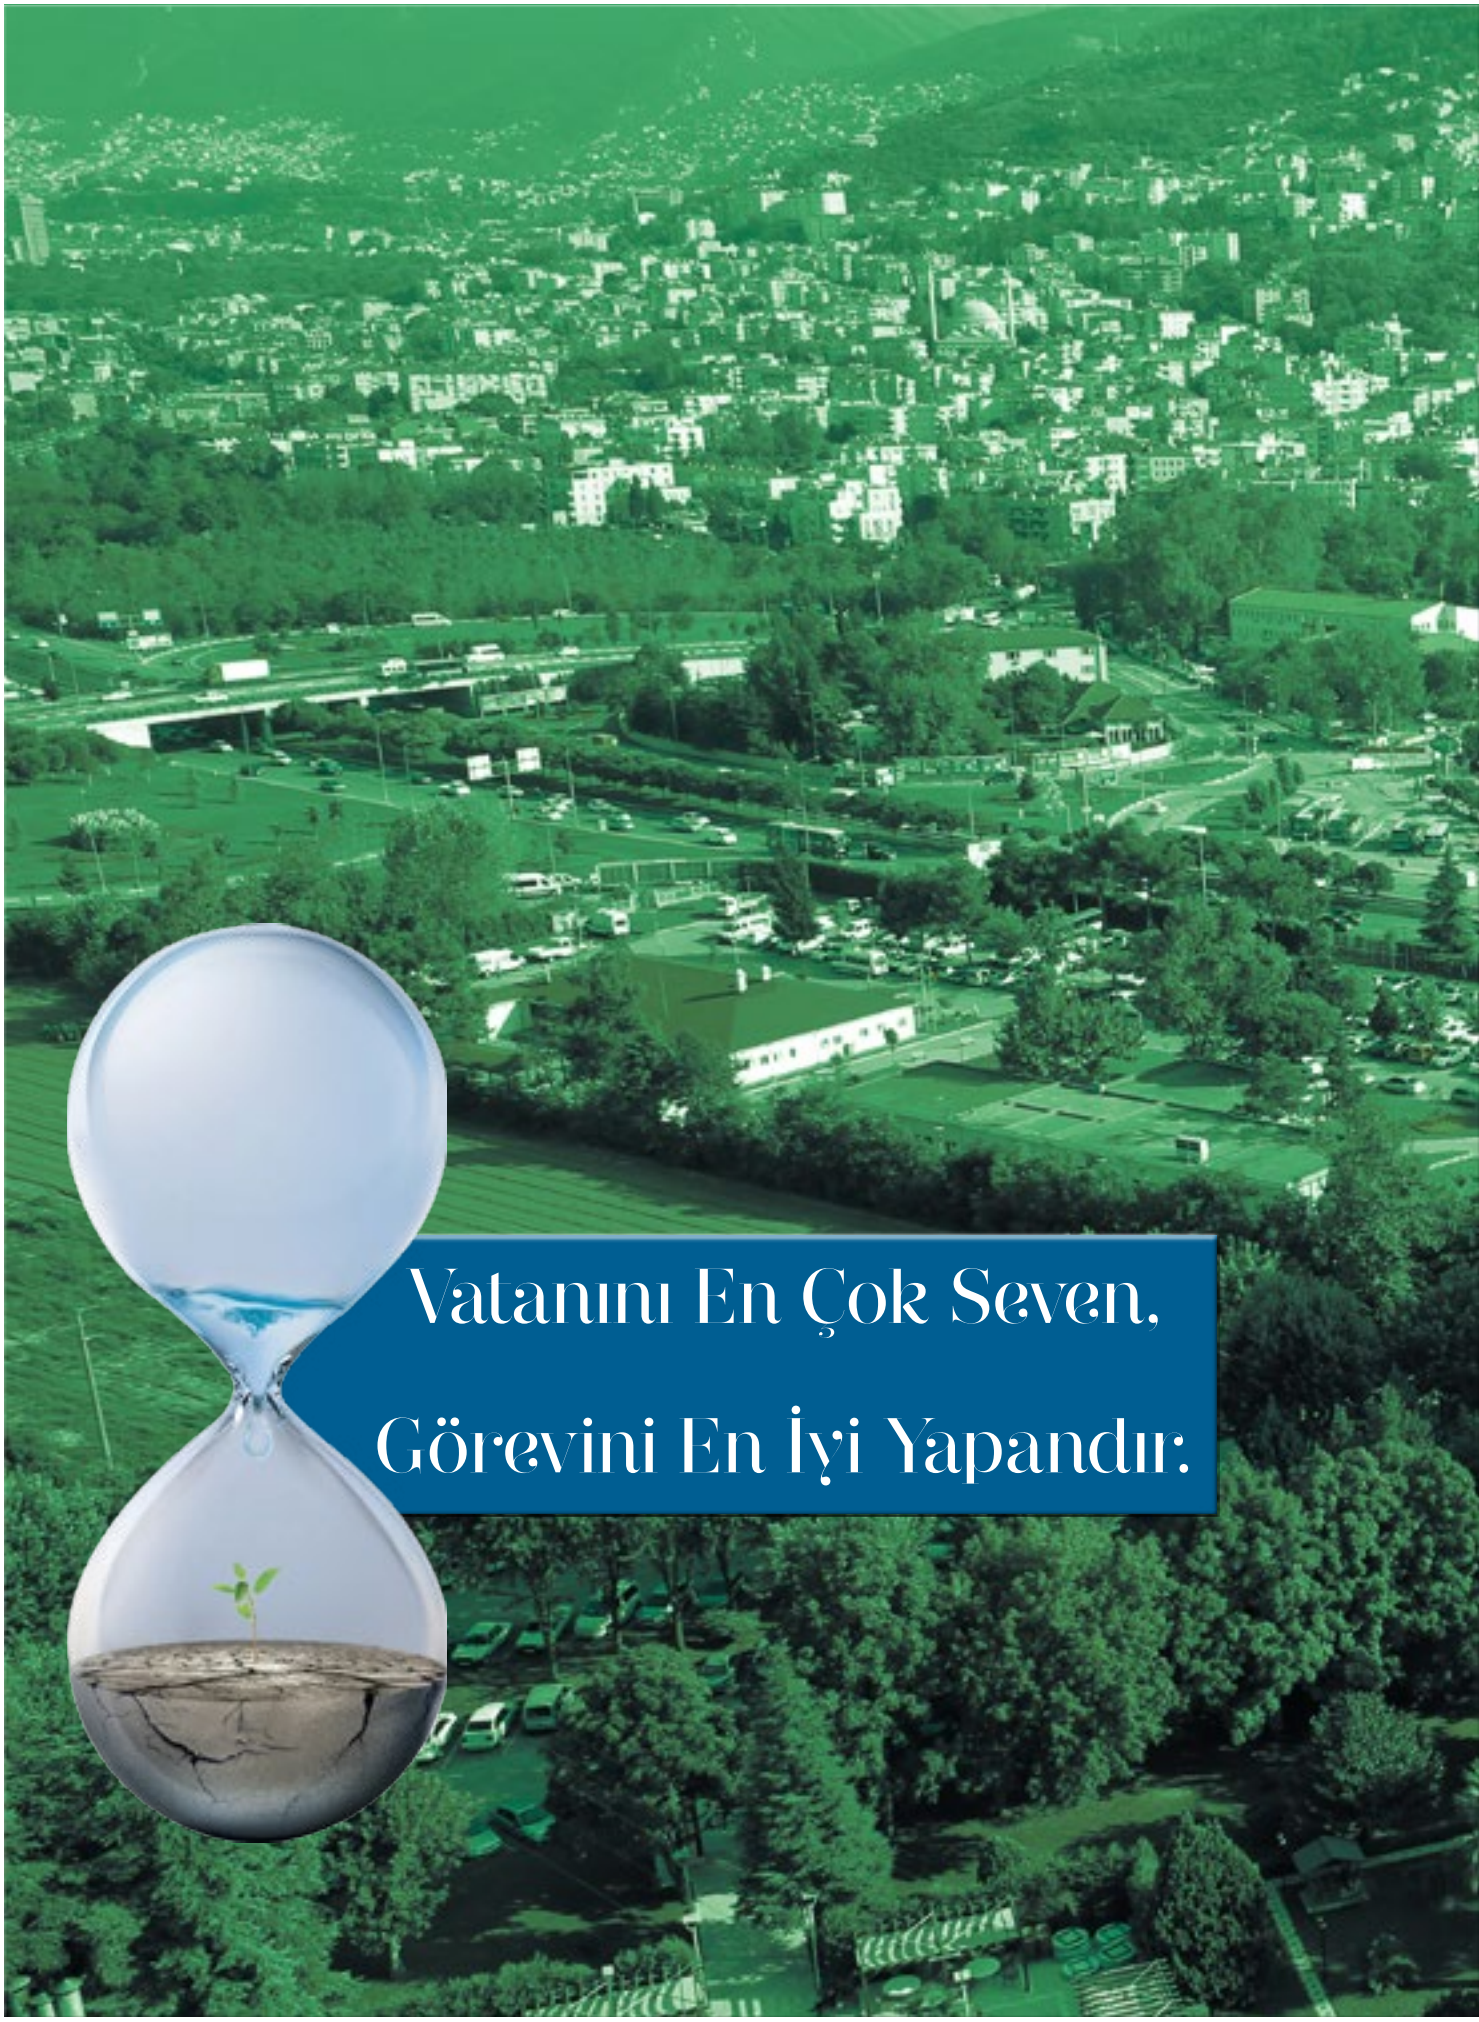
Vatanını En Çok Seven,
Görevini En İyi Yapandır.


BURSA
BUSKİ

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON - VİZYON, KALİTE POLİTİKAMIZ VE TEMEL DEĞERLER	10
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	11
B.1. Kanunlarla Verilen	11
B.2. Yönetmeliklerle Düzenlenen	12
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	13
C.1. Fiziksel Yapı	13
C.2. Örgüt Yapısı	23
C.3. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar	26
C.4. İnsan Kaynakları	28
C.5. Sunulan Hizmetler	33
C.6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	69

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ	71
B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	73

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER	75
A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları	75
A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	76
A.3. Mali Denetim Sonuçları	81
B. PERFORMANS BİLGİLERİ	82
B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	82
B.2. Performans Sonuçları Tablosu	119

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. ÜSTÜNLÜKLER	128
B. ZAYIFLIKLAR	128
C- DEĞERLENDİRME	129



Recep ALTEPE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Genel Kurul Üyeleri,

Güzel Bursa'mızın daha yaşanabilir ve sorunlarından arındırılmış çevreye sahip olabilmesi için bütün kaynaklarımızı seferber ettik.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüzün sağlıklı içme suyu temini ile sorunsuz altyapı ağının oluşumuna yönelik gerçekleştirdiği örnek çalışmalar, altı yeni atık su arıtma tesisinin de yakın gelecekte hizmete girmesiyle büyük bir ivme yakalamış olacak.

Şehrimizin sembolik değerlerinden Nilüfer Deresi'nin temiz akması ve Gemlik Körfezi'nin kirlilikten arındırılması için hayata geçirilen büyük altyapı projesi iseyaşanılmasından mutluluk duyulan şehir Bursa" ilkemizin temelini oluşturan çevre yatırımlarımıza, güzel bir örnek oluşturuyor.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin kurucusu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'deki partneri olan Bursa, her alanda örnek alınan yatırımlarıyla,marka kent Bursa" olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sağlıklı üst yapının, sorunlarından arındırılmış altyapı ağıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Bursa, artık bir dünya kenti olma yolunda hızlı gelişmelerini her alanda sürdürüyor.

BUSKİ'nin sergilediği çalışma performansı ise hedeflerimize ulaşmada büyük katkı sağlıyor.

Gerek içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmaları, gerekse atık su arıtma tesisleri ile çevre sorunlarını gidermede, farklı çözümler üreterek hayata geçiriyoruz.

İnsanların en temel haklarından birinin de içilebilir su kaynaklarına erişmek olduğunu biliyoruz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, BUSKİ aracılığıyla, insanımızın ihtiyacı olan su kaynaklarını en doğru şekilde yönlendiriyoruz.

İçme suyundan, yağmursuyu ve kanalizasyona, su depolarından atık sulara, derelerden kuyulara kadar birçok açıdan suyu kontrol ediyoruz.

Şehrimizin dünyanın en saygın ve örnek alınan şehirleri arasında yer alabilmesi için yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz.

Sağlıklı altyapı hizmetlerinden modern şehircilik uygulamalarına, sosyal ve kültürel projelerden spor yatırımlarına kadar her alanda Bursa'yı, örnek alınan bir konuma getirebilmenin kararlılığındayız.

Bu vesileyle, her birinizi, en içten duygularımla selamlarım.



İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
BUSKİ Genel Müdürü

Değerli Genel Kurul Üyeleri,

Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla yatırımlarımıza hız verdik.

Nilüfer Deresi'nin ve Gemlik Körfezi'nin kirlilikten arındırılması projeleri başta olmak üzere kolektör bağlantıları, kanal hatları ile atık su arıtma tesislerinin yapımına büyük önem veriyoruz.

Samanlı kolektörünün devreye girmesiyle, Nilüfer Deresi'ne şehrin doğu yakasından kanalize olan atık suları, kolektörlerle Doğu Atık Su Arıtma Tesisi'ne yönlendirerek arıtılmalarını sağladık.

Böylelikle, Uludağ'ın güney yamaçlarındaki Aras Suyu'ndan doğan 176 kilometrelik Nilüfer Deresi'nin Geçit'e kadar olan bölümünü kirlilikten arındırmış olduk.

Çevre yatırımları içerisinde önemli yer tutan altı arıtma tesisini daha, çok yakında hizmete sunacağız.

Söz konusu tesisler, Nilüfer Deresi'ni tümüyle kirlilikten arındıracağı gibi Gemlik Körfezi'nin atık sulardan kaynaklanan kirliliğinin önüne geçmiş olacak.

Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, yağmur ve kanal giderlerinin birbirinden ayrılması, su depolarının inşaatı, arıtma tesisleri gibi diğer altyapı çalışmalarıyla da 10 ilçemizin altyapı ağını yenilemenin çalışmaları içerisindeyiz.

İçme suyu hatlarında gerçekleştirdiğimiz rehabilitasyon, bakım, yenileme ve kaçak su kullanımına karşı başlattığımız mücadele ile sudaki kayıp kaçak oranını, Avrupa ortalaması olan yüzde 22'ler seviyesine geriletme başarısı gösterdik.

Bu bağlamda, mevcut 6.311,8 kilometrelik içme suyu şebeke hattı, 2016 yılında eklenen 813.6 kilometre ile 7.125,4 kilometreye, yine isale hattı 111.8 kilometrelik ilaveyle 971,9 kilometreye çıkarıldı. Bununla birlikte Bursa'ya 47 yeni su deposu kazandırıldı.

Yine 3.869,9 kilometreden oluşan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ise 309,2 kilometrelik (dere ıslahı dahil) ilaveyle 4.179,1 kilometreye ulaştı.

83.103.031 metreküp Doğu Arıtma Tesisi, 18.770.372 metreküpü de Batı Arıtma Tesisi'nde olmak üzere toplam 101.873.403 metreküp atık su arıtıldı.

2016'da öngörülen 1.050 milyon TL'lik gelir bütçesi ve 1.120 milyon TL'lik (ek ödenek dahil) gider bütçesi yüzde 98 oranında gerçekleşti.

2016'da hedeflerimizi aştık. 2017'de de aynı başarıyı sergilemek için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz.

Bu vesileyle, 2016 Yılı Faaliyet Raporu' nun hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BUSKİ
BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ

I-GENEL BİLGİLER

A. Misyon - Vizyon, Kalite Politikamız ve Temel Değerler

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C. İdareye İlişkin Bilgiler

I- GENEL BİLGİLER

A. MİSYON - VİZYON, KALİTE POLİTİKAMIZ VE TEMEL DEĞERLER

Misyon

Sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için;

• İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması,
• İhtiyaç sahiplerine dağıtılması,
• Kullanılmış su ile yağmursularının uzaklaştırılması,
• Su havzalarının korunması,
• Tarımsal sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama suyu temin edilmesi kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.

Vizyon

• İçme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,
• Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,
• Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

Kalite Politikamız

• Kalite Yönetim Sisteminin gereklerinin sürekli iyileştirilmesi,
• Kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi,
• Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,
• Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
• Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması,
• Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda altyapı (içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması.

Temel Değerler

• Çevreye ve insana saygı,
• Gelişime ve değişime açıklık,
• Müşteri memnuniyeti,
• Kalite,
• Etkinlik, verimlilik ve yeterlilik,
• Güvenilirlilik,
• Eşitlik ve tarafsızlık,
• Şeffaflık,
• Dürüstlük,
• Adalet,
• Hizmet bilinci, hizmet aşkı,
• Hizmetlerde önderlik ve örneklik,
• Katılımcılık,
• Meslek etiğine bağlılık,
• Halka yakınlık.

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B.1. Kanunlarca Verilen

BUSKİ Genel Müdürlüğü 20/11/1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenen değişik geçici 10. madde ve Bakanlar Kurulunun 08/09/1989 tarih 89/14524 Sayılı kararı ile; Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur.

Yetki görev ve sorumlulukları belirleyen kanunlar;

- 657 Devlet Memurları Kanunu
- 2560 İSKİ Kanunu,
- 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Belediye Kanunu,
- 2464 Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 Sular Hakkında Kanun,
- 167 Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 6200 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 3152 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 1593 Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
- 2872 Çevre Kanunu,
- 3213 Maden Kanunu,
- 1053 Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 2634 Turizm Teşvik Kanunu,
- 3516 Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- 5237 Türk Ceza Kanunu,
- 4734 Kamu İhale Kanunu,
- 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2942 Kamulaştırma Kanunu,
- 6107 İller Bankası Kanunu,
- 5442 İl İdaresi Kanunu,
- 5302 İl Özel İdaresi Kanunu,
- 4736 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 5779 Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 3194 İmar Kanunu,
- 2981 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,
- 5999 Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- 6360 Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
- 4759 İller Bankası Kanunu

B.2. Yönetmeliklerle Düzenlenen

BUSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri, yasalarla genel çerçevesi çizilmiş olmakla beraber, faaliyet alanı ile ilgili çıkarılmış yönetmeliklerle de işleyişini devam ettirmektedir. Bu yönetmelikler;

- BUSKİ Kuruluş ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği,
- Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- 1. Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği,
- İhale Yönetmeliği,
- İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği,
- Atık Su Deşarj Yönetmeliği,
- Tarifeler Yönetmeliği,
- Kütüphane Yönetmeliği,
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik,
- Disiplin Yönetmeliği,
- Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi,
- İçmesuyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik,
- İç Denetim Yönergesi.

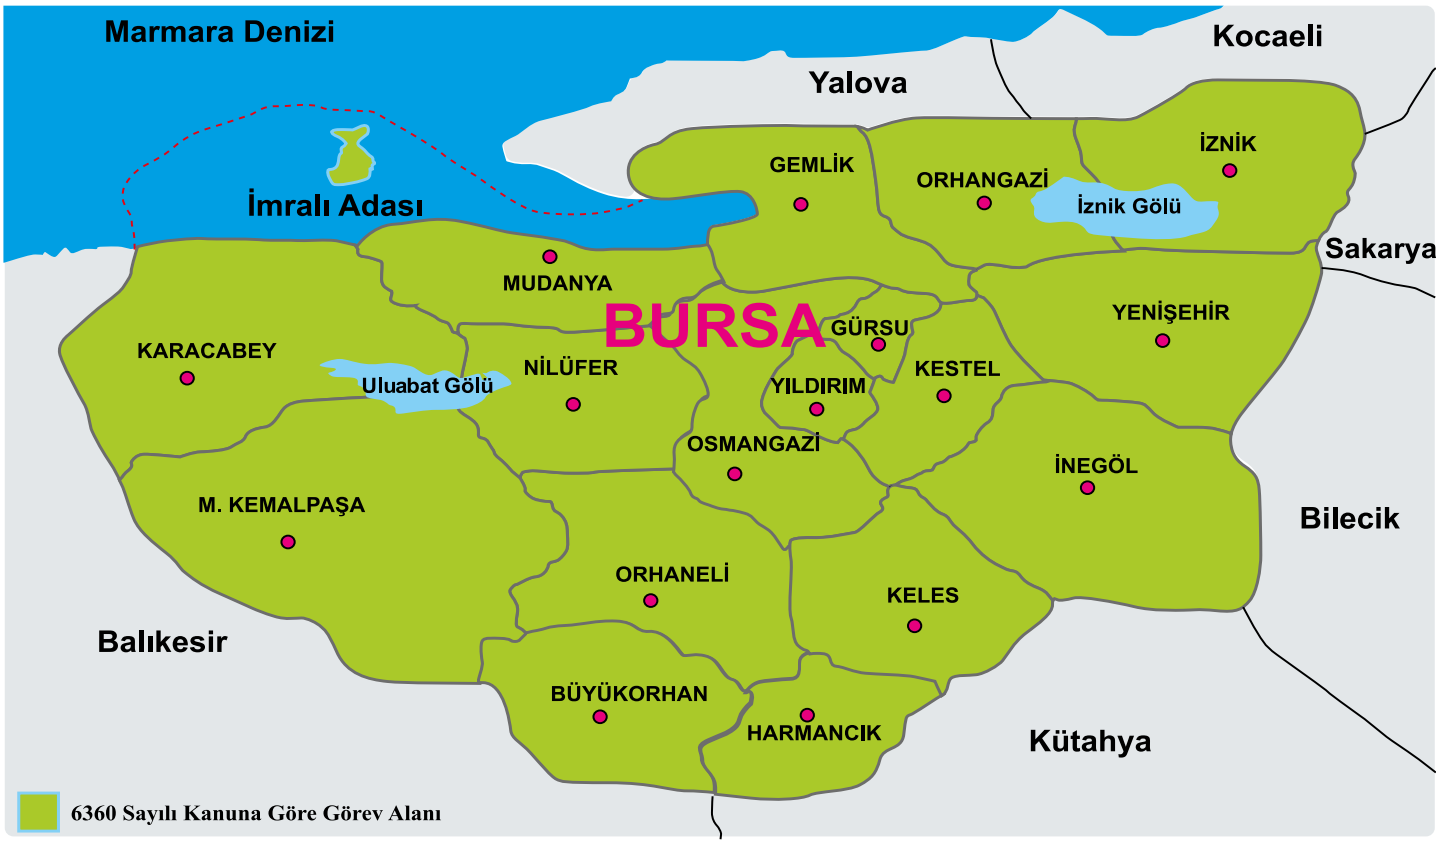

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

C.1. Fiziksel Yapı

a. Hizmet Binaları

Merkez Hizmet Alanı (Acemler Kampüsü)
• Ana Hizmet Binası
• Abone Hizmet Binası
• İşletmeler Hizmet Binası
• Sayaç Servisi Hizmet Binası
• SCADA Hizmet Binası
• Açık Saha Ambarı
• Kapalı Saha Ambarı (4525 m^2)
• Atölye Binaları (2256 m^2)
• Kapalı ve Açık Araç Parkı, (Kapalı 900 m^2, açık 2000 m^2)
• Arşiv Binası (420 m^2)
• Sivil Savunma Uzmanlığı Binası
• Konteyner Ek Hizmet Binaları (Tarımsal Planlama, İşletmeler 2, Kaynak Suları D. Bşk.)


Ana Hizmet Binası


Scada Binası


Güvenlik Binası


Abone İşleri Hizmet Binası

İlçe Hizmet Binaları

- Gemlik Şube Müdürlüğü Binası
- Gemlik Taşocakları İşletme Binası
- Mudanya Şube Müdürlüğü Binası
- Mudanya Harmanlar İşletme Binası
- Kestel Şube Müdürlüğü Binası
- Gürsu Şube Müdürlüğü Binası
- Görükle Şube Müdürlüğü Binası
- İnegöl Şube Müdürlüğü Binası
- Osmangazi / Gençosman Abonelik ve Tahsilat Hizmet Binası
- İznik Şube Müdürlüğü Binası
- M. K. Paşa Şube Müdürlüğü Binası
- Karacabey Şube Müdürlüğü Binası
- Yenişehir Şube Müdürlüğü Binası
- Orhangazi Şube Müdürlüğü Binası
- Orhaneli Şube Müdürlüğü Binası
- Nilüfer Abonelik ve Tahsilat Hizmet Binası
- Yıldırım Abonelik ve Tahsilat Hizmet Binası



Kestel Şube Müdürlüğü Binası

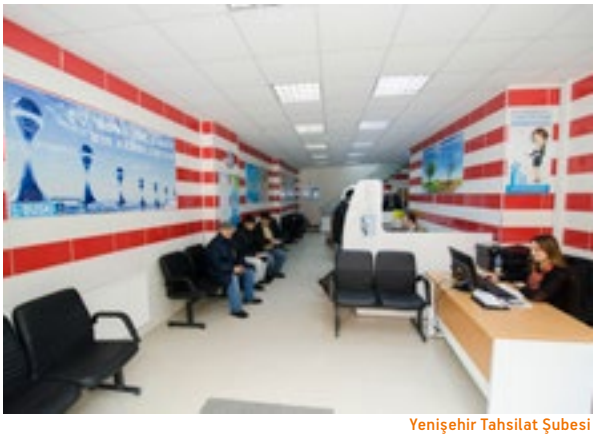

Yenişehir Tahsilat Şubesi



Karacabey Şube Müdürlüğü Binası



Altyapı Çalışması

b. İçmesuyu ve Atık Su Arıtma Tesisleri

İçmesuyu Arıtma Tesisi	Kapasite (m^3)	Arıtılan Su	
		Günlük (m^3/gün)	Yıllık (m^3/yıl)
Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisi	500.000	265.322	96.842.500
Mustafakemalpaşa Akarca İçmesuyu Arıtma Tesisi	110	7.064	2.578.464
İnegöl Alanyurt İçmesuyu Arıtma Tesisi	960	1.529	558.000
Mustafakemalpaşa Çan Deresi İçmesuyu Arıtma Tesisi	18.150	13.564	4.950.947
Büyükorhan İçmesuyu Arıtma Tesisi	1.296	689	251.518
Karacabey İçmesuyu Arıtma Tesisi	12.096	10.800	3.942.000
İnegöl Dipsiz Göl İçmesuyu Arıtma Tesisi	360	360	129.600
İnegöl Hamzabey İçmesuyu Arıtma Tesisi	120	240	86.400
İnegöl Mezitler İçmesuyu Arıtma Tesisi	360	360	129.600
Mustafakemalpaşa Karadere İçmesuyu Arıtma Tesisi	5.097	5.717	2.086.692
Gemlik Nacaklı İçmesuyu Arıtma Tesisi	10.368	4.649	1.696.784



Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisi



M. Kemalpaşa Çan Deresi İçmesuyu Arıtma Tesisi



Karacabey İçmesuyu Arıtma Tesisi

Atık Su Arıtma Tesisi	Kapasite (m^3)	Arıtılan Su	
		Günlük (m^3/gün)	Yıllık (m^3/yıl)
Doğu Atık Su Arıtma Tesisi	240.000	227.680	83.103.031
Batı (Özlüce) Atık Su Arıtma Tesisi	87.500	51.426	18.770.372
Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesisi	1.000	762	278.000
Mudanya Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisleri	25.000	18.411	6.720.120
Kent Katı Atık Depolama Alanı Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi	500	500	182.459
Gemlik Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi	27.000	25.096	9.159.948
Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi	1.200	1.379	503.375
Karacabey Atık Su Arıtma Tesisi	8.500	6.614	2.414.142
İnegöl Atık Su Arıtma Tesisi	3.500	2.701	985.973

* Kayapa Paket Atık Su Arıtma Tesisi 2016 yılında devredışı bırakılmıştır.



Batı Atıksu Arıtma Tesisi



Doğu Atıksu Arıtma Tesisi



İnegöl Yenice Atıksu Arıtma Tesisi

c. Tahsilat Şubeleri

Acemler, İhsaniye, Setbaşı, Gençosman, Eğitim, Gemlik, Mudanya, Görükle, Kestel, Gürsu, Güzelyalı, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Orhangazi, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık tahsilat şubeleri ve merkez vezne, 4 adet yerinde (mobil) tahsilat aracı ve Acemler mobil tahsilat şefliği.



Mobil Tahsilat Aracı



İnegöl Tahsilat Şubesi



Mudanya Tahsilat Şubesi



Karacabey Tahsilat Şubesi

d. Sosyal Tesisler

Düğün Salonu ve Yemekhane (Buski Kampüsü)

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarına öğle yemeği, personeline ve Bursa halkına cemiyetler için salon olarak hizmet veren düğün salonu ve yemekhane, 2006 yılı Mart ayından itibaren kiralama yöntemi ile hizmetine devam etmektedir. Cemiyetler için 2 adet salon bulunmaktadır. Açık bahçe olarak kullanılan bölüm 700 kişi oturma kapasiteli, kapalı salon olarak kullanılan bölüm ise 500 kişi oturma kapasitelidir.



Yemekhane



Düğün Salonu

Spor Tesisleri (Buski Kampüsü)

Genel Müdürlüğümüz nezdinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün yönetiminde 4 adet tenis kortu mevcuttur. Bunlar 2 adet kapalı, 2 adet açık kort şeklindedir.



Tenis Kortu



Futbol Sahası

Dobruca Lojmanları

Dobruca semtinde 16 ve 1 adet Genel Müdürlük olarak toplam 17 adet lojman bulunmaktadır. Kamu konutlarının tahsis şekli, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 3. Maddesine göre yapılmaktadır. Dobrucada bulunan lojmanlar Kamu Konutları Yönetmeliğine göre, görev tahsisli, sıra tahsisli ve hizmet tahsisli olmak üzere 3 şekilde tahsis edilmektedir.

Özel tahsisli lojman bulunmamaktadır. Lojman kira bedelleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü' nün her yıl yayınladığı tebliğe göre hesaplanmaktadır.

Genel Müdürlüğümüze ait 21 adet güvenlik su deposu lojmanımız bulunmaktadır.

Dobruca Sosyal Tesisleri

Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait olup; 15.05.2014 tarihi itibariyle işletmesi BURFAŞ A.Ş'ye geçmiştir. 4 katlı kafeterya ve açık-kapalı restaurantı bulunmaktadır.









e. Araç ve İş Makinesi Parkı

Mevcut Araclar

İlçe Bazında Araçlar	Adet
Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer	172
Gemlik	7
Mudanya	4
Kestel	4
Görükle	4
Gürsu	2
Büyükorhan	7
Harmancık	4
İznik	3
İnegöl	18
Karacabey	12
Keles	3
Mustafakemalpaşa	13
Orhangazi	6
Orhaneli	6
Yenişehir	9
TOPLAM	**274**

Kiralanan Araçlar

Kiralanan Araç	Adet
Binek Oto	146
Kamyonet	66
4x4 Kamyonet	74
Arazi Binek 4x4	4
Minibüs	7
Şoförsüz Binek	8
Motosiklet	25
Toplam	**330**

f. Pompa İstasyonları

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde;
- 32 adet ana pompa istasyonu 102 ünite,
- 38 adet lokal amaçlı pompa istasyonu 92 ünite,
- 20 adet acil terfi pompa istasyonu 32 ünite,
- 22 adet atık su pompa istasyonu 52 ünite bulunmaktadır.







g. Kuyular

İlçeler	Adet	İlçeler	Adet
Osmangazi	69	Orhangazi	15
Yıldırım	40	M.Kemalpaşa	6
Nilüfer	4	Yenişehir	14
Gemlik	16	İznik	9
Mudanya	7	Orhaneli	4
Gürsu	1	Keles	2
Kestel	1	Büyükorhan	8
İnegöl	38	Harmancık	1
Karacabey	6		
TOPLAM			**241**



Kuyu Çalışması

h. Su Depoları

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde;

- 393.940 m^3 toplam kapasiteli 305 adet depo mevcuttur.



Çağrışan Su Deposu



Erikli Su Deposu



İçmesuyu Dolum Tesisi Temel Atma Töreni



İçmesuyu Dolum Tesisi Şantiyesi

C.2. Örgüt Yapısı

a. Karar Alma Organları

Genel Kurul

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Genel Kuruludur.

Denetçiler

Genel Kurulca seçilen iki denetçiden oluşmaktadır. BUSKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler BUSKİ' nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasadışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurul'un Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur.

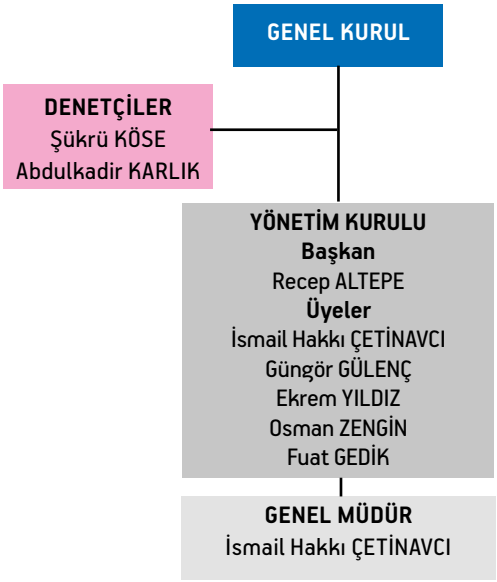

Yönetim Kurulu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Müdür, bir Genel Müdür Yardımcısı ve dışarıdan atanan en az üç üyeden oluşmaktadır.

Genel Müdürlük

BUSKİ Genel Müdürü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanır. Genel Müdür Yardımcıları'nın hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi halerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı kademe birimlerinden teşekkül eder ve BUSKİ' nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.

Daire Başkanları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulu'nun kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile; müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile; BUSKİ'nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır.

Genel Müdür'ün birinci derece tezkiye amiri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, ikinci derecede İçişleri Bakanı'dır.

b. Organizasyon Şeması

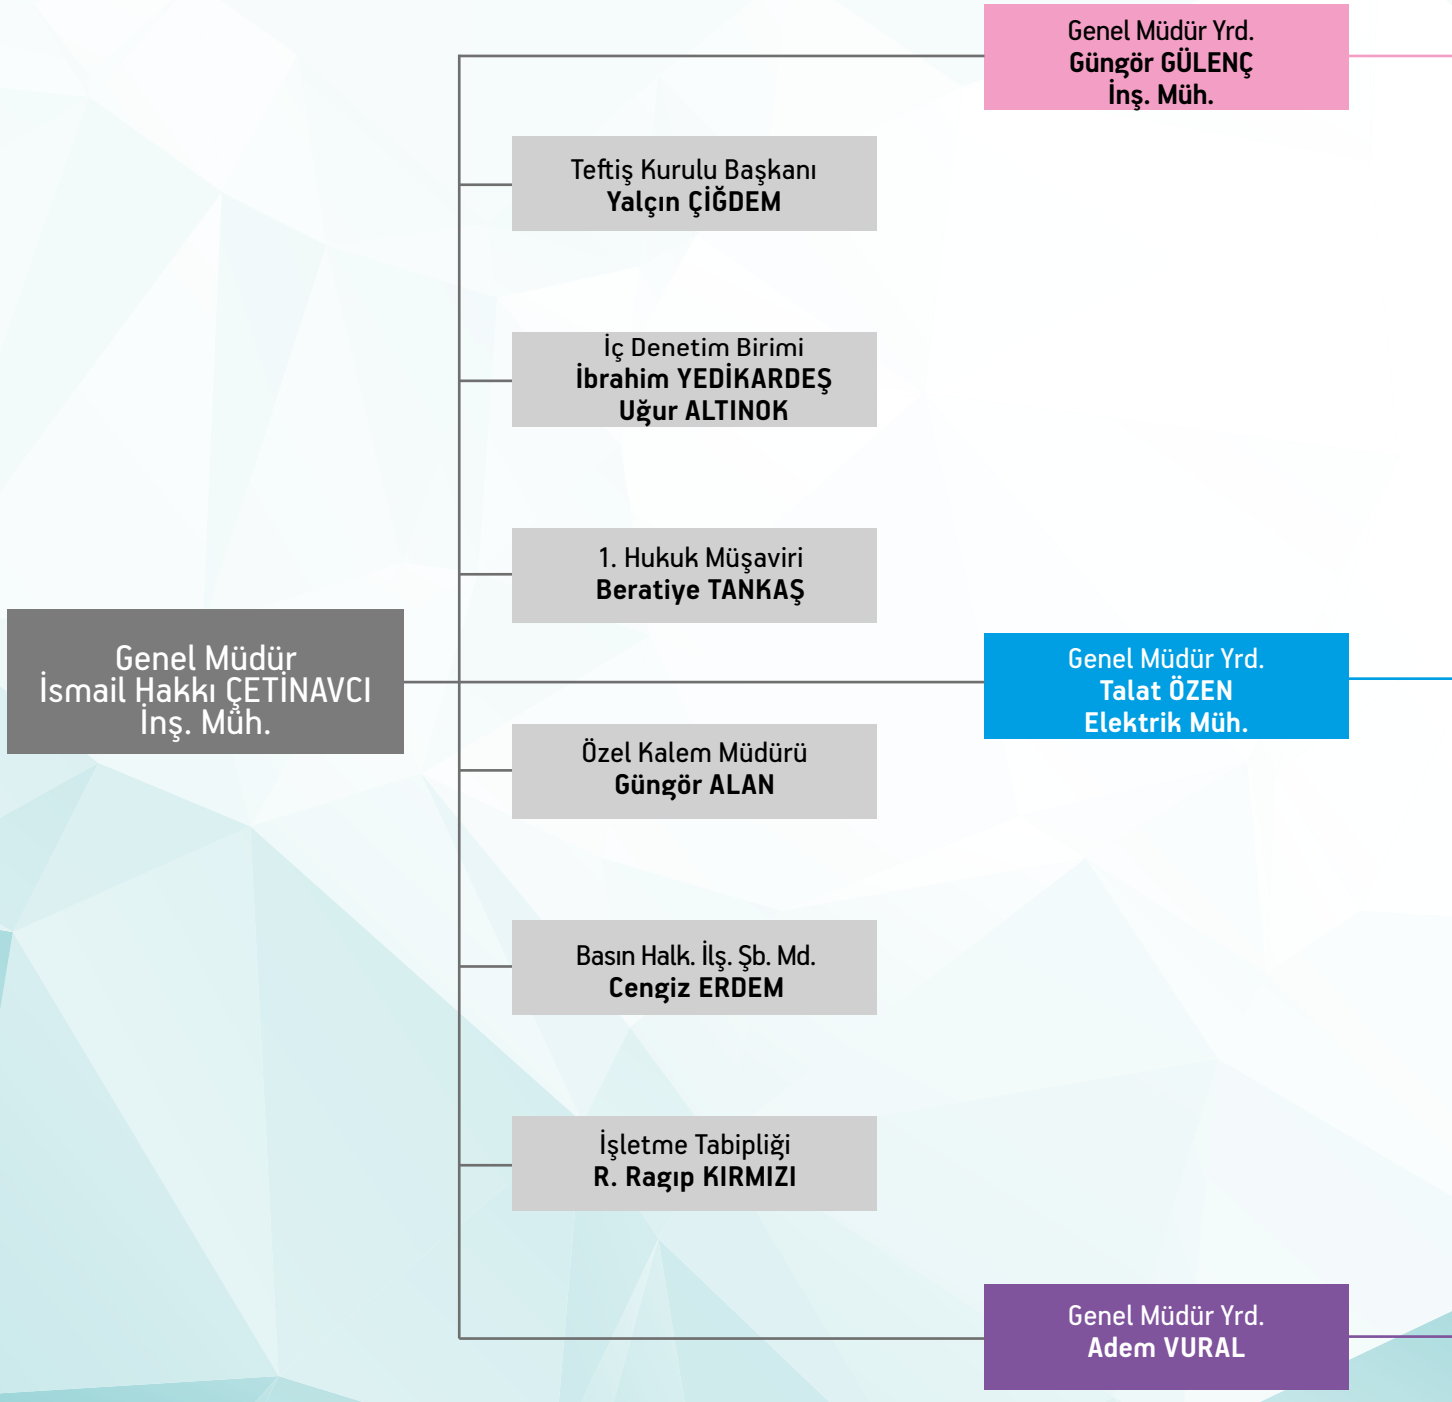

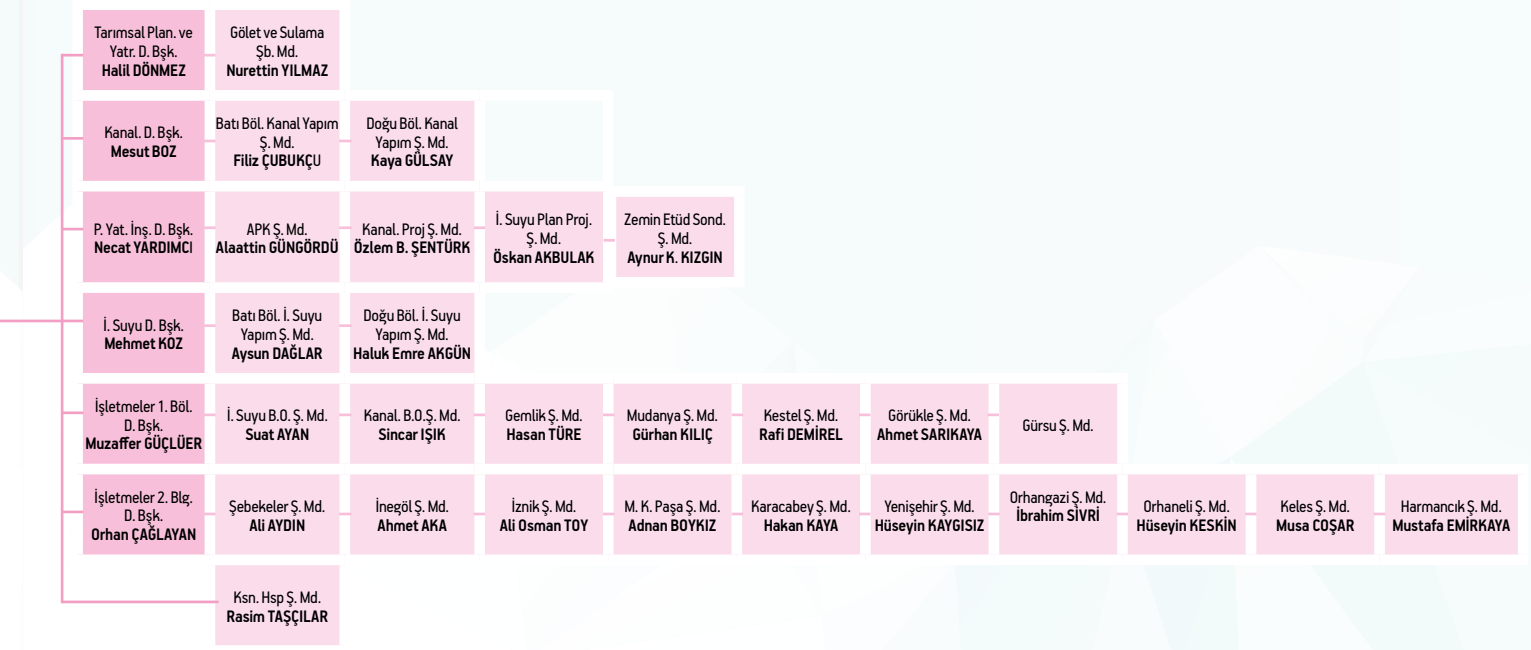
Tarımsal Plan. ve Yatr. D. Bşk. Halil DÖNMEZ
Gölet ve Sulama Şb. Md. Nurettin YILMAZ
Kanal. D. Bşk. Mesut BOZ
Batı Böl. Kanal Yapım Ş. Md. Filiz ÇUBUKÇU
Doğu Böl. Kanal Yapım Ş. Md. Kaya GÜLSAY
P. Yat. İnş. D. Bşk. Necat YARDIMCI
APK Ş. Md. Alaattin GÜNGÖRDÜ
Kanal. Proj Ş. Md. Özlem B. ŞENTÜRK
İ. Suyu Plan Proj. Ş. Md. Öskan AKBULAK
Zemin Etüd Sond. Ş. Md. Aynur K. KIZGIN
İ. Suyu D. Bşk. Mehmet KOZ
Batı Böl. İ. Suyu Yapım Ş. Md. Aysun DAĞLAR
Doğu Böl. İ. Suyu Yapım Ş. Md. Haluk Emre AKGÜN
İşletmeler 1. Böl. D. Bşk. Muzaffer GÜÇLÜER
İ. Suyu B.O. Ş. Md. Suat AYAN
Kanal. B.O.Ş. Md. Sincar IŞIK
Gemlik Ş. Md. Hasan TÜRE
Mudanya Ş. Md. Gürhan KILIÇ
Kestel Ş. Md. Rafi DEMİREL
Görükle Ş. Md. Ahmet SARIKAYA
Gürsu Ş. Md.
İşletmeler 2. Blg. D. Bşk. Orhan ÇAĞLAYAN
Şebekeler Ş. Md. Ali AYDIN
İnegöl Ş. Md. Ahmet AKA
İznik Ş. Md. Ali Osman TOY
M. K. Paşa Ş. Md. Adnan BOYKIZ
Karacabey Ş. Md. Hakan KAYA
Yenişehir Ş. Md. Hüseyin KAYGISIZ
Orhangazi Ş. Md. İbrahim SİVRİ
Orhaneli Ş. Md. Hüseyin KESKİN
Keles Ş. Md. Musa COŞAR
Harmancık Ş. Md. Mustafa EMİRKAYA
Ksn. Hsp Ş. Md. Rasim TAŞÇILAR

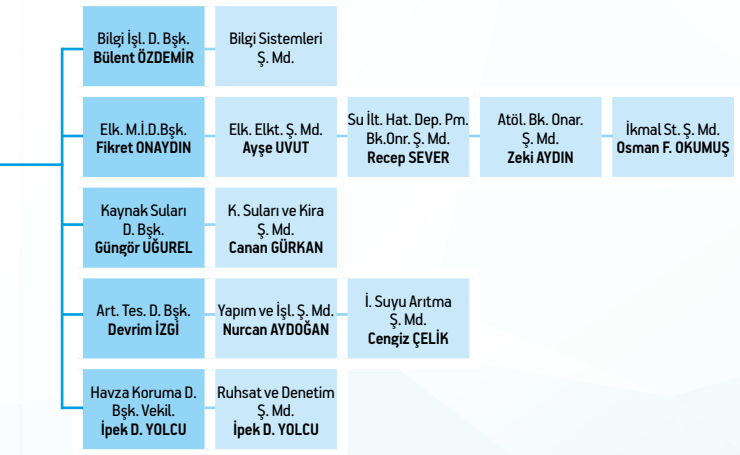
Bilgi İşl. D. Bşk. Bülent ÖZDEMİR
Bilgi Sistemleri Ş. Md.
Elk. M.İ.D.Bşk. Fikret ONAYDIN
Elk. Elkt. Ş. Md. Ayşe UVUT
Su İlt. Hat. Dep. Pm. Bk.Onr. Ş. Md. Recep SEVER
Atöl. Bk. Onar. Ş. Md. Zeki AYDIN
İkmal St. Ş. Md. Osman F. OKUMUŞ
Kaynak Suları D. Bşk. Güngör UĞUREL
K. Suları ve Kira Ş. Md. Canan GÜRKAN
Art. Tes. D. Bşk. Devrim İZGİ
Yapım ve İşl. Ş. Md. Nurcan AYDOĞAN
İ. Suyu Arıtma Ş. Md. Cengiz ÇELİK
Havza Koruma D. Bşk. Vekil. İpek D. YOLCU
Ruhsat ve Denetim Ş. Md. İpek D. YOLCU


İns. Kay. Eğt.D. Bşk. Mustafa CEYLAN
İnsan Kay. Ş. Md. Ahmet ARSLAN
Sosyal İşl. Ş. Md. Gürkan YAMAN
Özlük İşleri Ş. Md. Tülay ATALAY
Siv. Sav. Uzm. Münir YILMAZ
Emlak İsti. D. Bşk. Mehmet Sait AYIK
Hrt. Kam. Ş. Md. Murat KARAOĞLU
Coğ. Bil. Sis. Ş. Md. Hülya F. AYDIN
Str. Glş.D. Bşk. Halit KARASU
Str. Glş. Ş. Md. Nigar E. UĞURBAŞ
Muh. Ş. Md. Fezayi GARTEL
Tahsilat Ş. Md. Feridun AKÇAY
Ticaret İşl. D. Bşk. H. İbrahim GÜNEŞ
Satınalma Ş. Md. Ayşegül AYDIN
İhale ve Şart. Satınalma Ş. Md. Hasip UYAR
Abone İşl. D. Bşk. Cemal SEVİNÇ
Tahak. Ş. Md. İsmail BAŞARIR
Abone İşl. Ş. Md. Fatma TURHAN
Sayaç Ş. Md. Hüseyin HELVACI
Kaçak Su. Ş. Md. Sadık YEŞİLYURT

C.3. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

a. Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri

Paket Programlar
Dijital Arşiv, Form ve Süreç Yönetimi Projesi
Araç Takip Sistemi
Scada Sistemi
Network (Ağ) İzleme ve Takip Sistemi
Araç ve Akaryakıt Takip Programı
Ziyaretçi İnternet Hizmetleri
Buski Çağrı Merkezi
Lisanslama Takip Sistemi
Buski Abone Bilgi Sistemi (Babs) Yazılım İşletmenliği
Personel Devam Kontrolü Sistemi
Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistemi
Kurumsal İnternet Sitesi
İnternet Şubesi Bilgi Sistemi
Güvenlik Tur Kontrol Sistemi
Muhasebe ve Bütçe Kontrol Sistemi
Ambar Otomasyon Bilgi Sistemi
Yerel İnternet Buskinet Bilgi Sistemi
Arıza Takip Sistemi
Otomatik Ödeme Noktası
Ruhsat Analiz Bilgi Sistemi
İlçelere Göre Günlük Çalışmalar
Kirlilik İzleme İnternet Sistemi
Personel Maaş ve Bilgi Sistemi
Şikayet Öneri Katkı (Şök) Sistemi
Hasta Takip Sistemi

b- Coğrafi Bilgi Sistemi

Abone Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Coğrafi Bilgi Sistemi projeleri kapsamında oluşturulan Abone Coğrafi Bilgi Sistemi projesinde aboneye ait metinsel (abone no, adres bilgileri) ve grafik bilgiler (binalar) ilişkilendirilerek hangi abonenin hangi binada olduğunun tespit edilip kullanıcıya sunulması amaçlanmaktadır.

Abone Coğrafi Bilgi Sistemleri projesinde yapılan çalışmalar;

Arazi Çalışması

Coğrafi Bilgi Sistemi projeleri kapsamında oluşturulan Abone Coğrafi Bilgi Sisteminde abonenin abone numarası ve adres bilgileri ile bina bilgi ilişkisi sağlanamayan aboneleri sisteme aktarabilmek için arazi çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma ile arazi ekipleri tarafından halihazır, numarataj, uydu ve ortofoto haritaları ile araziye gidilip abonenin mekansal durumu paftalara işlenmektedir.

Arazi Çalışmalarından Gelen Verilerin Sisteme Aktarılması

Coğrafi Bilgi Sistemleri servisinde görevli bilgisayar operatörleri tarafından araziden gelen datalar ofiste GIS programları (Geomedia Professional) kullanılarak (abone ve bina ilişkilendirilmesi yapılarak) sisteme aktarılmaktadır.

Proje kapsamında 2016 yılı yıl sonu itibari ile 17 ilçede toplam 297000 bina ve toplam 1250033 su abonesi CBS sisteminde mevcut olup , 7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gursu) toplam 939398 aboneden 884272 abonenin bina ilişkisi sağlanarak % 94 oranında adres tespiti tamamlanmıştır. Yaklaşık % 3'lük bölümde adres karışıklığından ve sayaç durumlarından kaynaklanan problemlerden dolayı yer tespitinde sorun yaşanmakta olup, kalan % 2'lik kısım aylık güncellenen yeni abonelere karşılık gelmektedir.

6360 sayılı yasa ile sorumluluk alanına yeni katılan 10 ilçede de Abone Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Abone Coğrafi Bilgi Sistemi Projesinin devamı olarak 6360 sayılı yasa ile Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları ve buna bağlı olarak BUSKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanına yeni katılan 10 ilçeyi (İnegöl, Yenişehir, Karacabey, MustafaKemalPaşa, Orhangazi,İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık) kapsayan alanda da çalışma planlanmış olup ilçe şube müdürlükleri ile birlikte yapılan ortak çalışma ile yeni abonelerin konumlarının tespit edilerek ofis ortamında ilişkilendirilmesi ve bilgi sistemine düzenli aktarılması çalışması 2016 yılı içerisinde İznik, İnegöl, Yenişehir, Orhangazi, Orhaneli, Mustafakemalpaşa ilçelerinde başlatılmıştır. Bu kapsamda toplam 3549 abonenin konumları tespit edilerek sisteme dahil edilmiştir.

Yeni Abonelerin Sisteme Aktarılarak Binalarla İlişkilendirilmesi

Yeni aboneler aylık olarak sisteme aktarılıp numarataj ve bina kodu bilgisiyle büroda ilişkilendirilmesi yapılmaktadır. Numarataj ve bina kodu bilgisiyle yer tespiti yapılamayan aboneler için A4 boyutunda krokiler hazırlanarak arazide yer tespiti yapılmaktadır. 2016 yılı için sisteme 69511 yeni abone aktarılmıştır.

c. Büro Makine ve Cihazlar

Büro Makine ve Cihazları (adet)			
Bilgisayar	1.100	Total Station Ölçüm Aleti	14
Yazıcı	410	Arazi Kot Okuma Aleti	8
Çizici (plotter)	5	Telsiz	279
Tarayıcı (A0, A4 Scanner)	136	El Arazi Kot Okuma Aleti	9
Sunucu Bilgisayar (Server)	34	Dijital Fotoğraf Makinesi	80
Aktif Cihaz	74	Fax Cihazı	45
Plan Kopya Makinesi	1	Diz Üstü Bilgisayar	79
Fotokopi Makinesi	54	El Bilgisayarı	164
Motorola Tablet	215	**Toplam**	**2.707**

d. Harita, Plan ve Projeler

Harita, Plan ve Projeler (adet)	
1/1000 Ölçekli Halihazır Harita	**16.586**
1/1000 Ölçekli Orto Foto	**732**

C.4. İnsan Kaynakları

Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Memur	523	522	523	528	534	543	541	547	545	545	543	546
İşçi	438	431	412	390	380	379	336	330	330	328	323	323
Hizmet Alımı	1.493	1.506	1.507	1.512	1.515	1523	1519	1524	1538	1543	1562	1560
TOPLAM	**2.454**	**2.459**	**2.442**	**2.430**	**2.429**	**2.445**	**2.396**	**2.401**	**2.413**	**2.416**	**2.428**	**2.429**

Ay Bazında Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı (Kişi)

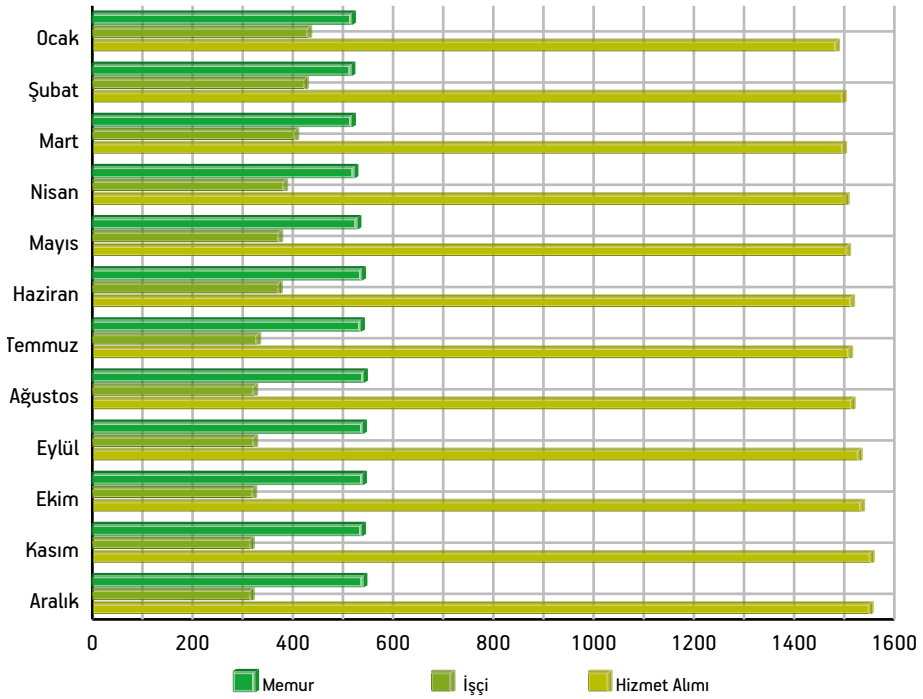

Kadro Durumuna Göre Personelin Dağılımı

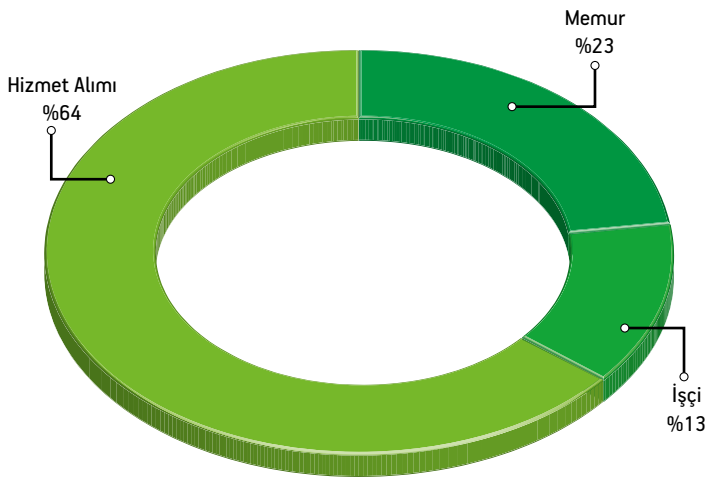

Memur Personel Sayısı (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Kadrolu Memur	516	515	515	520	526	535	533	539	537	537	535	537
Sözleşmeli Memur	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
TOPLAM	**523**	**522**	**523**	**528**	**534**	**543**	**541**	**547**	**545**	**545**	**543**	**546**

Ay Bazında Memur Personel Sayısı (Kişi)

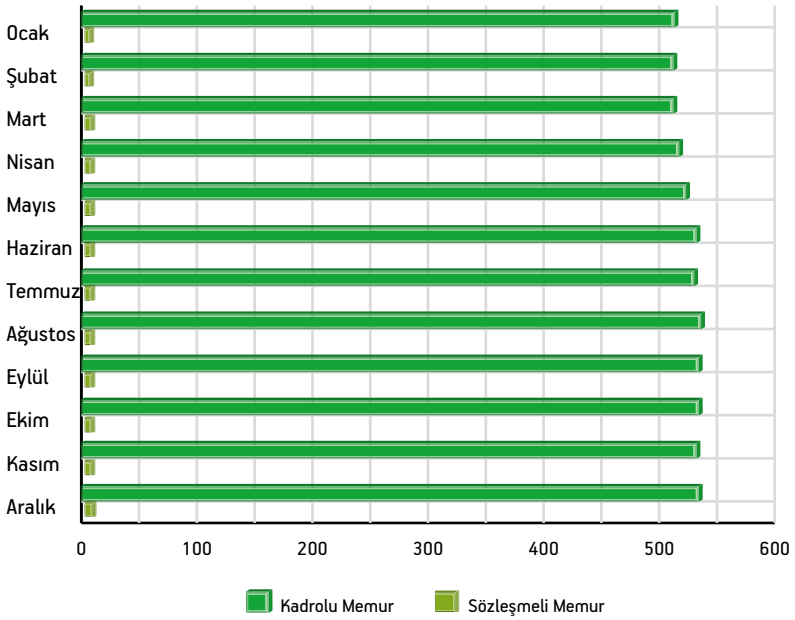

Memur Personelin Dağılımı

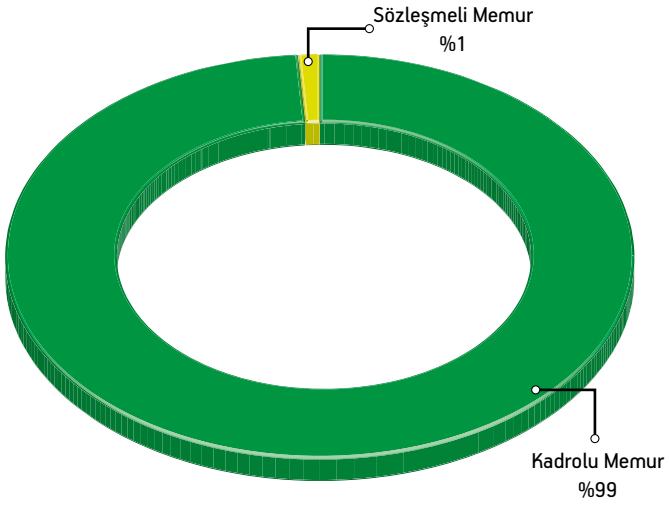

İşçi Personel Sayısı (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Kadrolu İşçi	435	428	409	387	377	376	333	328	328	326	321	321
Geçici İşçi	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
TOPLAM	**438**	**431**	**412**	**390**	**380**	**379**	**336**	**330**	**330**	**328**	**323**	**323**

Ay Bazında İşçi Personel Sayısı (Kişi)

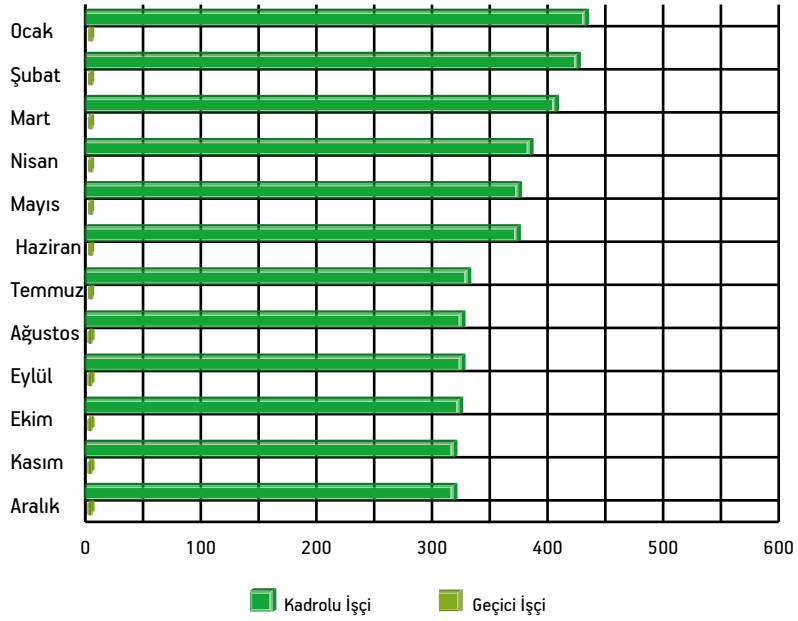

İşçi Personelin Dağılımı

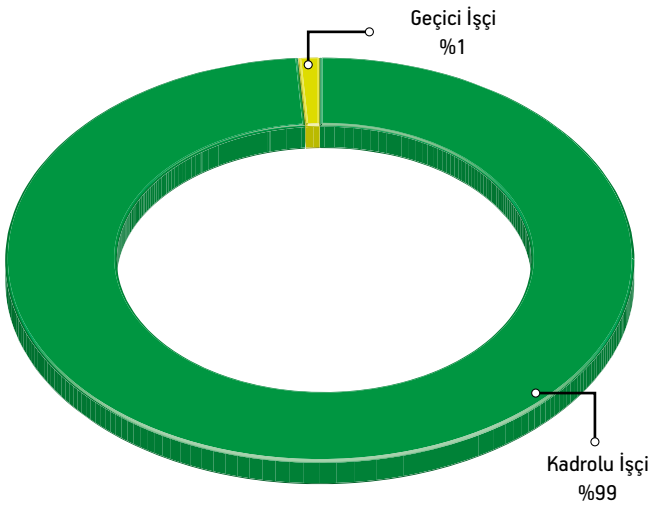

Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel Sayısı (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Teknik Hiz.	147	878	878	880	882	881	878	879	891	1.089	1.094	1.094
Güvenlik Hiz.	192	147	147	146	146	148	148	150	150	152	166	166
Temizlik Hiz.	255	194	195	196	195	196	195	196	196	-	-	-
Endeks Oku.Hiz.	864	252	252	255	257	259	259	260	259	260	260	258
Santral Hiz.	35	35	35	35	35	39	39	39	42	42	42	42
TOPLAM	**1.493**	**1.506**	**1.507**	**1.512**	**1.515**	**1.523**	**1.519**	**1.524**	**1.538**	**1.543**	**1.562**	**1.560**

Ay Bazında Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel Sayısı (Kişi)

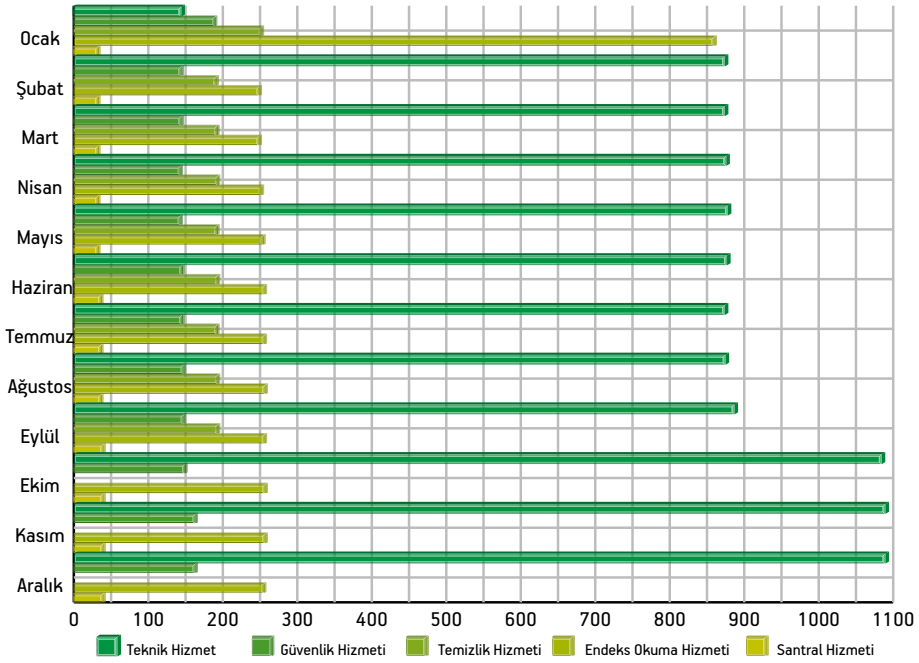

Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personelin Dağılımı

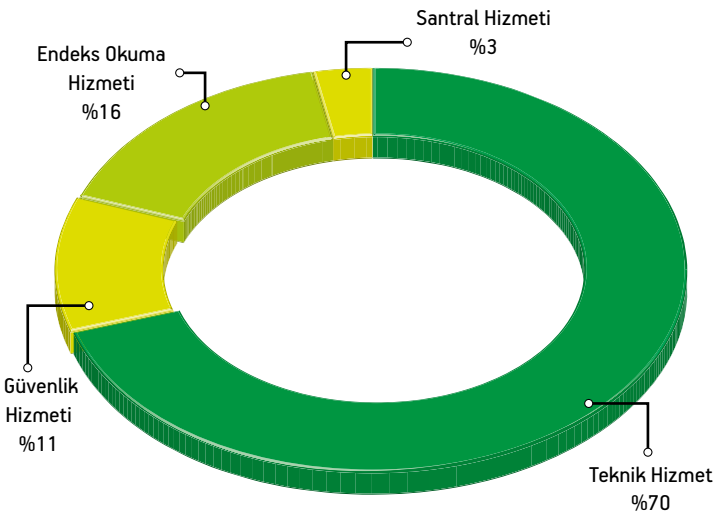

Yaş Gruplarına Göre Memur ve İşçi Personel Sayısı (Kişi)

Yaş Grubu	Memur	İşçi	TOPLAM
20-30	42	2	44
31-40	131	78	209
41-50	217	202	419
51-60	143	40	183
61 ve üstü	13	1	14
TOPLAM	**546**	**323**	**869**

Yaş Gruplarına Göre Memur ve İşçi Personelin Dağılımı

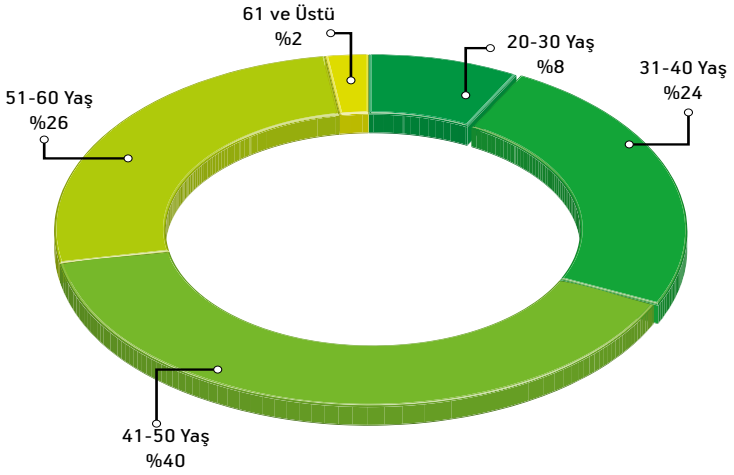

Öğrenim Durumlarına Göre Memur ve İşçi Personel Sayısı (Kişi)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	TOPLAM
İlköğretim	31	206	237
Lise	139	89	228
Önlisans	102	9	111
Lisans	253	18	271
Yüksek Lisans	19	1	20
Doktora	2		2
TOPLAM	**546**	**323**	**869**

Öğrenim Durumlarına Göre Memur ve İşçi Personelin Dağılımı

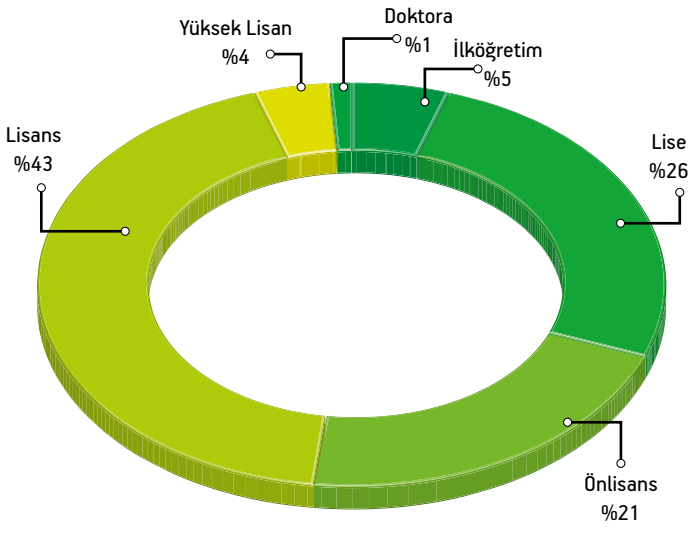

C.5. Sunulan Hizmetler

a. İçmesuyu Hizmetleri

a.1. İçmesuyu Kaynakları

Şehre Verilen Suyun Kaynak Bazında Dağılımı

Su Kaynakları	TOPLAM (m^3)
İçmesuyu Arıtma Tesisi	99.827.657
Pınar Kaynakları	17.373.455
Kuyular	4.035.118
TOPLAM	**121.236.230**

Şehre Verilen Suyun Dağılımı

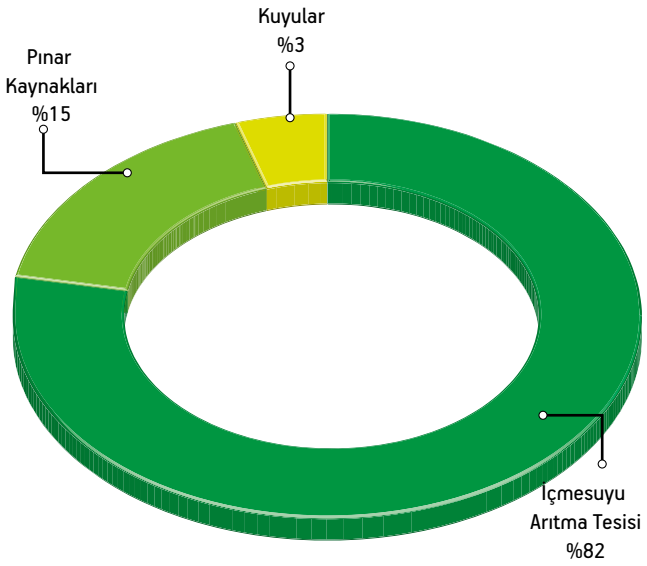









Dobruca İçmesuyu Artıma Tesisi

Doğancı Barajı

Yeri	Orhaneli Karayolu
Hizmete Giriş Yılı	1985
Kuruluş Amacı	İçmesuyu Temini ve Akış Regülasyonu
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	32.611.001 m ^{3}
Hizmet Dönemi	40 yıl

Doğancı Barajı Aylık Doluluk Oranı (m^3)

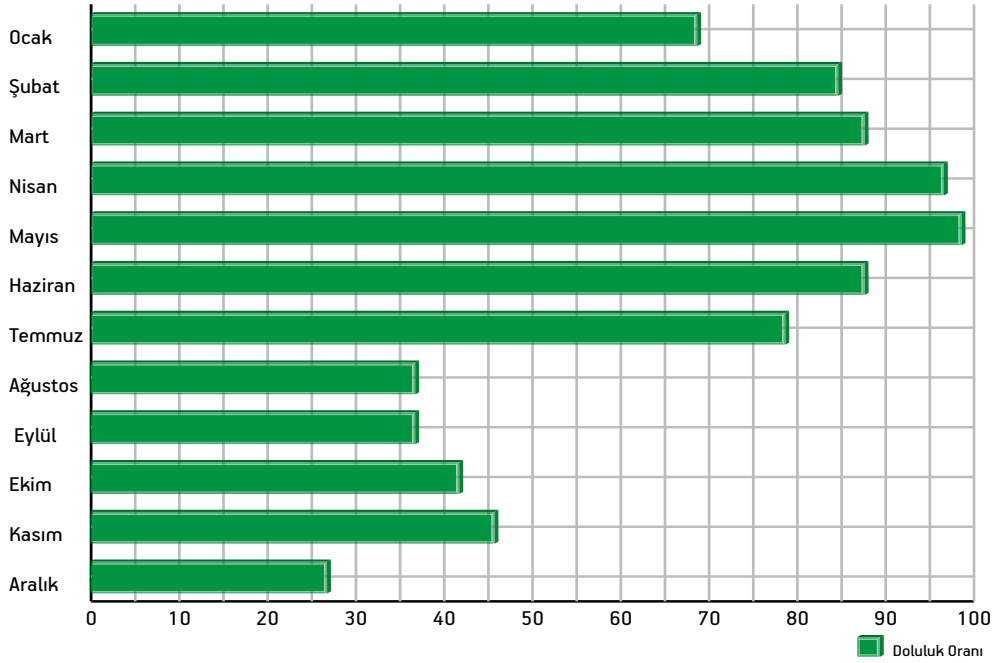



Doğancı Barajı

Nilüfer Barajı

Yeri	Keles Karayolu
Hizmete Giriş Yılı	2007
Kuruluş Amacı	İçmesuyu Temini ve Akış Regülasyonu
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	33.895.000 m^3
Hizmet Dönemi	40 yıl

Nilüfer Barajı Aylık Doluluk Oranı (m^3)

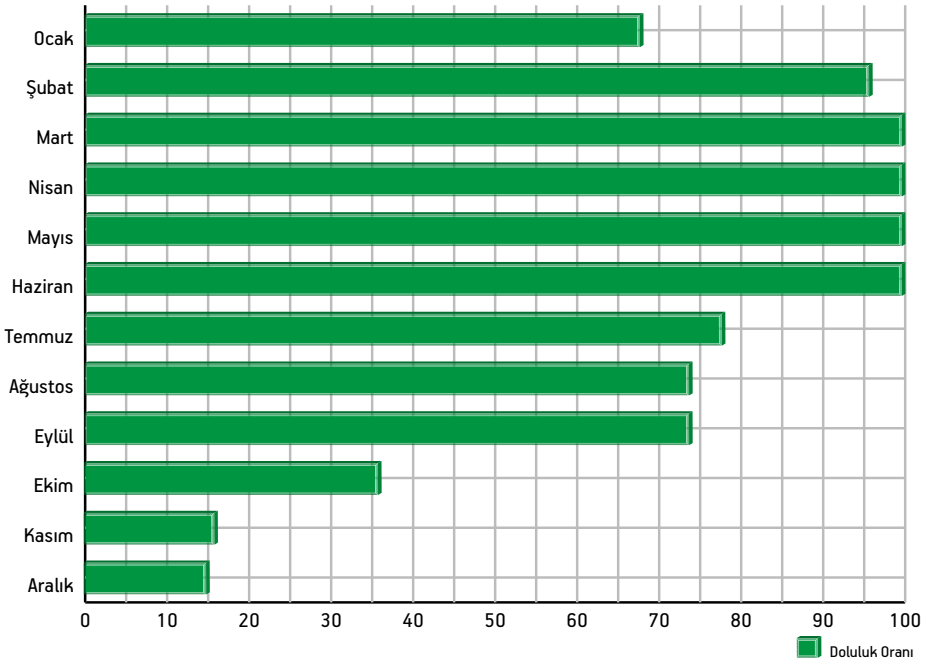



Nilüfer Barajı

Pınar Kaynakları

Pınar Kaynaklarından Şehre Verilen Su Miktarı

Depolar	m ³	Depolar	m ³
D1	615.016	Alaşar	478.115
D2	1.746.258	Abdalmurat	67.047
D2 Taşma	1.420.888	Tavacı	52.790
Kalıkaya (D5)	150.568	Mevlevihane	6.154.274
D25	636.208	C-4Gürsu	1.450
D22	2.083.153	İnkaya	611.137
D23	30.761	Çalı Üretim	208.960
D11	120.164	Kayapa Üretim	58.197
Y.Çekirge	144.666	Hasanağa Üretim	-
Dokuzgözler-D27	394.731	Akçalar Sanayi	12.697
Kestel 1. Kademe Üretim	489.188	Bayrampınar	1.188.095
Kestel 1. Kademe Aktaştepe	117.553	CF-12C2	493.323
Kuştepe	98.216		
TOPLAM			**17.373.455**

Ay Bazında Pınar Kaynaklarından Şehre Verilen Su Miktarı (m^3)

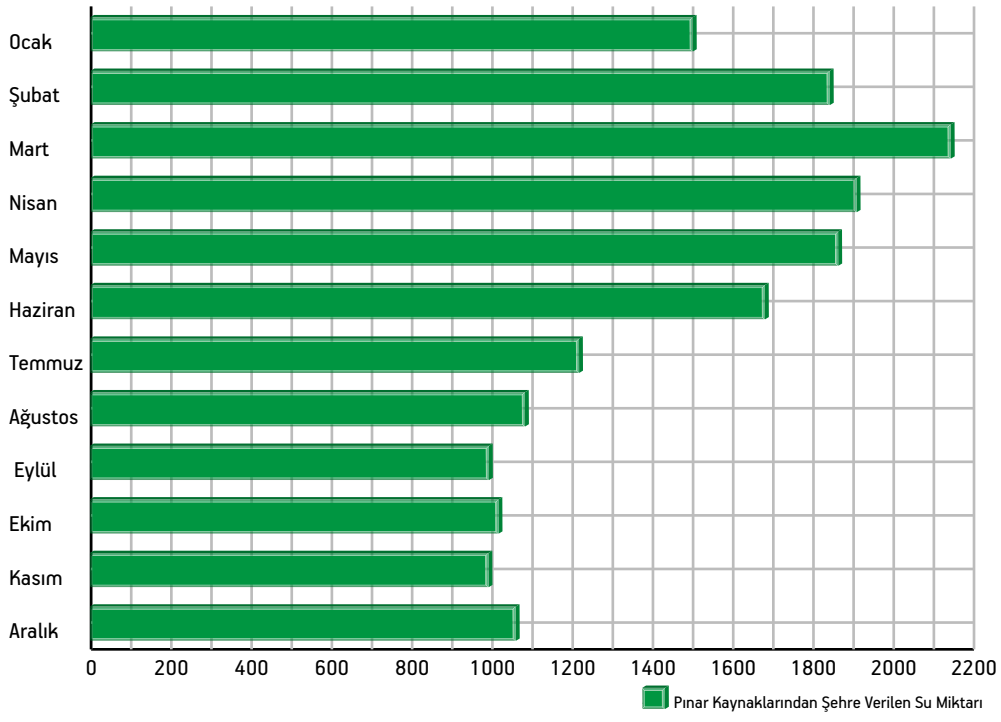

Pınar Kaynaklarından Beslenen Depolar

Depolar	Yeri	Kapasitesi (m^3)
D1	Piremir Mah.	1.619
D2	Piremir Mah.	3.457
D3	Piremir Mah.	4.446
D25	Gökdere Boğaza	3.119
D22	Uludağ Yolu	2.974
D23	Uludağ Yolu	89
D11	Uludağ Yolu	500
Yeni Çekirge	Uludağ Yolu	1.788
Dokuz Gözler-D27	Kestel	1.235
Kestel-1.Kd. Üretim	Kestel	870
Kestel-1.Kd. Aktaştepe	Kestel	5
Kuştepe	Molla Fenari Mah.	10
Alaşar	Molla Fenari	672
Abdalmurat	Molla Fenari	270
Tavacı	Teferrüç Mh.	51
Mevlevihane	Pınarbaşı Mh.	19.369
Çalı Üretim	Çalı Mh.	80
Akçalar Sanayi	Nilüfer	11

Kuyular

Kuyular	Yeri	Hizmete Giriş Yılı	Kapasitesi (m^3)
P1-P2	Acemler	1977	51.840
P3	Yavuz Selim Mah.	1977	46.600
P8-PY4	Hacivat Mah.	1977	55.330
Acemler	Alman Kanalı Kıyısında	2007	90.000
Köy Kuyuları	İsmetiye Köyü	-	720

Kuyulardan Şehre Verilen Su Miktarı

	m^3
P1-P2	1.519.912
P3 Üretim	352.004
P8-D9-C3	418.720
Acemler	-
Osk	69.120
Çeltik	1.489.062
Köy Kuyuları	-

a.2. Abonelik İşlemleri

İlçe Bazında Abone Sayıları

İlçeler	Abone Sayısı (Adet)			İlçeler	Abone Sayısı (Adet)		
	EKS	Mekanik Sayaç	Toplam		EKS	Mekanik Sayaç	Toplam
Osmangazi	15.556	323.575	339.131	M.Kemalpasa	782	35.227	36.009
Yıldırım	6.591	221.354	227.945	Orhangazi	479	24.393	24.872
Nilüfer	16.445	167.050	183.495	Yenişehir	1.883	17.272	19.155
Gemlik	1.046	71.243	72.289	İznik		13.813	13.813
Mudanya	2.944	60.011	62.955	Orhaneli		7.524	7.524
Gursu	2.635	25.633	28.268	Büyükorhan		4.415	4.415
Kestel	1.144	25.734	26.878	Harmancık		8.425	8.425
İnegöl	22.880	75.574	98.454	Keles		8	8
Karacabey	12.938	36.663	49.601	Toplusu		8	8
Toplam					94.822	1.158.492	1.253.314

Ay Bazında Abone Sayıları (Bin Adet)

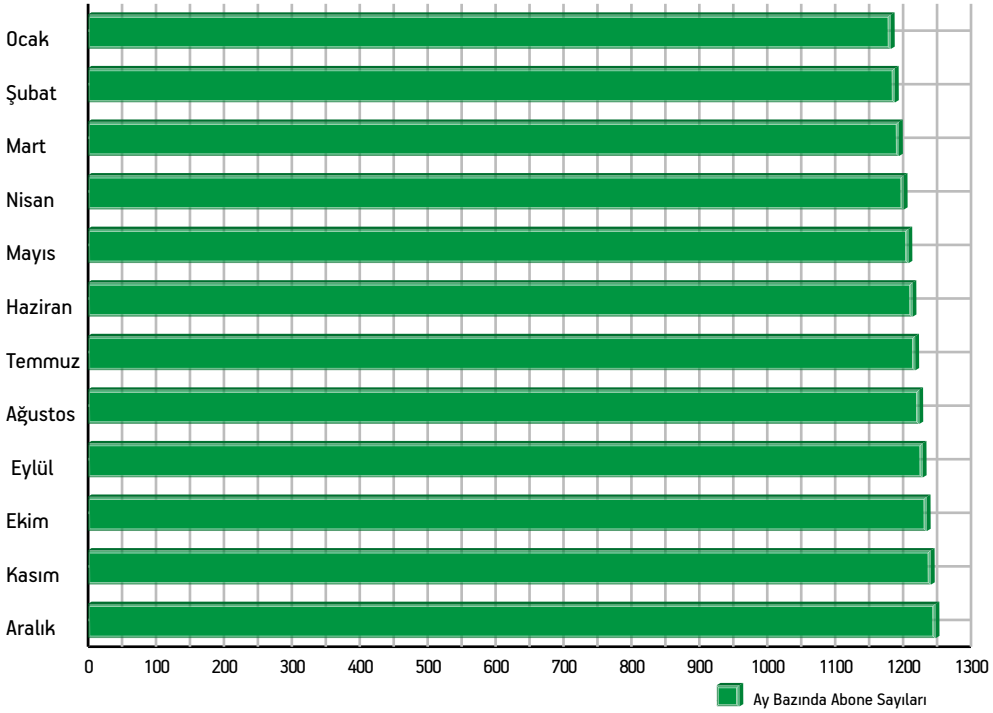

İlçe Bazında Abone Sayılarının Dağılımı

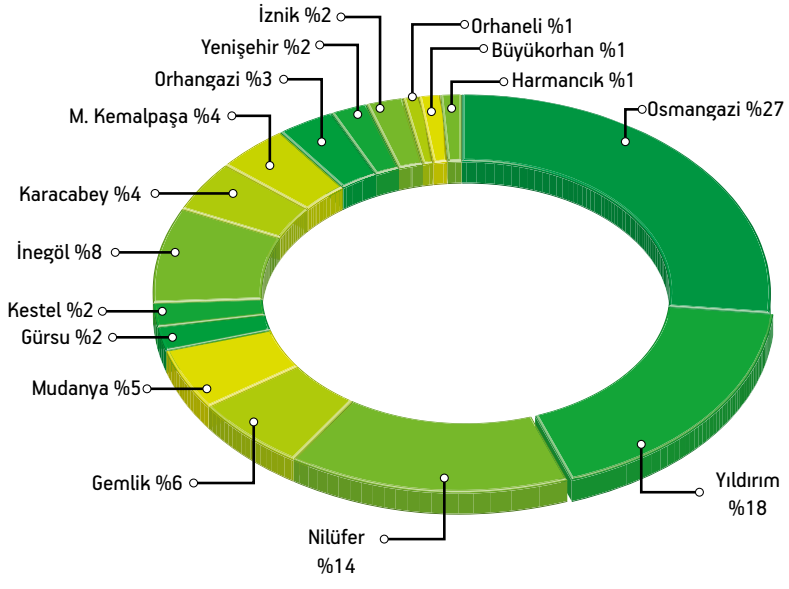

İlçe Bazında Su Tüketim Miktarları

İlçeler	Sarfiyat (m^3)			İlçeler	Sarfiyat (m^3)		
	EKS	Mekanik Sayaç	Toplam		EKS	Mekanik Sayaç	Toplam
Osmangazi	1.240.716	36.659.034	37.899.750	**M.Kemalpasa**	63.776	3.639.219	3.702.995
Yıldırım	573.266	24.509.690	25.082.956	**Orhangazi**	29.185	2.404.729	2.433.914
Nilüfer	1.221.942	24.094.933	25.316.875	**Yenişehir**	129.105	1.510.924	1.640.029
Gemlik	70.093	4.726.583	4.796.676	**İznik**	-	656.259	656.259
Mudanya	236.797	4.979.824	5.216.621	**Orhaneli**	-	365.317	365.317
Gursu	225.042	3.300.897	3.525.939	**Büyükorhan**	-	238.167	238.167
Kestel	88.410	3.498.580	3.586.990	**Harmancık**	-	468.060	468.060
İnegöl	2.055.977	13.351.718	15.407.695	**Keles**	-	5.326.812	5.326.812
Karacabey	935.285	4.981.580	5.916.865	**Toplusu**	-	4.870.910	4.870.910
Toplam					**7.622.395**	**139.703.546**	**147.325.941**

Ay Bazında Su Tüketim Miktarı (Bin m^3)

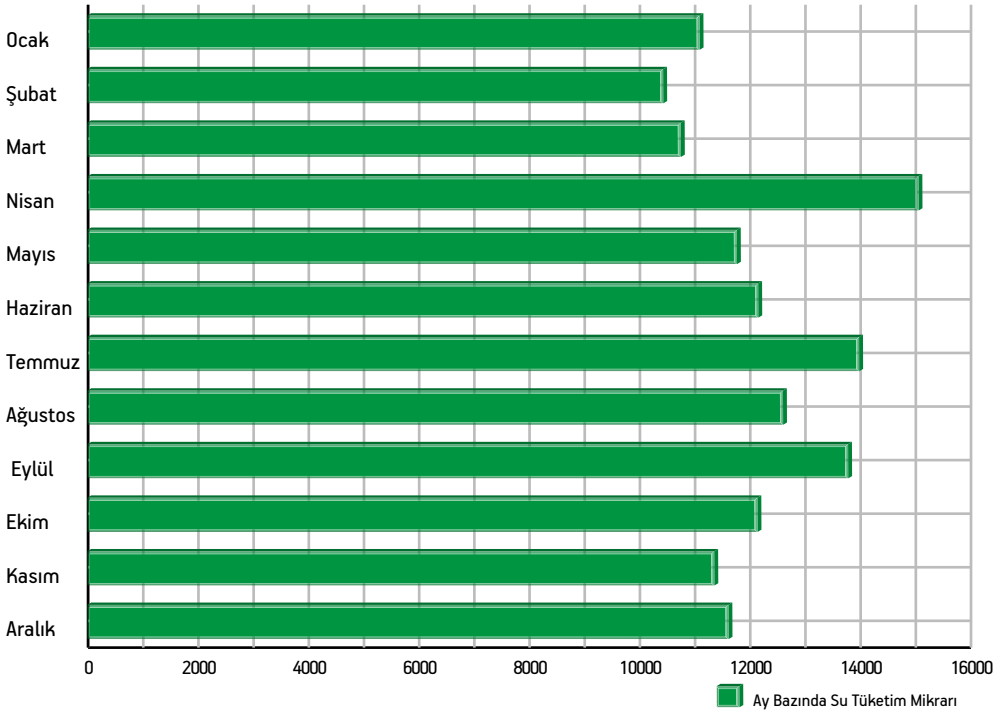

İlçe Bazında Su Tüketim Oranları

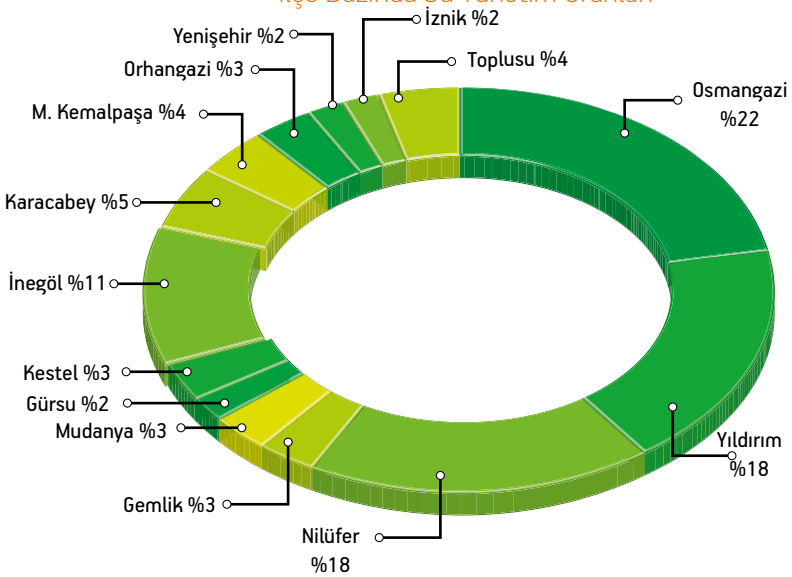

Su Gelirleri Tahakkuk Tutarı (KDV - ÇTV Dahil)

İlçeler	TL	İlçeler	TL
Osmangazi	241.356.860	M.Kemalpaşa	19.507.427
Yıldırım	165.841.121	Orhangazi	18.892.234
Nilüfer	147.925.586	Yenişehir	10.736.619
Gemlik	28.928.865	İznik	7.445.174
Mudanya	28.913.113	Orhaneli	2.326.964
Gürsu	18.667.755	Büyükorhan	1.237.927
Kestel	44.509.253	Harmancık	893.876
İnegöl	61.476.241	Keles	1.196.652
Karacabey	16.119.056	Toplusu	22.491.853
Toplam			838.466.576

Ay Bazında Su Gelirleri Tahakkuk Tutarları (TL)

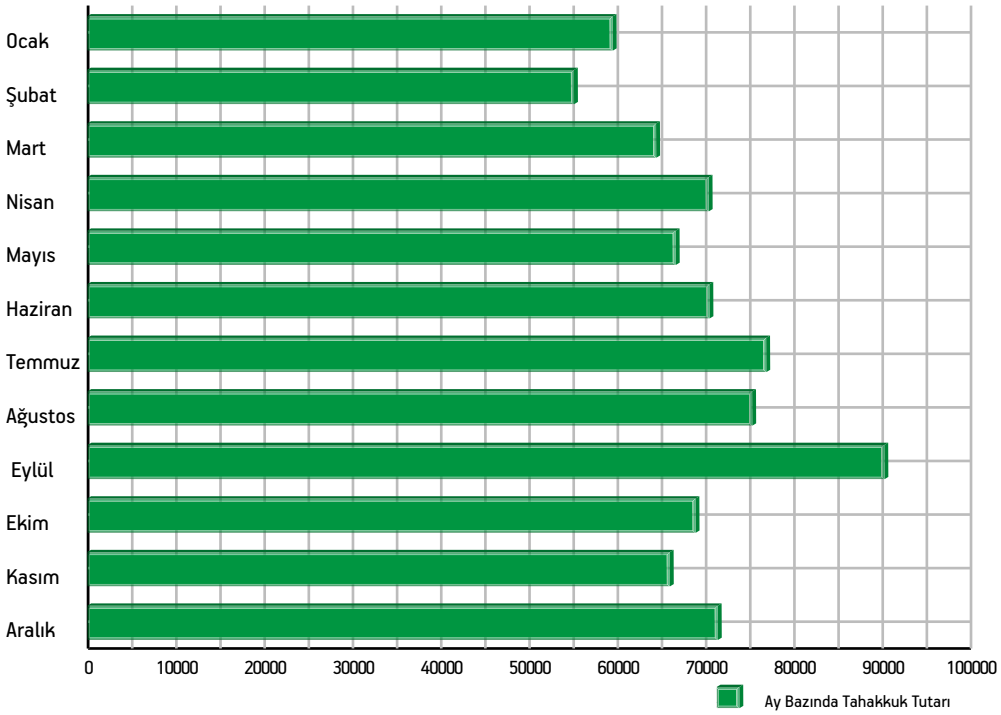

İlçe Bazında Su Gelirleri Tahakkuk Oranları

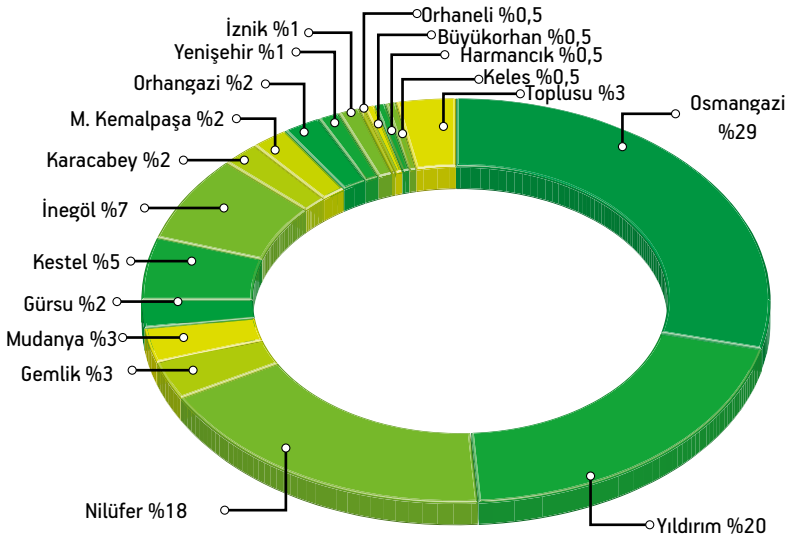

İlçe Bazında Su Gelirleri Tahsilat Tutarı (KDV - ÇTV Dahil)

İlçeler	TL	İlçeler	TL
Osmangazi	240.500.728	M.Kemalpaşa	17.423.173
Yıldırım	157.859.438	Orhangazi	18.932.018
Nilüfer	151.206.447	Yenişehir	9.593.477
Gemlik	29.085.958	İznik	6.942.503
Mudanya	28.455.390	Orhaneli	2.349.110
Gürsu	18.957.617	Büyükorhan	1.305.226
Kestel	34.320.424	Harmancık	948.104
İnegöl	57.614.095	Keles	1.186.671
Karacabey	14.783.020	Toplusu	23.945.934
Toplam			815.409.333

Ay Bazında Su Gelirleri Tahsilat Tutarları (TL)

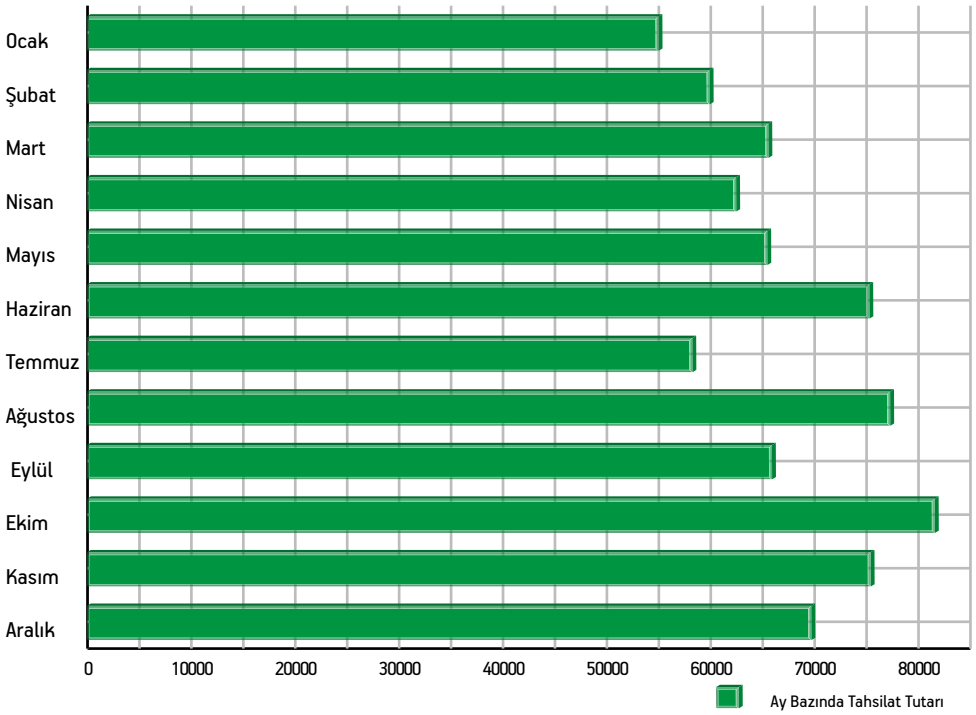

İlçe Bazında Su Gelirleri Tahsilat Oranları

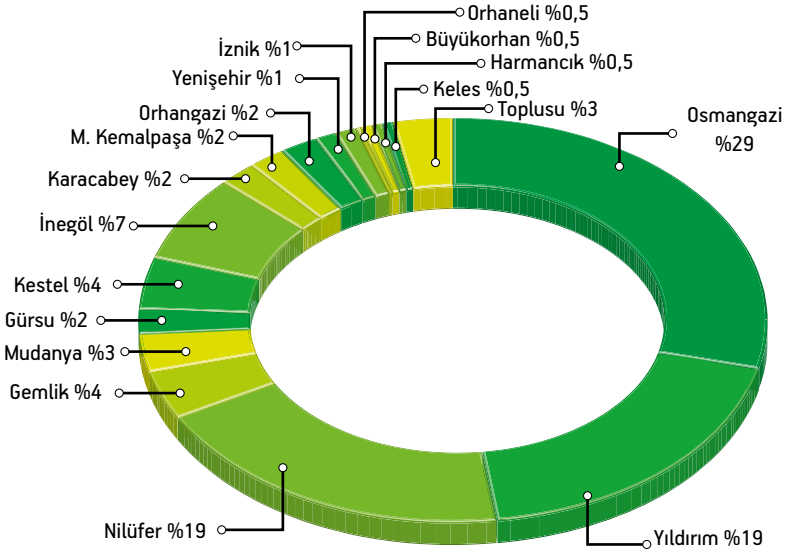

İlçe Bazında Su Gelirleri Tahsilat / Tahakkuk Tutarları

İlçeler	Tahakkuk (TL)	Tahsilat (TL)	İlçeler	Tahakkuk (TL)	Tahsilat (TL)
Osmangazi	241.356.860	240.500.728	Orhangazi	19.507.427	17.423.173
Yıldırım	165.841.121	157.859.438	M.Kemalpaşa	18.892.234	18.932.018
Nilüfer	147.925.586	151.206.447	Yenişehir	10.736.619	9.593.477
Gemlik	28.928.865	29.085.958	İznik	7.445.174	6.942.503
Mudanya	28.913.113	28.455.390	Orhaneli	2.326.964	2.349.110
Gürsu	18.667.755	18.957.617	Keles	1.237.927	1.305.226
Kestel	44.509.253	34.320.424	Büyükorhan	893.876	948.104
İnegöl	61.476.241	57.614.095	Harmancık	1.196.652	1.186.671
Karacabey	16.119.056	14.783.020	Toplusu	22.491.853	23.945.934
TOPLAM				838.466.576	815.409.333

İlçe Bazında Su Gelirleri Tahakkuk - Tahsilat Oranları

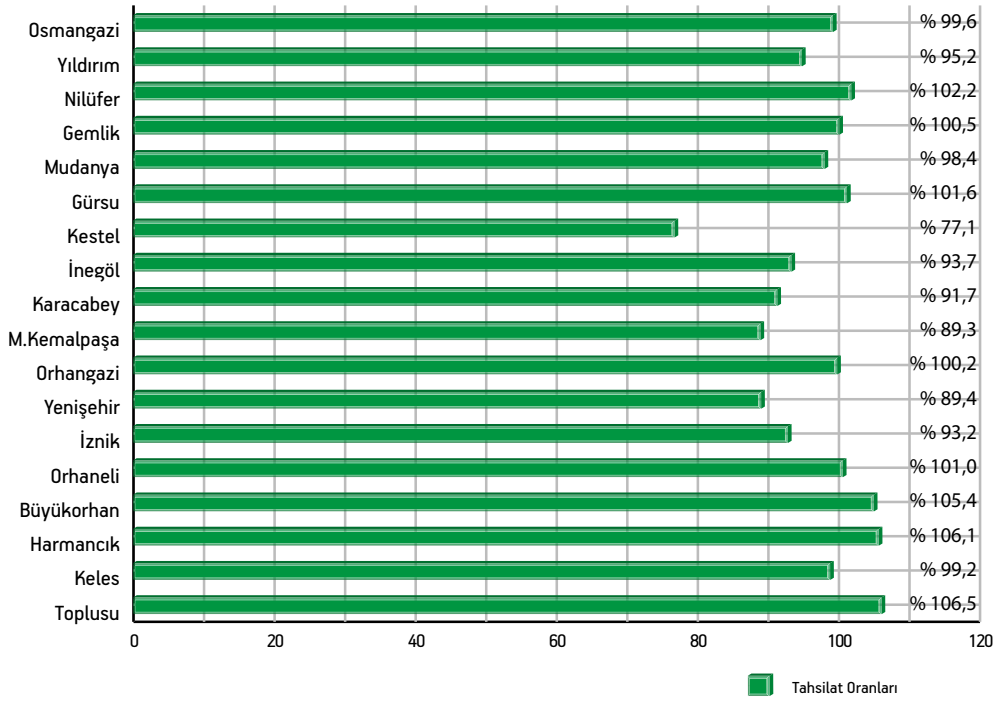

Tahsilat Kanalları

Tahsilat Kanalları	Tahsilat Oranları (%)
BUSKİ Gen. Müd. Tahsilat Şubeleri	32,1
Bankalar	44,4
PTT	18,1
İnternet	1,4
Mobil	0,1
Kiosk EKS TAHSİLAT	2,9
Kiosk TAHSİLAT	1,0
TOPLAM	100,0

Ay Bazında Üretilen - Tüketilen Kayıp Su Miktarı

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam
Üretilen Su Miktarı (milyon m^3)	8.579	7.871	8.428	8.382	9.048	9.707	9.891	10.470	9.757	9.504	8.916	9.176	**10.9729**
Tüketilen Su Miktarı (milyon m^3)	7.095	6.137	6.417	6.592	7.085	7.249	7.115	7.084	8.087	7.133	6.777	6.841	**83.612**
Diğer Kullanımlar (tahliyeler) (milyon m^3)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**480**
Kayıp Su Miktarı (milyon m^3)	1.444	1.694	1.970	1.750	1.924	2.418	2.736	3.346	1.630	2.331	2.098	2.296	**25.637**
KAYIP SU YÜZDESİ (%)	17	22	23	21	21	25	28	32	17	25	24	25	**22**

Aylara Göre Üretilen - Tüketilen ve Kayıp Su Miktarları (milyon m^3)

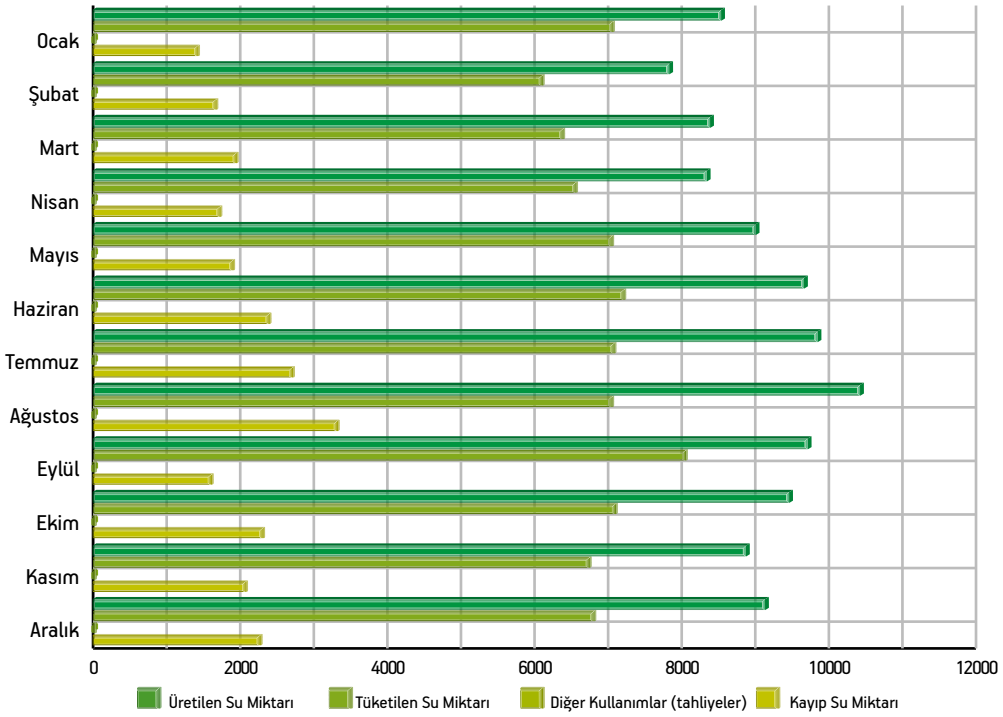

Aylara Göre Kayıp Su Oranları

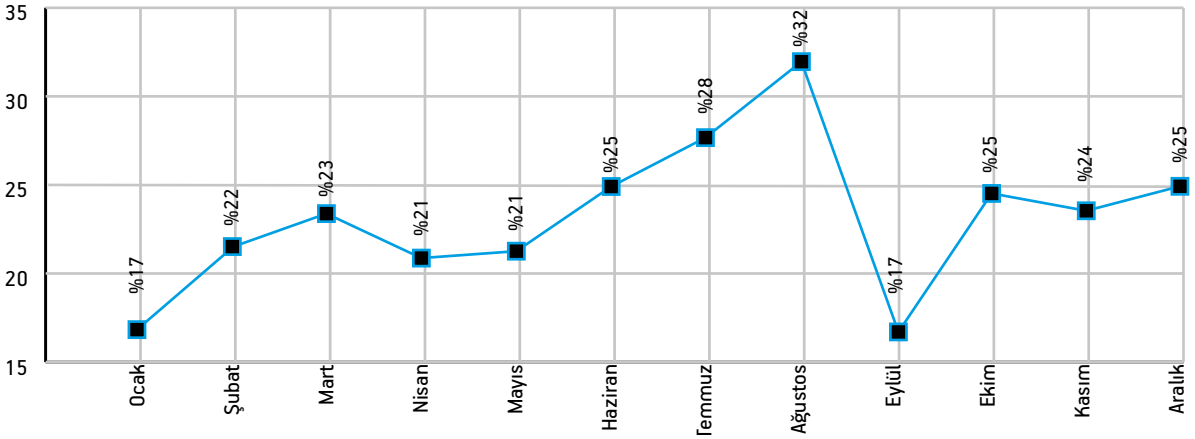

a.3. İçmesuyu İmalatları

İlçe Bazında İçmesuyu Şebeke İmalatları (km)

İlçeler	Km	İlçeler	Km
Osmangazi	67,2	Büyükorhan	48,2
Yıldırım	38,9	İznik	110,2
Nilüfer	61,5	Orhangazi	113,1
Gemlik	15,2	M.Kemalpaşa	58,1
Mudanya	22,6	Karacabey	45,4
Gürsu	3,0	Orhaneli	44,7
Kestel	48,8	Keles	15,4
İnegöl	64,2	Harmancık	5,0
Yenişehir	52,0		
TOPLAM			813,6

Ay Bazında İçmesuyu Şebeke İmalatları (km)

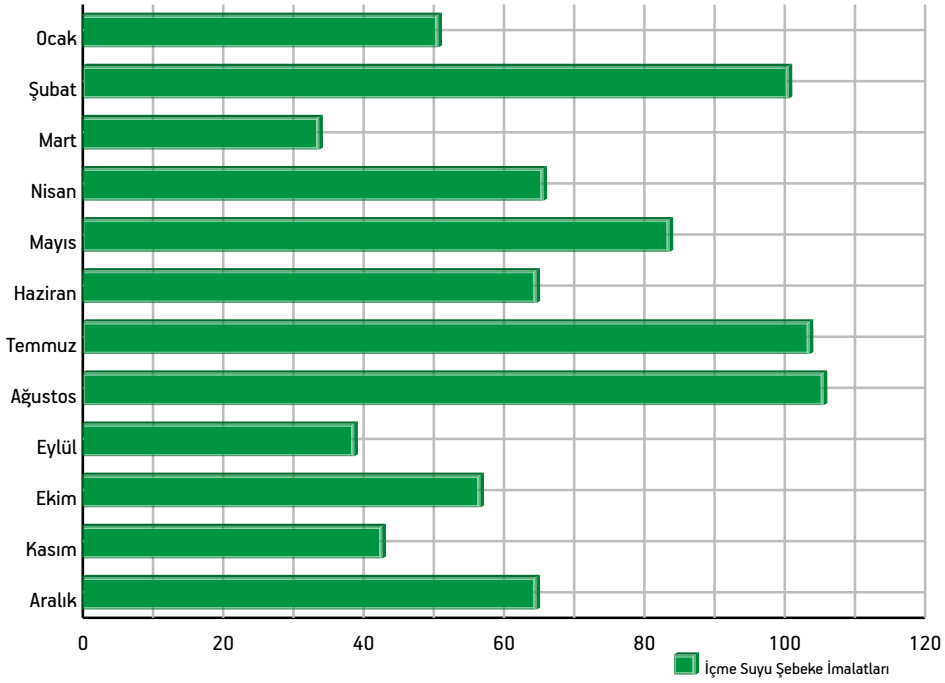

İlçe Bazında İçmesuyu Şebeke İmalat Oranları

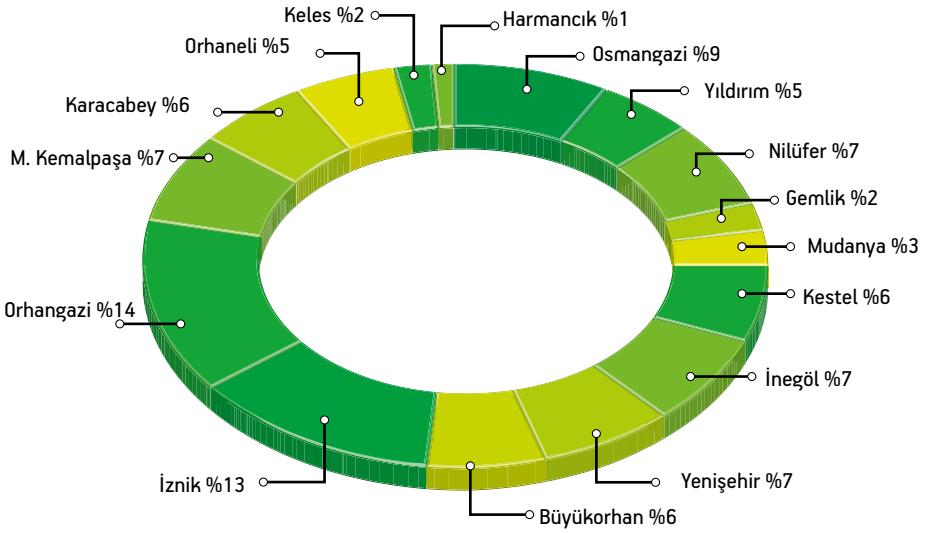

İlçe Bazında İçmesuyu İsale Hattı İmalatları

İlçeler	Km	İlçeler	Km
Osmangazi	33,9	Büyükorhan	-
Yıldırım	-	İznik	-
Nilüfer	20,0	Orhangazi	12,5
Gemlik	-	M.Kemalpaşa	20,5
Mudanya	2,5	Karacabey	4,5
Gürsu	-	Orhaneli	-
Kestel	7,2	Keles	-
İnegöl	10,7	Harmancık	-
Yenişehir	-		
TOPLAM			111,8

Ay Bazında İçmesuyu İsale Hattı İmalatları (km)

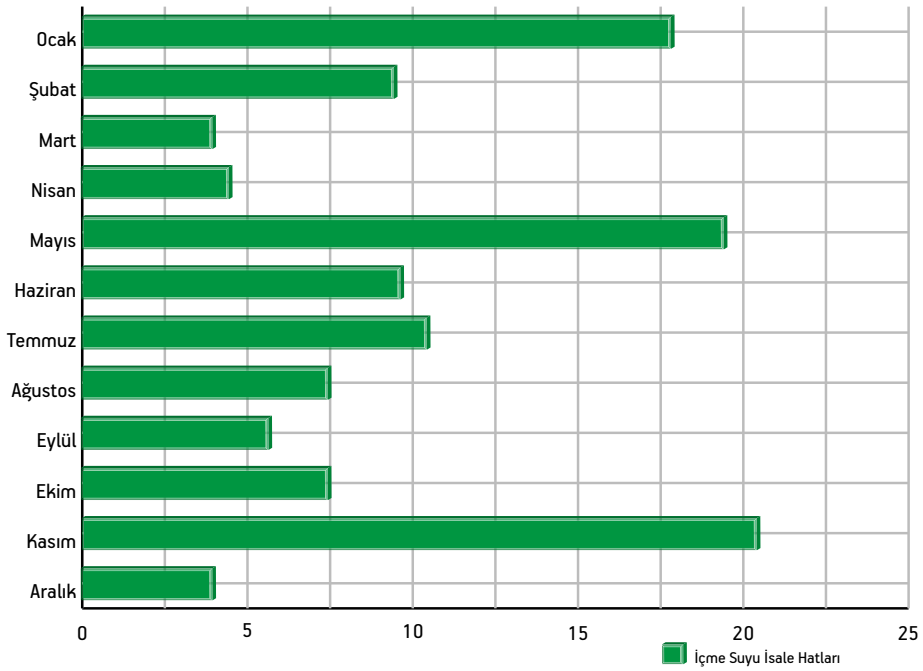

İlçe Bazında İçmesuyu İsale Hattı İmalat Oranları

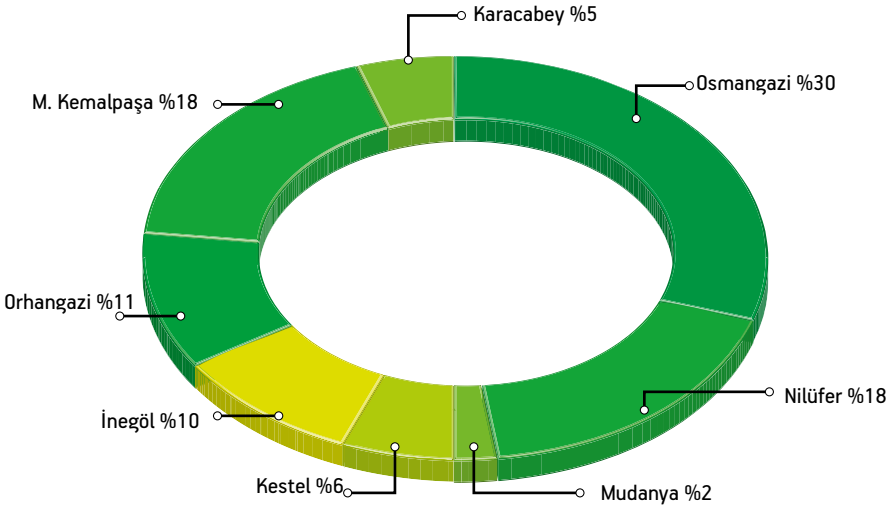

İlçe Bazında Pınar Kaynakları Islahı

İlçeler	Km	İlçeler	Km
Osmangazi	-	Büyükorhan	-
Yıldırım	-	İznik	-
Nilüfer	13,5	Orhangazi	2,5
Gemlik	-	M.Kemalpaşa	17,2
Mudanya	-	Karacabey	4,0
Gürsu	-	Orhaneli	2,5
Kestel	23,0	Keles	3,2
İnegöl	-	Harmancık	-
Yenişehir	-		
TOPLAM			**65,9**

Ay Bazında Pınar Kaynakları Islahı (Km)

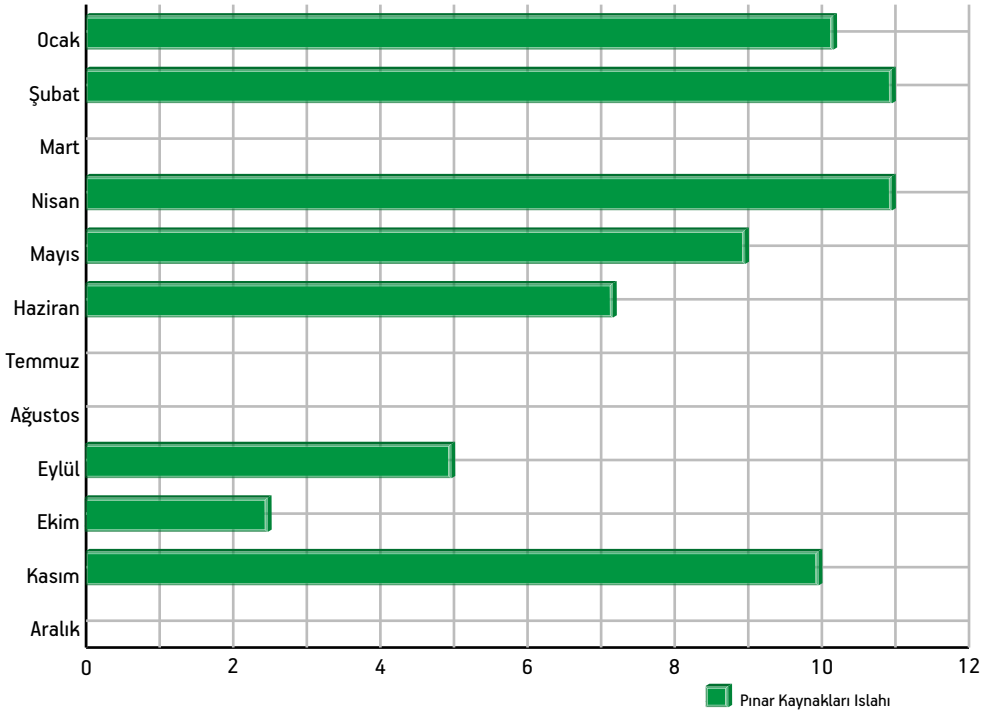

İlçe Bazında Pınar Kaynakları Islahı Oranları

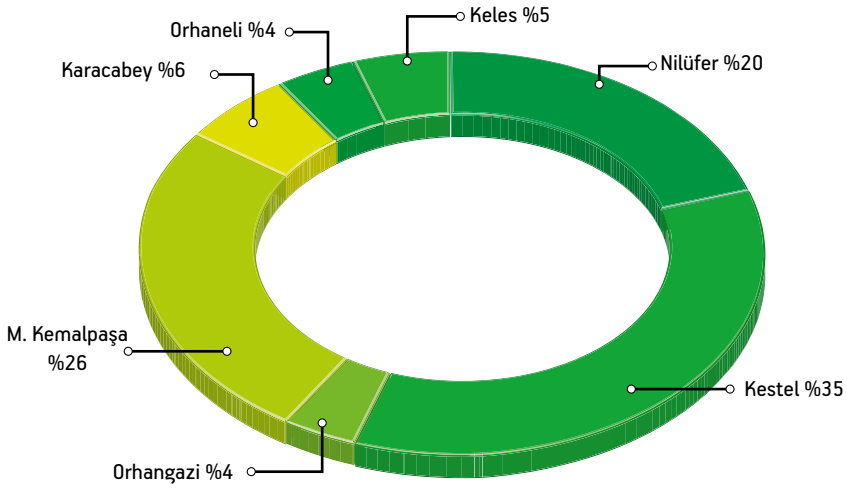

İlçe Bazında Depolar

İlçeler	Adet	Kapasite (m³)	İlçeler	Adet	Kapasite (m³)
Osmangazi	3	500	Yenişehir	5	1.000
Nilüfer	5	4.000	Orhangazi	3	700
Gemlik	1	5.000	Büyükorhan	2	400
Mudanya	3	1.800	Orhaneli	12	2.900
Kestel	1	500	M.Kemalpaşa	2	1.300
İnegöl	10	3.600			
TOPLAM				**47**	**21.700**

Ay Bazında Depolar (adet)

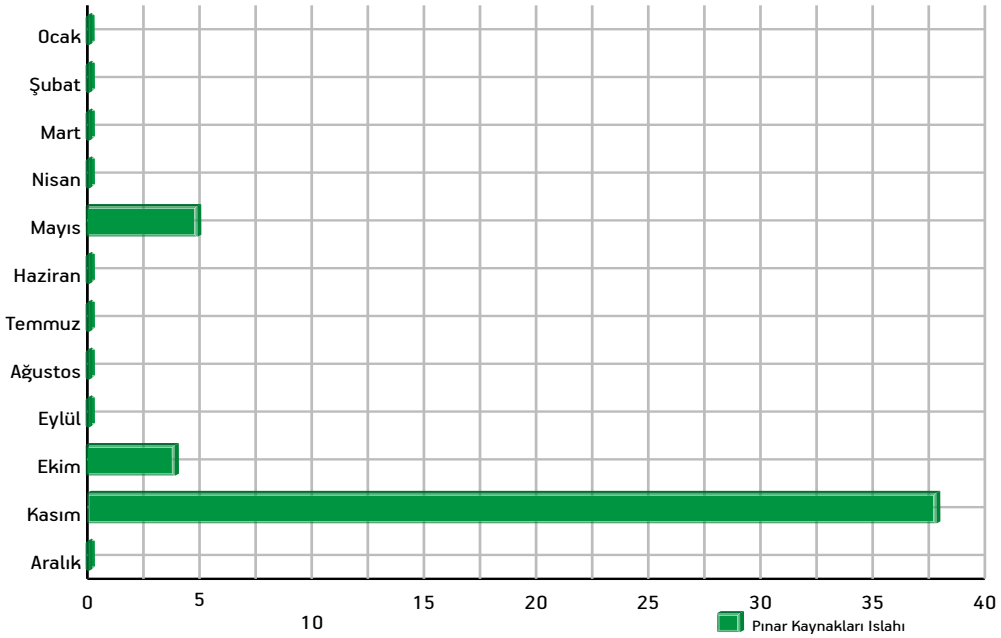

İlçe Bazında Depo Oranları

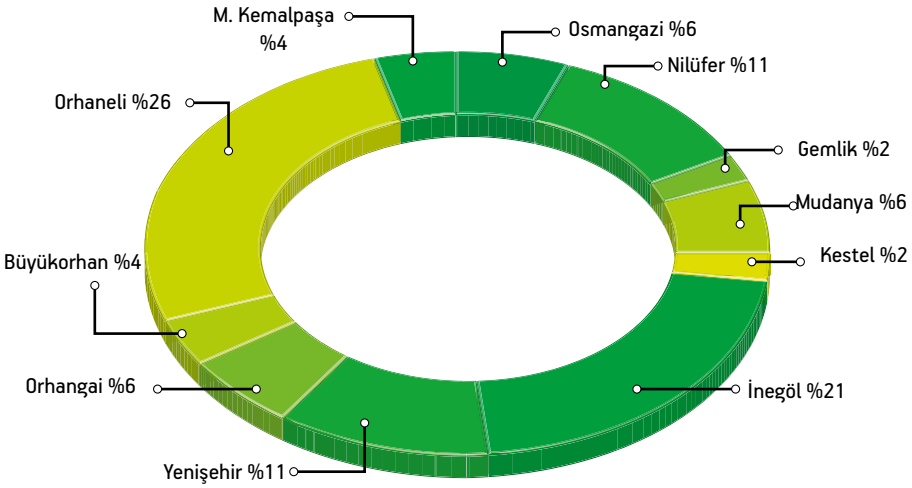

b. Yağmur Suyu, Dere Islahı ve Kanalizasyon Hizmetleri

İlçe Bazında Yağmur Suyu Şebeke İmalatları

İlçeler	m	İlçeler	m
Osmangazi	22.493	Büyükorhan	-
Yıldırım	5.837	İznik	3.807
Nilüfer	16.686	Orhangazi	2.370
Gemlik	19.484	M.Kemalpaşa	1.297
Mudanya	1.875	Karacabey	2.433
Gürsu	1.934	Orhaneli	-
Kestel	2.241	Keles	6
İnegöl	9.138	Harmancık	-
Yenişehir	23.212		
TOPLAM			**112.813**

Ay Bazında Yağmur Suyu Şebeke İmalatları (m)

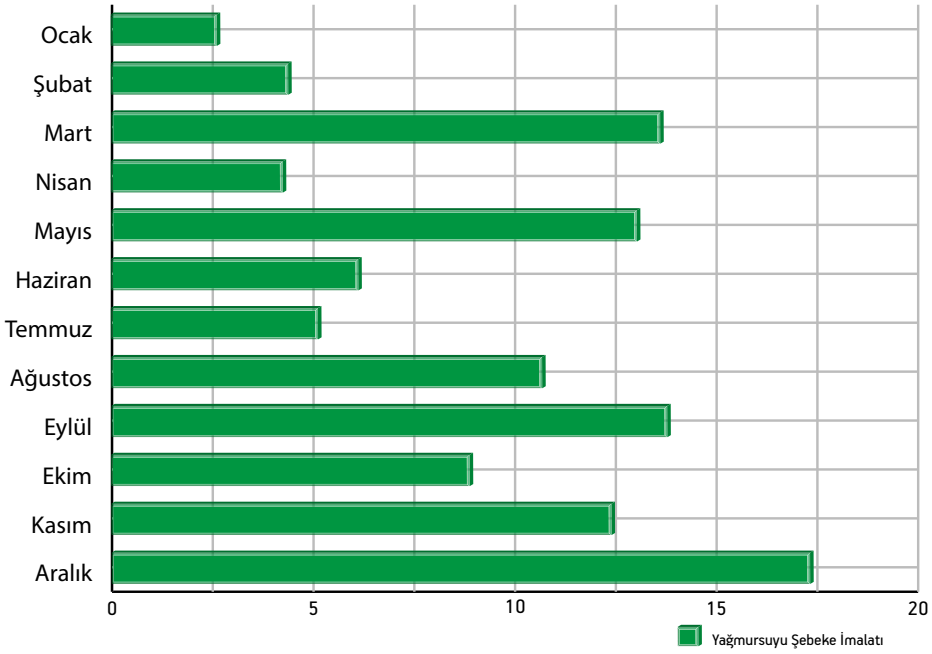

İlçe Bazında Yağmur Suyu Şebeke İmalat Oranları

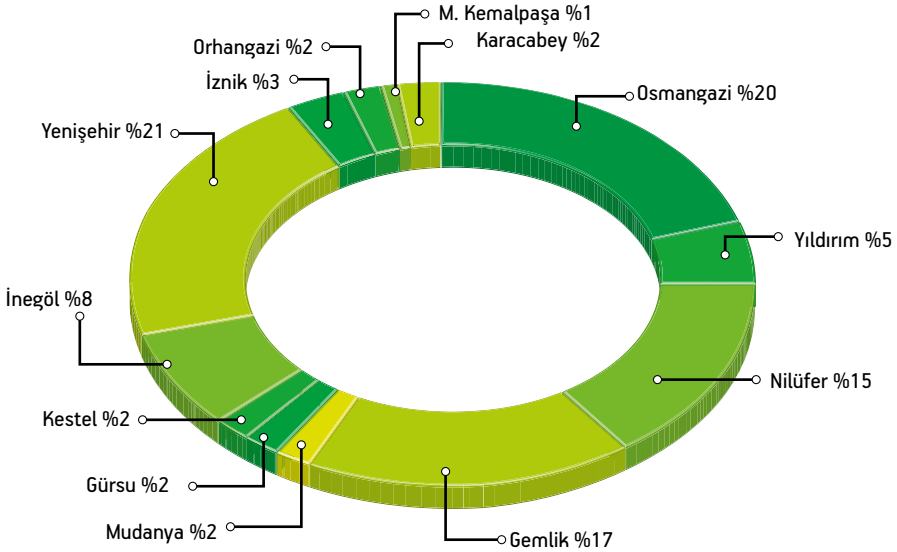

İlçe Bazında Kanalizasyon Şebeke İmalatları

İlçeler	m	İlçeler	m
Osmangazi	45.159	Büyükorhan	86
Yıldırım	6.574	İznik	2.104
Nilüfer	46.052	Orhangazi	7.585
Gemlik	40.733	M.Kemalpaşa	1.796
Mudanya	16.012	Karacabey	-
Gürsu	1.406	Orhaneli	2.066
Kestel	6.771	Keles	180
İnegöl	14.565	Harmancık	-
Yenişehir	4.474		
TOPLAM			**195.563**

Ay Bazında Kanalizasyon Şebeke İmalatları (m)

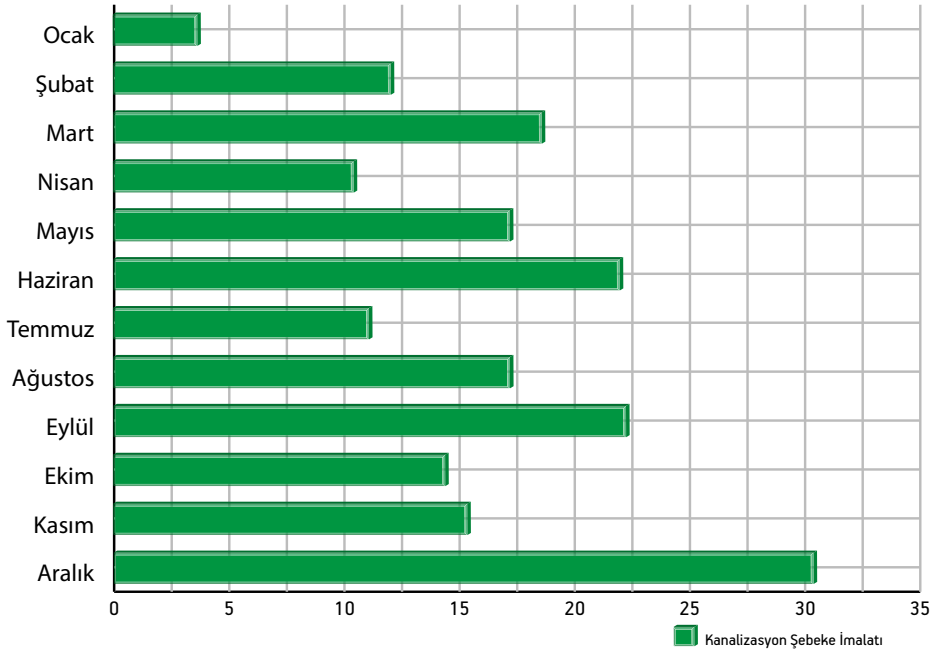

İlçe Bazında Kanalizasyon Şebeke İmala Oranları

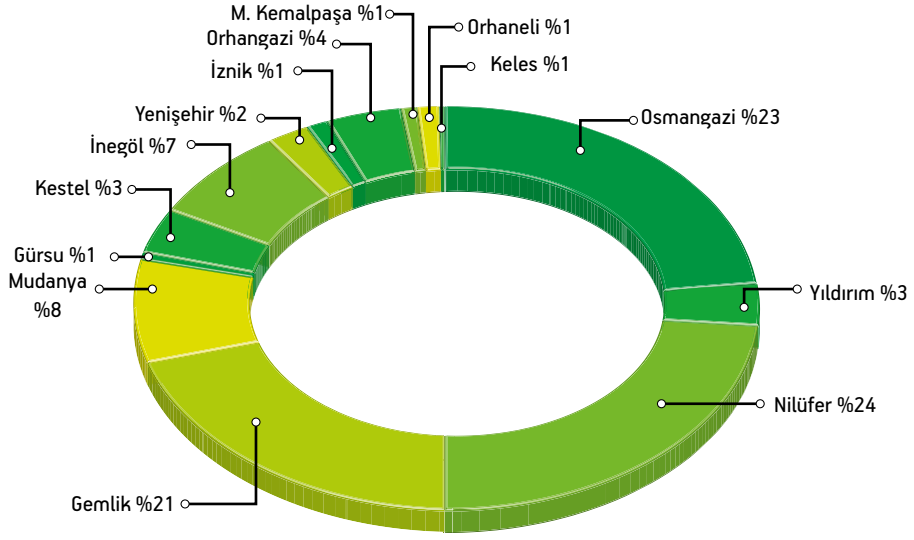

İlçe Bazında Dere Islahı

İlçeler	m	İlçeler	m
Osmangazi	200	Büyükorhan	-
Yıldırım	400	İznik	-
Nilüfer	-	Orhangazi	-
Gemlik	130	M.Kemalpaşa	-
Mudanya	-	Karacabey	-
Gürsu	-	Orhaneli	-
Kestel	123	Keles	-
İnegöl	-	Harmancık	-
Yenişehir	-		
TOPLAM			**853**



Dere Islahı Çalışması

c. Çevre Koruma ve Arıtma Hizmetleri

İçme Suyu Arıtma Tesisi Kimyasal Madde Sarfiyatları

	kg
Alüminyum Sülfat	536.074
Polielektrolit	5.067
Klor	109.169
Sülfürik Asit	995.882
Pot. Per.	-
CFS	-
Aktif Karbon	-
Demir III Klorür	30.270
Tuz (NaCl) Hipoks	381.175

İçme Suyu Laboratuarında Yapılan Analiz Sayıları

	Adet
Analizi Yapılan Numune Sayısı	18.388
Genel (40 parametre)	86.135
Ağır Metal (12 parametre)	17.826
Mikrobiyolojik (8 parametre)	23.384
TOPLAM (60 parametre)	**127.345**

Atıksu Laboratuarında Yapılan Analiz Sayıları

	Adet
Analizi Yapılan Numune Sayısı	4.183
Genel (31 parametre)	17.936
Ağır Metal (14 parametre)	6.070
TOPLAM (45 parametre)	**24.006**

Atıksu Kalite Ruhsatlandırma ve Denetleme İşlemi Yapılan İşyeri Sayıları

	Adet
Yeni Tespit Edilen İşyeri	482
Kapanan İşyeri	180
İl Çevre ve Orman Müd. Sevk Edilen İşyeri	-11
Ruhsat Dışı Bırakılan İşyeri	358
İşlemlerini Tamaml. Dolayı Ruhsat Kapsam Dışı YazısıVerilmeyen /Belgesiz Ruhsat Dışı Bırakılan İşyeri Sayısı	41
Genel Toplama Göre AKKR Kapsamında Olan Toplam İşyeri	9.526
AKKR Alan İşyeri	48
Toplam AKKR Alan İşyeri	3.763
Genel Toplamlara Göre AKKR Verme Oranı (%)	44
AKKR Süresi Dolan İşyeri	2015 Yılı İçerisinde Toplam 158 İşetmenin Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatının Süresi Dolacaktır.
KÖP Tahakkuku Yapılan İşletme sayısı	55
KÖP Tahakkuku Yapılan Toplam İşletme sayısı	2.292
AKKR Belgesini Alan Toplam İşletme Sayısı ve Yüzdeliği	-
Tahakkuk Ettirilen Toplam KÖP Bedeli (TL)	198.012.327
Tahsilatı Yapılan Toplam KÖP Bedeli ve Yüzdeliği (TL)	-

Çamur Bertarafı

BUSKİ bünyesinde bulanan Atıksu Arıtma Tesislerinden elde edilen çamurun Akışkan Yataklı Çamur Yakma Tesisinde yakılması ve elektrik enerjisi üretilmesi amaçlanmaktadır. Çamur yakma tesisi BUSKİ Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Mevcut Doğu Atıksu Arıtma Tesisi sınırları içinde yapılmaktadır.

Tesisin inşaat işi bitim tarihi 13.04.2017 olup; bu tarihten sonra işletmeye alınarak performans ve güvenilirlik testlerinden sonra geçici kabulü yapılarak; 1 yıl boyunca işletme süreci devam ederek tesis kesin kabule hazır hale getirilecektir. Tesisin kesin kabulünün yapılacağı tarih yaklaşık olarak 13.04.2019 tarihidir.

Çamur yakma tesisi hazırlama, yakma, arıtma ve elektrik üretimi ile yardımcı sistemlerden oluşmaktadır. Temel olarak 96 ton kuru/katı madde içerikli çamur yakma kapasitesine göre çift hat olarak tasarlanan sistemde yakma gerçekleştirilecektir.

Sistemde temel amaç çamurun yakılarak ve içerisindeki suyun buharlaştırılarak stabilizasyonu ve hacminin azaltılması olup; işlem sırasında ortaya çıkan atık ısıdan yararlanılarak da elektrik üretimi hedeflenmektedir. Çamurun tam olarak yanabilmesi için kendine yeterli enerjiye sahip olmadığı durumlarda doğal gaz ile enerji sağlanarak sürekli ve verimli şekilde yanmanın oluşması sağlanacaktır.

Farklı özelliklerde ve enerji değerlerinde gelen çamurun sürekli ve etkin olarak yakılabilmesine imkan verecek esnekliğe, sistemin ihtiyaç duyduğu elektriği sağlayacak ve mümkünse fazlasını üretecek verimliliğe, ve atıkların Türk ve Avrupa normlarını sağlayacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde emisyon duyarlılığına, işletme kolaylığı, bakım onarım ve tedarik kolaylığı ve uzun ömür sahip olacak bir sistem öngörülmüştür. Sistemin en önemli özellikleri emisyon kontrolü (baca gazı arıtımı) açısından Türk ve Avrupa standartlarının tamamen karşılanması ve elektrik üreterek katma değer sağlamasıdır.

Tesis 13.000 m² alanda yapılmakta olup projenin yaklaşık % 70 tamamlanmıştır. Tesis tamamlandığında 2,5 MW elektrik üretimi yapan ve BUSKİ nin atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurunu mevcut yönetmelik ve AB standartlarında berterafını sağlayan bir tesis olacaktır.





Çamur Yakma Tesisi

d. Kamulaştırma Faaliyetleri

İlçe Bazında Kamulaştırılan Alan (m²)

İlçeler	Toplam	İlçeler	Toplam
Gemlik	2.505	Mudanya	10.398
İnegöl	25.392	Nilüfer	920
İznik	6.546	Orhaneli	14.753
Gürsu	198	Osmangazi	2.033
Kestel	149.568	Yenişehir	42.952
Harmancık	-	Keles	274
Karacabey	2.969	Orhangazi	604
Büyükorhan	1.006	Yıldırım	546
Mustafakemalpaşa	-		
TOPLAM			**260.664**

Altyapı Türüne Göre Kamulaştırılan Alan (m²)

Altyapı Türü	Gemlik	İnegöl	İznik	Karacabey	Kestel	Mudanya	Nilüfer	Orhaneli	Osmangazi	Yenişehir	Yıldırım	Gürsu	Keles	B. Orhan	Toplam
Atıksu	-	-	-	-	788	9.140	146	-	198	-	-	198	274	-	10.742
H. Bina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.526	-	-	-	1.006	3.135
İ. Suyu	230	8.243	1.754	-	122.400	1.258	774	520	-	-	546	-	-	-	135.725
Sulama	-	17.149	4.792	2.969	26.380	-	-	14.233	-	41.427	-	-	-	-	106.952
Y. Suyu	2.275	-	-	-	-	-	-	-	1.835	-	-	-	-	-	4.110
Toplam	**2.505**	**25.392**	**6.546**	**2.969**	**149.568**	**10.398**	**920**	**14.753**	**2.033**	**42.953**	**546**	**198**	**274**	**1.006**	**260.664**

İlçe Bazında Altyapı Türüne Göre Kamulaştırılan Alan Dağılımı

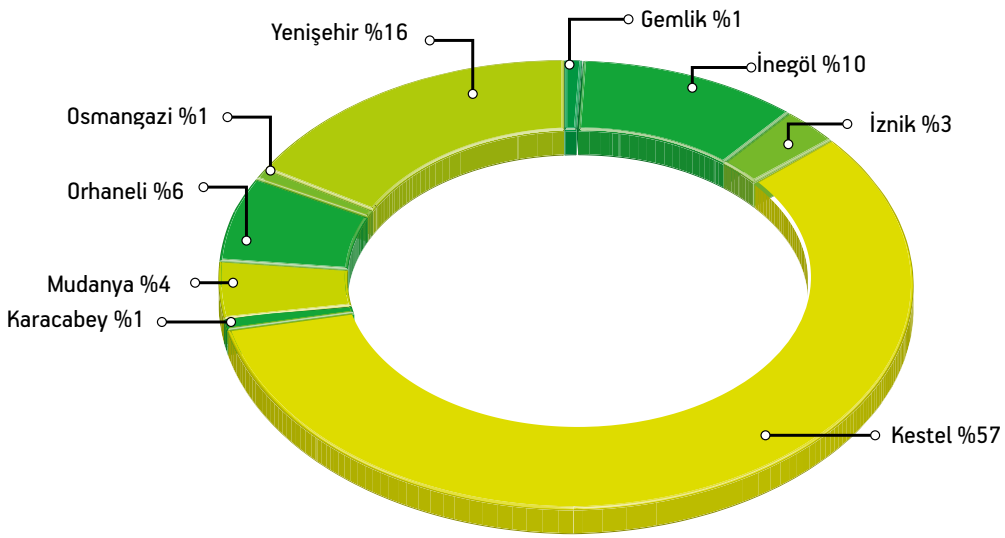

Fotogrametrik Harita Üretimi Projesi M5

"Bursa mülki il sınırını kapsayan yaklaşık 12.000 km² alan içinde 1/1000 ölçekli ortofoto haritalar ile yaklaşık 8.500 km²' lik alan içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli vektör haritaların üretimi (M5) projesi" devam etmektedir. 12.000 km²' lik M5 proje alanındaki 133 adet blokta; 69 adet C1, 100 adet C2, 1447 adet C3 yer kontrol noktalarının ve nivelman noktalarının tamamının tesisi, 1.616 adet noktanın GPS hesapları ve 790 km nivelman hesap işlemleri tamamlanmış, 56 adedi 2015 yılında olmak üzere proje sürecinde toplam 66 adet blokta 5.569 km² uçuş gerçekleşmiştir.

Yüklenici tarafından 31 adet blok 2.801 km²' lik alan değerlendirilmiş, 29 adet blokta bütünleme çalışmaları tamamlanmıştır.



Örnek Harita

Proje Kontrol ve Aplikasyon Faaliyetleri

Aplikasyon (Adet Nokta)	640
Proje Kontrol Ölçmeleri (Adet Proje)	22
Boykesit Ve Enkesit Ölçmeleri (m)	34.975
Detay, Plankote Ve Hacim Belirleme Ölçmeleri (m²)	699.865

İlçe Bazında Tahsis Alınan Alanlar

İlçeler	m²	İlçeler	m²
Gemlik	75.357	Mudanya	28.940
İnegöl	329.098	Nilüfer	1.591
İznik	193.538	Orhaneli	61.234
Gürsu	50.273	Osmangazi	39.118
Kestel	72.449	Yenişehir	8.227
Harmancık	25.856	Keles	90.025
Karacabey	44.875	Orhangazi	27.253
Büyükorhan	18.779	Yıldırım	3.981
Mustafakemalpaşa	78.567		
TOPLAM			**1.149.161**

İlçe Bazında m² Olarak Tahsis Alınan Alan Oranları

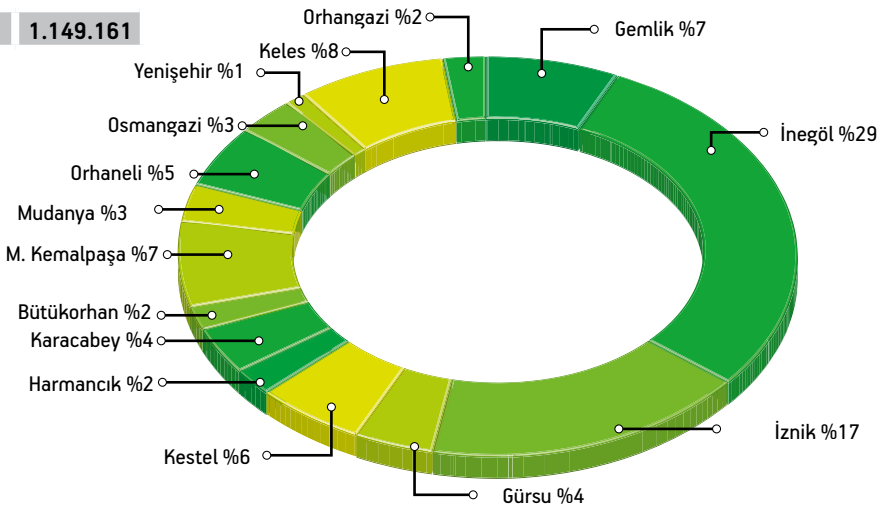

İlçe Bazında Tahsis Alınan Alanlar

İlçeler	m²	İlçeler	m²
Gemlik	3	Mudanya	11
İnegöl	11	Nilüfer	2
İznik	10	Orhaneli	8
Gürsu	2	Osmangazi	7
Kestel	13	Yenişehir	6
Harmancık	1	Keles	4
Karacabey	11	Orhangazi	3
Büyükorhan	1	Yıldırım	1
Mustafakemalpaşa	7		
TOPLAM			**101**

İlçe Bazında Adet Olarak Tahsis Alınan Alan Oranları

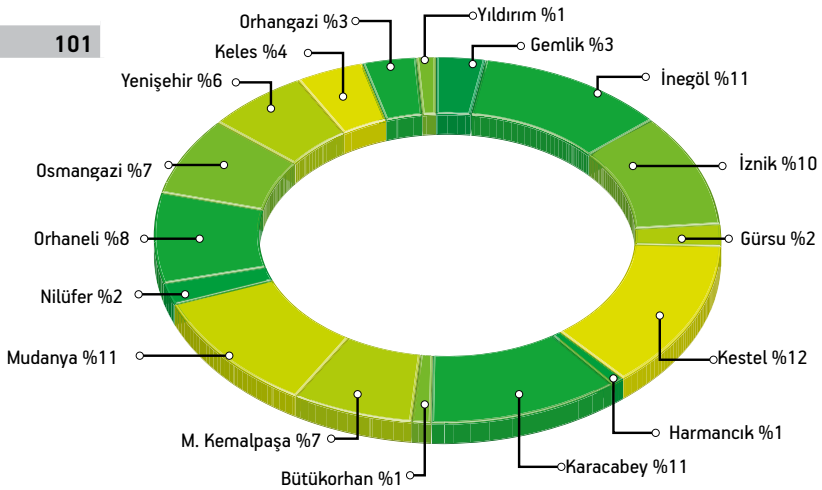

İlçe Bazında Tescil Sayısı

İlçeler	Adet	İlçeler	Adet
Gemlik	25	Mudanya	14
İnegöl	6	Nilüfer	7
İznik	3	Orhaneli	5
Gürsu	-	Osmangazi	18
Kestel	21	Yenişehir	6
Harmancık	-	Keles	2
Karacabey	-	Orhangazi	1
Büyükorhan	1	Yıldırım	-
M. Kemalpaşa	-		-
TOPLAM			**109**

İlçe Bazında Tescil Oranları

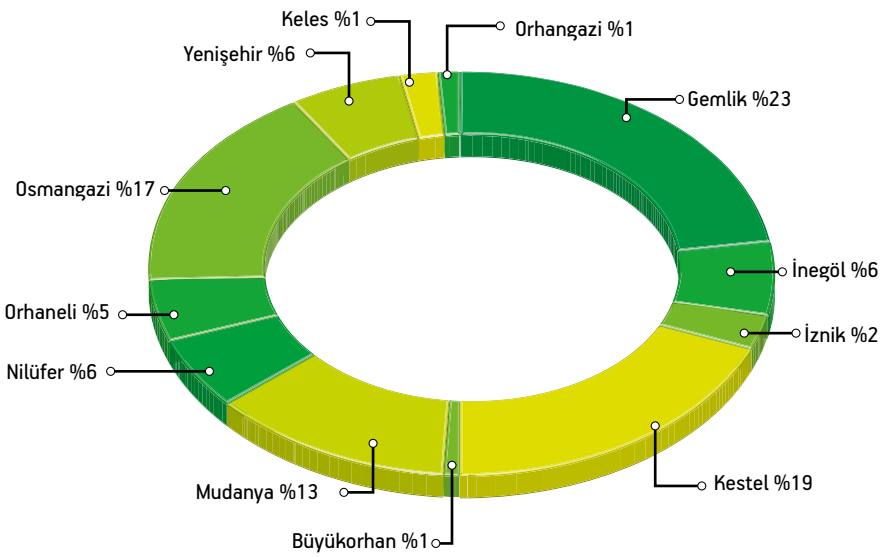

İlçe Bazında İrtifak Alanları

İlçeler	m²	İlçeler	m²
Gemlik	2.214	Mudanya	381
İnegöl	-	Nilüfer	61
İznik	-	Orhaneli	210
Gürsu	179	Osmangazi	4.644
Kestel	923	Yenişehir	-
Harmancık	-	Keles	-
Karacabey	-	Orhangazi	-
Büyükorhan	-	Yıldırım	-
M. Kemalpaşa	-		
TOPLAM			**8.612**

İlçe Bazında İrtifak Oranları

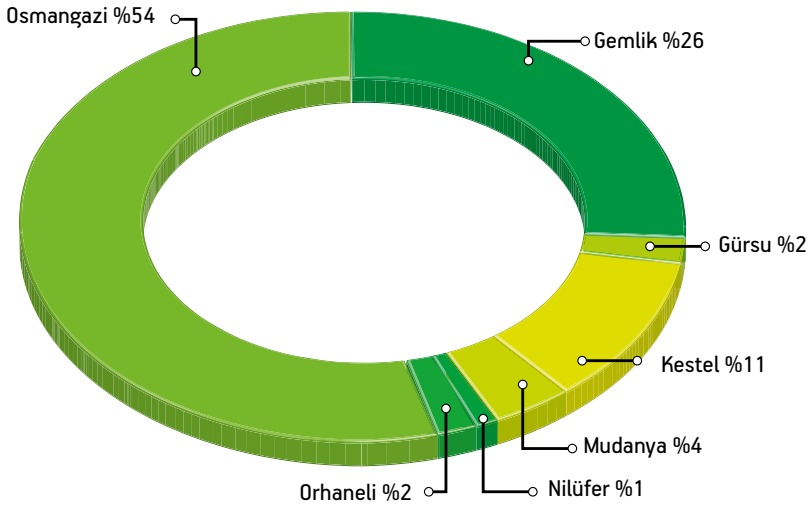

Altyapı Türüne Göre İrtifak Sayısı

İlçeler	Adet
Gemlik	20
Kestel	6
Mudanya	7
Nilüfer	1
Orhaneli	2
Osmangazi	13
Gürsu	1
Toplam	**50**

İlçe Bazında Altyapı Türüne Göre İrtifak Oranları

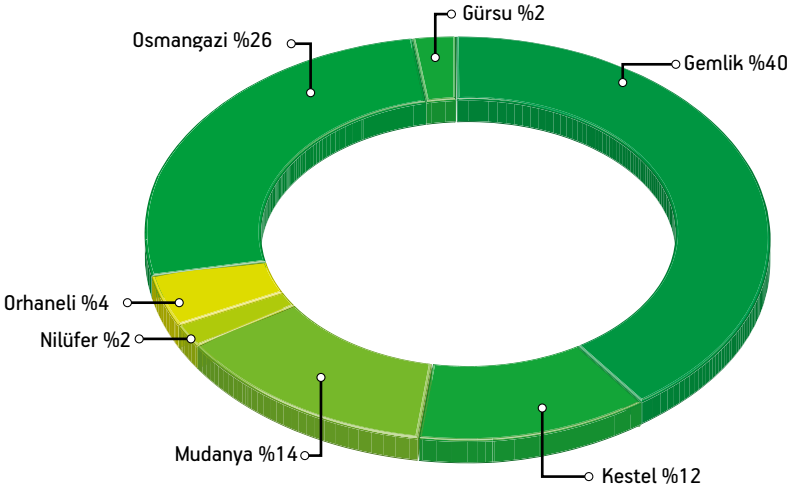

e. Asfalt Yama ve Kaplama Çalışmaları

İlçe Bazında Yapılan Asfalt Yama ve Kaplama Çalışmaları (Ton)

İlçeler		Ton	İlçeler		Ton
Osmangazi	Asfalt Yama	28.057	Büyükorhan	Asfalt Yama	1.124
	Asfalt Kaplama	62.788		Asfalt Kaplama	300
Yıldırım	Asfalt Yama	16.987	İznik	Asfalt Yama	3.880
	Asfalt Kaplama	13.233		Asfalt Kaplama	5.955
Nilüfer	Asfalt Yama	16.797	Orhangazi	Asfalt Yama	2.064
	Asfalt Kaplama	17.493		Asfalt Kaplama	16.842
Gemlik	Asfalt Yama	3.285	M.Kemalpaşa	Asfalt Yama	4.643
	Asfalt Kaplama	14.647		Asfalt Kaplama	9.679
Mudanya	Asfalt Yama	5.050	Karacabey	Asfalt Yama	977
	Asfalt Kaplama	9.653		Asfalt Kaplama	251
Gürsu	Asfalt Yama	2.134	Orhaneli	Asfalt Yama	1.053
	Asfalt Kaplama	2.954		Asfalt Kaplama	289
Kestel	Asfalt Yama	3.751	Keles	Asfalt Yama	598
	Asfalt Kaplama	11.792		Asfalt Kaplama	179
İnegöl	Asfalt Yama	7.629	Harmancık	Asfalt Yama	354
	Asfalt Kaplama	3.423		Asfalt Kaplama	180
Yenişehir	Asfalt Yama	1.021			
	Asfalt Kaplama	14.047			
TOPLAM	**Asfalt Yama**				99.404
	Asfalt Kaplama				183.704

Ay Bazında Yapılan Asfalt Yama ve Kaplama Çalışmaları (Ton)

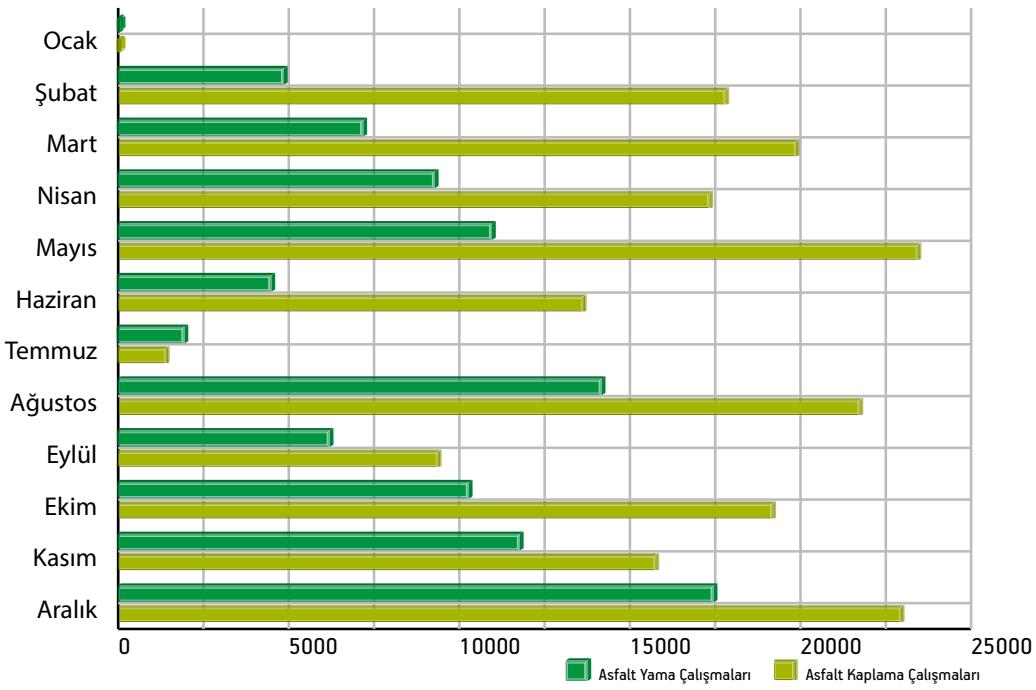

f. Baca Yükseltme Çalışmaları

İlçe Bazında Baca Yükseltme Çalışmaları (Adet)

İlçeler		Adet	İlçeler		Adet
Osmangazi	Kanal. Baca Yük.	103	İznik	Kanal. Baca Yük.	137
	Izgara Baca Yük.	77		Izgara Baca Yük.	137
Yıldırım	Kanal. Baca Yük.	93	Orhaneli	Kanal. Baca Yük.	79
	Izgara Baca Yük.	311		Izgara Baca Yük.	22
Nilüfer	Kanal. Baca Yük.	279	Büyükorhan	Kanal. Baca Yük.	29
	Izgara Baca Yük.	158		Izgara Baca Yük.	19
Mudanya	Kanal. Baca Yük.	0	Keles	Kanal. Baca Yük.	30
	Izgara Baca Yük.	0		Izgara Baca Yük.	29
Kestel	Kanal. Baca Yük.	0	Orhangazi	Kanal. Baca Yük.	25
	Izgara Baca Yük.	0		Izgara Baca Yük.	31
Gürsu	Kanal. Baca Yük.	0	Karacabey	Kanal. Baca Yük.	135
	Izgara Baca Yük.	0		Izgara Baca Yük.	3
Gemlik	Kanal. Baca Yük.	0	M.Kemalpaşa	Kanal. Baca Yük.	387
	Izgara Baca Yük.	1		Izgara Baca Yük.	55
Yenişehir	Kanal. Baca Yük.	120	Harmancık	Kanal. Baca Yük.	29
	Izgara Baca Yük.	81		Izgara Baca Yük.	2
İnegöl	Kanal. Baca Yük.	525			
	Izgara Baca Yük.	286			
TOPLAM	**Kanal. Baca Yük.**				**1.971**
	Izgara Baca Yük.				**1.212**

Ay Bazında Baca Yükseltme Çalışmaları (Adet)

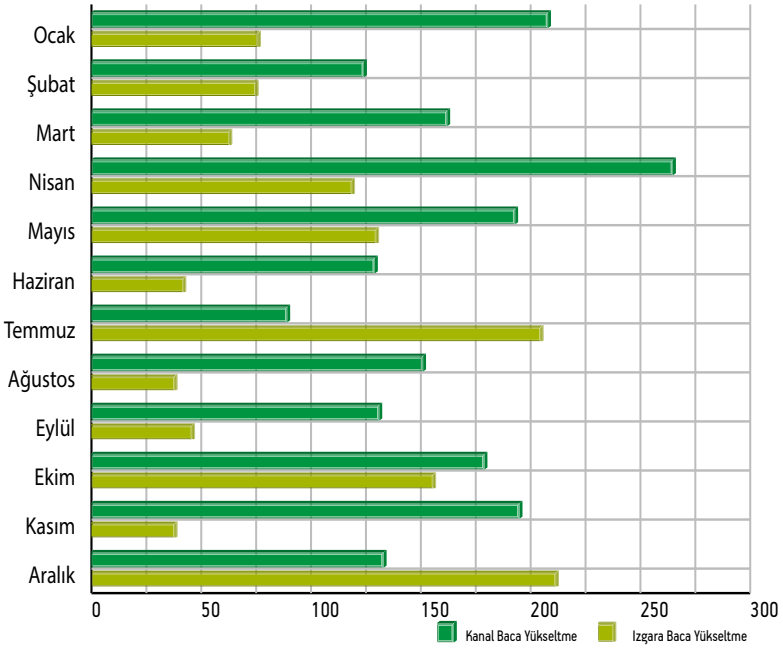

Baca Yükseltme Çalışmalarının Dağılımı

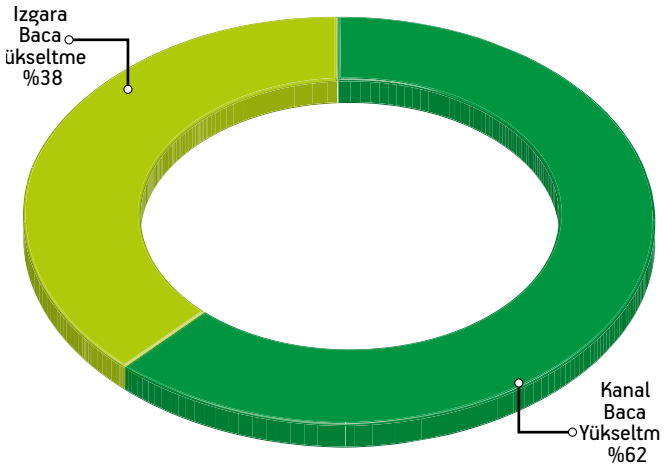

g. Abonelik Çalışmaları

İlçe Bazında Abonelik Çalışmaları (Adet)

İlçeler	Çalışma Türü	Adet	İlçeler	Çalışma Türü	Adet
Osmangazi	Yeni Abonelik	1.910	İznik	Yeni Abonelik	890
	Takılan Sayaç	971		Takılan Sayaç	1.900
Yıldırım	Yeni Abonelik	4.449	Orhaneli	Yeni Abonelik	1.342
	Takılan Sayaç	3.584		Takılan Sayaç	4.888
Nilüfer	Yeni Abonelik	3.840	Büyükorhan	Yeni Abonelik	1.928
	Takılan Sayaç	3.039		Takılan Sayaç	1.880
Mudanya	Yeni Abonelik	2.136	Keles	Yeni Abonelik	4.172
	Takılan Sayaç	1.162		Takılan Sayaç	1.878
Kestel	Yeni Abonelik	2.954	Orhangazi	Yeni Abonelik	943
	Takılan Sayaç	1.624		Takılan Sayaç	1.858
Gürsu	Yeni Abonelik	1.470	Karacabey	Yeni Abonelik	4.537
	Takılan Sayaç	619		Takılan Sayaç	1.778
Gemlik	Yeni Abonelik	982	M.Kemalpaşa	Yeni Abonelik	3.557
	Takılan Sayaç	944		Takılan Sayaç	4.642
Yenişehir	Yeni Abonelik	1.894	Harmancık	Yeni Abonelik	646
	Takılan Sayaç	1.795		Takılan Sayaç	958
İnegöl	Yeni Abonelik	8.993			
	Takılan Sayaç	11.197			
TOPLAM	**Yeni Abonelik**				46.643
	Takılan Sayaç				44.717

Ay Bazında Abonelik Çalışmaları (Adet)

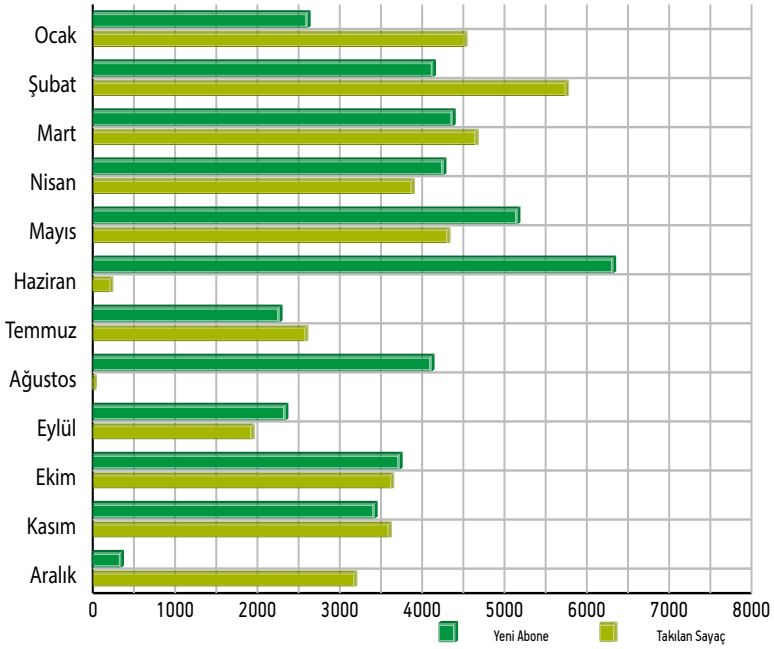

Abonelik Çalışmaları Dağılımı

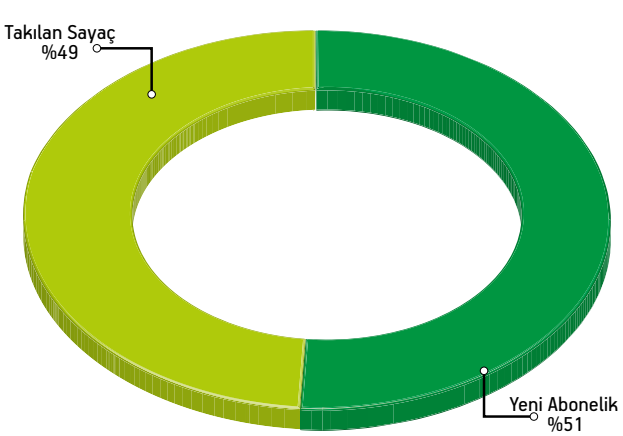

h. İçmesuyu Evsel Bağlantı Çalışmaları

İlçe Bazında İçmesuyu Evsel Bağlantı Çalışmaları

İlçeler	km	İlçeler	km
Osmangazi	15,25	Büyükorhan	6,83
Yıldırım	22,14	İznik	3,09
Nilüfer	9,95	Orhangazi	1,85
Gemlik	0,00	M.Kemalpaşa	3,92
Mudanya	2,15	Karacabey	3,00
Gürsu	3,34	Orhaneli	4,03
Kestel	11,14	Keles	2,28
İnegöl	16,52	Harmancık	0,30
Yenişehir	1,74		
TOPLAM			**107,52**

Ay Bazında İçmesuyu Evsel Bağlantı Çalışmaları (Km)

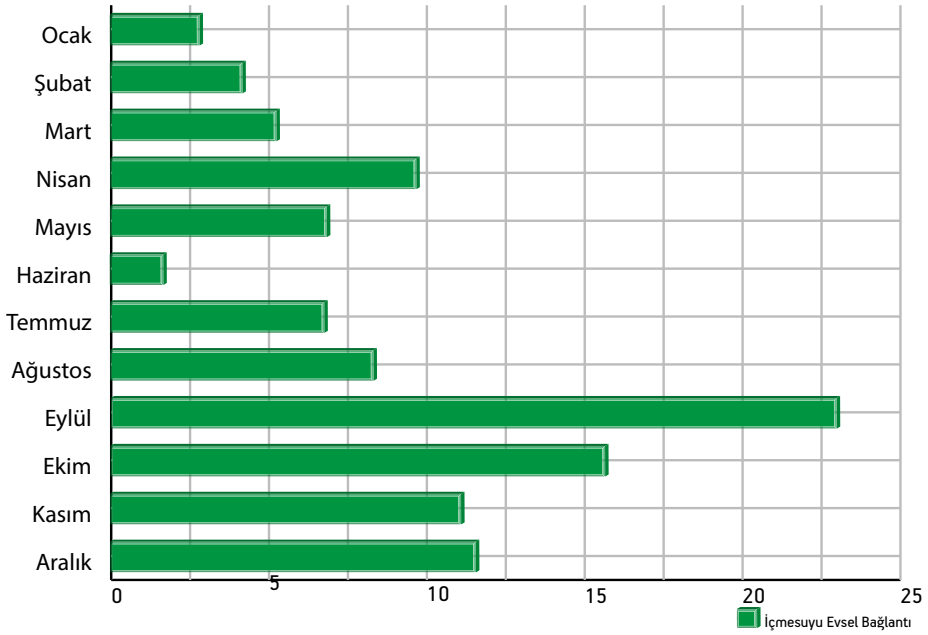

İlçe Bazında İçmesuyu Evsel Bağlantı Dağılımı

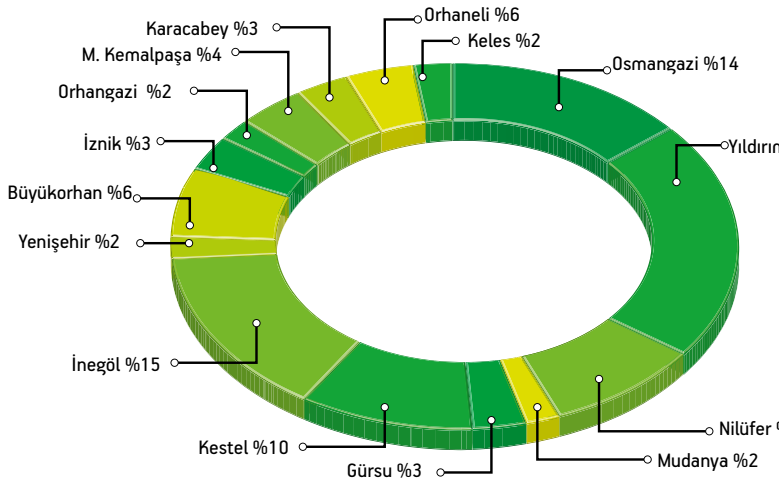

1. Arıza Tamir Çalışmaları

İlçe Bazında Arıza Tamir Çalışmaları (Adet)

İlçeler	Arıza Türü	Adet	İlçeler	Arıza Türü	Adet
Osmangazi	İçmesuyu Arıza	10.609	İznik	İçmesuyu Arıza	1.500
	Kanal Arıza	2.475		Kanal Arıza	3.165
Yıldırım	İçmesuyu Arıza	5.270	Orhaneli	İçmesuyu Arıza	2.226
	Kanal Arıza	1.906		Kanal Arıza	789
Nilüfer	İçmesuyu Arıza	4.361	Büyükorhan	İçmesuyu Arıza	2.618
	Kanal Arıza	901		Kanal Arıza	651
Mudanya	İçmesuyu Arıza	5.446	Keles	İçmesuyu Arıza	1.458
	Kanal Arıza	895		Kanal Arıza	441
Kestel	İçmesuyu Arıza	963	Orhangazi	İçmesuyu Arıza	3.404
	Kanal Arıza	118		Kanal Arıza	2.856
Gürsu	İçmesuyu Arıza	988	Karacabey	İçmesuyu Arıza	1.679
	Kanal Arıza	109		Kanal Arıza	609
Gemlik	İçmesuyu Arıza	2.191	Mustafakemalpaşa	İçmesuyu Arıza	5.810
	Kanal Arıza	329		Kanal Arıza	363
Yenişehir	İçmesuyu Arıza	1.543	Harmancık	İçmesuyu Arıza	704
	Kanal Arıza	426		Kanal Arıza	382
İnegöl	İçmesuyu Arıza	6.137			
	Kanal Arıza	7.617			
TOPLAM	**İçmesuyu Arıza**				**56.907**
	Kanal Arıza				**24.032**

Ay Bazında Arıza Tamir Çalışmaları (Adet)

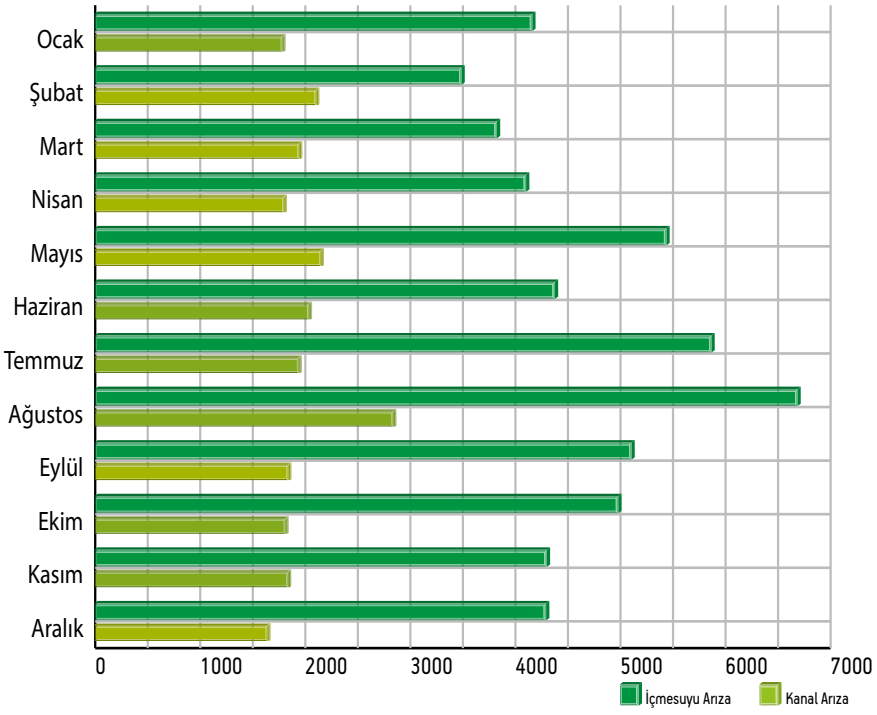

Arıza Tamir Çalışmaları Dağılımı

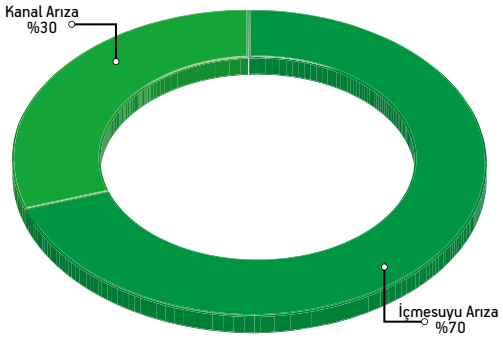

i. Proje Hizmetleri

Onaylanan Proje Metrajları (Km)

İlçeler		Km	İlçeler		Km
Osmangazi		19,2	İnegöl		3.811,9
	İçmesuyu	13,6		İçmesuyu	3.561,5
	Yağmursuyu	2,1		Yağmursuyu	39,1
	Atıksu	3,5		Atıksu	211,4
Yıldırım		-	Karacabey		1.317,4
	İçmesuyu	-		İçmesuyu	1.305,5
	Yağmursuyu	-		Yağmursuyu	49,9
	Atıksu	-		Atıksu	97,1
Nilüfer		-	Büyükorhan		434,4
	İçmesuyu	7,6		İçmesuyu	353,3
	Yağmursuyu	6,5		Yağmursuyu	4,0
	Atıksu	19,1		Atıksu	77,1
Mudanya		64,3	Yenişehir		958,8
	İçmesuyu	78,1		İçmesuyu	703,1
	Yağmursuyu	2,0		Yağmursuyu	24,4
	Atıksu	18,8		Atıksu	231,3
Kestel		15,7	M.Kemalpaşa		1.007,0
	İçmesuyu	10,2		İçmesuyu	953,0
	Yağmursuyu	-		Yağmursuyu	8,4
	Atıksu	5,5		Atıksu	45,6
Gürsu		2,3	Keles		374,8
	İçmesuyu	-		İçmesuyu	371,0
	Yağmursuyu	2,3		Yağmursuyu	-
	Atıksu	-		Atıksu	3,8
Gemlik		12,1	Orhaneli		791,7
	İçmesuyu	-		İçmesuyu	-
	Yağmursuyu	8,1		Yağmursuyu	-
	Atıksu	3,9		Atıksu	-
İznik		-	Harmancık		-
	İçmesuyu	-		İçmesuyu	-
	Yağmursuyu	-		Yağmursuyu	-
	Atıksu	-		Atıksu	-
Orhangazi		386,2			
	İçmesuyu	3,6			
	Yağmursuyu	192,9			
	Atıksu	189,7			
TOPLAM					**9.946,3**
	İçmesuyu				**8.547,2**
	Yağmursuyu				**355,4**
	Atıksu				**1.043,7**

Ay Bazında Onaylanan Proje Metrajları (km)

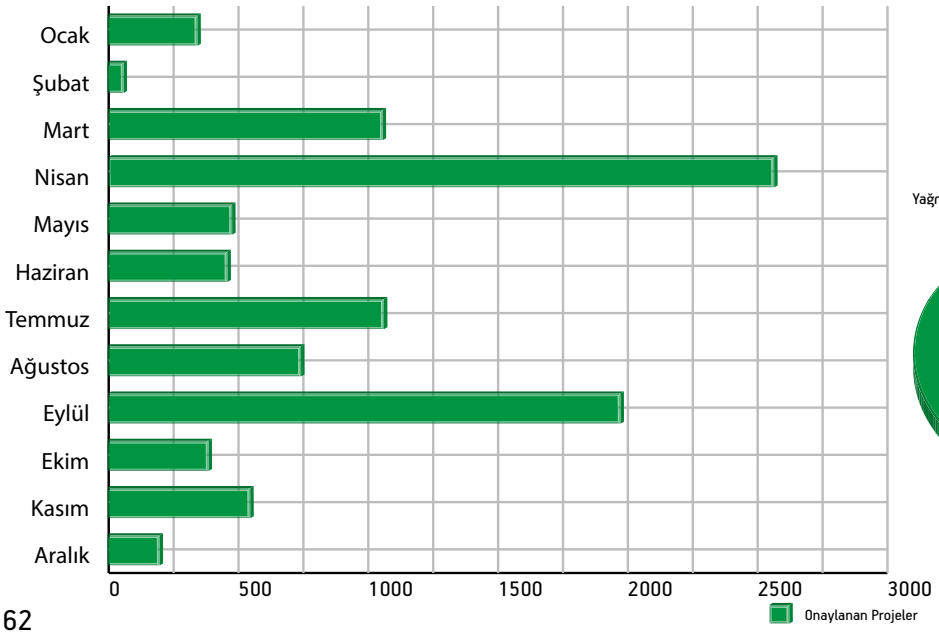

Onaylanan Projelerin Dağılımı

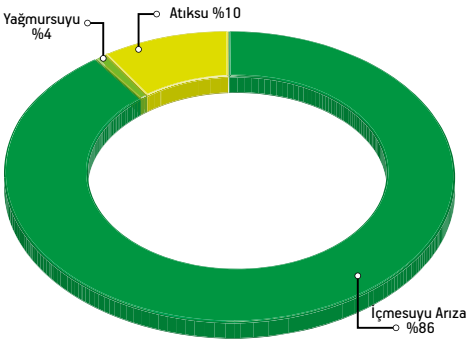

Avan Proje Metrajları (Km)

İlçeler		Km	İlçeler		Km
Osmangazi		21,1	İnegöl		1.875,6
	İçmesuyu	-		İçmesuyu	1.875,0
	Yağmursuyu	0,5		Yağmursuyu	0,6
	Atıksu	20,6		Atıksu	-
Yıldırım		2,5	Karacabey		510,9
	İçmesuyu	-		İçmesuyu	510,9
	Yağmursuyu	0,7		Yağmursuyu	-
	Atıksu	1,8		Atıksu	-
Nilüfer		7,4	Büyükorhan		-
	İçmesuyu	-		İçmesuyu	-
	Yağmursuyu	0,2		Yağmursuyu	-
	Atıksu	7,2		Atıksu	-
Mudanya		7,3	Yenişehir		368,3
	İçmesuyu	-		İçmesuyu	368,3
	Yağmursuyu	1,1		Yağmursuyu	-
	Atıksu	6,2		Atıksu	-
Kestel		3,4	M.Kemalpaşa		839,3
	İçmesuyu	-		İçmesuyu	839,3
	Yağmursuyu	0,9		Yağmursuyu	-
	Atıksu	2,5		Atıksu	-
Gürsu		-	Orhaneli		-
	İçmesuyu	-		İçmesuyu	-
	Yağmursuyu	-		Yağmursuyu	-
	Atıksu	-		Atıksu	-
Gemlik		-	Keles		-
	İçmesuyu	-		İçmesuyu	-
	Yağmursuyu	-		Yağmursuyu	-
	Atıksu	-		Atıksu	-
İznik		-	Harmancık		-
	İçmesuyu	-		İçmesuyu	-
	Yağmursuyu	-		Yağmursuyu	-
	Atıksu	-		Atıksu	-
Orhangazi		-			
	İçmesuyu	-			
	Yağmursuyu	-			
	Atıksu	-			
Toplam					**3.635,7**
	İçmesuyu				**3.593,5**
	Yağmursuyu				**4,0**
	Atıksu				**38,2**

Ay Bazında Avan Proje Metrajları (Km)

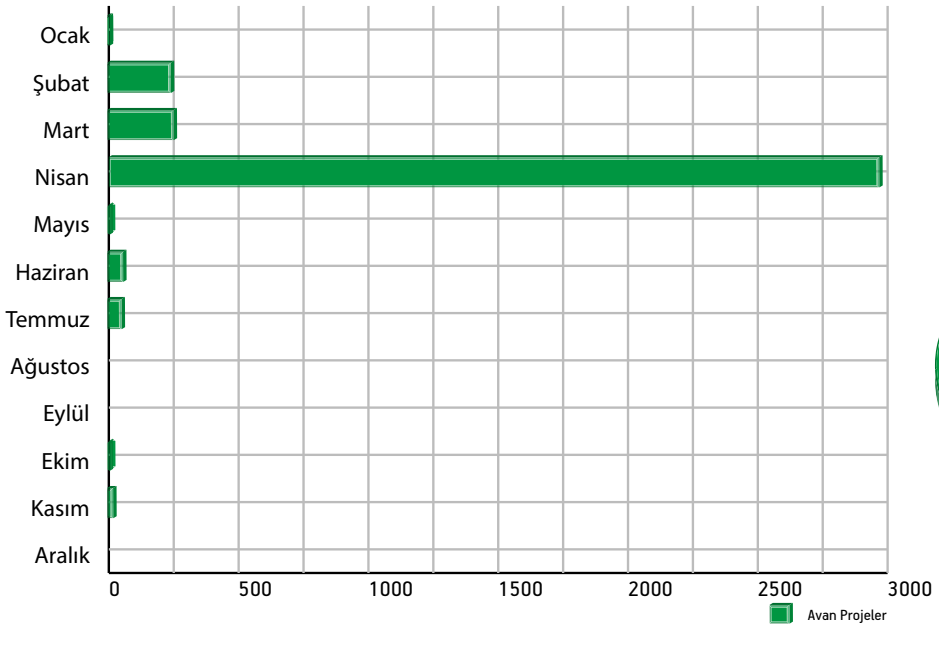

Avan Projelerin Dağılımı

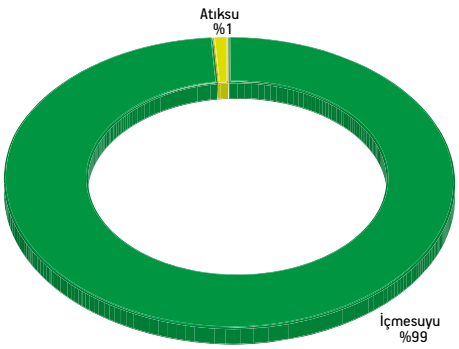

j. Tarımsal Sulamaya Yönelik Gölet ve Sulama Hizmetleri

İlçe Bazında Gölet ve Sulama Tesisleri (Adet ve Alanları)

İlçeler	Gölet		Sulama Havuzu		Sulama Tesisi		
	Adet	Sulama Alanı (dekar)	Adet	Sulama Alanı (dekar)	Adet	İsale Hat Uzunluğu (metre)	Sulama Alanı (dekar)
Gemlik	-	-	6	300	-	-	-
Harmancık	-	-	1	50	-	-	-
İnegöl	-	-	-	-	2	16.234	410
İznik	1	130	-	-	2	12.823	120
Keles	-	-	1	50	-	-	-
Kestel	1	250	1	50	-	-	-
Mudanya	-	-	1	50	1	10.325	2.500
Orhaneli	1	400	1	50	2	4.322	250
Osmangazi	-	-	2	100	2	16.601	600
Yenişehir	1	1.500	-	-	2	5.346	460
Toplam	**4**	**2.280**	**13**	**650**	**11**	**65.651**	**4.340**

İlçe Bazında Gölet Dağılımı

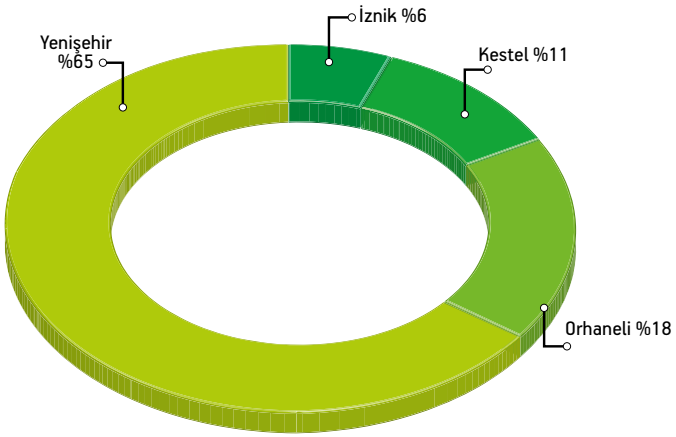

İlçe Bazında Sulama Tesisi Dağılımı

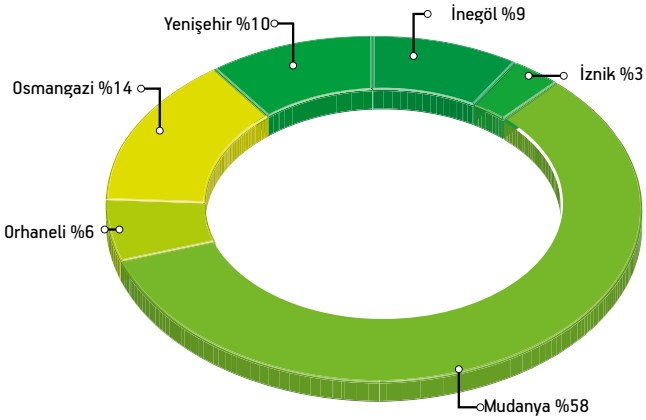

İlçe Bazında Sulama Havuzu Dağılımı

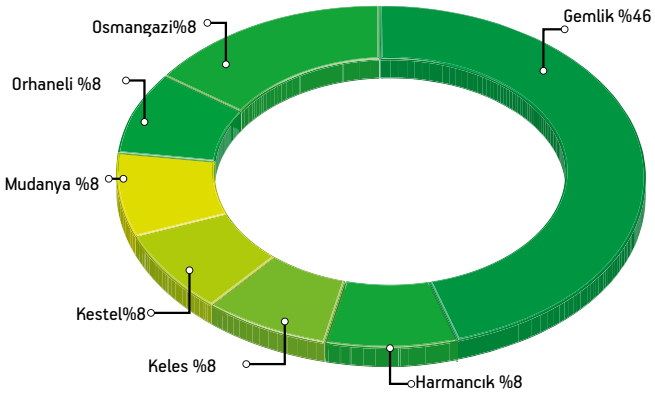

k. Doğal Kaynak Suyu Hizmetleri

29 adet 104,70 lt/sn debide su kaynağı,25.769.640,76 TL bedel karşılığında kiralanmıştır. 29 adet kiralama dosyası için 2016 yılı içinde tahakkuk edilen tutar 27.156.865,73 TL. dir. 2016 yılında 17 adet ticari su kaynağı kiralama başvurusunda bulunmuş olup bunlardan 14 adedi süresi sona erip yeniden talepte bulunan dosyalar, 9 adedi yeni kaynak kiralama başvurusu dosyalarıdır.





Kaynak Suyu

l. Scada (Supervisory Control and Data Acquisition)

Scada Veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemidir.

Scada sistemi ile bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, Çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlanabilmektedir. Yeni eklenecek olan uzak istasyonların saha ekipmanlarının testleri, donanımsal ve yazılımsal yapılarının kontrolleri ve HMI ekranlarında görüntülenecek olan istasyon tasarımları Test Panoları üzerinde BUSKİ Scada personeli tarafından yapıldıktan sonra Saha ortamına entegre edilmektedir.

Scada Kapsamında İşletilen İstasyonlar

İstasyon	Toplam (adet)
Depolar	6
Pompalar	1
Altbölge Deb.	6
Dağınık Deb.	0
Kontrol Deb.	4
Şebeke Vanaları	0
Su Art. Tes. Arayüzü	3
Baraj	1
TOPLAM	**21**



Scada

m. Güneş Enerjisi Sistemi (GES)

	Toplam (KWH)
Batı Atık Su Arıtma Tesisi (130 kWp)	190.189,00
D46 Görükle (200 kWp)	308.389,25
GENEL TOPLAM	498.578,25

n. HES

		Toplam (KWH)
D0 Deposu	(500 kWp)	843.814,52
D13 Deposu	(1200 kWp)	255.183,39
TOPLAM		1.098.997,91



Fethiye Spor Tesisi



Atıcılar 2 Spor Tesisi



Vatan Spor Tesisi



Şahinbaşol Spor Tesisi

o. Dış Kredi Finansman İşlemleri

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi (AYB - 1)

İçme suyu, yağmur suyu ve atık su yatırımları ile bu yatırımlar için kullanılan malzemelerin temini için 1993 - 2001 arasında Dünya Bankası' ndanBursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi" kapsamında alınan kredi ile yapılan yatırımların devamı niteliğinde, 05.12.2000 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 2006 yılında kullanımı tamamlanan 80.000.000,00 Avro tutarında AYB' den kredi alınmıştır. Bahsi geçen kredinin geri ödemesi 30 Kasım 2018 tarihinde tamamlanacaktır.

	31.12.2016' ya Kadar (€)	31.12.2016 Sonrası (€)	Genel Toplam (€)
Ödenecek	-	14.671.564.40	14.671.564.40
Ödenen	76.999.250.60	-	76.999.250.60
Toplam	**76.999.250.60**	**14.671.564.40**	**91.670.815,00**

Alman Kalkınma Bankası Kredisi (KFW)

"Bursa Kanalizasyon III. Merhale Projesi" kapsamında aşağıdaki tabloda detayları verilen Atık Su Arıtma Tesisleri'nin (A.A.T.) finansmanında kullanılmak üzere toplam 30 milyon Avro KFW kredisi alınmak üzere 28.05.2010 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ve Hazine Müsteşarlığı arasında ikraz anlaşması ve aynı tarihte KFW ile kredi anlaşması imzalanmıştır. Kredinin kullanımı Aralık 2011' de başlamış olup, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacaktır.

İŞİN ADI	İşin Durumu	Sözleşme Tutarı (Keşif Artışları Dahil €)	Gerçekleşme Tutarı (€)
İş Paketi 1 Gemlik, Mudanya, Kurşunlu A.A.T	Söz. Tar. 14.04.2016	16.576.676,08	1.719.390,43
İş Paketi 2 K.Kumla, Akçalar, Nilüfer, (Badırga) A.A.T	Söz. Tar. 12.04.2016	14.785.474,84	1.724.483,56
İş Paketi 3 K.Kumla,Kurşunlu D.D.D	Planlama Aşamasında	-	-
Bursa Atıksu Projesi III.Merhale Detaylı Tasarım ve İhale için Müş.Hiz.Proje Yürütücü Kur.İhale ve Sözleşme Yapılması ve Kontrollük Konularında Destek için Müşavirlik İşi (KMH-2010/1K)	Söz. Tar. 14.12.2011	3.869.952,14	2.414.971,60

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi (AYB - 2)

"Bursa Kanalizasyon III. Merhale Projesi" kapsamında muhtelif kanalizasyon ve içme suyu projeleri ile bu projelerde kullanılacak malzemelerin finanse edilmesi amacıyla toplam 50 milyon Avro tutarında AYB kredisi alınmıştır. 25.11.2010 tarihinde imzalanan Garanti Protokolü ve Kredi Sözleşmesi gereği ilk dilimin kullanımı 2012 yılında başlamıştır. 2015 yılında 2. ve 3. dilimin talebi yapılmıştır. 24.02.2036 tarihinde kredi geri ödemesi tamamlanacaktır.

	31.12.2016' ya Kadar (€)	31.12.2016 Sonrası (€)	Genel Toplam (€)
Ödenecek	-	59.806.207,51	59.806.207,51
Ödenen	2.243.450,00	-	2.243.450,00
Toplam	**2.243.450,00**	**59.806.207,51**	**62.049.657,51**

AYB Kredisi Kapsamındaki Yatırımlar

İŞİN ADI	FİRMA ADI	İŞİN DURUMU	SÖZLEŞME TUTARI (Keşif Artışlı)	GERÇEKLEŞME TUTARI (TL)
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Uygulamaları				
A3.3.2 Barakfakih ve P. Kanal. ve Y.Suyu Kollek. Y.İşi	Tekno Kanal-Yuner İş Ort.	Söz. Tar. 20.11.2013	51.497.708,99 TL	49.706.614,77 TL
A3.2 Gemlik Körfezi Y.Suyu Kollek. Y. İşi	Altınbaş-Mufa-Kanık İş Ort.	Söz. Tar.25.07.2014	78.078.105,05 TL	57.753.784,80 TL
A3.3.1 Samanlı Kollek. Y. İşi	Gintaş-Zitaş İş Ort.	Söz. Tar. 15.08.2011	14.233.834,85 TL	14.233.834,85 TL
A3.4.1 Batı Nilüfer Y.Suyu Kollek. Y. İşi	Güven-Binaş-Yuner İş Ort.	Söz. Tar. 16.01.2015	58.675.819,98 TL	30.155.538,16 TL
A3.4.2 Hasanağa Ovaakça Kollek. Yapım İşi	Ohitan-Nyn İş Ort.	Söz. Tar. 13.04.2015	78.085.011,97 TL	16.940.661,18 TL
Müşavirlik Hizmetleri				
Mali Kayıtların Denetimi	Güney Bağımsız Denetim .A.Ş.	Söz. Tar. 12.07.2011	126.000,00 €	72.000,00 €
Bursa Atıksu Projesi II için Teknik Destek Hizmetleri (KMH-2011/A)	Ar-Tem İş Ort.	Söz. Tar. 03.05.2012	11.424.112,37 TL	10.599.557,68 TL



ö. Diğer Hizmetler

Kurum İçi Denetim

İç Denetim Birimi'nce; İç Denetim Programı çerçevesinde ticari amaçlı kaynak suları kiralama denetimi işlemleri, banka işlemleri denetimi zamanında tamamlanmıştır. İç denetçi sayısı üçten az olan kamu idarelerinde 2016 yılında kamu iç denetim otomasyon programına geçileceği Kamu İç denetim Strateji Belgesinde beyan edildiğinden, bu programa temel alt yapı oluşturabilmek amacıyla abonelik işlemleri ve taşıt yönetimi kiralama işlemlerinin denetimi iptal edilmiştir.

2016 yılı iç denetim programı dışında Genel Müdürlük makamının 26.05.2015 tarih ve 19639 Sayılı emirleri üzerine Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın organizasyon yapısı gözden geçirilerek yasal mevzuata uygun yapılandırılması konusunda görüş ve önerilerin bir rapor haline getirilmesi talep edilmiş ve bu talep danışmanlık raporu ile karşılanmıştır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca 2016 yılında 16 adet inceleme raporu, 7 adet soruşturma raporu, 3 adet cevaplı teftiş raporu ve 10 adet Valilik Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Hukuk İşlemleri

1 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında; 5.454 adet evrak gelmiş , 1.643 adet evrak çıkışı yapılmıştır.

1 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında; 228 adet kurumumuzca 3.849 adet kurumumuzca, özel avukatlarınca olmak üzere toplam 4.077 ilamsız takip yapılmış ve 104 adet dava neticelendirilip işlemden kaldırılmıştır.

İcra takiplerinden 8.546.054.30 TL tahsilat yapılmıştır.

Sağlık Hizmetleri

2016 yılı içerisinde 1.982 kişinin hasta kaydı yapılmış, muayenesi sonucu reçete verilmiştir. Gereken hastaların enjeksiyon, pansuman, kulak lavajı, tansiyon takipleri yapılmıştır.

Eğitim Faaliyetleri

2016 yılında 3.995 kişiye kurum içi, 821 kişiye de kurum dışı eğitim verilmiştir.

Muhtelif meslek liselerinden 51 öğrenciye bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla haftanın 3 günü ücretli, 2016 yılı yaz döneminde de 144 üniversite ve 23 meslek lisesi öğrencisine 20-30 iş günü staj yapması sağlanmıştır.

Kesin Hesap İşlemleri

Kesin Hesap Şube Müdürlüğü'nce 2016 yılında 52 adet kesin hesap, 1089 adet hakediş ve 493 adet yeni fiyat analizi incelemesi yapılmıştır.

C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Kurumda 2014 yılı Haziran ayından itibaren Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumun sağlanması amacıyla iç kontrol sistemi oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. İlk olarak Genel Müdürümüz başkanlığında kurumda, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Tüm birimlerden birim müdürleri ve diğer personelden olmak üzere İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Hazırlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 31/12/2014 tarih ve 45953 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile yürürlüğe konulmuştur.

2015 yılında; İç Kontrol Eylem Planıyla planlanan eylemlerin uygulanması çalışmaları yürütülmüştür. İç Kontrol Standartları Risk Değerlendirme Bileşeni kapsamında kurumumuzun risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla bütün birimlerde Risk Koordinatörleri, Birim Risk Sorumluları ve Alt Birim Risk Sorumluları belirlenerek, risk yönetim ekipleri oluşturulmuştur. Ayrıca birimlerin oluşturacağı risk eylem planlarının değerlendirilmesi, kurumun risk strateji ve politikalarının belirlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla kurumda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı'nın başkanlığında, tüm birim yöneticilerinin üyesi olduğu Risk Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

2015 yılında uygulaması yapılan eylem planı, izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında, 2016 yılı başında İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak üst yöneticiye sunulmuştur. Bu raporda eylem planının revize edilmesi öngörülmüş ve 2016 yılında yeni İç kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanarak 09/06/2016 tarih 21640 sayılı Genel Müdürlük oluru ile uygulanmaya başlanmıştır. Plan 2017 yılında uygulanmaya devam edilecektir.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaç-1 :	**Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.**
A1 H1:	Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 200 km. pınar kaynağı ıslahının, 2019 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.
A1 H2:	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisi yapmak.
A1 H3:	2019 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarında bulunan yerleşim alanlarındaki atıksuların arıtılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak.
A1 H4:	Kuraklık ve ihtiyaç artışı nedeniyle 2019 yılı sonuna kadar toplam 100 adet sondaj kuyusu açmak.
A1 H5:	İçmesuyu kalitesini 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.
A1 H6 :	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut 213 adet kuyuyu aktif halde tutmak.
A1 H7:	Her yıl 120 adet köye dezenfeksiyon sistemini kurmak veya iyileştirmek.
Amaç-2 :	**Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.**
A2 H1:	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale getirmek ve iyileştirmek.
A2 H2:	4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını 2019 yılı sonuna kadar %31'e düşürmek.
A2 H3:	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde %23 kaçak su oranını 2019 yılı sonuna kadar %20'ye düşürmek .
A2 H4:	2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 208 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.
Amaç-3 :	**Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.**
A3 H1:	2019 yılı sonuna kadar 2.000 km şebeke inşaatı yapmak.
A3 H2:	2019 yılı sonuna kadar 500 km isale hattı inşaatı yapmak.
A3 H3:	2019 yılı sonuna kadar 175 adet depo inşaatı yapmak.
A3 H4:	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 5.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.
A3 H5:	İçme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini 2019 yılı sonuna kadar ortalama 30 saate düşürmek.
A3 H6:	2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.
A3 H7:	2019 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.
A3 H8:	Otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaları çalışır halde tutmak.
A3 H9:	2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve depoyu otomatik çalışır hale getirmek.
A3 H10:	2015 yılı sonuna kadar 320.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların tamamını değiştirmek, sonraki yıllarda da her yıl, bir önceki yıl sonu itibariyle, 10 yılını doldurmuş sayaçların tamamını değiştirmek.
A3 H11:	Abonelik müracatından itibaren keşif işlemlerini 2017 itibariyle 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.
A3 H12:	2014 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının 2019 yılı sonuna kadar %80'ini tahsil etmek.
A3 H13:	Dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %80'den %90'a çıkarmak.
A3 H14:	2015 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımını yapmak.

A3 H15:	2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisi faal halde tutmak.
A3 H16:	2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisi scada sistemine almak.
A3 H17:	2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatını tamamlamak.
A3 H18:	Her yıl sonunda bir sonraki yıl için yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve içmesuyu paket arıtmaların bakım ve onarımlarını yapmak.
A3 H19:	2019 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının katodik korumasını yapmak.
Amaç-4 :	**Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.**
A4 H1:	Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 2019 yılı sonuna kadar 5.000 km'sini hazırlamak.
A4 H2:	2015-2019 yılları arasında 525 Km yağmursuyu hattı döşemek.
A4 H3:	2015-2019 yılları arasında sel taşkınlarını önlemek için derelerin 19 km'sini ıslah etmek.
A4 H4:	2015-2019 yılları arasında 1.000 km kanalizasyon hattı döşemek.
A4 H5:	2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisi yapmak.
A4 H6:	2015 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu online izleme sistemi kurmak ve izleyebilir hale gelmek.
A4 H7:	2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.
A4 H8:	AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.
Amaç-5 :	**Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.**
A5 H1:	İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini sağlamak.
A5 H2:	Plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını karşılamak.
A5 H3:	Plan dönemi içerisinde her yıl lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini gerçekleştirmek.
A5 H4:	Bilgisayar teknolojisini ve altyapısını her yıl %20 geliştirmek.
A5 H5:	Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısını fiber hatlara taşımak.
A5 H6:	Her yıl 4 daire başkanlığının teftişini yapmak.
A5 H7:	2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 6400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.
A5 H8:	Satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda sistem kurmak.
A5 H9:	Yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesini 2017 yılına kadar tamamlamak ve 2018 yılı içinde projenin tümünün Buski'de kullanılmasını ve programlara uyarlanmasını sağlamak.
A5 H10:	Kurumu tanıtmak, su bilinci ve kültürü düzeyini arttırmak.
A5 H11:	Yıllık ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.
A5 H12:	Kurumda istatistik ve raporlama sistemini 2016 sonuna kadar kurmak.
A5 H13:	Sağlık hizmetlerine müraacaat eden tüm talepleri gün içerisinde karşılamak.
A5 H14:	Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.
A5 H15:	Kurumda iç kontrol sistemini 2015 sonuna kadar kurmak ve uygulanmasını sağlamak.

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

*** Kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi,**

İyi yönetişim; bütün vatandaşların gerekli bilgiye kolayca ulaşabildiği saydam yönetimi, katılımcılığı, hesap verebilir ve sorumlu biçimde yönlendiren etkin süreç ve yapıları içermektedir.

Yönetim, hukuk kuralları içinde kalarak, objektif bilgiye dayalı karar vermekte ,hukuk yolu ile denetlenmektedir.

Kurumsal gelişim; kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı, bütçelendiği ve raporlandığı konularında sorumlu ve gerektiğinde hesap verebilir bir yönetim anlayışı, serbest bilgi akışının sağlanması ile mümkün olabilmektedir.

*** Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,**

Doğal kaynaklarımızın korunması, atık miktarlarında azalma ve ekonomiye katkı sağlanması, kentimizde yaşayanlara su ve temiz çevre kültürü kazandırılması ile mümkün olacaktır. Su kültürünün ve su tasarrufu bilincinin oluşturulması hedeflerimizdir.

*** Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda altyapı (içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması,**

Kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan yeni yerleşim birimlerinde planlı altyapı hizmeti sunulmakta ve eski yerleşim yerlerinde ise altyapıların rehabilitasyonun sağlanmasına yönelik yenileme projelerine ağırlık verilmektedir.

*** Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,**

Su kaynakları ve çevre ile ilgili konuların, kamuoyu ve hemşerilerimizin gündeminde daha çok yer bulması sağlanmakta ve kent sakinlerinin çevre bilincini artıracak etkinlik ve faaliyetlere öncülük yapılmakta ve destek sağlanmaktadır. Her türlü kirliliği oluşmadan önlemek, tüm kirletici parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek.

*** Bilgi teknolojileri takip edilmesi ve kullanımının sağlanması.**

E-Buski uygulaması, hizmetlere erişmede etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Bilgi teknolojilerinin kullanımının sağlanması ile esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetişim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

B. Performans Bilgileri

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2016 - 31.12.2016 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİ				2015	2016
830	1	0	Personel Giderleri	63.340.572,74	68.757.500,76
830	1	1	Memurlar	25.573.188,50	29.832.147,12
830	1	2	Sözleşmeli Personel	394.375,73	544.927,51
830	1	3	İşçiler	37.268.951,13	38.209.113,78
830	1	4	Geçici Personel	104.057,38	171.312,35
830	2	0	Sosyal Güvenlik Kurumlarina Devlet Primi Giderleri	10.476.005,28	10.147.885,39
830	2	1	Memurlar	3.880.218,09	4.581.893,33
830	2	2	Sözleşmeli Personel	65.099,64	89.733,08
830	2	3	İşçiler	6.530.687,55	5.476.258,98
830	3	0	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	216.780.442,44	263.561.378,65
830	3	1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.740.235,47	1.072.979,19
830	3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	41.228.738,13	45.883.712,93
830	3	3	Yolluklar	390.475,21	424.365,91
830	3	4	Görev Giderleri	9.374.237,29	6.361.046,92
830	3	5	Hizmet Alımları	157.596.901,21	201.224.691,26
830	3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	958.002,09	822.497,24
830	3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	5.207.007,61	7.663.656,22
830	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	284.845,43	107.725,52
830	3	9	Diger Tedavi ve Saglik Malzemesi Giderleri	0,00	703,46
830	4	0	Faiz Giderleri	4.458.622,81	27.728.508,86
830	4	2	Diger İç Borç Faiz Giderleri	1.699.492,98	22.825.624,79
830	4	3	Dış Borç Faiz Giderleri	2.759.129,83	4.902.884,07
830	5	0	Cari Transferler	5.474.926,54	6.555.536,91
830	5	1	Görev Zararları	1.205.046,44	1.387.086,82
830	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	67.887,36	74.676,10
830	5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	4.201.992,74	5.093.773,99
830	6	0	Sermaye Giderleri	548.688.709,15	737.825.516,14
830	6	1	Mamul Mal Alımları	36.288.238,58	41.038.848,42
830	6	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	4.071,00	0,00
830	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	5.041.961,06	6.648.180,79
830	6	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulastırması	6.703.531,33	12.313.065,82
830	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	488.501.273,46	666.886.445,52
830	6	6	Menkul Mallarin Büyük Onarım Giderleri	1.196.949,46	2.714.390,14
830	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	10.952.684,26	8.224.585,45
830	7	0	Sermaye Transferleri	2.000.000,00	5.680.000,00
830	7	1	Sermaye Transferleri	2.000.000,00	5.680.000,00
BÜTÇE GİDERLER TOPLAMI				851.219.278,96	1.120.256.326,71

BÜTÇE GELİRLERİ				2015	2016
800	3	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	524.486.267,37	641.311.827,56
800	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	506.007.819,33	616.968.928,00
800	3	6	Kira Gelirleri	18.478.448,04	24.342.899,56
800	4	0	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.406.972,50	3.914.908,60
800	4	2	M. Yönet. Büt.e Dahil İdar. Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	3.593.927,06
800	4	5	Proje Yardımları	3.406.972,50	320.981,54
800	5	0	Diğer Gelirler	99.844.154,40	107.337.719,96
800	5	1	Faiz Gelirleri	8.649.440,51	11.288.895,80
800	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	81.746.181,16	92.212.128,90
800	5	3	Para Cezalari	0,00	18.378,22
800	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	9.448.532,73	3.818.317,04
800	6	0	Sermaye Gelirleri	36.173,10	40.381,50
800	6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	36.173,10	40.381,50
BÜTÇE GELİRLER TOPLAMI				627.773.567,37	752.604.837,62

RED VE İADELER				2015	2016
810	3	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	551.697,80	1.467.298,98
810	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	547.353,35	1.396.495,53
810	3	6	Kira Gelirleri	4.344,45	70.803,45
810	5	0	Diğer Gelirler	128.458,19	248.331,46
810	5	1	Faiz Gelirleri	6.995,48	219.988,33
810	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	121.412,70	28.343,13
810	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	50,01	0,00
RED VE İADELER TOPLAMI				680.155,99	1.715.630,44
NET BÜTÇE GELİRİ				627.093.411,38	750.889.207,18
BÜTÇE GELİR GİDER FARKI				-224.125.867,58	-369.367.119,53

A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (Varlıklar)			
	2014	2015	2016
1-0-0 DÖNEN VARLIKLAR	247.316.599,34	348.822.809,30	478.679.382,28
1-10-0 Hazır Degerler	21.124.676,89	30.604.908,25	28.632.139,89.
1-10-102 Banka Hesabı	8.297.851,33	9.225.568,31	17.532.033,02
1-10-104 Proje Özel Hesabı	1.987.903,11	5.539.790,06	2.452.063,96
1-10-105 Döviz Hesabı	2.579.207,99	3.380.612,72	209.872,56
1-10-108 Diğer Hazır Değerler Hesabı	1.936.837,52	2.363.074,82	1.995.947,35
1-10-109 Banka Krd. Kartla. Alaca.	6.322.876,94	10.095.862,34	6.442.223,00
1-11-0 Menkul Kıymet Ve Varlıklar	6.620.000,00	3.670.000,00	0,00
1-11-118 Diğ. Menkul Kıymet Ve Varl.	6.620.000,00	3.670.000,00	0,00
1-12-0 Faaliyet Alacakları	139.265.475,06	189.810.563,14	264.318.531,31
1-12-120 Gelirlerden Alacaklar H.	114.284.154,34	135.912.882,54	93.331.253,76
1-12-121 Gelir. Takipli Alacaklar H.	0,00	0,00	46.208.128,34
1-12-122 Gelir. Tecilli ve Tehirli	0,00	0,00	22.474.934,22
1-12-126 Verilen Depozito Ve Tem.	24.981.320,72	53.897.680,60	102.175.764,44
1-12-127 DiğerFaaliyet Alcakları H.	0,00	0,00	128.450,55
1-13-0 Kurum Alacakları	0,00	0,00	7.000.000,00
1-13-132 Kurumca Verilen Borçlar H.	0,00	0,00	7.000.000,00
1-14-0 Diğer Alacaklar	1.122.226,60	278.013,92	456.382,40
1-14-140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.122.226,60	278.013,92	456.382,40.
1-15-0 Stoklar	37.120.090,97	54.922.995,98	56.333.951,77
1-15-150 İlk Madde Ve Malz H.	37.120.090,97	54.922.995,98	56.333.951,77
1-16-0 Ön Ödemeler	1.400.952,34	1.489.797,97	1.391.139,10.
1-16-160 İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00	191.818,04	0,00
1-16-162 Bütçe Dışı Avans Ve Kred. H.	1.382.452,34	1.297.979,93	1.391.139,10
1-16-162 Bütçe Dışı Avans Ve Kredi H.	18.500,00	0,00	0,00
1-16-165 Mahsup Dön. Akt. Avan.	40.663.177,48	68.046.530,04	0,00

PASİF (Kaynaklar)			
	2014	2015	2016
3-0-0...KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR	229.068.920,90	380.758.599,22	483.110.538,81
3-30-0 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00	26.162.561,41	80.668.645,67
3-30-300 Banka Kredileri Hesabı	0,00	25.985.207,73	73.267.445,67
3-30-303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	177.353,68	7.401.200,00
3-31-0 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	19.547.754,08	22.354.405,92	26.410.442,08
3-31-310 Cari Yılda Ödenecek Dış Mali B.	19.547.754,08	22.354.405,92	26.410.442,08
3-32-0 Faaliyet Borçları	36.176.030,68	115.181.537,58	67.105.008,36
3-32-320 Bütçe Emanetleri Hesabı	36.176.030,68	115.181.537,58	67.105.008,36
3-33-0 Emanet Yabancı Kaynaklar	137.530.417,88	172.602.792,87	238.666.452,78
3-33-330 Alınan Depozito Ve Teminatlar	68.657.082,09	76.125.984,49	91.313.199,83
3-33-333 Emanetler Hesabı	68.873.335,79	96.476.808,38	147.353.252,95
3-36-0 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	13.752.295,87	16.538.309,16	23.171.403,82
3-36-360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	3.939.376,20	4.767.737,82	6.552.443,47
3-36-361 Ödenecek Sosyal Güvenlik K.	961.037,47	1.391.037,10	1.062.021,81
3-36-362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdarele.	8.532.581,35	9.983.716,24	15.131.511,36
3-36-363 Kamu İdareleri Payları Hesabı	319.300,85	395.818,00	425.427,18
3-37-0 Borç Ve Gider Karşılıkları	19.803.836,18	15.110.983,55	6.119.354,74
3-37-372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hes.	15.267.808,75	12.031.325,00	517.524,93
3-37-379 Diğer Borç Ve Gider Karşılık.	4.536.027,43	3.079.658,55	5.601.829,81
3-38-0 Gelecek Aylara Ait Gelir.	2.258.586,21	12.808.008,73	40.969.231,36
3-38-381 Gider Tahakkukları Hesabı	2.258.586,21	12.808.008,73	40.969.231,36
4-0-0 UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR	408.611.444,98	581.075.555,14	1.042.020.764,41
4-40-0 Uzun Vadeli İç Mali Borç.	83.377.058,67	160.339.723,99	462.473.241,24
4-40-400 Banka Kredileri Hesabı	80.903.880,40	127.199.797,68	401.786.556,99
4-40-403 Kamu İdar.e Mali Borç.	2.473.178,27	33.139.926,31	60.686.684,25
4-41-0 Uzun Vadeli Dış Mali Borç.	87.638.290,24	141.307.960,32	211.872.672,16

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (Varlıklar)			
	2014	2015	2016
1-19-0 Diğer Dönen Varlıklar	40.663.177,48	68.046.530,04	120.547.237,81
1-19-190 Devreden Katma Değer Vergisi H.	0,00	0,00	120.547.237,81
2-0-0 DURAN VARLIKLAR	1.585.216.622,08	1.917.668.682,85	2.548.028.510,26
2-22-0 Faaliyet Alacakları	0,00	0,00	12.240,00
2-22-227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI H.	0,00	0,00	12.240,00
2-23-0 KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	254.269.587,29
2-23-239 DİĞER KURUM ALACAKLARI H.	0,00	0,00	254.269.587,29
2-24-0 Mali Duran Varlıklar	5.027.805,01	12.206.609,00	17.886.609,00
2-24-240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Ser.	5.027.805,01	12.206.609,00	8.528.667,40
2-24-241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURUL.	0,00	0,00	9.357.941,60
2-25-0 Maddi Duran Varlıklar	1.578.272.950,94	1.905.462.073,85	2.275.860.073,97
2-25-250 Arazi Ve Arsalar Hesabı	99.485.462,52	105.958.902,02	118.083.900,03
2-25-251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri H.	1.365.263.913,35	1.443.320.251,48	1.583.144.227,25
2-25-252 Binalar Hesabı	39.037.120,76	41.657.763,70	49.285.601,11
2-25-253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hes.	170.394.936,80	252.535.519,36	267.464.295,54
2-25-254 Taşıtlar Hesabı	11.464.785,90	21.237.405,29	31.981.644,54
2-25-255 Demirbaşlar Hesabı	10.682.048,45	11.651.998,79	13.779.667,18
2-25-257 Birikmış Amortismanlar Hesabı	-439.975.804,09	-495.458.757,88	-550.187.270,25
2-25-258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hes.	318.895.487,25	515.886.441,09	744.793.985,03
2-25-259 Yatırım Avansları Hesabı	3.025.000,00	8.672.550,00	17.514.023,54
2-26-0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.915.866,13	0,00	0,00
2-26-260 Haklar Hesabı	18.972.973,98	44.821.758,12	70.723.814,60
2-26-268 Birikmış Amortismanlar Hesabı	-17.057.107,85	-44.821.758,12	-70.723.814,60
AKTİF TOPLAMI	**1.832.533.221,42**	**2.266.491.492,15**	**3.026.707.892,54**

PASİF (Kaynaklar)			
	2014	2015	2016
4-41-410 Dış Mali Borçlar Hesabı	87.638.290,24	141.307.960,32	211.872.672,16
4-43-0 DIGER BORÇLAR	0,00	0,00	4.697.512,25
4-43-430 ALIN. DEP. VE TEMİNAT.	0,00	0,00	4.697.512,25
4-47-0 Borç Ve Gider Karşılıkları	222.393.987,17	226.861.575,42	221.156.447,14
4-47-472 Kıdem Taz. Karş. Hes.	43.408.400,49	46.502.896,77	46.502.896,77
4-47-479 Diğer Borç Ve Gider Karşılık.	178.985.586,68	180.358.678,65	174.653.550,37
4-48-0 Gelecek Yillara Ait Gelir. V.	15.202.108,90	52.566.295,41	141.820.891,62
4-48-481 Gider Tahakk.Hesabı	15.202.108,90	52.566.295,41	141.820.891,62
5-0-0 ÖZ KAYNAKLAR	1.194.852.855,54	1.304.657.337,79	1.501.576.589,32
5-50-0 Net Değer	294.208.746,85	405.340.724,08	782.172.036,57
5-50-0 Net Değer	294.208.746,85	405.340.724,08	0,00
5-50-500 Net Değer Hesab	379.046.087,93	378.585.771,26	782.172.036,57
5-52-0 Yeniden Değerleme Farkları	379.046.087,93	378.585.771,26	0,00
5-52-522 Yeniden Değerleme Farkları H.	406.287.630,71	416.326.374,97	0,00
5-57-0 Geçmis Yıllar Olumlu Faaliyet.	406.287.630,71	416.326.374,97	520.730.842,45
5-57-570 Geç. Yıllar Olumlu F.	115.310.390,05	104.404.467,48	520.730.842,45
5-59-0 Dönem Faaliyet Sonuçları	115.310.390,05	104.404.467,48	198.673.710,30
5-59-590 DÖNEM OLUM. F. SON.	115.310.390,05	104.404.467,48	198.673.710,30
PASİF TOPLAMI	**1.832.533.221,42**	**2.266.491.492,15**	**3.026.707.892,54**

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2016 - 31.12.2016 FALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GİDERLER				2014	2015	2016
630	1	0	Personel Giderleri	67.631.613,66	59.317.005,08	57.693.323,83
630	1	1	Memurlar	22.068.862,16	25.573.185,50	30.161.491,65
630	1	2	Sözleşmeli Personel	246.563,67	394.375,73	544.927,51
630	1	3	İşçiler	45.223.805,79	33.245.386,47	26.815.592,32
630	1	4	Geçici Personel	92.382,04	104.057,38	171.312,35
630	2	0	Sos. Güv. Kur. Devlet P. Gi.	9.764.969,62	10.476.005,28	10.147.885,39
630	2	1	Memurlar	3.318.341,38	3.879.790,14	4.581.648,20
630	2	2	Sözleşmeli Personel	46.638,19	65.463,94	90.073,72
630	2	3	İşçiler	6.399.990,05	6.530.751,20	5.476.163,47
630	3	0	Mal Ve Hizmet Alım Gid.	217.473.711,79	208.666.807,36	375.074.502,85
630	3	1	Üret. Yön. Mal Ve Mal. Al.	94.916,56	44.290,30	12.604,00
630	3	2	Tük. Yön. Mal Ve Mal. Al.	24.055.892,68	27.289.042,55	28.965.237,90
630	3	3	Yolluklar	285.479,22	390.460,63	424.365,91
630	3	4	Görev Giderleri	16.464.891,75	8.858.307,20	7.016.659,55
630	3	5	Hizmet Alımları	173.561.198,04	156.818.646,80	325.272.077,83
630	3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	373.143,87	609.858,29	335.791,57
630	3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	2.448.186,52	4.098.584,01	4.881.300,71
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	190.003,15	10.557.617,58	8.166.465,38
630	4	0	Faiz Giderleri	1.206.011,85	48.277.371,90	138.212.288,62
630	4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	958.407,16	33.016.675,58	124.834.495,42
630	4	3	Dış Borç Faiz Giderleri	247.604,69	15.260.696,32	13.377.793,20
630	5	0	Cari Transferler	34.107.574,70	15.179.895,61	5.002.898,77
630	5	1	Görev Zararları	30.536.819,65	8.655.247,75	-165.551,32
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluslara Yapılan Transferler	36.489,68	67.887,36	74.676,10
630	5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	3.534.265,37	6.456.760,50	5.093.773,99
630	11	0	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	17.242.008,91	55.987.466,06	64.718.821,43
630	11	1	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kur Farkları	4.677.050,65	41.426.999,41	64.718.357,03

GELİRLER				2014	2015	2016
600	3	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	414.822.524,54	483.111.264,96	592.119.214,74
600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	406.952.974,22	464.337.533,61	559.948.032,65
600	3	6	Kira Gelirleri	7.869.550,32	18.773.731,35	32.171.182,09
600	4	0	Al. Bağış ve Yard. ile Özel Ge.	10.214.507,20	3.406.972,50	3.914.908,60
600	4	2	M. Yön. Büt. Da. İd. Al. B. ve Y.			3.593.927,06
600	4	5	Proje Yardımları	10.214.507,20	3.406.972,50	320.981,54
600	5	0	Diğer Gelirler	89.705.711,72	107.848.133,23	377.518.310,51
600	5	1	Faiz Gelirleri	5.870.962,20	8.656.851,72	11.139.696,68
600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan P.	69.439.703,56	90.137.475,33	99.400.381,40
600	5	3	Para Cezalari	1.500,00		18.378,22
600	5	9	Diğer Çesitli Gelirler	14.393.545,96	9.053.806,18	266.959.854,21
600	11	0	Değer ve Miktar Degişimleri G.	24.244.134,07	32.116.316,93	14.565.829,51
600	11	1	Dö. Mevc. D. Oluşan Ol. Kur F.	17.381.913,33	25.940.402,75	14.565.829,51
600	11	2	Kamu İda. B.siz Olarak Al. Mali olmayan Varl. Elde Ed. Gelirler			1,00
GELİRLER TOPLAMI				538.986.877,53	626.482.687,62	988.118.264,36
FALİYET SONUCU (+/-)				115.310.390,05	104.404.467,48	198.673.710,30

GİDERLER				2014	2015	2016
630	11	6	Kur Değişikligi Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Artışlar	12.564.958,26	14.560.466,65	464,40
630	12	0	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler		2.053.996,07	3.643.194,23
630	12	5	Diğer Gelirler		2.053.996,07	3.643.194,23
630	13	0	Amortisman Giderleri	56.294.258,70	85.788.777,42	91.569.957,51
630	13	1	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	51.735.921,45	85.788.777,42	65.667.901,03
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	4.558.337,25		25.902.056,48
630	14	0	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	19.956.338,25	36.330.895,36	43.168.365,43
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	1.087.955,84	1.072.228,31	1.962.074,93
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı e Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	3.842,18	12.911,83	25.110,44
630	14	3	Tıbbi ve Labaratuar Sarf Malzemeleri	260.603,25	257.534,04	349.473,01
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	3.597.629,57	6.544.695,23	7.603.155,87
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	450.688,89	694.133,94	236.205,61
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	847.696,87	325.090,92	1.175.352,95
630	14	7	Yiyecek	60.402,75	74.059,29	127.096,20
630	14	8	İçecek			535,50
630	14	10	Zirai Maddeler	59.006,00	187.453,42	16.310,00
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	4.730.514,36	7.669.855,39	8.295.390,23
630	14	13	Yedek Parçalar	7.967.894,24	18.518.291,58	21.167.372,43
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	178.894,21	204.613,29	118.246,56
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	686.793,87	691.029,08	1.137.530,99
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	14.796,22	78.999,04	954.510,71
630	25	0	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler			213.316,00
630	25	5	Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler			213.316,00
GİDERLER TOPLAMI				423.676.487,48	522.078.220,14	789.444.554,06

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU

GELİR BÜTÇESİ	BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ	EK ÖDENEK	AKTARMA SONRASI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	KALAN	ORAN %
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.	654.511.225,00	-	654.511.225,00	639.844.528,58	14.666.696,42	98
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	400.000,00	-	400.000,00	3.914.908,60	-3.514.908,60	979
Diğer Gelirler.	98.126.764,53	-	98.126.764,53	107.089.388,50	-8.962.623,97	109
Sermaye Gelirleri.	350.000,00	-	350.000,00	40.381,50	309.618,50	12
Alacaklardan Tahsilat	108.612.010,47	-	108.612.010,47	-	108.612.010,47	-
GELİR BÜTÇESİ	**862.000.000,00**		**862.000.000,00**	**750.889.207,18**	**111.110.792,82**	**87**
AÇIK-FAZLA	**188.000.000,00**	**93.956.351,50**	**281.956.351,50**	**286.651.182,39**	**-4.694.830,89**	**102**
İç Borçlanma	91.500.000,00	93.956.351,50	185.456.351,50	278.778.196,81	-93.321.845,31	
İLBANK	91.500.000,00	93.956.351,50	185.456.351,50	278.778.196,81	-93.321.845,31	
İç Borç Geri Ödemesi	-22.700.000,00	-	-22.700.000,00	-41.910.725,05	19.210.725,05	
İLBANK	-22.700.000,00		-22.700.000,00	-20.338.903,46	-2.361.096,54	
GARANTİ	-	-	-	-21.571.821,59	21.571.821,59	
Dış Borçlanma	142.000.000,00	-	142.000.000,00	81.066.472,23	60.933.527,77	
AYB	71.000.000,00	-	71.000.000,00	65.958.000,00	5.042.000,00	
KfW	71.000.000,00	-	71.000.000,00	15.108.472,23	55.891.527,77	
Dış Borç Geri Ödemesi	-22.800.000,00	-	-22.800.000,00	-31.282.761,60	8.482.761,60	
AYB	-22.800.000,00	-	-22.800.000,00	-24.335.661,60	1.535.661,60	
KfW	-	-	-	**-6.947.100,00**	**6.947.100,00**	
TOPLAM	**1.050.000.000,00**	**93.956.351,50**	**1.143.956.351,50**	**1.037.540.389,57**	**106.415.961,93**	

GİDER BÜTÇESİ	BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ	EK ÖDENEK	AKTARMA SONRASI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	KALAN	ORAN %
Personel Giderleri	88.800.000,00	-	80.837.600,99	68.757.500,76	12.080.100,23	85
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.700.000,00	-	12.531.596,45	10.147.885,39	2.383.711,06	81
Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	242.000.000,00	-	264.163.442,06	263.561.378,65	602.063,41	100
Faiz Giderleri	9.700.000,00	-	27.728.508,86	27.728.508,86	-	100
Cari Transferler	6.300.000,00	-	6.555.536,91	6.555.536,91	-	100
Sermaye Giderleri	639.900.000,00	93.956.351,50	745.639.666,23	737.825.516,14	7.814.150,09	99
Sermaye Transferleri	6.500.000,00	-	6.500.000,00	5.680.000,00	820.000,00	87
Yedek Ödenek	43.100.000,00	-	-	-	-	
GİDER BÜTÇESİ	**1.050.000.000,00**	**93.956.351,50**	**1.143.956.351,50**	**1.120.256.326,71**	**23.700.024,79**	**98**

Gerçekleşen Gelir Bütçesinin Türlerine Göre Dağılımı

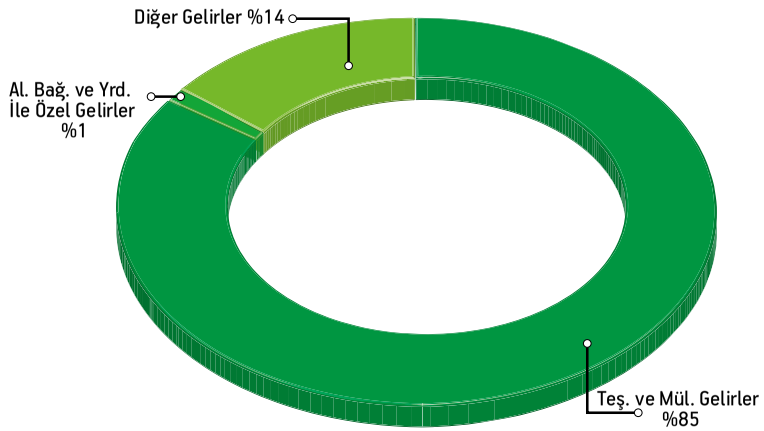

Gerçekleşen Gider Bütçesinin Türlerine Göre Dağılımı

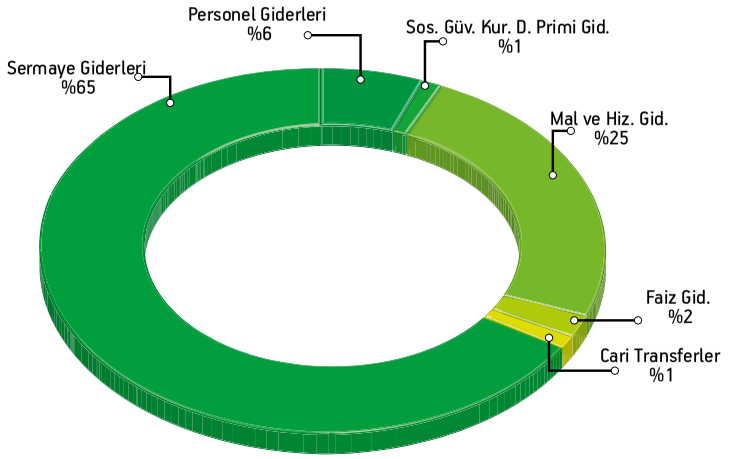

A.3. Mali Denetim Sonuçları

Avrupa Yatırım Bankası'ndan alınan kredi sözleşmesi gereği her yıl Mayıs - Haziran aylarında Uluslararası Denetim Firması tarafından bir önceki yıla ait mali kayıtlar denetlenmekte olup, 2016 yılı içinde 2015 yılı denetlenmiştir.

Sayıştay Başkanlığı denetçileri tarafından kurumumuzda Temmuz ayında başlamış 2016 yılı denetimi halen devam etmektedir.



Sultanlar Çeşmesi (Otobüs Terminali)

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

İşin Adı	Buski Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme Ve Bakımı Hizmetleri Alım İşi (Arıtma 5)
Sözleşme Bedeli	35.690.082,58 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Bursa İl Sınırları
Gerçekleşme Düzeyi	% 96
İşin Tamamlanma Tarihi	31.03.2017



İşin Adı	Orhaneli Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Ve Kanalizasyon İnşaatı İşi
Sözleşme Bedeli	3.964.788,67 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	25.05.2016





İşin Adı	İznik Belediyesi MBR Teknoloji Atıksu Arıtma Tesisi Ve Kanalizasyon İnşaatı İşi
Sözleşme Bedeli	38.246.971,50 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 95
İşin Tamamlanma Tarihi	01.12.2016





İşin Adı	Yenişehir (Bursa) Atıksu Arıtma Tesisi Ve Kanalizasyon İnşaatı İşi
Sözleşme Bedeli	32.690.515,70 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	12.10.2016



İşin Adı	Orhangazi Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Ve Kanalizasyon İnşaatı İşi
Sözleşme Bedeli	8.104.998,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 99
İşin Tamamlanma Tarihi	30.06.2015





İşin Adı	400 Ton/Gün Kap. Akışkan Yataklı Çamur Yakma Ve Enerji Elde Etme Tes. Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	68.000.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 70
İşin Tamamlanma Tarihi	13.04.2019



İşin Adı	400 Ton/Gün Kap. Akışkan Yataklı Çamur Yakma Ve Enerji Elde Etme Tesisi Yapım İşi Kap. İhale Ve Yapım Sürecinde Teknik Dan. Ve Araştırma Gel. Hizmet Alımı İşi
Sözleşme Bedeli	1.200.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 96
İşin Tamamlanma Tarihi	16.01.2017



İşin Adı	KMH-2010/1K Bursa Atıksu Projesi 3. Merhale Müşavirlik Hizmeti Alım İşi
Sözleşme Bedeli	3.560.810,42 Euro+309.141,72 Euro
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik, Mudanya, Nilüfer Mevkii
Gerçekleşme Düzeyi	% 62
İşin Tamamlanma Tarihi	30.09.2017



İşin Adı	İş Paketi- 1 Kurşunlu, Gemlik Ve Mudanya Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	16.576.679,08 Euro
Çalışma Yapılan İlçe	Kurşunlu, Gemlik Ve Mudanya
Gerçekleşme Düzeyi	% 10
İşin Tamamlanma Tarihi	16.02.2019



İşin Adı	İş Paketi- 2 Akçalar, Küçükkumla Ve Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	14.785.474,84 Euro
Çalışma Yapılan İlçe	Akçalar, Küçükkumla Ve Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 11
İşin Tamamlanma Tarihi	28.01.2019



İşin Adı	Doğu Atıksu Arıtma Tesisi 3 Adet Çökeltim Havuzu Ve 1 Adet Çamur Tankı İnşaatı İle Revizyonu İşi
Sözleşme Bedeli	5.868.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	12.02.2016



İşin Adı	Boyalıca (İznik) Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	839.140,58 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	10.08.2016



İşin Adı	İhata Kafes Tel Ve Himaye Kapısı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.250.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 77
İşin Tamamlanma Tarihi	21.10.2016



İşin Adı	Batı AAT Çamur Susuzlaştırma Tesisi Kapasite Arttırımı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.169.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	21.01.2017



İşin Adı	Batı Atıksu Arıtma Tesisi Koku Önleme Perdesi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.441.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	24.08.2016



İşin Adı	Muhtelif Tehlikeli Gaz Algılama Ve Havalandırma Sistemi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	440.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	15.10.2016



İşin Adı	Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	14.474.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	% 31
İşin Tamamlanma Tarihi	06.12.2018



İşin Adı	Hançerli Lagün İnşaatı Yapımı İşi
Sözleşme Bedeli	2.436.750,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya İlçesi Hançerli Köyü
Gerçekleşme Düzeyi	% 92
İşin Tamamlanma Tarihi	11.12.2016



İşin Adı	Ekinli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	149.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey İlçesi Ekinli Köyü
Gerçekleşme Düzeyi	% 50
İşin Tamamlanma Tarihi	10.02.2017



İşin Adı	Bursa İli Muhtelif İlçelerinde 14 Adet Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi Ve Yapıma Esas İhale Dokümanlarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi
Sözleşme Bedeli	1.995.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Bursa İli Mülki Sınırları
Gerçekleşme Düzeyi	% 20
İşin Tamamlanma Tarihi	07.07.2017



İşin Adı	Yenişehir (Fethiye, Karacaali), İnegöl (Gündüzlü), İznik (Sansarak) Doğal Arıtma Tesisi Revizyon Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	643.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir, İnegöl, İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 40
İşin Tamamlanma Tarihi	08.01.2017



İşin Adı	İçmesuyu Ve İlçe Arıtma Tesisleri İşletme Ve Bakım Hizmetleri Alım İşi (İAAT-1)
Sözleşme Bedeli	7.000.113,34 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Bursa İli
Gerçekleşme Düzeyi	% 21
İşin Tamamlanma Tarihi	31.08.2017



İşin Adı	Muhtelif İlçelerde (Harmancık, Keles, Yenişehir, İnegöl) Bölgesel Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.266.125,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 6
İşin Tamamlanma Tarihi	18.02.2018



İşin Adı	Narlı-Çınarcık Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.324.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik İlçesi Narlı Ve Fadıllı Mahallesi
Gerçekleşme Düzeyi	% 57
İşin Tamamlanma Tarihi	13.08.2017



İşin Adı	Kestel İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.997.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Kestel İlçesi
Gerçekleşme Düzeyi	% 5
İşin Tamamlanma Tarihi	18.12.2017



İşin Adı	450 Adet İçmesuyu Deposuna Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması İşi
Sözleşme Bedeli	3.885.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 28
İşin Tamamlanma Tarihi	18.05.2017



İşin Adı	Bursa İli Muh. İlç. Bulunan İ.Suyu Arıtma Tes. Yatak Malz. Değ. Ve Onarımı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	141.600,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	09.04.2017



İşin Adı	Karacabey İlçesi Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Ve Revizyonu Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	427.900,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey İlçesi
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	04.02.2016



Elektrik Makina Ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı

İşin Adı	Havuzların Bakım, Onarım Ve İşletilmesi İşi.
Sözleşme Bedeli	1.297.325,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 57
İşin Tamamlanma Tarihi	05.09.2016



İşin Adı	Havuz Yapıları Ve Ekipmanlarının Bakım, Onarım Ve İşletilmesi İşi
Sözleşme Bedeli	1.099.602,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 2
İşin Tamamlanma Tarihi	07.12.2018



İşin Adı	2016 Yeşil Alanların Bakımının Yaptırılması Hizmet Alım İşi.
Sözleşme Bedeli	1.429.754,35 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 24
İşin Tamamlanma Tarihi	24.05.2018



İşin Adı	İlçelere Enerji Nakil Hattı Yapılması İşi.
Sözleşme Bedeli	2.050.883,30
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 99
İşin Tamamlanma Tarihi	21.09.2016



İşin Adı	Bursa Merkez İlçeler Ve İlçelere Bağlı Köylere Enerji Nakil Hattı Yapılması İşi.
Sözleşme Bedeli	1.515.099,80 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 46
İşin Tamamlanma Tarihi	24.05.2018



İşin Adı	İçmesuyu Ve Atıksu Terfi Tesisleri İle Su Kuyularının Bakımı, Onarımı Ve İşletilmesi İşi.
Sözleşme Bedeli	1.097.764,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 97
İşin Tamamlanma Tarihi	26.07.2017



İşin Adı	D12 Su Deposuna Hes Tesisi Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	3.678.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 2
İşin Tamamlanma Tarihi	21.04.2018



İşin Adı	D13 Su Deposuna Hes Tesisi Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	5.056.700,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 89
İşin Tamamlanma Tarihi	21.01.2016



İşin Adı	Katodik Koruma Sistemi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	700.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	24.03.2016



İşin Adı	Buski 420 Gün Süreli Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi.
Sözleşme Bedeli	31.717.322,89 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 45
İşin Tamamlanma Tarihi	23.06.2016



İşin Adı	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi.
Sözleşme Bedeli	61.426.030,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 13
İşin Tamamlanma Tarihi	31.08.2018



İçmesuyu Daire Başkanlığı

İşin Adı	2016/4 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Mustafakemalpaşa - Karacabey)
Sözleşme Bedeli	4.841.250,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa- Karacabey
Gerçekleşme Düzeyi	%15
İşin Tamamlanma Tarihi	12.07.2018



İşin Adı	2014/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi.
Sözleşme Bedeli	2.698.530,50 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	07.04.2016



İşin Adı	2014/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi.
Sözleşme Bedeli	2.249.101,60 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	23.03.2016



İşin Adı	2014/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi .
Sözleşme Bedeli	2.535.975,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	11.07.2016



İşin Adı	2014/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş.İşi .
Sözleşme Bedeli	1.924.553,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	09.09.2016



İşin Adı	2014/1 Muh.Depo İnş.İşi.
Sözleşme Bedeli	5.214.610,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	16.03.2016



İşin Adı	2014/2 Muh Depo İnş.İşi.
Sözleşme Bedeli	5.308.753,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	12.07.2016



İşin Adı	Orhaneli, Keles, B.Orhan Ve Harmancık İlç. Muh. Mh. İ.Suyu Şeb. Ve İsa. Hat. İnş. İşi.
Sözleşme Bedeli	2.873.646,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	05.03.2016



İşin Adı	İznik İçmesuyu Altyapı İnşaatı İşi
Sözleşme Bedeli	2.367.337,00
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	10.03.2016



İşin Adı	Mustafa Kemalpaşa İçmesuyu Altyapı İnşaatı İşi
Sözleşme Bedeli	1.902.286,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	10.03.2016



İşin Adı	İçmesuyu Ana İletim Hatlarında Karayollarını Zemin Altından Delerek Yatay Delgi İnş.Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	904.850,00
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	27.01.2017



İşin Adı	2016/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.Ve Yeni Şeb.Ve İsale Hattı İnş. İşi (Orhangazi - İznik)
Sözleşme Bedeli	3.748.050,62
Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi-İznik
Gerçekleşme Düzeyi	%25
İşin Tamamlanma Tarihi	26.10.2017



İşin Adı	Orhangazi-Keles İlçeleri Muhtelif Su Alma Yapıları Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.690.065,50 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi-Keles
Gerçekleşme Düzeyi	%25
İşin Tamamlanma Tarihi	24.06.2017



İşin Adı	2016/3 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş. İşi (Nilüfer-Orhaneli)
Sözleşme Bedeli	3.548.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer-Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	%25
İşin Tamamlanma Tarihi	18.10.2017



İşin Adı	Mustafa Kemalpaşa İlçesi 2.Grup Muhtelif Su Alma Yapıları Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.894.383,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	%1
İşin Tamamlanma Tarihi	24.06.2017



İşin Adı	Mustafa Kemalpaşa İlçesi 1.Grup Muhtelif Su Alma Yapıları Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.939.390,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	%1
İşin Tamamlanma Tarihi	24.06.2017



İşin Adı	Karacabey İlçesi Muhtelif Su Alma Yapıları Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.695.454,00
Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
Gerçekleşme Düzeyi	%15
İşin Tamamlanma Tarihi	26.06.2017



İşin Adı	2016/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş. İşi
Sözleşme Bedeli	5.068.658,50
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%10
İşin Tamamlanma Tarihi	02.04.2018



İşin Adı	2016/4 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş. İşi
Sözleşme Bedeli	6.450.050,00
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%15
İşin Tamamlanma Tarihi	14.12.2017



İşin Adı	2015/4 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi (Mustafakemalpaşa - Karacabey)
Sözleşme Bedeli	4.522.368,10
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa-Karacabey
Gerçekleşme Düzeyi	%15
İşin Tamamlanma Tarihi	08.10.2017



İşin Adı	2015/1 Muh.Depo İnş. İşi. (Mustafakemalpaşa - Karacabey)
Sözleşme Bedeli	5.679.739,39
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa-Karacabey
Gerçekleşme Düzeyi	%90
İşin Tamamlanma Tarihi	11.01.2017



İşin Adı	2016/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.Ve Yeni Şeb.Ve İsale Hattı İnş. İşi. (B. Merkez Batı)
Sözleşme Bedeli	3.979.050,00
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%5
İşin Tamamlanma Tarihi	17.04.2018



İşin Adı	2016/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.Ve Yeni Şeb.Ve İsale Hattı İnş. İşi. (B. Merkez Doğu)
Sözleşme Bedeli	2.650.750,00
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%15
İşin Tamamlanma Tarihi	22.10.2017



İşin Adı	2016/1 Muh. Abone Talepleri İçm. Şbk. İnş. İşi
Sözleşme Bedeli	1.587.165,00
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım-Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%20
İşin Tamamlanma Tarihi	01.09.2017



İşin Adı	2015/4 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh. İnş. İşi (Batı - Merkez Muhtelif)
Sözleşme Bedeli	2.649.698,00
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%75
İşin Tamamlanma Tarihi	01.05.2017



İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı

İşin Adı	2014/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.796.075,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 89
İşin Tamamlanma Tarihi	24.06.2016



İşin Adı	2014/2 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.902.797,65 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 84
İşin Tamamlanma Tarihi	09.06.2016



İşin Adı	2015/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	5.645.460,91 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 57
İşin Tamamlanma Tarihi	02.03.2018



İşin Adı	2016/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.494.43,00TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 66
İşin Tamamlanma Tarihi	15.11.2017



İşin Adı	2014/2 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.130.155,60 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
Gerçekleşme Düzeyi	% 88
İşin Tamamlanma Tarihi	26.08.2016



İşin Adı	2015/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	5.500.830,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
Gerçekleşme Düzeyi	% 22
İşin Tamamlanma Tarihi	01.03.2018



İşin Adı	2014/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.629.014,40 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 91
İşin Tamamlanma Tarihi	24.09.2016



İşin Adı	2015/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	4.750.239,23 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 49
İşin Tamamlanma Tarihi	23.02.2018



İşin Adı	2015/1 Gemlik Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.378.935,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
Gerçekleşme Düzeyi	% 52
İşin Tamamlanma Tarihi	09.11.2017



İşin Adı	2014 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.701.597,40 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya
Gerçekleşme Düzeyi	% 113
İşin Tamamlanma Tarihi	17.06.2016



İşin Adı	2016 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	4.383.800,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya
Gerçekleşme Düzeyi	% 25
İşin Tamamlanma Tarihi	16.11.2017



İşin Adı	2015/1 Görükle Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.736.182,50 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Görükle
Gerçekleşme Düzeyi	% 58
İşin Tamamlanma Tarihi	07.06.2017



İşin Adı	2016 Kestel Ve Gürsu İlçeleri Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.997.789,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Kestel, Gürsu
Gerçekleşme Düzeyi	% 38
İşin Tamamlanma Tarihi	23.06.2017



İşin Adı	Kestel İlçesi Mahallelerinde Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.813.775,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Kestel, Gürsu
Gerçekleşme Düzeyi	% 75
İşin Tamamlanma Tarihi	06.01.2017



İşin Adı	2015 Buski Yıldırım İlçesi Ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolunun Doğusu İçmesuyu Evsel Bağlantı Ve Arızaları Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.385.174,20 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi / Yıldırım
Gerçekleşme Düzeyi	% 82
İşin Tamamlanma Tarihi	21.12.2017



İşin Adı	2015 Buski Nilüfer İlçesi Ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolunun Batısı İçmesuyu Evsel Bağlantı Ve Arızaları Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.178.985,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi / Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 47
İşin Tamamlanma Tarihi	23.06.2017



İşin Adı	Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, M. Kemalpaşa, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles İlçe Sınırları Dahilinde Asfalt Yapımı Ve Onarım İşi
Sözleşme Bedeli	29.979.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 120
İşin Tamamlanma Tarihi	16.09.2016



İşin Adı	2016 Yılı1.Bölge Asfalt Yapımı Ve Onarımı İşi
Sözleşme Bedeli	49.997.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 33
İşin Tamamlanma Tarihi	22.08.2018



İşin Adı	2016 Yılı 2.Bölge Asfalt Yapımı Ve Onarım (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir) İşi
Sözleşme Bedeli	49.618.900,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 33
İşin Tamamlanma Tarihi	22.08.2018



İşin Adı	2015/1 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları Ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi
Sözleşme Bedeli	2.189.468,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 58
İşin Tamamlanma Tarihi	22.01.2018



İşin Adı	2015/1 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları Ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi
Sözleşme Bedeli	4.232.024,60 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
Gerçekleşme Düzeyi	% 84
İşin Tamamlanma Tarihi	08.12.2017



İşin Adı	2016/1 Nilüfer Ve Doğancı Barajı Su Alma Havzasındaki Köylerdeki Atıksu Depolarının Vidanjörle Çekilmesi Hizmet Alım İşi
Sözleşme Bedeli	1.888.800,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 93
İşin Tamamlanma Tarihi	21.01.2017



İşin Adı	2015/1 Muhtelif İlçelerde Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.684.500,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 119
İşin Tamamlanma Tarihi	03.03.2017





İşin Adı	2014/1 Nilüfer İlçesi Kan. Ve Yağ. Hattı Arızası Onarımı, Evsel Bağlantı Yapımı, Yağmursuyu Izgara Yapımı, Kan. Ve Yağ. Kap. İle Izg. Yüks. Ve Alç. Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.348.645,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 88
İşin Tamamlanma Tarihi	08.01.2016



İşin Adı	2014/1 Osmangazi İlçesi Kan. Ve Yağ. Hattı Arızası Onarımı, Evsel Bağlantı Yapımı, Yağmursuyu Izgara Yapımı, Kan. Ve Yağ. Kap. İle Izg. Yüks. Ve Alç. Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.934.310,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 115
İşin Tamamlanma Tarihi	10.02.2017



İşin Adı	2015/1 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçelerinde El Kazısı İle Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Ha TLarı Yapılması İşi
Sözleşme Bedeli	1.190.053,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 95
İşin Tamamlanma Tarihi	24.03.2017



İşin Adı	2015/1 Buski Merkez Yağ. Izg. Ve Izgara Bağlantı Hatlarının Tem. Hiz. Alım İşi
Sözleşme Bedeli	1.086.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 58
İşin Tamamlanma Tarihi	12.08.2017



İşin Adı	2016 BBB Sınırları İçerisinde Atıksu Deposu (Fosseptik) İnş. Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.098.365,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 25
İşin Tamamlanma Tarihi	21.10.2017



İşin Adı	2016/1 Nilüfer İlçesi Kan. Evsel Bağlantıları Ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.795.665,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 39
İşin Tamamlanma Tarihi	09.06.2018



İşin Adı	Nilüfer Ve Doğancı Su Alma Havzasındaki Köy. Atıksu Dep. Vidanjörle Çekim İşi
Sözleşme Bedeli	425.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 99
İşin Tamamlanma Tarihi	26.03.2016



İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanlığı

İşin Adı	Alttemel Dolgu Malzemesi Alım İşi
Sözleşme Bedeli	459.125,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	07.12.2016



İşin Adı	İznik Atıksu Depolarının Vidanjörle Çekim İşi
Sözleşme Bedeli	412.800,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	31.12.2016



İşin Adı	Yenişehir Fosseptik İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	538.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	02.03.2017



İşin Adı	Büyükorhan Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	950.720,18 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Büyükorhan
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	02.03.2017



İşin Adı	Harmancık-Keles Foseptik Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	946.819,39 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Harmancık-Keles
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	08.04.2017



İşin Adı	İnegöl Merkez Mahalleleri Kanalizasyon Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.762.124,16 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	01.08.2016



İşin Adı	Karacabey Foseptik İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	785.400,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	11.04.2017



İşin Adı	Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.399.864,48 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	03.03.2017



İşin Adı	Yenişehir Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.659.128,87 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	03.03.2017



İşin Adı	2015/2 Orhaneli Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.012.565,20 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	% 97
İşin Tamamlanma Tarihi	07.04.2018



İşin Adı	2015/2 Büyükorhan Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.840.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Büyükorhan
Gerçekleşme Düzeyi	% 37
İşin Tamamlanma Tarihi	07.04.2018



İşin Adı	2015/2 İnegöl Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.367.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 37
İşin Tamamlanma Tarihi	21.07.2018



İşin Adı	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.398.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 22
İşin Tamamlanma Tarihi	22.04.2018



İşin Adı	Karacabey Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.515.200,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	18.03.2017



İşin Adı	2015/2 İznik Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.186.249,50 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 51
İşin Tamamlanma Tarihi	02.05.2018



İşin Adı	2015/2 Mustafakemalpaşa Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.679.722,30 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	% 65
İşin Tamamlanma Tarihi	28.06.2018



İşin Adı	2015/2 Yenişehir Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.979.213,66 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	% 87
İşin Tamamlanma Tarihi	13.07.2018



İşin Adı	Harmancık Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	799.783,75 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Harmancık
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	07.04.2017



İşin Adı	İznik Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.198.100,61 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	30.03.2017



İşin Adı	Mustafakemalpaşa Foseptik İnş. Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.382.461,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	% 31
İşin Tamamlanma Tarihi	09.06.2017



İşin Adı	Orhaneli Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.432.392,18 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	30.03.2017



İşin Adı	Orhangazi Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.181.385,04 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	06.04.2017



İşin Adı	2016/1 İznik Atıksu Depolarının Vidanjörle Çekim İşi
Sözleşme Bedeli	296.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 44
İşin Tamamlanma Tarihi	15.08.2017



İşin Adı	2016/1 Muhtelif Mah. Kan. İnş. Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.947.015,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl,Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	% 39
İşin Tamamlanma Tarihi	20.04.2018



İşin Adı	Büyükorhan-Orhaneli Foseptik İnş. Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	947.100,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Büyükorhan-Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	% 91
İşin Tamamlanma Tarihi	18.05.2017



İşin Adı	İnegöl Foseptik İnş. Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.356.300,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	01.05.2017



İşin Adı	10 İlçe Muhtelif Mah. Kan. İnş. Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.100.194,60 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	26.01.2017



İşin Adı	2015/2 Keles Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.333.282,25 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Keles
Gerçekleşme Düzeyi	% 17
İşin Tamamlanma Tarihi	22.08.2018



İşin Adı	2016/2 Muhtelif Mah. Kan. İnş. Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.131.992,50 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Keles,Orhaneli,Büyükorhan
Gerçekleşme Düzeyi	% 44
İşin Tamamlanma Tarihi	05.09.2018



İşin Adı	2015/2 Karacabey Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.441.419,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
Gerçekleşme Düzeyi	% 87
İşin Tamamlanma Tarihi	27.06.2018



İşin Adı	Yenişehir Evsel Bağlantı ve Hat İlavesi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.244.279,85 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	05.05.2017



İşin Adı	İznik-Orhangazi Foseptik İnş. Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	738.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik-Orhangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	25.05.2017



İşin Adı	2015/2 Harmancık Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.287.692,36 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Harmancık
Gerçekleşme Düzeyi	% 22
İşin Tamamlanma Tarihi	22.09.2018



İşin Adı	Keles Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.472.308,64 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Keles
Gerçekleşme Düzeyi	% 81
İşin Tamamlanma Tarihi	17.08.2017



İşin Adı	İnegöl Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.396.123,29 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 96
İşin Tamamlanma Tarihi	12.09.2017



İşin Adı	İnegöl Evsel Bağlantı ve Hat İlavesi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.103.282,56 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	01.07.2017



İşin Adı	İznik Evsel Bağlantı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.072.680,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	12.05.2017



İşin Adı	Yenişehir Evsel Bağlantı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.188.534,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	12.05.2017



Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

İşin Adı	2015/14 Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	12.412.850,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%20
İşin Tamamlanma Tarihi	07.03.2018



İşin Adı	2016/03 İnegöl Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	16.929.273,95 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	%10
İşin Tamamlanma Tarihi	25.04.2019



İşin Adı	2016/04 Karacabey Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	10.160.626,80 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
Gerçekleşme Düzeyi	%5
İşin Tamamlanma Tarihi	08.06.2019



İşin Adı	2016/05 Mustafakemalpaşa Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	6.947.255,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	%5
İşin Tamamlanma Tarihi	11.10.2018



İşin Adı	Kaplıkaya Deresi Islahı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	8.057.357,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
Gerçekleşme Düzeyi	%5
İşin Tamamlanma Tarihi	14.06.2019



İşin Adı	Cilimboz Deresi Islahı 2 Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.011.752,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	%80
İşin Tamamlanma Tarihi	23.01.2017



İşin Adı	Nilüfer Deresi Panayır Mevkii Şev Düzenlemesi işi
Sözleşme Bedeli	1.976.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	%20
İşin Tamamlanma Tarihi	05.09.2017



Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı

İşin Adı	İçmesuyu Dolum Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	Kestel
Çalışma Yapılan İlçe	66.516.000,00 TL
Gerçekleşme Düzeyi	% 16
İşin Tamamlanma Tarihi	07.11.2017



İşin Adı	İnegöl Hizmet Binası Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	İnegöl
Çalışma Yapılan İlçe	3.519.000,00 TL
Gerçekleşme Düzeyi	% 18
İşin Tamamlanma Tarihi	01.08.2017



İşin Adı	Nilüfer Çayı İle Yan Dere. Yerleşim Yerleri İle Arazi. Taşk. Kor. Master Plan Rap. İle Apl. Dayalı Uyg. Prj. Ve İnş. İhale Dos. Haz. Dan. Hizmet Alım İşi
Sözleşme Bedeli	3.300.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 57
İşin Tamamlanma Tarihi	11.08.2017



İşin Adı	Orhangazi İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu Ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yapımı İşi
Sözleşme Bedeli	325.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	29.06.2016



İşin Adı	M. Kemalpaşa İlç. Bağlı Muh. Köy. Atıksu Ve Yağ. Uygulama Proj. Yapımı İşi
Sözleşme Bedeli	349.560,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	M. Kemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	% 81
İşin Tamamlanma Tarihi	30.06.2016



İşin Adı	Karacabey İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu Ve Yağ. Uyg. Prj. Yapımı İşi
Sözleşme Bedeli	301.760,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
Gerçekleşme Düzeyi	% 93
İşin Tamamlanma Tarihi	29.09.2017



İşin Adı	Orhaneli İlç. Bağlı Beldeler Ve Muhtelif Köyler İle Büyükorhan İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu Ve Yağmursuyu Uyg. Projelerinin Yapımı İşi Hazırlama İşi
Sözleşme Bedeli	270.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	% 83
İşin Tamamlanma Tarihi	17.03.2016



İşin Adı	İznik İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu Ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Yapımı İşi
Sözleşme Bedeli	340.301,25 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	16.05.2016



İşin Adı	İnegöl İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu Ve Yağmursuyu Uyg. Prj. Yapımı İşi
Sözleşme Bedeli	218.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 89
İşin Tamamlanma Tarihi	17.05.2016



İşin Adı	Bursa Atıksu Projesi II İçin Teknik Destek Ve Müşavirlik İşleri Hizmet Alım İşi
Sözleşme Bedeli	11.424.112,37 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Bursa
Gerçekleşme Düzeyi	%85
İşin Tamamlanma Tarihi	29.09.2017



İşin Adı	Bursa İli Gemlik Körfez Havz. Dere Ve Yan Dere. Yer. Yerleri İle Araz. Taş. Korunması Ve Aplik. Dayalı Uygulama Projelerinin Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti Alım İşi
Sözleşme Bedeli	895.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
Gerçekleşme Düzeyi	% 80
İşin Tamamlanma Tarihi	25.08.2017



İşin Adı	Bursa İli İçmesuyu Havzası İle Su Ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki Problemlerin Tespiti Ve Çözüm Önerileri Getirilmesi Projesi İşi
Sözleşme Bedeli	215.200,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Bursa
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	03.11.2016



İşin Adı	BBB Gen. Sın. İçin Atıksu Ve İçm. Yat. Fizibilite Raporunun Haz. Hizmeti İşi
Sözleşme Bedeli	95.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Bursa
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	09.05.2016



İşin Adı	Hüdavendigar Kent Parkı Kano Yarış Parkuru Kanal Düzen. Hazırlanması İşi
Sözleşme Bedeli	140.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	18.07.2016



İşin Adı	Yenişehir İlç. Bağlı Muhtelif Köylerin Atıksu Ve Yağ. Uygulama Prj. Hazırlanması İşi
Sözleşme Bedeli	294.525,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	% 94
İşin Tamamlanma Tarihi	16.05.2016



İşin Adı	İnegöl İlçesi Ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projesi Hazırlama İşi
Sözleşme Bedeli	4.487.500,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 80
İşin Tamamlanma Tarihi	14.03.2016



İşin Adı	Yenişehir İlçesi Ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projesi Hazırlama İşi
Sözleşme Bedeli	2.464.400,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	21.03.2016



İşin Adı	Karacabey İlçesi Ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projesi Hazırlama İşi
Sözleşme Bedeli	2.990.300,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	21.03.2016



İşin Adı	Mustafakemalpaşa İlçesi Ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projesi Hazırlama İşi
Sözleşme Bedeli	4.396.900,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	07.04.2016



İşin Adı	Orhangazi İlçesi İle İznik İlçesi Ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projesi Hazırlama İşi
Sözleşme Bedeli	3.265.190,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	10.10.2015



İşin Adı	Büyükorhan - Harmancık İlç. Ve Köy. İçm. Uyg. Prj. Haz. Dan. Hiz. Alımı İşi
Sözleşme Bedeli	2.886.650,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Büyükorhan Ve Harmancık
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	06.04.2016



İşin Adı	Orhaneli - Keles İlçesi Ve Köyleri İçm. Uyg. Prj. Haz. Dan. Hizmeti Alımı İşi
Sözleşme Bedeli	3.225.200,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli Ve Keles
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	20.04.2016



İşin Adı	Yaylacık, Kayapa Ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Rap. Haz. Hizmet Alımı İşi
Sözleşme Bedeli	790.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	17.12.2017



İşin Adı	Bursa İli Muhtelif Yerlerde Su Sondajı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	747.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 119
İşin Tamamlanma Tarihi	18.07.2017



İşin Adı	Bursa İli Muhtelif Yerlerde Su Sondajı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.275.500,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 1
İşin Tamamlanma Tarihi	29.12.2018



Tarımsal Planlama Daire Başkanlığı

İşin Adı	Yenişehir Terziler Sulama Göleti (Kil Dolgulu) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.672.074,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	% 95
İşin Tamamlanma Tarihi	06.10.2016



İşin Adı	İznik Tacir Sulama Göleti (Kil Dolgulu) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	852.326,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	09.09.2016



İşin Adı	Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Memranlı) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.556.729,16 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
Gerçekleşme Düzeyi	% 5
İşin Tamamlanma Tarihi	10.04.2018



İşin Adı	İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı) işi
Sözleşme Bedeli	1.526.663,94 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 44
İşin Tamamlanma Tarihi	16.09.2017



İşin Adı	İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Membranlı) İşi
Sözleşme Bedeli	1.789.234,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 20
İşin Tamamlanma Tarihi	08.04.2018



İşin Adı	İznik Aydınlar Sulama Göleti (Membranlı) İşi
Sözleşme Bedeli	2.934.727,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 55
İşin Tamamlanma Tarihi	13.09.2017



İşin Adı	İznik Candarlı Sulama Göleti (Memranlı) işi
Sözleşme Bedeli	3.407.937,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 28
İşin Tamamlanma Tarihi	08.10.2017



İşin Adı	İznik Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) İşi
Sözleşme Bedeli	2.852.734,96 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	%10
İşin Tamamlanma Tarihi	22.10.2017



İşin Adı	Keles Menteşe Sulama Göleti (Memranlı) İşi
Sözleşme Bedeli	1.897.724,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Keles
Gerçekleşme Düzeyi	%5
İşin Tamamlanma Tarihi	30.04.2018



İşin Adı	Kestel Kozluören Sulama Göleti (Membranlı) İşi
Sözleşme Bedeli	1.413.076,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Kestel
Gerçekleşme Düzeyi	% 22
İşin Tamamlanma Tarihi	26.08.2017



İşin Adı	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Memranlı) İşi
Sözleşme Bedeli	2.827.707,16 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	% 7
İşin Tamamlanma Tarihi	12.05.2018



İşin Adı	İnegöl Sarıpınar Sulama Göleti (Membranlı) İşi
Sözleşme Bedeli	4.703.105,94 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 7
İşin Tamamlanma Tarihi	08.08.2018



İşin Adı	İznik Şerefiye Sulama Havuzu Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	103.599,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	22.07.2016



İşin Adı	Gürsü Dışkaya -İnegöl Çiftlik-İnegöl Hamidiye Sulama Tesisi-İnegöl Karagölet Sulama Havuzları Yapım İşi (4 Adet)
Sözleşme Bedeli	893.560,90 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gürsu - İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 5
İşin Tamamlanma Tarihi	16.10.2017



İşin Adı	Keles Avdan-Keles Akçapınar İlaçlama Ve Sulama Havuzu Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	97.116,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Keles
Gerçekleşme Düzeyi	% 80
İşin Tamamlanma Tarihi	30.09.2016



İşin Adı	Mudanya Işıklı İlaçlama Havuzu ,Mudanya Trilye Derivasyon Hattı Ve Mudanya Çayönü Sulama Göleti Anroşman Bakım Onarım Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	361.080,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya
Gerçekleşme Düzeyi	% 55
İşin Tamamlanma Tarihi	03.08.2017



İşin Adı	Keles Haydar Elektropompaj Sulama Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	295.000,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Keles
Gerçekleşme Düzeyi	%20
İşin Tamamlanma Tarihi	03.09.2017



İşin Adı	Keles Baraklı Sulama Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	669.265,00 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Keles
Gerçekleşme Düzeyi	%20
İşin Tamamlanma Tarihi	03.09.2017



İşin Adı	Orhaneli Dağgüney Ve Orhaneli Deliballılar Sulama Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	305.313,20 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	%20
İşin Tamamlanma Tarihi	05.09.2017



İşin Adı	Mudanya Ülkü Zirai İlaçlama Havuzu-Gemlik Fevziye Sulama Havuzu Ve Osmangazi Dağakça Yapim İşi
Sözleşme Bedeli	281,949,20 TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya-Gemlik-Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	%20
İşin Tamamlanma Tarihi	04.10.2017



B.2. Performans Sonuçları Tablosu

⬇	DÜŞÜK	% 99 ve Altı	★	TAMAM	% 100
⬆	YÜKSEK	101 ve Üstü	⊗	İPTAL	İdare veya birim hedefi / göstergeyi geçerli sebeplerden dolayı gerçekleştirmekten vazgeçti ise

STRATEJİK AMAÇ 1:	Mevcut su kaynaklarını en uygun şekilde kullanılabilir hale getirmek ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek sürdürülebilirliğini sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF 1.1:	Hamzalı alanına içme suyu temin edilmesi gerekmekte olup, 2016 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek				YÜKSEK
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1: 2016 yılı sonuna kadar 60 km şebeke yenileme çalışmasını tamamlayarak %100'ünü gerçekleştirmek.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM		
	60	65,5	Şebeke İşl. D.B.		
STRATEJİK HEDEF 1.2:	2016 yılı sonuna kadar içmesuyu Şebekesine kaçak kontrolü				DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1: 2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Sisteleme Tesisinin %60'ını tamamlamak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM		
	%60	%0	Planlama Yat. ve İnşaat D.B.		
STRATEJİK HEDEF 1.3:	2016 yılı sonuna kadar Değirmenyol ve Nilüfer Barajı havzalarında bulunan yerleşim alanlarındaki atıksuların arıtılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak.				DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1: 2016 yılı sonuna kadar Değirmenyol ve Nilüfer Baraj havzalarındaki yerleşim alanlarındaki atıksuların %35'inin arıtılması veya uzaklaştırılmasını yapmak	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM		
	%35	%0	Arıtma İşl. D.B., Planlama Yat. ve İnşaat D.B., Kan. D.B.		
STRATEJİK HEDEF 1.4:	Yeraltı su havzalarında yapılacak olan 2016 yılı sonuna kadar toplam 120 adet sondaj kuyusu açmak.				YÜKSEK
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1: 2016 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM		
	20	34	Planlama Yat. ve İnşaat D.B.		
STRATEJİK HEDEF 1.5:	İçmesuyu kaynaklarını 3 ayda bir kimyasal ve bakteriyolojik olarak numune alarak denetlemek.				TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1: 2016 yılında 3 ayda bir kimyasal ve bakteriyolojik numune alarak denetlemek.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM		
	%100	%100	Arıtma İşletmeleri D.B.		
STRATEJİK HEDEF 1.6:	Mevcut kaynaklarımızda yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut 213 adet kuyuyu aktif halde tutmak.				DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1: 2016 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100'ünü aktif halde tutmak	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM		
	%100	%68	Elektrik Mak. ve Bakım D.B.		
STRATEJİK HEDEF 1.7:	Her yıl 120 adet kuyuda dezenfeksiyon işlemi yapmak veya letmek				DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1: 2016 yılında 120 adet kuyu dezenfeksiyon işlemlerinin %100'ünü kurmak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM		
	%100	%83	Arıtma İşl. D.B.		
STRATEJİK AMAÇ 2:	Su kaynaklarında meydana gelecek su kaybını tespit etmek ve kayıp-kaçak oranını düşürmek				
STRATEJİK HEDEF 2.1:	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2016 yılı sonuna kadar %30'lara indirmek ve letmek				YÜKSEK
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1: Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2016 yılı sonuna kadar %30'unu ölçülebilir hale getirmek.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM		
	%30	%95	Elektrik Mak. ve Bakım D.B., İçmesuyu D.B., Yapımcılar İl Bölge D.B.		

STRATEJİK HEDEF 2.2:	4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını 2019 yılı sonuna kadar %31'e düşürmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1 :2016 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %35'e düşürmek.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	YÜKSEK
	%35	%33	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.İçmesuyu D.B., İşletmeler I.Bölge D.B., Abone İşleri D.B.	
STRATEJİK HEDEF 2.3:	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde %23 kaçak su oranını 2019 yılı sonuna kadar %20'ye düşürmek .			
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1 :2016 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını %22 oranında düşürmek.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	TAMAM
	%22,0	%23	İşletmeler I.Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.	
STRATEJİK HEDEF 2.4:	2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 208 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1 :2016 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	DÜŞÜK
	40	2	İşletmeler I.Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., Emlak İst. D.B.	
STRATEJİK AMAÇ 3:	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.			
STRATEJİK HEDEF 3.1:	2019 yılı sonuna kadar 2.000 km şebeke inşaatı yapmak.			
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1 :2015 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	YÜKSEK
	400	895	İçmesuyu D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.2:	2019 yılı sonuna kadar 500 km isale hattı inşaatı yapmak.			
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1 :2016 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	YÜKSEK
	100	120	İçmesuyu D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.3:	2019 yılı sonuna kadar 175 adet depo inşaatı yapmak.			
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1 :2016 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	YÜKSEK
	35	47	İçmesuyu D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.4:	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 5.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.			
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1 :2016 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 1000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	YÜKSEK
	1.000	8.547	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.5:	İçme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini 2019 yılı sonuna kadar ortalama 30 saate düşürmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1 : 2015 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 39 saate düşürmek.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	YÜKSEK
	39	33	İşletmeler I.Bölge D.B.	
			İşletmeler II.Bölge D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.6:	2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.			

PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1 : 2016 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 4 iş günü içinde takmak	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	TAMAM
	4	4	İşletmeler I.Bölge D.B.	
			İşletmeler II.Bölge D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.7:	2019 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.			YÜKSEK
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1 :2016 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 7 iş günü içinde tamamlamak	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	7	5	İşletmeler I.Bölge D.B.	
			İşletmeler II.Bölge D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.8:	Otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaları çalışır halde tutmak.			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 2016 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompanın %100'ünü çalışır halde tutmak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.9:	2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve depoyu otomatik çalışır hale getirmek.			DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ 3.9.1 :2016 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100'ünü otomatik çalışır hale getirmek.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	%100	%57	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.10:	2015 yılı sonuna kadar 320.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların tamamını değiştirmek, sonraki yıllarda da her yıl, bir önceki yıl sonu itibariyle, 10 yılını doldurmuş sayaçların tamamını değiştirmek.			DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ 3.10.1 :2016 yılı sonuna kadar 320.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100'ünü değiştirmek.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	%100	%85	Abone İşleri D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.11:	Abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2017 itibariyle 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 3.11.1 :2016 itibariyle abonelik müracaatından itibaren keşif işlemlerini 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	2	2	Abone İşleri D.B., İşletmeler II.Bölge D.B., İşletmeler I.Bölge D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.12:	2014 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının 2019 yılı sonuna kadar %80'ini tahsil etmek.			DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ 3.12.1 :2014 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının 2016 yılı sonuna kadar %15'ini tahsil etmek.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	15%	%10,5	Strateji Gel. D.B., 1. Hukuk Müş.	
STRATEJİK HEDEF 3.13:	Dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %80'den %90'a çıkarmak.			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 3.13.1 :2016 yılında dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %80'den %84'e çıkarmak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	%84	%84	Abone İşleri D.B., 1. Hukuk Müş., İşletmeler I.Bölge D.B., İşletmeler II.Bölge D.B. Strateji Gel. D. B	
STRATEJİK HEDEF 3.14:	2015 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımını yapmak.			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 3.14.1 :2016 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımını %100 ünü tamamlamak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	%100	%100	Planlama Yat. ve İnş. D.B.	

STRATEJİK HEDEF 3.15:	**2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisi faal halde tutmak.**			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 2016 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisisin %100'ünü faal halde tutmak.	2016 Tahmin	**Yılsonu** Gerçek.	**SORUMLU BİRİM**	
	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.16:	**2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisi scada sistemine almak.**			DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ 3.16.1 :2016 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100'ünü scada sistemine almak	2016 Tahmin	**Yılsonu** Gerçek.	**SORUMLU BİRİM**	
	%100	%0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.17:	**2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatını tamamlamak.**			DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ 3.17.1 :2016 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100'ünü tamamlamak.	2016 Tahmin	**Yılsonu** Gerçek.	**SORUMLU BİRİM**	
	%100	%86	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.18:	**2016 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.**			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 3.18.1 :2016 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100'ünü yapmak.	2016 Tahmin	**Yılsonu** Gerçek.	**SORUMLU BİRİM**	
	%100	%100	Arıtma Tes. D.B.	
STRATEJİK HEDEF 3.19:	**2019 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının katodik korumasını yapmak.**			DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ :2016 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100'ünün katodik korumasını yapmak.	2016 Tahmin	**Yılsonu** Gerçek.	**SORUMLU BİRİM**	
	%100	%0	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.	
STRATEJİK AMAÇ 4:	**Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.**			YÜKSEK
STRATEJİK HEDEF 4.1:	**Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 2019 yılı sonuna kadar 5.000 km'sini hazırlamak.**			
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1 :2016 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 1.000 km'sini hazırlamak.	2016 Tahmin	**Yılsonu** Gerçek.	**SORUMLU BİRİM**	
	1.000	1.399	Planlama Yat. ve İnş. D.B.	
STRATEJİK HEDEF 4.2:	**2015-2019 yılları arasında 525 Km yağmursuyu hattı döşemek.**			YÜKSEK
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1 :2016 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	2016 Tahmin	**Yılsonu** Gerçek.	**SORUMLU BİRİM**	
	105	112,8	Kanalizasyon D.B.	
STRATEJİK HEDEF 4.3:	**2015-2019 yılları arasında sel taşkınlarını önlemek için derelerin 19 km'sini ıslah etmek.**			DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ 2016 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 3 km'sini ıslah etmek.	2016 Tahmin	**Yılsonu** Gerçek.	**SORUMLU BİRİM**	
	3	0,83	Kanalizasyon D.B.	
STRATEJİK HEDEF 4.4:	**2015-2019 yılları arasında 1.000 km kanalizasyon hattı döşemek.**			

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1 :2016 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	2016	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	DÜŞÜK
	Tahmin			
	200	195,6	Kanalizasyon D.B.	
STRATEJİK HEDEF 4.5:	2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisi yapmak.			DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1 :2016 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisinin %25'ini tamamlamak.	2016	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	Tahmin			
	%25	%18	Arıtma Tes. D.B.	
STRATEJİK HEDEF 4.6:	2015 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu online izleme sistemi kurmak ve izleyebilir hale gelmek.			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 2016 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu online izleme sistemi kurmak ve %100'ünü izleyebilir hale gelmek.	2016	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	Tahmin			
	%100	%100	Arıtma Tes. D.B.	
STRATEJİK HEDEF 4.7:	2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.			YÜKSEK
PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1 :2016 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatının %50'si tamamlamak ve işletmeye almak.	2016	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	Tahmin			
	%50	%70	Arıtma Tes. D.B.	
STRATEJİK HEDEF 4.8:	AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1 :2016 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100'ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	2016	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	Tahmin			
	%100	%100	Havza Koruma D.B	
STRATEJİK AMAÇ 5:	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.			TAMAM
STRATEJİK HEDEF 5.1:	İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ 2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.	2016	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	Tahmin			
	%100	%100	Havza koruma D.B.	
STRATEJİK HEDEF 5.2:	Plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını karşılamak.			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1 :2016 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak	2016	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	Tahmin			
	%100	%100	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.	
STRATEJİK HEDEF 5.3:	Plan dönemi içerisinde her yıl lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini gerçekleştirmek.			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1 :2016 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	2016	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	Tahmin			
	%100	%100	Bilgi İşlem D.B.	
STRATEJİK HEDEF 5.4:	Bilgisayar teknolojisini ve altyapısını her yıl %20 geliştirmek.			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1 :2016 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.	2016	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	Tahmin			
	%20	%20	Bilgi İşlem D.B.	

STRATEJİK HEDEF 5.5:	Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısını fiber hatlara taşımak.			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1 :2016 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20'sini fiber hatlara taşımak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	%20	%20	Bilgi İşlem D.B.	
STRATEJİK HEDEF 5.6:	Her yıl 4 daire başkanlığının teftişini yapmak.			DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1 :2016 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	4	2	Teftiş Kurulu Başkanlığı	
STRATEJİK HEDEF 5.7:	2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 6400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.			YÜKSEK
PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1 :2016 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 2.900 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	1.200	1.230	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.	
STRATEJİK HEDEF 5.8:	Satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda sistem kurmak.			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 5.8.1 :2016 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda kurulacak sistemin %20'sini kurmak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	%20	%20	Ticaret İşleri D.B.	
STRATEJİK HEDEF 5.9:	Yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesini 2017 yılına kadar tamamlamak ve 2018 yılı içinde projenin tümünün Buski'de kullanılmasını ve programlara uyarlanmasını sağlamak.			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 5.9.1 :2016 yılı sonuna kadar yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesinin %37'sini tamamlamak	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	%37	%37	Emlak ve İst. D.B.	
STRATEJİK HEDEF 5.10:	Kurumu tanıtmak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ :Kurumu tanıtmak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	%100	%100	Basın ve Halkla İlş. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.	
STRATEJİK HEDEF 5.11:	Yıllık ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.			DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ 5.11.1 :2016 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	6	2	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.	
STRATEJİK HEDEF 5.12:	Kurumda istatistik ve raporlama sistemini 2016 sonuna kadar kurmak.			DÜŞÜK
PERFORMANS HEDEFİ 5.12.1 :2016 yılı sonuna kadar kurumda istatistik ve raporlama sistemini %100 kurmak.	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	%100	%40	Strateji Gel. D.B., Bilgi İşlem D.B.	
STRATEJİK HEDEF 5.13:	Sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm talepleri gün içerisinde karşılamak.			TAMAM
PERFORMANS HEDEFİ 5.13.1 :2016 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müracaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak	2016 Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	%100	%100	Uzman Tabiplik	
STRATEJİK HEDEF 5.14:	Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.			

PERFORMANS HEDEFİ 5.14.1 :Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.	2016			TAMAM
	Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	%100	%100	Kesin Hesap Ş.M.	
STRATEJİK HEDEF 5.15:	Kurumda iç kontrol sistemini 2015 sonuna kadar kurmak ve uygulanmasını sağlamak.			düşür
PERFORMANS HEDEFİ 5.15.1 :2016 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	2016			
	Tahmin	Yılsonu Gerçek.	SORUMLU BİRİM	
	%100	%35	Strateji Gel. D.B.	


SU BURSA'DA
ÇEŞMEDEN İÇİLİR
Çeşmeden içilen su
sağlıklı, güvenli ve
daha ekonomiktir...

IV-KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

B. Zayıflıklar

C. Değerlendirme

IV. KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. ÜSTÜNLÜKLER

Güçlü Yönler

1. Özel bir kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip köklü bir kurum olması,
2. Dünyada tanınır konumda ve Türkiye'de benzer kamu kurum ve kuruluşlara öncülük edecek nitelikte olması,
3. Güçlü bir mali yapıya sahip olması, kredibilitesinin yüksek olması,
4. Büyük ölçekli yatırımcı bir kuruluş olması nedeniyle profesyonel hizmet alma ve profesyonel hizmet verme gücüne sahip olması,
5. Su kalitesinde standartları yakalamış olması,
6. TS-EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip olması,
7. Yatırım ihtiyacının karşılanmasında kredibilitesinin yüksek olması,
8. Abonelere yönelik sanal ortamdaki çözüm ve uygulamalarının gelişmişliği,
9. Tahsilat noktalarının çokluğu ve bölgesel dağılımının dengeli olması,
10. Bursa genelinde atık su ve yağmur suyu hatlarının %99'unun ayrıştırılmış olması,
11. Su kayıplarının düşüklüğü konusunda Türkiye'de birinci sırada olması,
12. Nilüfer ve Doğancı gibi iki adet büyük barajının olması,
13. Tahsilat oranının yüksek olması,
14. Abonelere kaliteli içmesuyu sağlaması,
15. İçmesuyu ve atıksu arıtma tesisilerinin varlığı,
16. Abonelere alternatif ödeme seçeneklerinin sunulması,
17. Kurumumuz yazılımlarının çoğunlukla kendi personeli tarafından yapılması,
18. Scada sistemine sahip olması
19. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmesi.

Fırsatlar

1. Su kaynaklarına ulaşma ve kullanma imkânına sahip olunması,
2. Bursa'da su ve atık su konusunda yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip üniversitelerin ve araştırma kurumlarının oluşmaya başlaması,
3. Tedarikçi kullanımı açısından güçlü özel sektörün olması ve alternatif hizmet yöntemlerinin gelişmesi,
4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik yönetim anlayışına geçilmesi zorunluluğu, AB uyum çabalarının ve politikalarının varlığı,
5. Yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki gelişmeler,
6. 6360 Sayılı Kanun ile yetkilerin artması,
7. Teknoloji imkanlarının artması,
8. Personelin gelişen teknolojiye kısa sürede uyum sağlaması,
9. İçmesuyu ve atıksu teknolojilerinde gelişme olması.

B- ZAYIFLIKLAR

Zayıf Yönler

1. Özel bir kanunla kurulmuş olmakla birlikte diğer kanunlarla bazı kısıtlamaların oluşması,
2. Personele yönelik imkanların (lokal, kreş v.b.) yetersiz kalması,
3. Kurum çalışanları arasında ücret dengesizliğinin olması,
4. Hizimet alanının genişlemesi ile artan personel ihtiyacının tamamanın karşılanamaması,
5. Abone bilgi ve adres güncellemesinin olmaması.

Tehditler

1. Bursa'nın sürekli göç almasına bağlı olarak nüfusun hızla artması,
2. Bursa'nın coğrafi konumu,
3. Su kaynaklarının yüzeysel sulardan oluşması,
4. İçme suyu kaynaklarının bulunduğu arazilerdeki mülkiyet sorunu nedeniyle kamulaştırma bedellerinin giderek yükselmesi ve havzaların korunmasına yönelik kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma mahiyetli davaların ciddi boyutlara ulaşması,
5. Havza çevrelerinin doğal güzelliğinin nitelikli kaçak yapılaşmalar için cazibe merkezleri olması,
6. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri,
7. Bursa'da doğal afet risklerinin varlığı (1.dereceden deprem bölgesi olması),
8. Yağmursuyu ve derelerle ilgili yetki ve görev karmaşası, koordinasyon ve mevzuat eksiklikleri,
9. Diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları sırasında altyapıya zarar vermesi,
10. Hukuki davaların sonuçlanma süresinin uzun olması

C. DEĞERLENDİRME

- Doğancı Barajı yanında Nilüfer Barajı'nın da devrede bulunması ilimiz açısından bir avantaj olurken, şehrin yoğun göç alarak nüfusun hızla artması nedeniyle yeni yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyacı, planlama ve hizmet kalitesi yönünden dezavantaj oluşturmaktadır.

- İdarece açılacak davalar ve icra takibine konacak dosyalar önceden bilinememektedir. Bu hususlar, tamamıyla diğer birimlerin taleplerine bağlı olduğundan, bu konuları içeren, ileriye dönük plan ve programların yapılmasında güçlük çekilmektedir. İdare faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, üçüncü kişilerle idare arasında doğabilecek ihtilaflarda, kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, üçüncü kişinin haklı olması durumunda, açılan davaların kaybedilmesi riski bulunmaktadır.

- Öğrencilere yönelik bilinçli su kullanım eğitimleri ve BUSKİ tesislerine yapılan teknik geziler devam edecektir.

- Kayıp-kaçak ile ilgili çalışmalara çok yönlü olarak ve kararlılıkla devam edilecektir.

- E-İmzaya paralel olarak dijital arşive geçiş çalışmaları devam edecektir.

- Enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

- Yeni teknoloji ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalış malara devam edilecektir.

- Halkla ilişkiler ve hizmet masasının güçlendirilmesine, hizmet verilen abonelerin öneri ve şikayetlerine karşılık gerekli tedbirleri almaya, duyarlı olmaya ve kurum hizmetleri hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam edilecektir.

- Kurumsal kültürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, personelin nitelik olarak geliştirilmesi, bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.

- Yeraltı ve yerüstü tüm su kaynaklarının kullanımında kurumlar arası yetki ve sorumlulukların karmaşıklığını giderecek, yeni bir Yer Altı Suları Yasası"na ihtiyaç vardır.

- 6360 Sayılı Kanun ile görev alanımıza giren tarımsal sulama tesisi ve gölet yapımlarına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
BUSKİ Genel Müdürü

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2016 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.



Halit KARASU
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
