BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

2018 Yılı Faaliyet Raporu

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Elektronik örneğini

www.buski.gov.tr

adresinde bulabilirsiniz.



“Kendiniz için değil,
bağlı bulunduğunuz ulus için
elbirliği ile çalışınız.
Çalışmaların en yükseği budur.”



İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON- VİZYON, KALİTE POLİTİKAMIZ VE TEMEL DEĞERLER . 12
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 14
B.1. Kanunlarla Verilen 14
B.2. Yönetmeliklerle Düzenlenen 15
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 16
C.1. Fiziksel Yapı 16
C.2. Örgüt Yapısı 22
C.3. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 28
C.4. İnsan Kaynakları 30
C.5. Sunulan Hizmetler 34
C.6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 71

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 74
B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 77

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER 80
A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları 80
A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 84
A.3. Mali Denetim Sonuçları 87
B. PERFORMANS BİLGİLERİ 88
B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 88
B.2. Performans Sonuçları Tablosu 132

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. ÜSTÜNLÜKLER 144
B. ZAYIFLIKLAR 144
C. DEĞERLENDİRME 145



“Bursa için hep birlikte çalışıyoruz”

Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Bursa’yı her alanda örnek alınan kent konumuna getirmeyi hedefliyoruz.

Akıllı şehir uygulamalarından sosyal projelere, turizm yatırımlarından kültürel çalışmalara kadar gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, hedefimize giden yolda önemli adımları oluşturuyor.

Bütün bunların yanı sıra Bursa’yı daha sağlıklı yarınlara taşımak, en önde gelen hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Bu doğrultuda, çevre yatırımlarına büyük önem vermekteyiz.

Gemlik Körfezi ve Nilüfer Çayı’nın atık sulardan kaynaklanan kirliliğine son verecek olan atık su arıtma tesisleri yatırımımız, bunun en somut örneğini oluşturuyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz atık su arıtma tesisleri, çevre alanında attığımız en büyük adımlardan biri.

Yaklaşık 200 milyon - TL’lik yatırımla Bursa’ya kazandırdığımız tesisler, çevreye katacakları değer ve yatırım büyüklükleriyle, Türkiye’ye örnek teşkil edebilecek görünüme sahip bulunuyor.

Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan, ultraviyole dezenfeksiyon sistemine sahip tesisler, teknolojinin ulaşmış olduğu en son gelişmeler bağlamında inşa edildi.

Kartvizitinde “sanayi şehri”, “tarih şehri”, “kültür şehri”, “ticaret şehri” gibi pek çok unvanın yazılı bulunduğu güzel Bursamız, bütün bu bilinen özelliklerinin yanında, “turizm şehri”dir aynı zamanda…

Eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi birikimiyle turistlerin ilgi odağında yer alan Bursa, bundan böyle tertemiz sahilleriyle de “deniz şehri” unvanıyla anılacağı günlerin yakınında. Bursa’yı “deniz şehri” unvanına sahip olmayı hazırlayan sürecin başında, BUSKİ Genel Müdürlüğümüzün dereleri, su kaynaklarını ve denizleri atık sulardan kaynaklanabilecek kirlilikten arındırmaya yönelik gerçekleştirdiği çevre yatırımları bulunuyor.

Hep söylediğimiz gibi “birlikte çalışıp birlikte başaracağız”.

Biz, Bursa’ya aşığız. Bursa’nın geleceği için hep birlikte çalışıyoruz.

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı



“Kusursuz altyapı hedefi”

Bursa Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları, bütün hızıyla devam ediyor.

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, dere ıslahlarına, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılmasından, yeni arıtma tesislerinin yapımına kadar gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, sorunlarından arındırılmış altyapı ağının oluşumunda, Bursa’yı geleceğe taşıyacak çok önemli adımları oluşturuyor.

Gemlik Körfezi, Nilüfer Çayı ve Uluabat Gölü’nün atık sulardan kaynaklanan kirliliğine son verecek altı arıtma tesisimiz, sağlıklı şehir hedefine giden yoldaki kilometre taşlarını meydana getiriyor.

Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla bir defada gerçekleştirilen en büyük çevre yatırımı kapsamında işletmeye aldığımız Gemlik, Küçükkumla, Kurşunlu, Mudanya atık su arıtma tesisleri ile Gemlik Körfezi’nin; Nilüfer Atık Su Arıtma Tesisi ile Nilüfer Çayı’nın ve Akçalar Atık Su Arıtma Tesisi ile de Uluabat Gölü’nün atık sulardan kaynaklanan kirliliği son bulmuş olacak.

Bu, “sağlıklı şehir Bursa” hedefinde, tarihi dönüm noktasına ulaşıldığı anlamına da geliyor. Büyükşehir Belediyemizin bugünden geleceği planlayan Bursa vizyonu sayesinde biz, bugün, az önce sözünü ettiğim tarihi dönüm noktasını yaşıyoruz.

Bursa’nın simge değerlerinden Nilüfer Çayı’nın eski hayat dolu günlerine kavuşması, yine şehrimizin incisi Gemlik Körfezi ile bir tabiat harikası Uluabat Gölü’nün kirlilikten arındırılması, Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla elde edilen büyük kazanımlar anlamında nesiller boyu hep hatırlanacak.

Bursa’nın her alanda örnek alınan şehir konuma gelmesi doğrultusunda biz BUSKİ olarak, dün olduğu gibi bugün de sorumluluk sahamızdaki görevlerimizi en kusursuz biçimde yerine getirmenin kararlılığındayız.

Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla, çalışmalarımıza, dün olduğu gibi bugün de artan bir tempoyla devam ediyoruz.

Bu vesileyle, 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Güngör GÜLENÇ
BUSKİ Genel Müdürü

BUSKİ İNFOGRAFİK 2018

Hizmet Verilen Nüfus **2.936.803** (kişi)

Toplam Hizmet Alanı **10.882** (km^2)

Abone Sayısı **1.329,618** (adet)

Su Kaynakları **154 milyon** (m^3/yıl)

İçmesuyu Arıtma Tesisleri Sayısı **25** (Adet)

İçmesuyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi **138 milyon** (m^3/yıl)

Atıksu Arıtma Tesisleri Sayısı **19** (adet)

BUSKİ İNFOGRAFİK 2018

Atıksu Arıtma Tesisleri Kapasitesi **141 milyon** (m^3 / yıl)

Su Depo Sayısı **414** (adet)

Su Depo Kapasitesi **530 bin** (m^3)

İçmesuyu Hattı Uzunluğu **9.556** (km)

Dere Islahı **19** (km)

Yağmursuyu Şebeke Hattı **1.449** (km)
Kanalizasyon Şebeke Hattı **3.479** (km)

Çamur Yakma Tesisi Berterafı **35 bin** (ton/yıl)

Çamur Yakma Sonucu Elde Edilen
Elektrik Enerjisi **3 milyon** (kw/saat)



1. GENEL BİLGİLER

A. Misyon
Vizyon
Kalite Politikamız
Temel Değerler

B. Yetki
Görev
Sorumluluklar

C. İdareye İlişkin Bilgiler

I- GENEL BİLGİLER

A. MİSYON, VİZYON, KALİTE POLİTİKASI ve TEMEL DEĞERLER

Misyonumuz

Bursa Halkının;

- İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması,
- Kullanılmış su ile yağmursularının uzaklaştırılması,
- Su havzalarının korunması,
- Tarımsal sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama suyu temin edilmesi kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.

Vizyonumuz

Su Şehri Bursa'nın;

- İçme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,
- Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,
- Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir kurumu olmaktır.



Kalite Politikamız

- Kalite Yönetim Sisteminin, yasal şartlar çerçevesinde sürekli iyileştirilmesi,
- Kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi,
- Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,
- Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda altyapı (içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu yatırımlarının planlanması ve gerçekleştirilmesi,
- Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
- Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirerek, içerden ve/veya dışardan gelebilecek tüm tehditlerden korunması,
- Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanmasıdır.

K - Q
TSE - ISO - EN
9001

TÜRKAK
Test
TS EN ISO IEC 17025
AB-0739-T

İlkeler

- Kamu hizmet bilinci
- Halka Hizmet Bilinci
- Hizmet Standartlarına Uyma
- Amaç ve Vizyona Bağlılık
- Dürüstlük ve Tarafsızlık
- Saygınlık ve Güven

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B.1. Kanunlarla Verilen

BUSKİ Genel Müdürlüğü 20.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenen değişik geçici 10. madde ve Bakanlar Kurulunun 08.09.1989 tarih 89/14524 Sayılı kararı ile; Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur.

Yetki görev ve sorumlulukları belirleyen kanunlar;



657	Devlet Memurları Kanunu
2560	İSKİ Kanunu,
5216	Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5393	Belediye Kanunu,
2464	Belediye Gelirleri Kanunu,
831	Sular Hakkında Kanun,
167	Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
1593	Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
2872	Çevre Kanunu,
3213	Maden Kanunu,
5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
4562	Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
2634	Turizm Teşvik Kanunu,
3516	Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
5237	Türk Ceza Kanunu,
4734	Kamu İhale Kanunu,
4735	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
2863	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
2942	Kamulaştırma Kanunu,
6107	İller Bankası Kanunu,
5442	İl İdaresi Kanunu,
5302	İl Özel İdaresi Kanunu,
3194	İmar Kanunu,
4759	İller Bankası Kanunu
3152	İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
6200	Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
5999	Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
1053	Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
2981	İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,
4736	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
5779	Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
6360	Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
4857	İş Kanunu
5434	Emekli Sandığı Kanunu
2004	İcra İflas Kanunu
6245	Harcırah Kanunu
7201	Tebligat Kanunu
6331	İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
506	Sosyal Sigortalar Kanunu
5176	Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5510	Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
2429	Ulusal Bayram Ve Genel Tatillker Hakkında Kanun
3628	Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
4483	Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4688	Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu
6698	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
992	Seriri Ve Gıdai Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan Ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarları Kanunu
3071	Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

B.2. Yönetmeliklerle Düzenlenen

BUSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri, yasalarla genel çerçevesi çizilmiş olmakla beraber, faaliyet alanı ile ilgili çıkarılmış yönetmeliklerle de işleyişini devam ettirmektedir. Bu yönetmelikler;

- BUSKİ Kuruluş ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği,
- Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- 1. Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği,
- İhale Yönetmeliği,
- İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği,
- Atık Su Deşarj Yönetmeliği,
- Tarifeler Yönetmeliği,
- Kütüphane Yönetmeliği,
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik,
- Disiplin Yönetmeliği,
- Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi,
- İçmesuyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik,
- İç Denetim Yönergesi,
- Harita Bilgi ve Belge Yönetmeliği,
- Tarifeler Yönergesi.



C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

C.1. Fiziksel Yapı

a. Hizmet Binaları

Merkez Hizmet Alanı (Acemler Kampüsü)

1-	Ana Hizmet Binası	**8-**	Atölye Binaları
2-	Abone Hizmet Binası	**9-**	Kapalı ve Açık Araç Parkı
3-	İşletmeler Hizmet Binası	**10-**	Arşiv Binası
4-	Sayaç Servisi Hizmet Binası	**11-**	Konteyner Ek Hizmet Binaları
5-	SCADA Hizmet Binası	**12-**	Güvenlik Binası
6-	Açık Saha Ambarı	**13-**	Hukuk Müşavirliği Binası
7-	Kapalı Saha Ambarı	**14-**	İş Sağlığı ve Güvenliği Binası

İlçe Hizmet Binaları

1-	Gemlik Şube Müdürlüğü Binası
2-	Gemlik Taşocakları İşletmesi Binası
3-	Mudanya Şube Müdürlüğü Binası
4-	Mudanya Harmanlar İşletmesi Binası
5-	Kestel Şube Müdürlüğü Binası
6-	Gürsu Şube Müdürlüğü Binası
7-	Görükle Şube Müdürlüğü Binası
8-	İnegöl Şube Müdürlüğü Binası
9-	Abone İşleri Hizmet Binası
10-	Gençosman Hizmet Binası
11-	Setbaşı Tahsilat Şubesi Binası
12-	İznik Şube Müdürlüğü Binası
13-	M. K. Paşa Şube Müdürlüğü Binası
14-	Karacabey Şube Müdürlüğü Binası
15-	Yenişehir Şube Müdürlüğü Binası
16-	Orhangazi Şube Müdürlüğü Binası
17-	Orhaneli Şube Müdürlüğü Binası
18-	Nilüfer Tahsilat Şubesi Binası
19-	Yıldırım Eğitim Hizmet Binası
20-	Büyükorhan Şube Müdürlüğü Binası
21-	Keles Şube Müdürlüğü Binası
22-	Harmancık Şube Müdürlüğü Binası

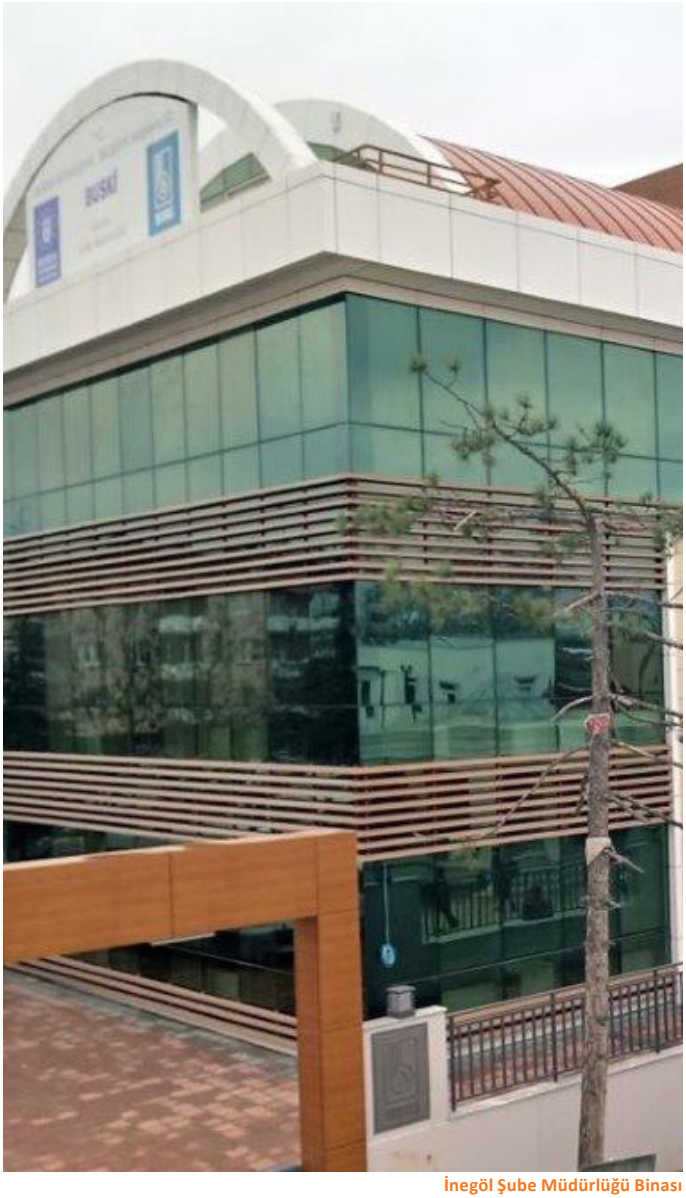

İnegöl Şube Müdürlüğü Binası

b. İçmesuyu ve Atık Su Arıtma Tesisleri

	İçmesuyu Arıtma Tesisleri	Kapasite (m^3)	Arıtılan Günlük Su (m^3/gün)	Arıtılan Yıllık Su (m^3/yıl)	Kullanım Oranı (%)
1-	Dobruca İçmesuyu Arıtma	500.000	307.837	112.360.674	62
2-	Çan Deresi İçmesuyu Arıtma	26.000	13.564	5.019.818	52
3-	Merkez İçmesuyu Paket Arıtma	16.000	11.381	4.154.004	71
4-	Akarca İçmesuyu Arıtma	13.000	9.735	3.553.336	75
5-	Nacaklı İçmesuyu Arıtma	11.250	5.651	2.062.706	50
6-	Kestel Paket İçmesuyu Arıtma	432	432	1.892.160	100
7-	Tatkavaklı Paket İçmesuyu Arıtma	432	432	1.892.160	100
8-	Gölecik İçmesuyu Paket Arıtma	5.250	5.126	1.871.141	98
9-	Karadere İçmesuyu Paket Arıtma	5.200	4.702	1.716.384	90
10-	Alanyurt İçmesuyu Yumuşatma Paket Arıtma	2.000	2.591	945.787	130
11-	Karıncalı İçmesuyu Paket Arıtma	1.469	1.469	536.112	100
12-	Çınarcık Paket İçmesuyu Arıtma	5.184	5.184	436.943	100
13-	Dağkadı - Şahmelek İçmesuyu Paket Arıtma	1.150	1.073	391.805	93
14-	Merkez İçmesuyu Paket Arıtma	1.296	634	231.470	49
15-	İsaören-Dipsizgöl İçmesuyu Paket Arıtma	605	605	220.752	100
16-	Mezitler İçmesuyu Paket Arıtma	605	385	140.589	64
17-	Kömürcükadı-Şapçı İçmesuyu Paket Arıtma	600	319	116.485	53
18-	Belenören İçmesuyu Paket Arıtma	259	259	94.608	100
19-	Narlı Paket İçmesuyu Arıtma	864	207	75.655	24
20-	Kuştepe İçmesuyu Paket Arıtma	173	173	63.072	100
21-	Abdalmurad İçmesuyu Paket Arıtma	173	173	63.072	100
22-	Hamzabey İçmesuyu Paket Arıtma	302	106	38.790	35
23-	Haydar İçmesuyu Paket Arıtma	104	104	37.843	100
24-	Soğukpınar İçmesuyu Paket Arıtma	130	64	23.514	49
25-	İkizce İçmesuyu Paket Arıtma	260	37	7.840	14
Toplam		**592.738**	**372.243**	**137.946.720**	**63**



Kurşunlu AAT

	Atık Su Arıtma Tesisleri	Kapasite (m^3)	Arıtılan Su		Kullanım Oranı (%)
			Günlük (m^3/gün)	Yıllık (m^3/yıl)	
1-	Doğu Atıksu Arıtma Tesisi	240.000	222.891	81.355.202	93
2-	Batı Atıksu Arıtma Tesisi	87.500	65.016	23.730.691	74
3-	Gemlik Atıksu Ön Arıtma Ve Derin Deniz Deşarjı	27.000	24.034	8.772.541	89
4-	Mudanya Atıksu Ön Arıtma Ve Derin Deniz Deşarjı	25.000	23.534	8.589.941	94
5-	Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi	19.000	17.841	6.511.900	94
6-	Yenişehir Atıksu Arıtma Tesisi	7.000	5.051	1.843.797	72
7-	Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisi	12.000	14.258	1.739.434	119
8-	Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi	21.850	11.244	1.371.730	51
9-	Kumla Atıksu Arıtma Tesisi	5.350	4.644	1.277.061	87
10-	İznik (Mbr) Atıksu Arıtma Tesisi	8.790	3.284	1.198.531	37
11-	Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisi	4.725	4.110	879.570	87
12-	Kumla Ön Arıtma Ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi	28.500	12.553	809.444	44
13-	Karacabey Atıksu Arıtma Tesisi	8.500	2.218	809.444	26
14-	Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi	18.850	10.280	627.095	55
15-	Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi	4.561	1.681	563.161	37
16-	Hasanağa Paket Atıksu Arıtma Tesisi	1.200	1.152	420.345	96
17-	Orhaneli Atıksu Arıtma Tesisi	1.000	873	318.654	87
18-	Narlı Paket Atıksu Arıtma Tesisi	1.000	800	292.000	80
19-	Kent Katı Atık Depolama Alanı Süzüntü Suyu Arıtma	500	364	132.724	73
Toplam		**522.326**	**425.828**	**141.243.265**	**82**



K. Kumla AAT

c. Tahsilat Şubeleri

1-	Nilüfer Tahsilat Şubesi	**9-**	M. Kemalpaşa Tahsilat Şubesi	**17-**	Gürsu Tahsilat Şubesi
2-	Setbaşı Tahsilat Şubesi	**10-**	Karacabey Tahsilat Şubesi	**18-**	Güzelyalı Tahsilat Şubesi
3-	Osmangazi Tahsilat Şubesi	**11-**	İznik Tahsilat Şubesi	**19-**	İnegöl Tahsilat Şubesi
4-	Yıldırım Tahsilat Şubesi	**12-**	Orhangazi Tahsilat Şubesi	**20-**	Harmancık Tahsilat Şubesi
5-	Gemlik Tahsilat Şubesi	**13-**	Yenişehir Tahsilat Şubesi	**21-**	Merkez Vezne
6-	Mudanya Tahsilat Şubesi	**14-**	Orhaneli Tahsilat Şubesi	**22-**	Mobil Tahsilat Aracı
7-	Görükle Tahsilat Şubesi	**15-**	Büyükorhan Tahsilat Şubesi	**23-**	Keles Tahsilat Şubesi
8-	Kestel Tahsilat Şubesi	**16-**	Mudanya Sahil Tahsilat Şubesi		

d. Sosyal Tesisler

1- Düğün Salonu ve Yemekhane (BUSKİ Kampüsü)	**3-** Dobruca Lojmanları
2- Spor Tesisleri (BUSKİ Kampüsü)	**4-** Dobruca Sosyal Tesisleri

e. Araç ve İş Makinesi Parkı

Mevcut Araçlar (Kurum Aracı)

İlçe Bazında Araçlar	Adet
Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer	171
Gemlik	6
Mudanya	5
Kestel	5
Görükle	1
Gürsu	2
Büyükorhan	4
Harmancık	4
İznik	5
İnegöl	16
Karacabey	12
Keles	4
Mustafakemalpaşa	17
Orhangazi	7
Orhaneli	8
Yenişehir	12
Toplam	**279**

Kiralanan Araçlar

Kiralanan Araç	Adet
Binek Otomobil (Şoförsüz)	63
Binek Otomobil (Şoförlü)	34
Kapalı Kasa Kamyonet (Şoförlü)	26
Kapalı Kasa Kamyonet (Şoförsüz)	8
4x2 Çift Kabin Kamyonet	71
4x4 Çift Kabin Kamyonet	68
4x4 Arazi Binek	9
Minibüs	2
Motosiklet	37
Kamyon (5 Tonluk)	20
Kazıcı Yükleyici İş Makinesi	51
Vinç	1
Toplam	**390**

Genel Araç Durumu

Araç Grubu	Kurum Aracı	Kiralık Araç	Toplam Kullanılan Araç
Muhtelif Makine, Araç ve Ekipmanlar	152	51	203
Kamyonet	56	145	201
Binek Grubu	12	172	184
Kamyon	45	20	65
Panelvan	11	-	11
Toplu Taşıma Araçları	3	2	5
Toplam	**279**	**390**	**669**

f. Pompa İstasyonları

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde;
- 35 adet ana pompa istasyonu 116 ünite,
- 45 adet lokal amaçlı pompa istasyonu 107 ünite,
- 16 adet terfi pompa istasyonu 24 ünite,
- 21 adet atık su pompa istasyonu 49 ünite bulunmaktadır.

g. Kuyular

İlçeler	Adet	İlçeler	Adet
Osmangazi	81	Büyükorhan	8
Yıldırım	40	Mudanya	7
İnegöl	38	Orhaneli	4
Mustafakemalpaşa	17	Nilüfer	2
Gemlik	16	Keles	2
Orhangazi	14	Kestel	1
Yenişehir	12	Harmancık	1
İznik	9	Gürsu	
Karacabey	9		
Toplam			**261**

h. Su Depoları

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde;
530.640 m^3 toplam kapasiteli 414 adet su deposu mevcuttur.



Pompa İstasyonu

e-BUSKİ

Mobil Şube





İOS ve Android Markette!

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ
BURSA SU ve KANALİZASYON İDARESİ

BUSKİ

BursaBuski

buskigenelmudurlugu

buskibasin

C.2. Örgüt Yapısı

a. Karar Alma Organları

Genel Kurul

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Genel Kuruludur.

Denetçiler

Genel Kurulca seçilen iki denetçiden oluşmaktadır. BUSKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler BUSKİ' nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasadışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurul'un Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Müdür, bir Genel Müdür Yardımcısı ve dışarıdan atanan en az üç üyeden oluşmaktadır.

Genel Müdürlük

BUSKİ Genel Müdürü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanır. Genel Müdür Yardımcıları'nın hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi halerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı kademe birimlerinden teşekkül eder ve BUSKİ' nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.

Daire Başkanları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulu'nun kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile; müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile; BUSKİ'nin diğer personelleri Genel Müdür tarafından atanır.

Genel Müdür'ün birinci derece tezkiye amiri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, ikinci derecede İçişleri Bakanı'dır.



Yeşil Türbe

b. Organizasyon Şeması

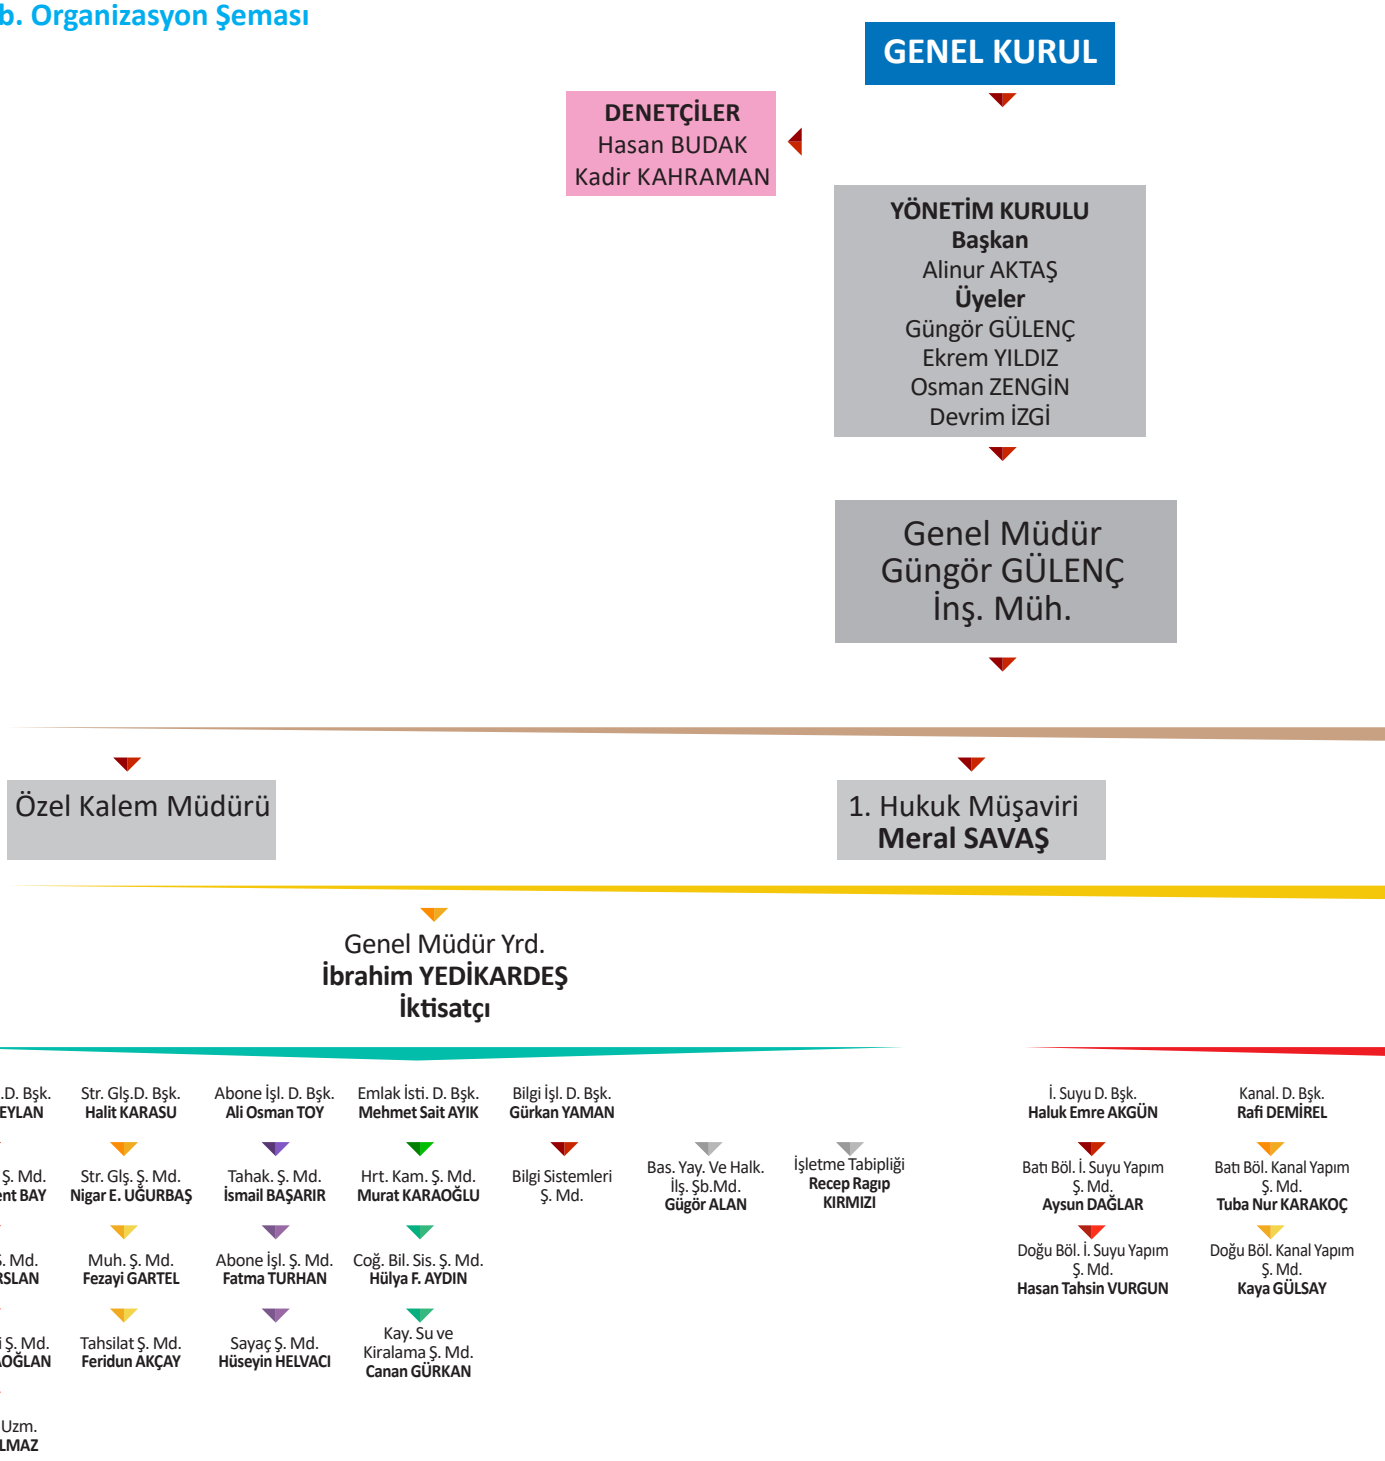



İç Denetim Birimi Bşk.
Uğur ALTINOK

Teftiş Kurulu Başkanı
Celal İSTANBULLU

Genel Müdür Yrd.
Devrim İZGİ
İnş. Yük. Müh.

- Art. Tes. D. Bşk. **Alaattin GÜNGÖRDÜ**
  - Yapım ve İşl. Ş. Md. **Nurcan AYDOĞAN**
    - İ. Suyu Arıtma Ş. Md. **Cengiz ÇELİK**
      - Ruhsat ve Dnt.Ş. Md. **İpek D. YOLCU**
- P. Yat. İnş. D. Bşk. **Gürhan KILIÇ**
  - APK Ş. Md. **Filiz ÇUBUKÇU**
    - Kanal. Proj Ş. Md. **Özlem B. ŞENTÜRK**
      - İ. Suyu Plan Proj. Ş. Md. **Öskan AKBULAK**
        - Zemin Etüd Sond. Ş. Md. **Aynur K. KIZGIN**
- Ticaret İşl. D. Bşk. **H. İbrahim GÜNEŞ**
  - Satınalma Ş. Md. **Ayşegül AYDIN**
    - İhale ve Şart. Satınalma Ş. Md. **Hasip UYAR**
- Ksn. Hsp. Ş. Md.

Genel Müdür Yrd.
Mesut BOZ
İnş. Müh.

- İşletmeler 1. Böl. D. Bşk. **Levent RONA**
  - İ. Suyu B.O. Ş. Md. **Suat AYAN**
    - Kanal. B.O.Ş. Md. **Sincar IŞIK**
      - Gemlik Ş. Md. **Aykut ÇATAL**
        - Mudanya Ş. Md. **Hasan TÜRE**
          - Kestel Ş. Md. **Murat DAŞOĞLU**
            - Görükle Ş. Md. **Hüsamettin AKMAN**
              - Gürsu Ş. Md. **Erdem ATİK**
- İşletmeler 2. Blg. D. Bşk. **Ali AYDIN**
  - Şebekeler Ş. Md. **Sadetdin TOPCAN**
    - İnegöl Ş. Md. **İbrahim ÖZBEK**
      - İznik Ş. Md. **Fidan TURGUT**
        - M. K. Paşa Ş. Md. **Kemal GÜVEN**
          - Karacabey Ş. Md. **Hakan KAYA**
            - Yenişehir Ş. Md. **Hüseyin KAYGISIZ**
              - Orhangazi Ş. Md. **İbrahim SİVRİ**
                - Orhaneli Ş. Md. **Hüseyin KESKİN**
                  - Keles Ş. Md. **Musa COŞAR**
                    - Harmancık Ş. Md. **Mustafa EMİRKAYA**
- Tarımsal Plan. ve Yatr. D. Bşk. **Halil DÖNMEZ**
  - Gölet ve Sulama Şb. Md. **Nurettin YILMAZ**
- Elk. M.İ.D.Bşk. **Recep SEVER**
  - Elk. Elkt. Ş. Md. **Ayşen UVUT**
    - Su İlt. Hat. Dep. Pm. Bk.Onr. Ş. Md. **Mustafa PAKKAN**
      - Atöl. Bk. Onar. Ş. Md. **Zeki AYDIN**
        - İkmal St. Ş. Md. **Osman F. OKUMUŞ**









BURSA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ
BUSKİ
BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

C.3. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

a- Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemi

Paket Programlar	Şikâyet Öneri Katkı (ŞÖK) Sistemi
Dijital Arşiv, Form ve Süreç Yönetimi Projesi	Hasta Takip Sistemi
BUSKİ Abone Bilgi Yönetim Sistemi (BABYS)	Güvenlik Tur kontrol sistemi
BUSKİ Çağrı Merkezi	Proje Yönetim Sistemi
Araç ve Akaryakıt Takip Programı	Lisanslama Takip Sistemi
Araç Görüntüleme ve Mobil Takip Sistemi	Otomatik Ödeme Noktası
Personel Devam Kontrolü Sistemi (PDKS)	Bilgi Sistemleri Sistem Odası
Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistemi	Veri Tabanı İzleme ve Takip Sistemi
Kurumsal İnternet Sitesi	Taşınır Bilgi Sistemi
Buski İnternet Şubesi Bilgi Sistemi	İnternet Erişimi Fiber Altyapıya Taşınması
Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi	Kurum Yerel Ağ Alt Yapısı Revize Edilmesi
Ambar Otomasyon Bilgi Sistemi	RF ID Etiketleme
Arıza Takip Sistemi	Omurga Anahtar ve Sanal Ağ (VLAN) Çalışması
Ruhsat - Analiz Bilgi Sistemi	Sistem Güvenlik Duvarı Yeni Versiyona Geçişi
Numune Kabul ve Raporlama Programı	Felaket Kurtarma Merkezi (FKM)
İlçelere Göre Günlük Çalışmalar	Personel Maaş ve Bilgi Sistemi
Kirlilik İzleme Sistemi	

b- Coğrafi Bilgi Sistemi

Abone Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Coğrafi Bilgi Sistemi projeleri kapsamında oluşturulan Abone Coğrafi Bilgi Sistemi projesinde aboneye ait metinsel (abone no, adres bilgileri) ve grafik bilgiler(binalar) ilişkilendirilerek hangi abonenin hangi binada olduğunun tespit edilip kullanıcıya sunulması amaçlanmaktadır.

Abone Coğrafi Bilgi Sistemleri projesinde yapılan çalışmalar;

Arazi Çalışması

Coğrafi Bilgi Sistemi projeleri kapsamında oluşturulan Abone Coğrafi Bilgi Sisteminde abonenin abone numarası ve adres bilgileri ile bina bilgi ilişkisi sağlanamayan aboneleri sisteme aktarabilmek için arazi çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma ile arazi ekipleri tarafından halihazır, numarataj, uydu ve ortofoto haritaları ile araziye gidilip abonenin mekansal durumu paftalara işlenmektedir.

Arazi Çalışmalarından Gelen Verilerin Sisteme Aktarılması

Coğrafi Bilgi Sistemleri servisinde görevli bilgisayar operatörleri tarafından araziden gelen datalar ofiste GIS programları (Geomedia Professional, Citysurf Editleme) kullanılarak (abone ve bina ilişkilendirilmesi yapılarak) sisteme aktarılmaktadır.

Proje kapsamında 2018 yılı yıl sonu itibari ile 17 ilçede toplam 328.651 bina ve toplam 1.363.554 su abonesi

CBS sisteminde mevcut olup, 7 ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gursu) toplam 1.027.806 aboneden 975.298 abonenin bina ilişkisi sağlanarak % 95 oranında adres tespiti tamamlanmıştır. Yaklaşık % 4'lük bölümde adres karışıklığından ve sayaç durumlarından kaynaklanan problemlerden dolayı yer tespitinde sorun yaşanmakta olup, kalan % 1'lik kısım aylık güncellenen yeni abonelere karşılık gelmektedir.

6360 Sayılı Yasa ile sorumluluk alanına yeni katılan 10 ilçede de Abone Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Abone Coğrafi Bilgi Sistemi Projesinin devamı olarak 6360 Sayılı Yasa ile Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları ve buna bağlı olarak BUSKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanına katılan 10 ilçede (İnegöl, Yenişehir, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık) çalışma devam etmekte olup, ilçe şube müdürlükleri ile birlikte yapılan ortak çalışma ile gerekli programlar (CitySurf ve Google Earth) kurulup eğitimler verilerek yeni abonelerin konumları tespit edilip ofis ortamında ilişkilendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca Orhaneli ilçesinde eski abonelerin konumlarının tespit edilmesi çalışmaları tamamlanmış olup Keles, Büyükorhan, Harmancık ilçelerinde eski abonelere yönelik çalışma devam etmektedir.

Yeni Abonelerin Sisteme Aktarılarak Binalarla İlişkilendirilmesi

Yeni aboneler aylık olarak sisteme aktarılıp numarataj ve bina kodu bilgisiyle büroda ilişkilendirilmesi yapılmaktadır. Numarataj ve bina kodu bilgisiyle yer tespiti yapılamayan aboneler için A4 boyutunda krokiler hazırlanarak arazide yer tespiti yapılmaktadır. 2018 yılı için 7 merkez ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu) toplam 37.709 abone CBS sistemine aktarılmış olup, 33.750 abonenin yer tespiti %90 oranında tamamlanmıştır. 10 ilçede (İnegöl, Yenişehir, Karacabey, MustafaKemalPaşa, Orhangazi, İznik, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık) 2018 yılı için 10.714 abone CBS sistemine aktarılmış olup, 4.905 abonenin yer tespiti %46 oranında tamamlanmıştır.

c. Büro Makine ve Cihazlar

Donanm ve Ekipmanları	Toplam (adet)	Donanm ve Ekipmanları	Toplam (adet)
Bilgisayar	1.653	Aktif Cihaz	75
Yazıcı	518	Fotokopi Makinesi	54
El Bilgisayarı	227	Faks Cihazı	45
Diz Üstü Bilgisayar	175	Sunucu Bilgisayar (Server)	40
Tarayıcı (A0, A4 Scanner)	146	Çizici (Plotter)	8
Tablet	335	Depolama Sistemleri (Storage)	9

d. Harita, Plan ve Projeler

Harita Bilgi ve Belgeleri Arşivinde (Habba) Bulunan Harita Bilgi Ve Belgeleri Ürün Tanımlama Ve İzleme Tablosu

Ürün Adı	Ölçek	Arşivdeki Miktar (Adet)	Ürün Adı	Ölçek	Arşivdeki Miktar (Adet)
BURSA Temel Arazi Planları (M1)	1:1000	3.463	Ortofoto Pafta (M3)	1:1000	477
BURSA Temel Arazi Planları (M1)	1:5000	257	BURSA Temel Arazi Planları (4)	1:1000	6.041
Ortofoto Pafta (M1)	1:5000	255	BURSA Temel Arazi Planları (4)	1:5000	457
IKONOS Uydu Görüntüleri	1:5000	370	BURSA Temel Arazi Planları (5)	1:1000	28.595
SPOT Uydu Görüntüleri	1:25000	76	BURSA Temel Arazi Planları (5)	1:5000	1.867
BURSA Temel Arazi Planları (3)	1:1000	4.370	BURSA Eski Halihazır Ortofotolar	1:5000 1:1000	331
BURSA Temel Arazi Planları (3)	1:5000	247			

C.4. İnsan Kaynakları

Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı (Kişi)

Kadro	Kişi
Memur	644
İşçi	245
İdare Şirketi (BİNTED)	1.696
Toplam	**2.585**

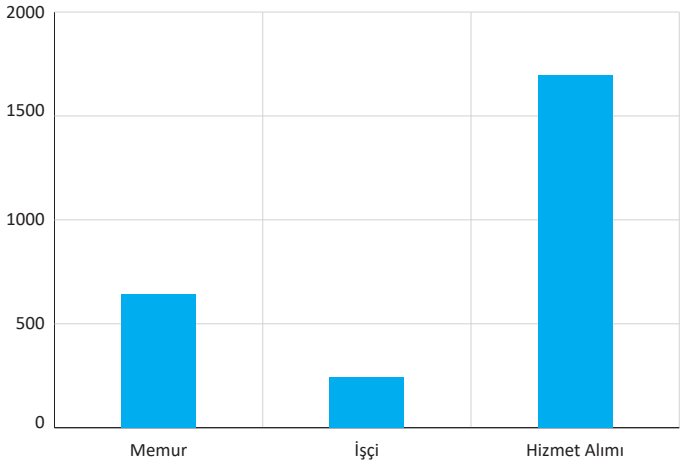

Yaş Grubuna Göre Personel Sayısı (Kişi)

Yaş Grubu	Memur	İşçi	İdare Şirketi (BİNTED)	Toplam
20-30	74	-	393	**467**
31-40	171	53	810	**1.034**
41-50	250	175	464	**889**
51-60	131	17	28	**176**
61 ve üstü	18	-	-	**17**
Toplam	**644**	**245**	**1.696**	**2.585**

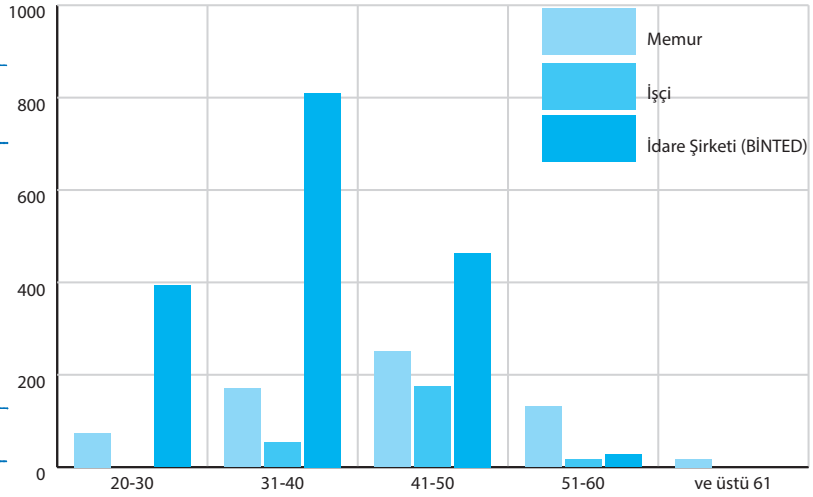

Öğrenim Durumuna Göre Personel Sayısı (Kişi)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	İdare Şirketi (BİNTED)	Toplam
İlköğretim	14	76	370	**460**
Lise	97	104	811	**1.012**
Önlisans	54	8	293	**355**
Lisans	448	56	213	**718**
Yüksek Lisans	30	1	9	**39**
Doktora	1		-	**1**
Toplam	**644**	**245**	**1.696**	**2.585**

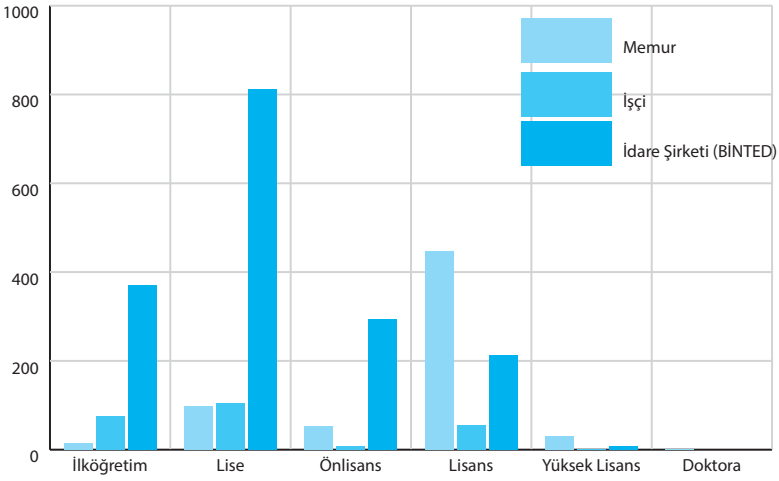

Cinsiyete Göre Personel Sayısı (Kişi)

Kadro	Erkek	Kadın	Toplam
İdare Şirketi (BİNTED)	1.458	238	**1.696**
Memur	500	144	**644**
İşçi	216	29	**245**
Toplam	**2.174**	**411**	**2.585**

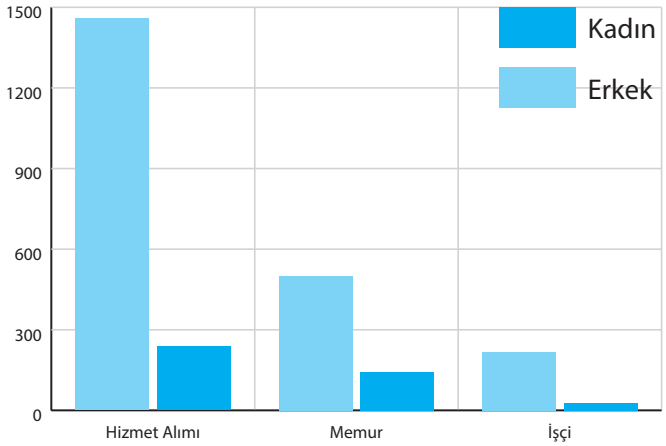

Çalışma Süresine Göre Personel Sayısı (Kişi)

Çalışma Süresi	Memur	İşçi	İdare Şirketi (BİNTED)	Toplam
0-5	151	-	1.132	**1.252**
6-10	92	7	334	**440**
11-15	34	70	135	**247**
16-20	180	107	59	**327**
21-25	93	44	31	**177**
26-30	44	16	5	**67**
30+	50	1		**52**
Toplam	**644**	**245**	**1.696**	**2.585**

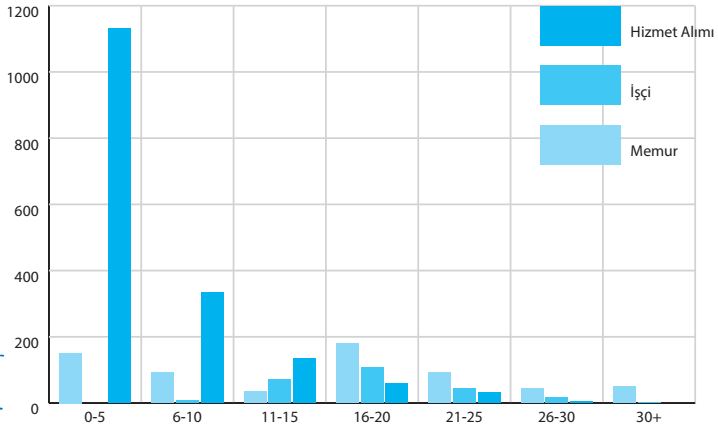




BUSKI



C.5. Sunulan Hizmetler

a. İçmesuyu Hizmetleri

a.1. İçmesuyu Kaynakları

Şehre Verilen Suyun Kaynak Bazında Dağılımı

Su Kaynakları	TOPLAM (m^3)
İçmesuyu Arıtma Tesisleri	137.946.720
Pınar Kaynakları	13.954.701
Kuyular	2.102.547
TOPLAM	**154.003.968**

Şehre Verilen Suyun Dağılımı

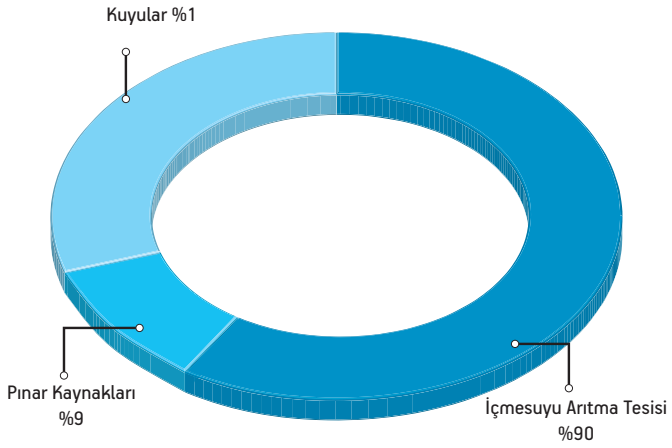



SCADA

Barajlar

	Doğancı Barajı	Nilüfer Barajı
Yeri	Orhaneli Karayolu	Keles Karayolu
Hizmete Giriş Yılı	1985	2007
Kuruluş Amacı	İçmesuyu Temini ve Akış Regülasyonu	İçmesuyu ve Akış Regülasyonu
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	32.611.001 m ³	33.895.000 m³
Hizmet Dönemi	41 yıl	41 yıl

Doğancı Barajı Aylık Doluluk Oranı (m³)

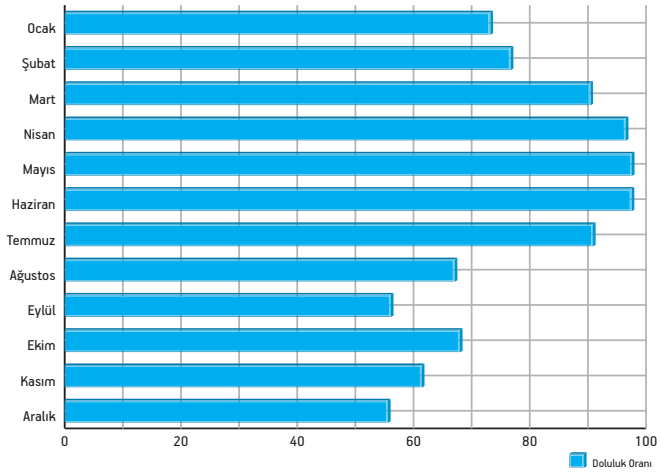

Nilüfer Barajı Aylık Doluluk Oranı (m³)

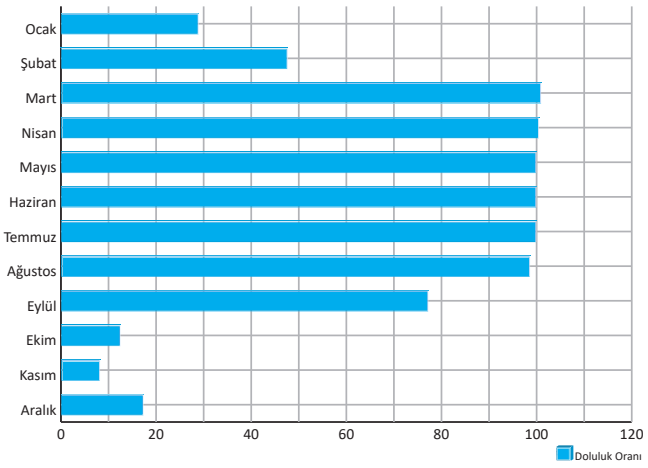



Doğancı Barajı



Nilüfer Barajı

Barajların Aylık Doluluk Oranı

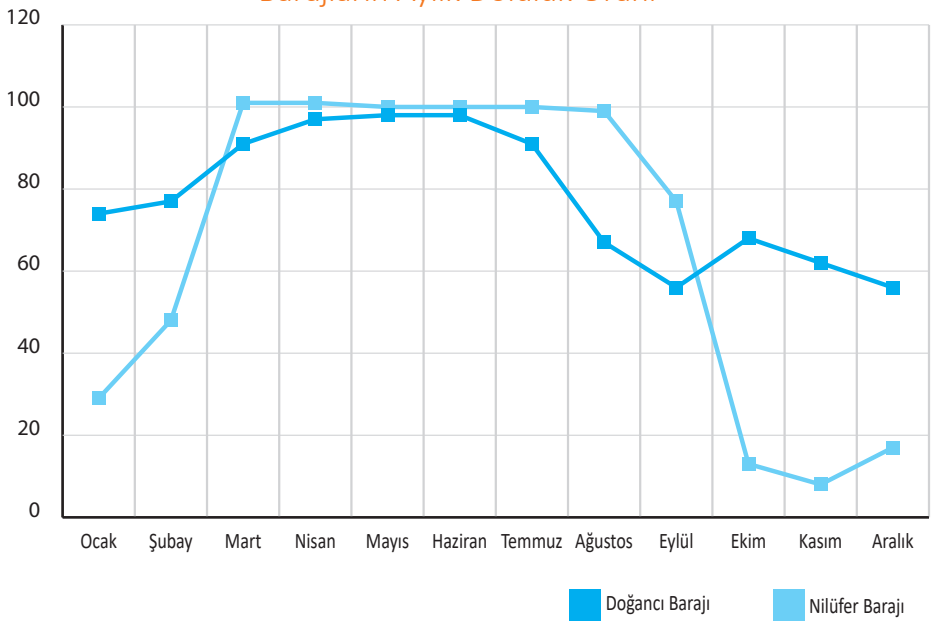

Pınar Kaynakları

Pınar Kaynaklarından Şehre Verilen Su Miktarı

Depolar	m³	Depolar	m³
Mevlihane	5.895.294	Kalıkaya (D5)	157.680
D22	2.009.879	D11	124.925
D2 Üretim	1.961.230	Kestel 1. Kademe Aktaştepe	93.418
Bayrampınar	768.496	Akçalar Sanayi	80.397
D25	679.333	İnkaya	54.750
D1	586.512	Abdalmurat	38.775
Alaşar	557.276	D23	30.198
CF-12C2	379.680	Kuştepe	29.530
Dokuzgöller-D27	330.939	Tavacı	18.250
Kestel 1. Kademe Üretimi	158.139		
TOPLAM			**13.954.701**

Pınar Kaynaklarından Şehre Verilen Su Miktarı (m³)

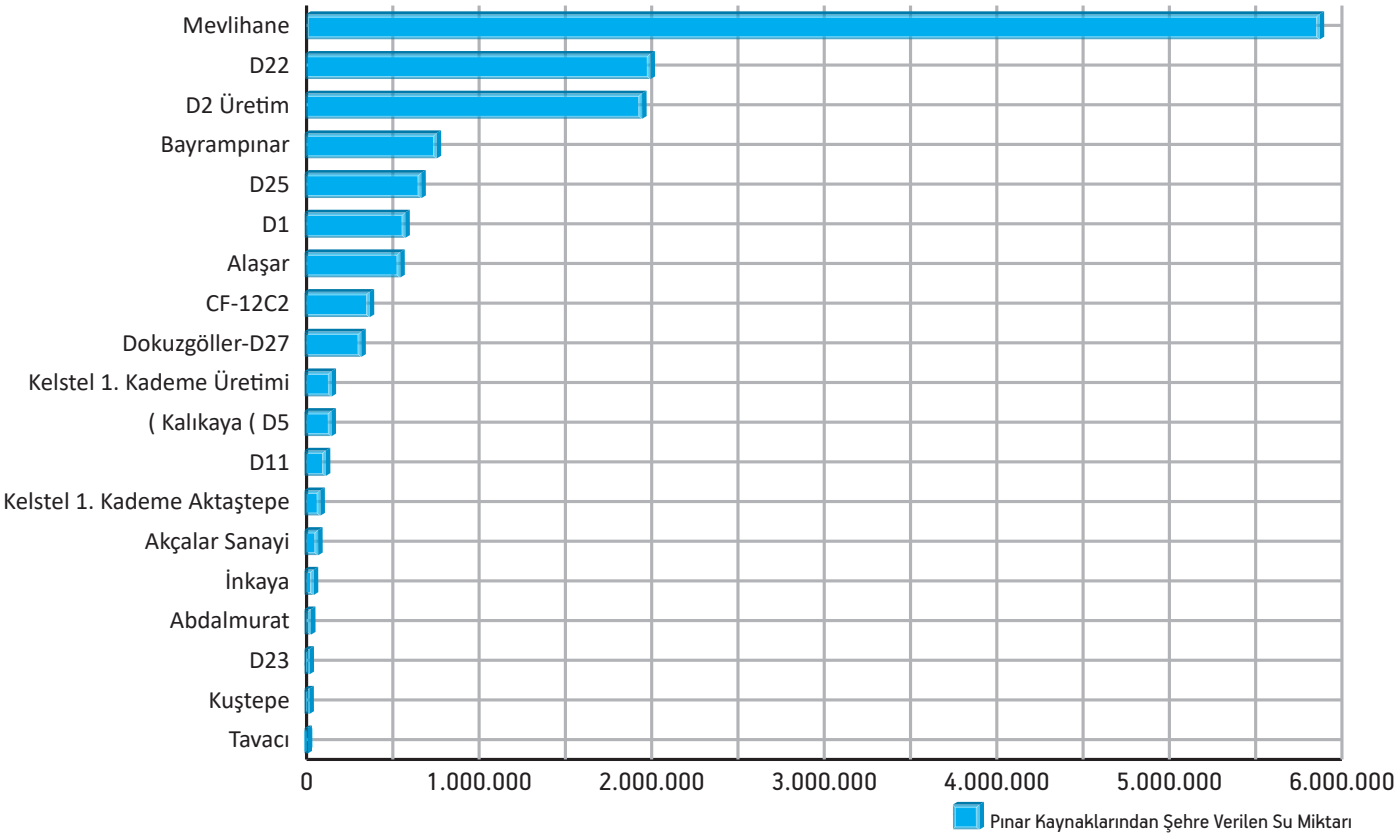

Pınar Kaynaklarından Beslenen Depolar

Depolar	Yeri	Kapastesi (m³)
Bayram Pınarı	İnkaya Mh.	10.000
D3	Piremir Mh.	5.000
D25	Gökdere Boğazı	5.000
D22	Uludağ Yolu	5.000
Dokuzgözler-D27	Kestel	5.000
Kestel 1.Kademe Üretim	Kestel	3.000
D1	Piremir Mh.	2.500
D2 Üretim	Piremir Mh.	2.500
D23	Uludağ Yolu	2.500
D11	Uludağ Yolu	2.500
Akçalar Sanayi	Nilüfer	1.000
Y.Çekirge	Uludağ Yolu	600
Kuştepe	Molla Fenari	600
Alaşar	Molla Fenari	500
Abdalmurat	Molla Fenari	200
İnkaya Pınarı	İnkaya Mh.	150
Tavacı	Teferrüç Mh.	50
Kestel 1.Kademe Aktaştepe	Kestel	Şebekeye
Mevlevihane	Pınarbaşı	Şebekeye
Toplam Kapasite		**46.100**

Kuyular

Kuyular	Yeri	Hizmete Giriş Yılı	Kapasitesi (m³)
Acemler Grubu (OSK, Çeltik, Mutlular, Dereçavuş)	Alman Kanalı	2007	90.000
Köy Kuyuları	Gölyazı		90.000
P8-D9-C3	Hacivat Mh.	1977	55.330
P1-P2	Acemler	1977	51.840
P3	Yavuzselim Mh.	1977	46.600
Doğanevler	Doğanevler	2017	21.600
Toplam			**355.370**

Kuyulardan Şehre Verilen Su Miktarı

Kuyular	(m³)
P8-D9-C3	1.191.678
P3 Üretim	783.119
Köy Kuyuları (Gölyazı)	127.750
Toplam	**2.102.547**

a.2. Abonelik İşlemleri

İlçe Bazında Abone Sayıları

İlçeler	Abone Sayısı (Adet)			
	Mekanik Sayaç	EKS	GPRS	Toplam
Osmangazi	339.978	16.556	219	356.753
Yıldırım	230.693	7.870	142	238.705
Nilüfer	184.519	20.378	95	204.992
İnegöl	79.929	24.053	111	104.093
Gemlik	73.877	1.823	45	75.745
Mudanya	62.221	4.021	27	66.269
M.Kemalpasa	41.331	10.406	41	51.778
Karacabey	37.541	13.670	60	51.271
Orhangazi	35.667	1.162	33	36.862
Gürsu	27.618	3.373	18	31.009
Kestel	28.444	1.434	22	29.900
Yenişehir	24.695	1.086	22	25.803
İznik	17.796	3.153	29	20.978
Orhaneli	14.732		15	14.747
Keles	8.587		8	8.595
Büyükorhan	7.692		8	7.700
Harmancık	4.408		2	4.410
Toplusu	8			8
Genel Toplam	**1.219.736**	**108.985**	**897**	**1.329.618**

İlçe Bazında Abone Sayıları

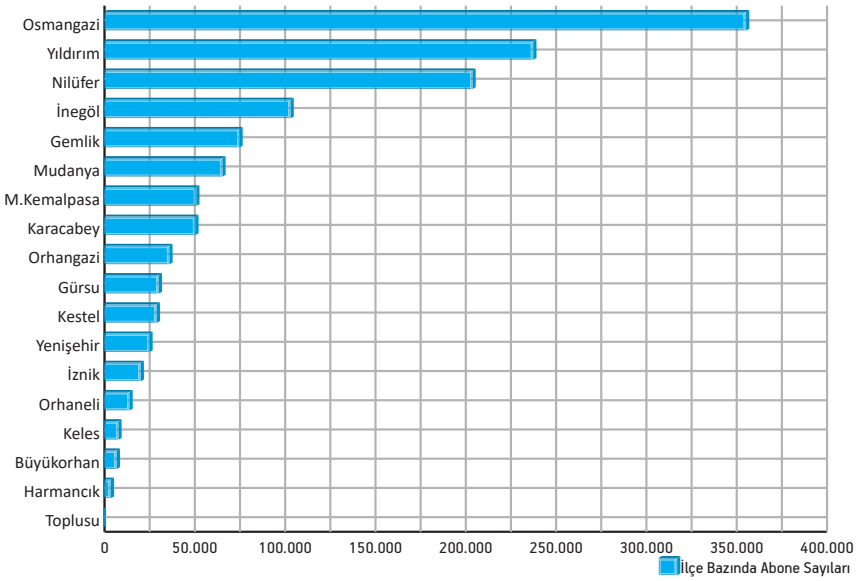

Sayaç Tiplerine Göre Abonelik Oranları

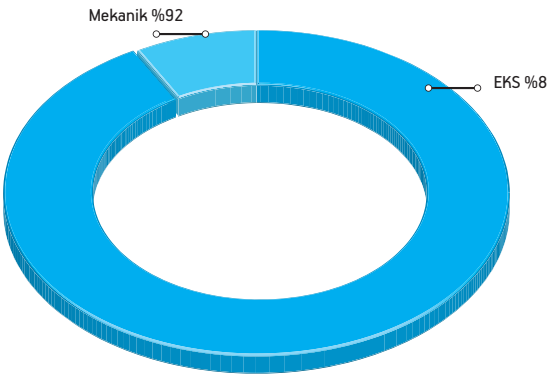

İlçe Bazında Su Tüketim Miktarları

İlçeler	Sarfiyat (m³) Toplam	İlçeler	Sarfiyat (m³) Toplam
Osmangazi	44.398.536	Orhangazi	4.292.196
Yıldırım	26.265.016	Karacabey	3.987.464
Nilufer	25.804.765	Yenişehir	2.756.501
İnegöl	10.964.269	İznik	1.968.937
Mudanya	5.930.455	Orhaneli	820.797
Gemlik	5.432.755	Keles	486.274
M.Kemalpasa	4.856.310	Büyükorhan	394.765
Gürsu	4.655.743	Harmancık	280.606
Kestel	4.423.461		
Genel Toplam			**147.718.850**

İlçe Bazında Su Tüketim Miktarı (Bin m³)

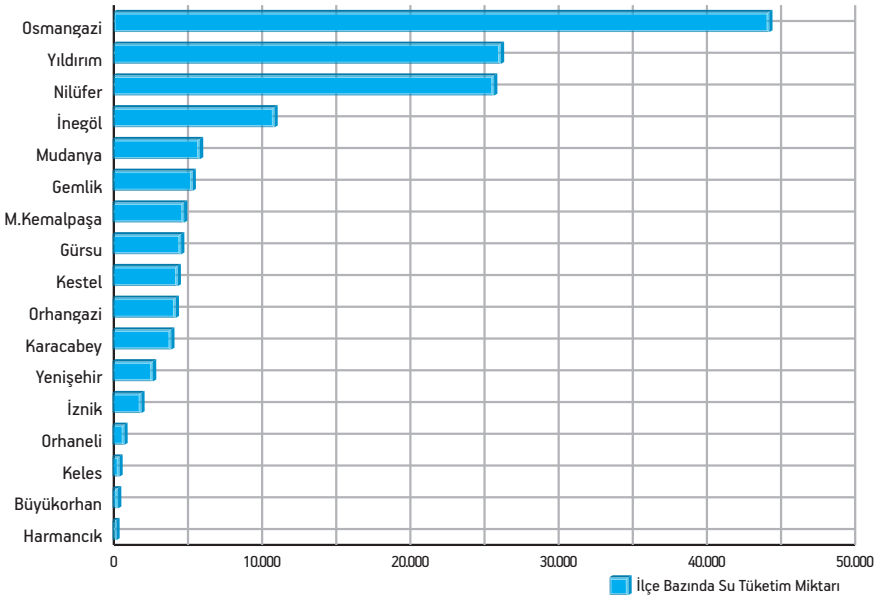

Türlerine Göre Abone Sayıları

İşyeri	114.159
Mesken	1.184.184
İnşaat	13.713
Resmi	6.109
Diğer	9.489
Toplam	**1.327.654**

İlçe Bazında Su Gelirleri Tahakkuk Tutarı

İlçeler	TL	İlçeler	TL
Osmangazi	283.796.499	Gürsu	21.684.681
Yıldırım	178.988.406	Karacabey	20.457.671
Nilüfer	178.300.587	Yenişehir	13.037.199
İnegöl	69.132.106	İznik	9.508.831
Kestel	62.194.866	Orhaneli	2.837.066
Mudanya	34.758.645	Keles	1.247.675
Gemlik	33.119.120	Büyükorhan	1.224.708
M.Kemalpaşa	22.795.535	Harmancık	1.049.386
Orhangazi	21.740.154	Diğer Gelirler	72.664.862
Toplam			**1.028.537.997**

İlçe Bazında Su Gelirleri Tahakkuk Tutarları (TL)

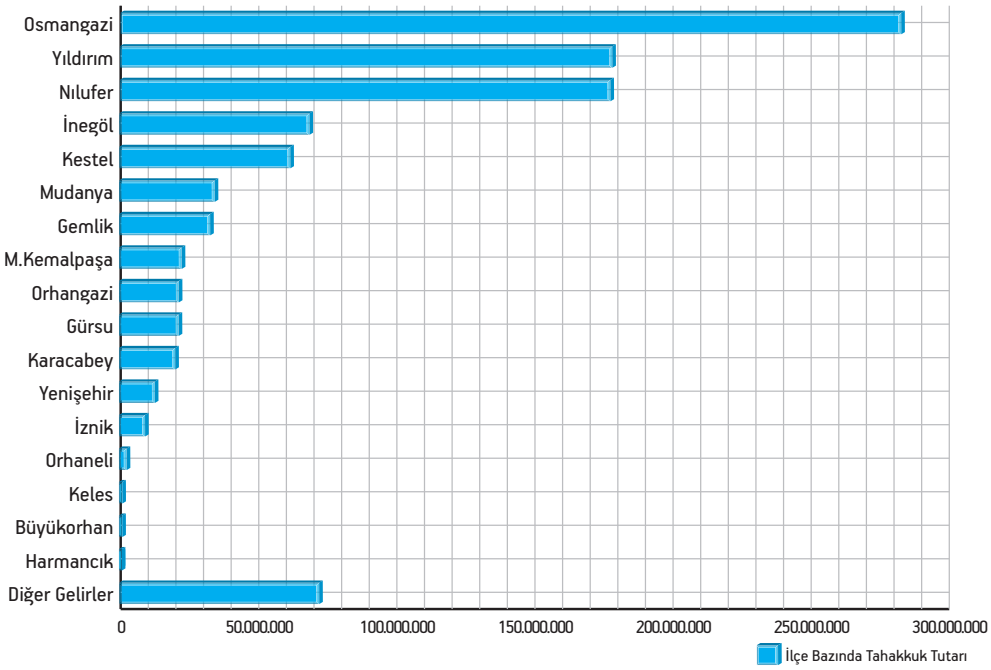

İlçe Bazında Su Gelirleri Tahakkuk Oranları

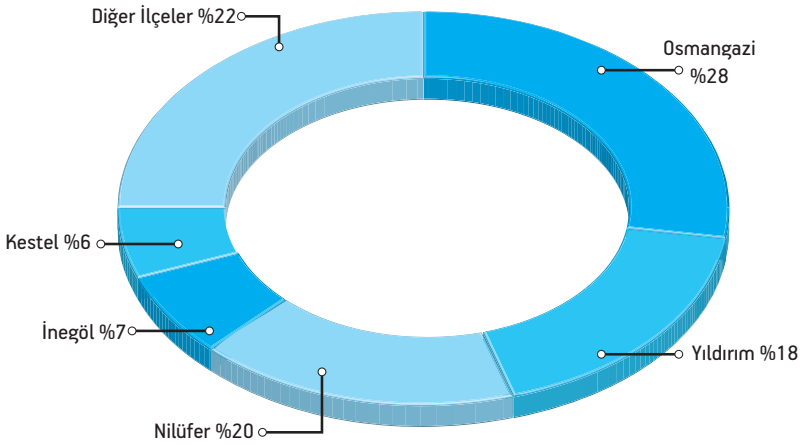

İlçe Bazında Su Gelirleri Tahsilat Tutarı

İlçeler	TL	İlçeler	TL
Osmangazi	279.134.303	Gürsu	22.563.446
Yıldırım	179.949.449	Karacabey	20.375.933
Nilüfer	183.674.900	Yenişehir	13.167.888
İnegöl	69.291.755	İznik	9.602.686
Kestel	63.082.081	Orhaneli	2.797.691
Mudanya	35.149.903	Keles	1.349.363
Gemlik	33.963.306	Büyükorhan	1.219.840
M.Kemalpaşa	23.385.257	Harmancık	1.222.691
Orhangazi	22.194.913	Diğer Gelirler	42.841.327
Toplam			**1.004.966.732**

İlçe Bazında Su Gelirleri Tahsilat Tutarları (TL)

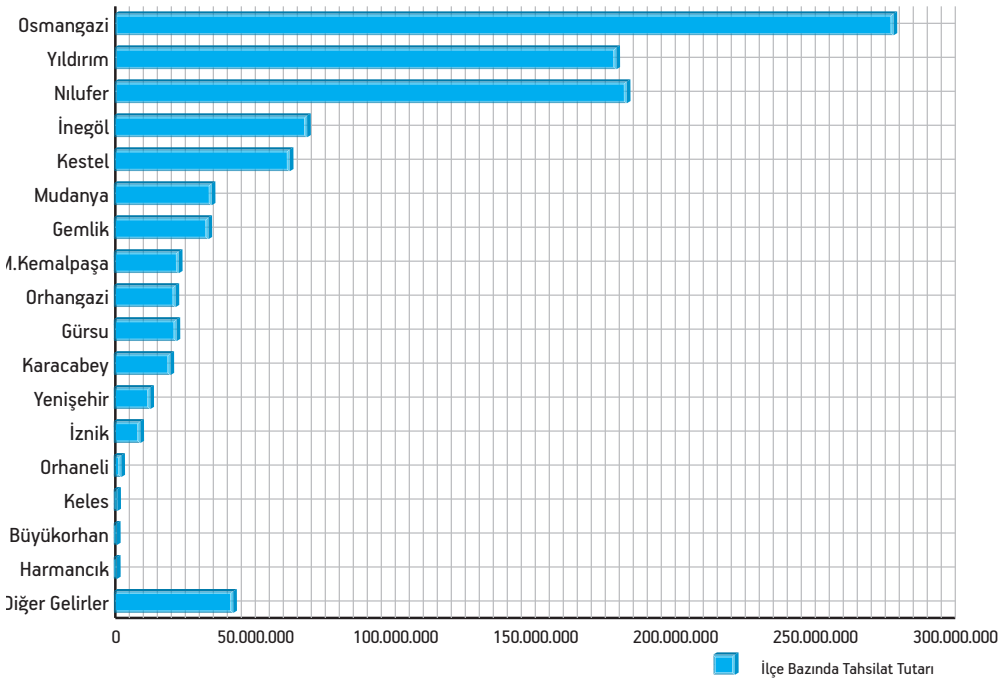

İlçe Bazında Su Gelirleri Tahsilat Oranları
(Toplam Tahsilat İçindeki Payları)

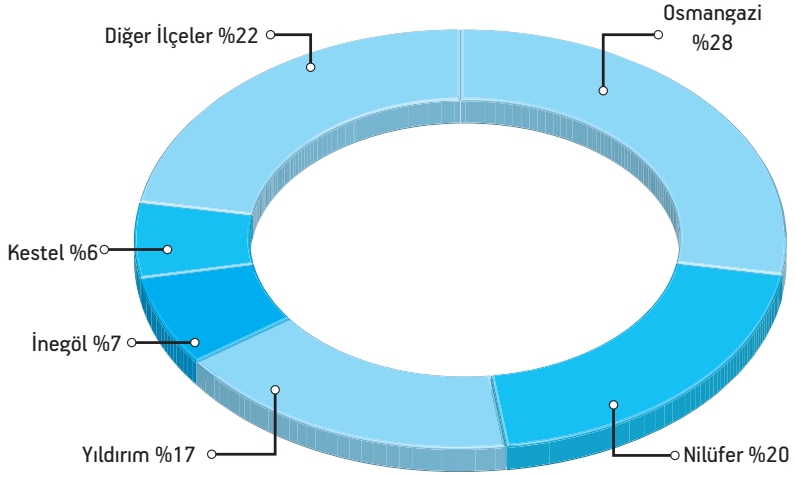

İlçe Bazında Su Gelirleri Tahsilat / Tahakkuk Tutarları

İlçeler	Tahakkuk (TL)	Tahsilat (TL)	%	İlçeler	Tahakkuk (TL)	Tahsilat (TL)	%
Osmangazi	283.796.499	279.134.303	98	Gürsu	21.684.681	22.563.446	104
Yıldırım	178.988.406	179.949.449	101	Karacabey	20.457.671	20.375.933	100
Nilüfer	178.300.587	183.674.900	103	Yenişehir	13.037.199	13.167.888	101
İnegöl	69.132.106	69.291.755	100	İznik	9.508.831	9.602.686	101
Kestel	62.194.866	63.082.081	101	Orhaneli	2.837.066	2.797.691	99
Mudanya	34.758.645	35.149.903	101	Keles	1.247.675	1.349.363	108
Gemlik	33.119.120	33.963.306	103	Büyükorhan	1.224.708	1.219.840	100
M.Kemalpaşa	22.795.535	23.385.257	103	Harmancık	1.049.386	1.222.691	117
Orhangazi	21.740.154	22.194.913	102	Diğer Gelirler	72.664.862	42.841.327	59
Toplam					**1.028.537.997**	**1.004.966.732**	**98**

İlçe Bazında Su Gelirleri Tahsilat / Tahakkuk Oranları

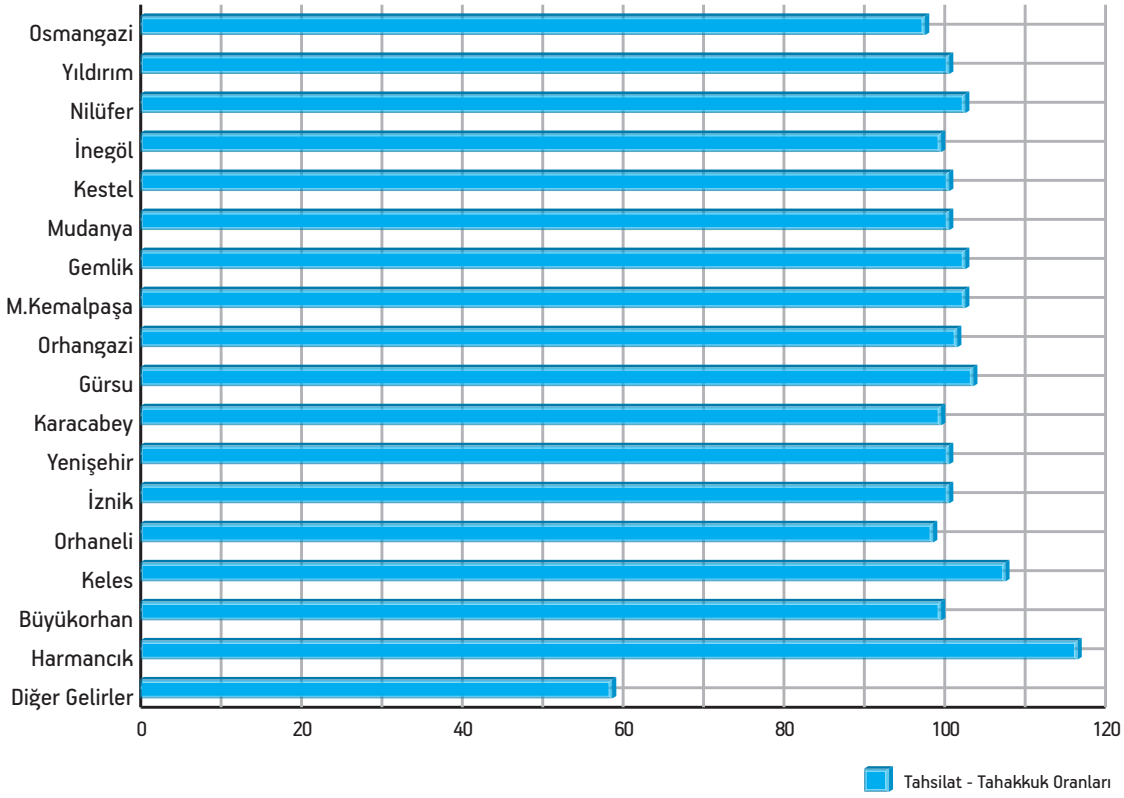

Tahsilat Kanalları

Tahsilat Kanalları	Tahsilat Oranları (%)
Bankalar + Eft	51
BUSKİ Gen. Müd. Tahsilat Şubeleri	19
Ptt	15
İnternet + Kiosk	5
Faturamatik	6
Faturavizyon	2
Enkolay	2
Toplam	**100**

Ay Bazında Üretilen - Tüketilen Kayıp Su Miktarı (milyon m³)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Kayıp Oranı
Toplam Üretilen Su Miktarı	9,18	8,57	9,51	9,43	10,02	9,96	11,05	11,25	10,53	9,88	9,08	9,03	**117.49**
Tüketim Toplamı	7,10	6,78	7,49	7,99	8,18	7,97	7,96	8,20	7,32	8,21	7,94	7,69	**92.81**
Kayıp Su Miktarı	2,08	1,78	2,01	1,44	1,84	2,00	3,10	3,06	3,21	1,67	1,14	1,34	**24.68**
Kayıp Su Yüzdesi (%)	**% 23**	**% 21**	**% 21**	**% 15**	**% 18**	**% 20**	**% 28**	**% 27**	**% 30**	**% 17**	**% 13**	**% 15**	**% 21**

Ay Bazında Üretilen - Tüketilen ve Kayıp Su Miktarları (milyon m³)

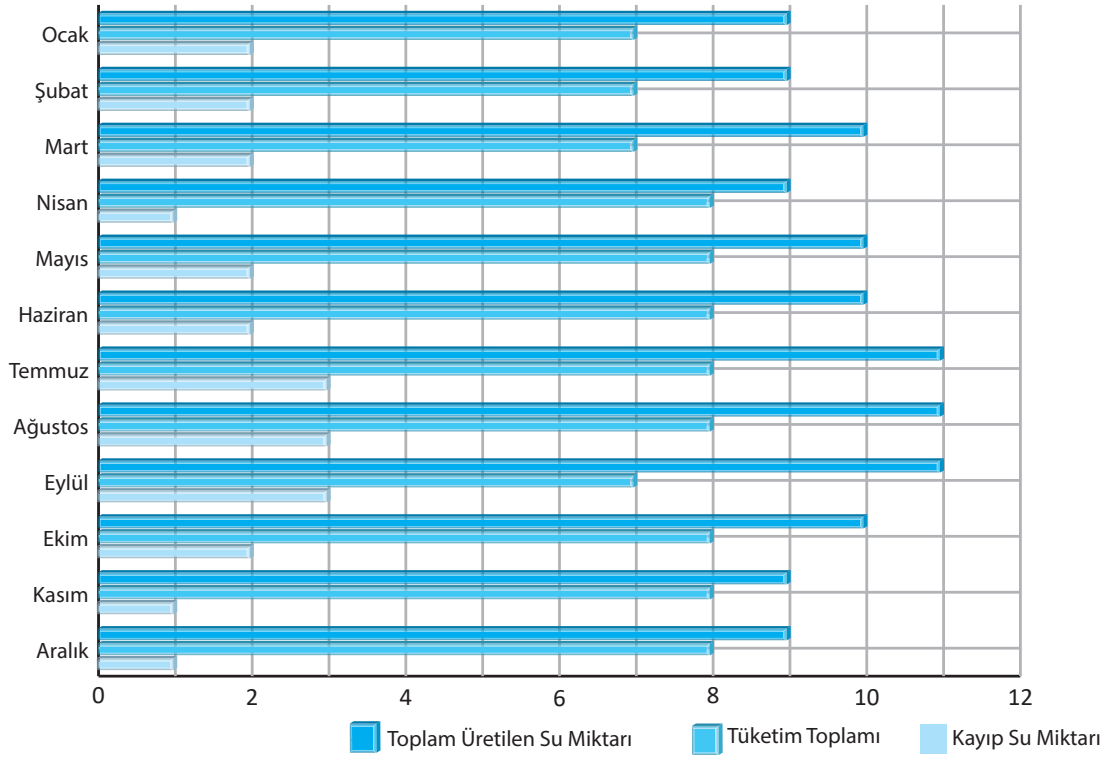

Aylara Göre Kayıp Su Oranları

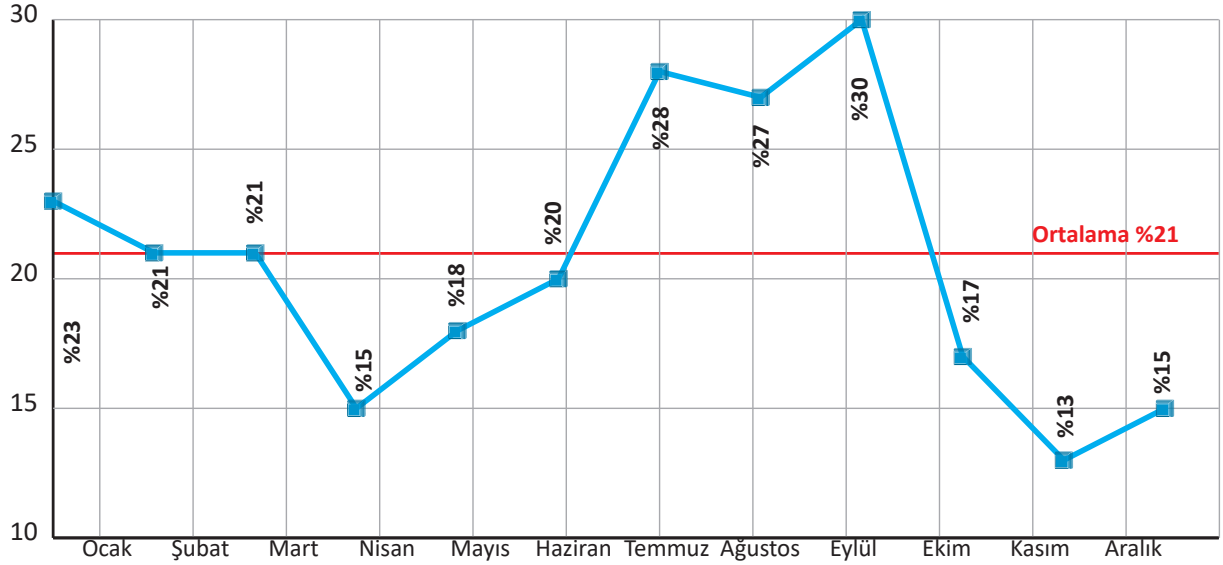



a.3. İçmesuyu İmalatları

İlçe Bazında İçmesuyu Şebeke İmalatları

İlçeler	Km	İlçeler	Km
Osmangazi	49	Orhaneli	23
Yıldırım	43	İznik	20
M.Kemalpaşa	41	Mudanya	11
Yenişehir	34	Kestel	9
Nilüfer	33	Büyükorhan	6
Karacabey	29	Harmancık	5
Keles	29	Gemlik	
Orhangazi	27	Gürsu	
İnegöl	26		
Toplam			**369**

İlçe Bazında İçmesuyu Şebeke İmalatları (km)

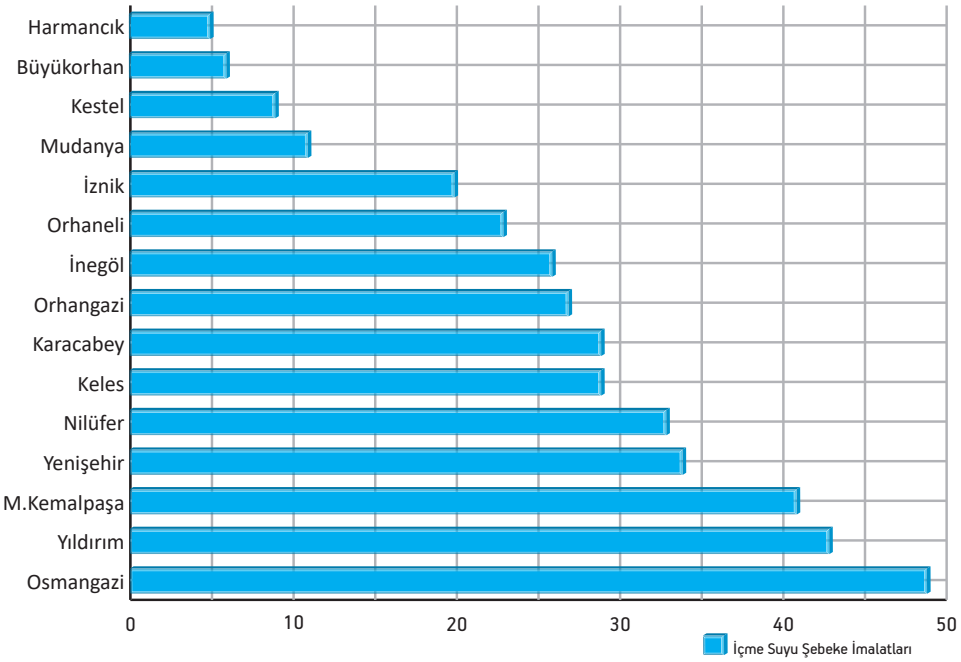

İlçe Bazında İçmesuyu Şebeke İmalat Oranları

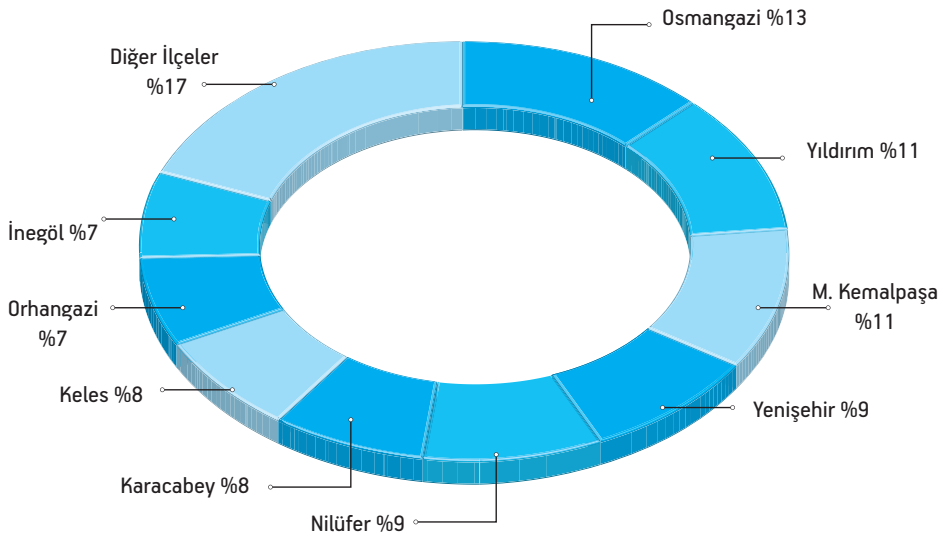

İlçe Bazında İçmesuyu İsale Hattı İmalatları

İlçeler	Km	İlçeler	Km
İznik	9	Osmangazi	3
M.Kemalpaşa	8	Nilüfer	3
Orhaneli	7	Karacabey	3
İnegöl	6	Orhangazi	2
Mudanya	5	Keles	2
Yenişehir	4	Büyükorhan	1
Toplam			**53**

İlçe Bazında İçmesuyu İsale Hattı İmalatları (km)

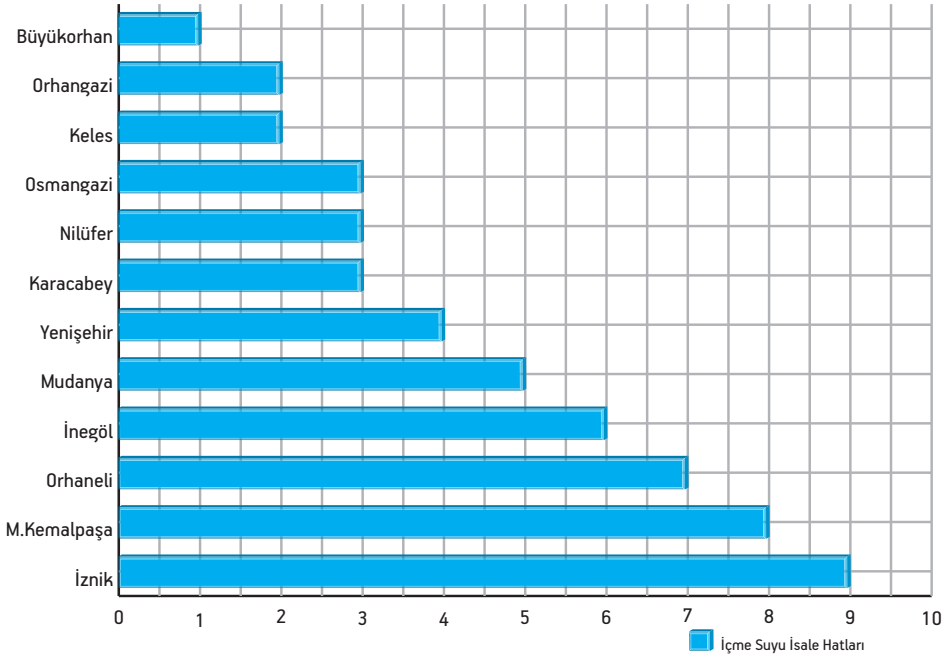

İlçe Bazında İçmesuyu İsale Hattı İmalat Oranları

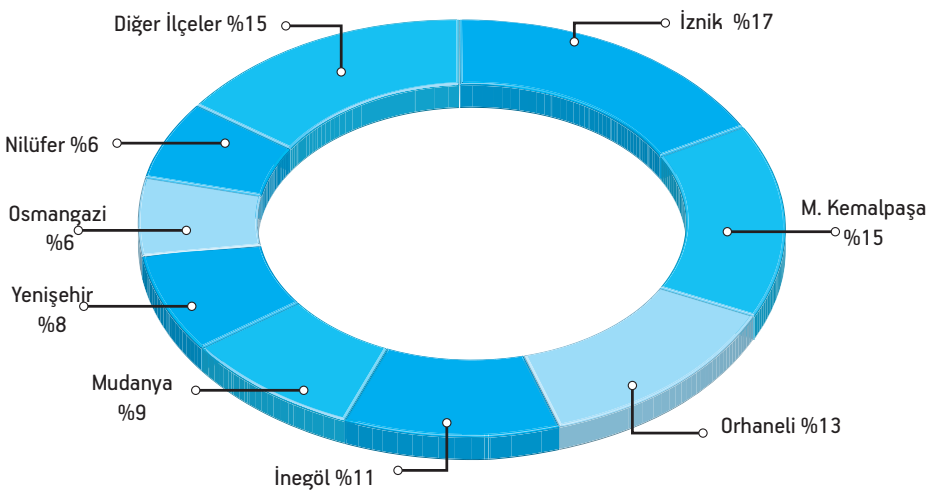

İlçe Bazında Pınar Kaynakları Islahı

İlçeler	Km
Kestel	18
Orhangazi	6
Karacabey	6
Keles	1
TOPLAM	**31**

İlçe Bazında Pınar Kaynakları Islahı (km)

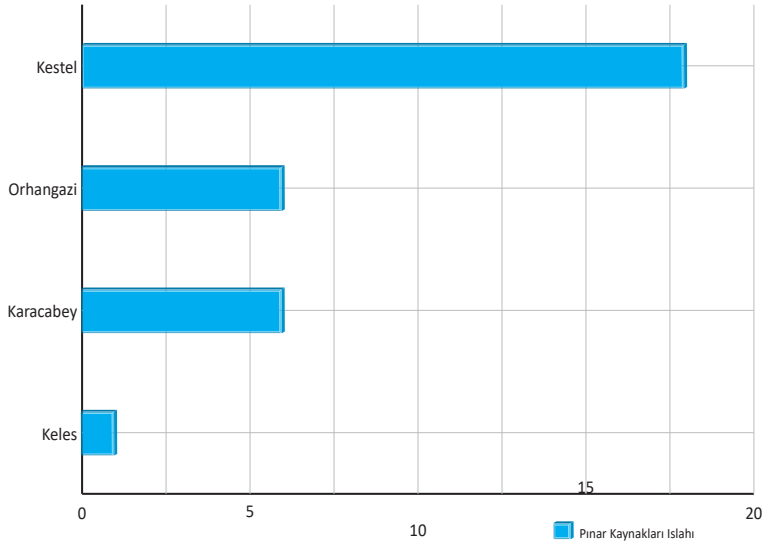

İlçe Bazında Pınar Kaynakları Islahı Oranları

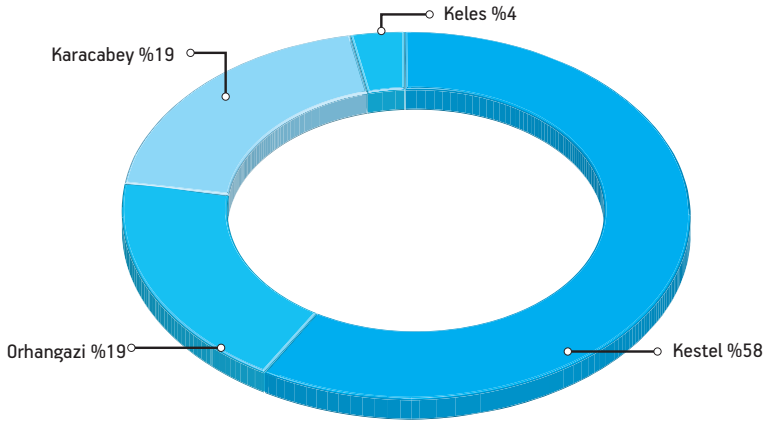

İlçe Bazında Depolar

İlçeler	Adet	Kapasite (m³)	İlçeler	Adet	Kapasite (m³)
Nilüfer	1	10.000	İnegöl	3	700
M.Kemal-paşa	5	9.000	Yenişehir	3	600
Kestel	2	1.500	Mudanya	1	300
Harmancık	7	1.400	Osmangazi	1	200
İznik	4	1.100	Orhaneli	1	200
Gemlik	1	1.000	Yıldırım	-	-
Keles	5	1.000	Gürsu	-	-
Karacabey	1	1.000	Büyükorhan	-	-
Orhangazi	1	7.500			
TOPLAM				**36**	**35.500**

İlçe Bazında Depolar (adet)

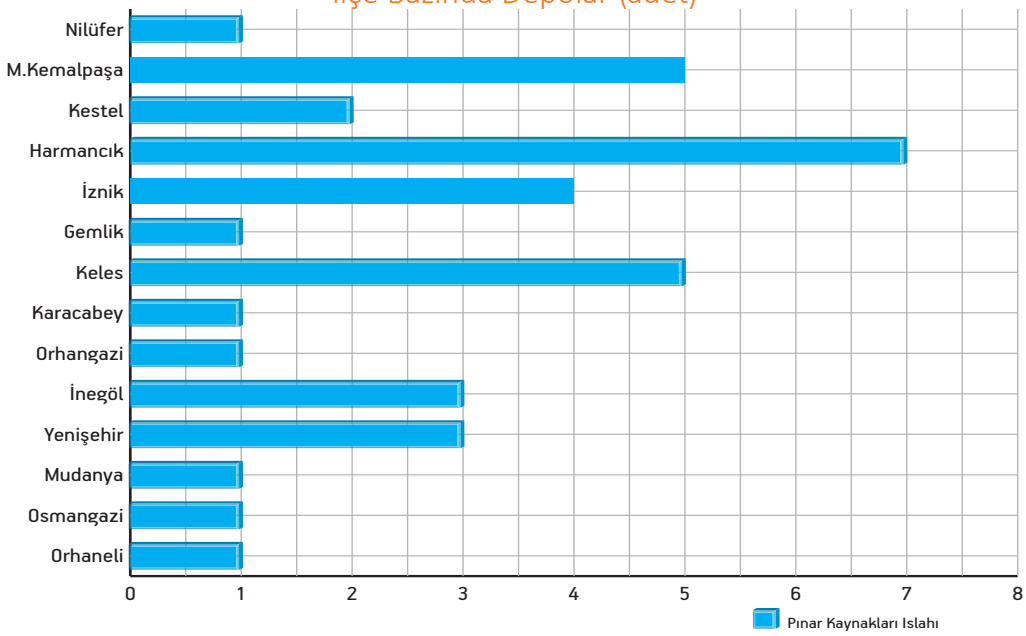

İlçe Bazında Depo Oranları

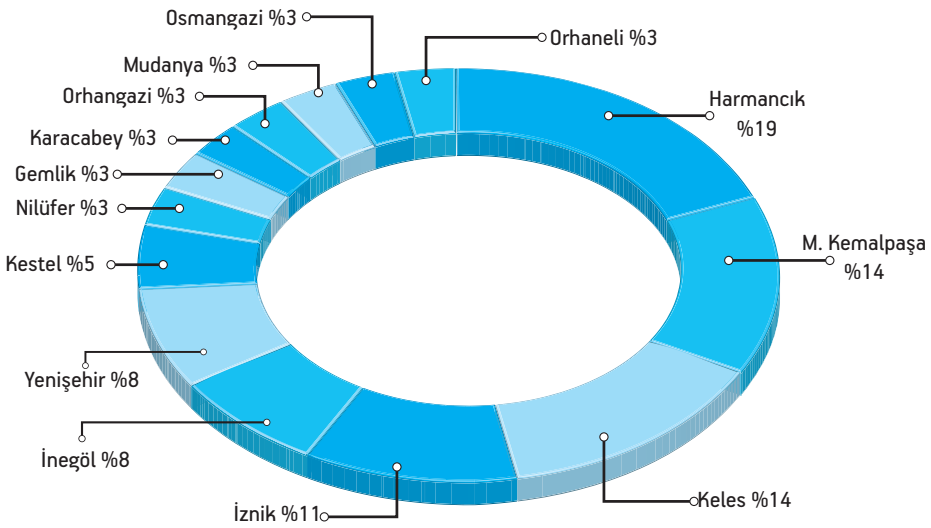


KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU
ÇALIŞMASI
TACİ TOSUN LTD. ŞTİ.

b. Yağmur Suyu, Dere Islahı ve Kanalizasyon Hizmetleri

İlçe Bazında Yağmur Suyu Şebeke İmalatları

İlçeler	m	İlçeler	m
Orhangazi	-	Gemlik	1.294
Orhaneli	-	İznik	1.566
Yenişehir	84	Keles	3.933
Kestel	333	Karacabey	6.755
Mudanya	781	Osmangazi	7.454
M.Kemalpaşa	830	Nilüfer	7.758
Yıldırım	906	Harmancık	10.385
Büyükorhan	4.104	İnegöl	12.337
Gürsu	1.382		
TOPLAM			**59.902**

İlçe Bazında Yağmur Suyu Şebeke İmalatları (m)

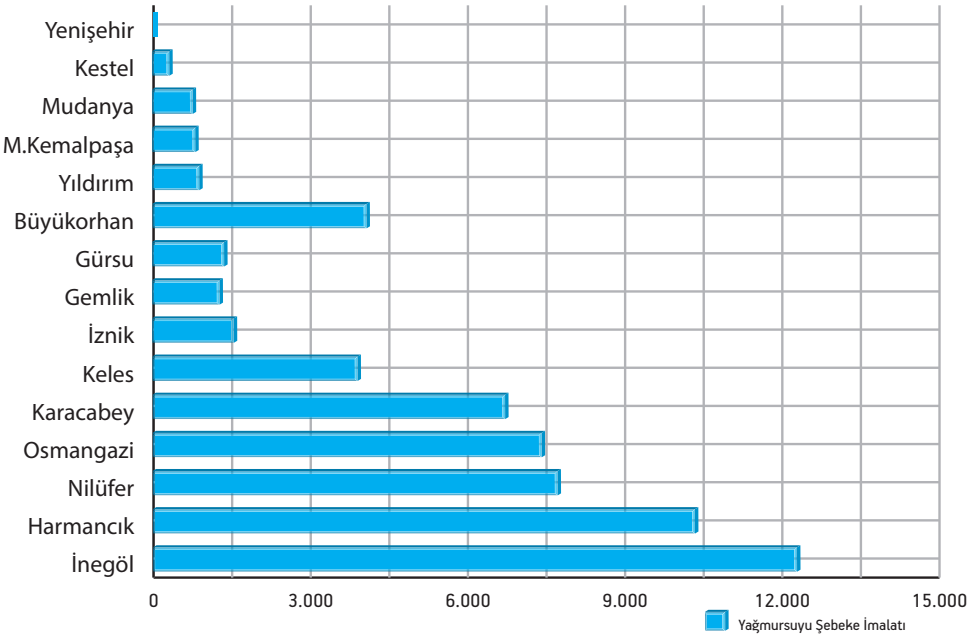

İlçe Bazında Yağmur Suyu Şebeke İmalat Oranları

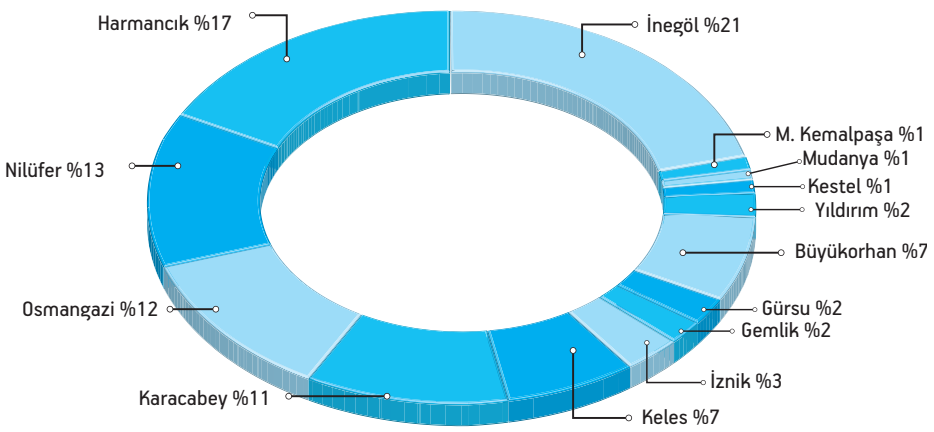

İlçe Bazında Kanalizasyon Şebeke İmalatları

İlçeler	m	İlçeler	m
Orhaneli	-	M.Kemalpaşa	4.903
Orhangazi	171	Büyükorhan	10.349
Kestel	771	Gemlik	8.299
Gürsu	2.473	Karacabey	9.493
Keles	3.148	Osmangazi	12.135
Yenişehir	3.707	Harmancık	14.843
Mudanya	4.275	Nilüfer	21.479
Yıldırım	4.191	İnegöl	22.381
İznik	4.391		
TOPLAM			**127.009**

İlçe Bazında Kanalizasyon Şebeke İmalatları (m)

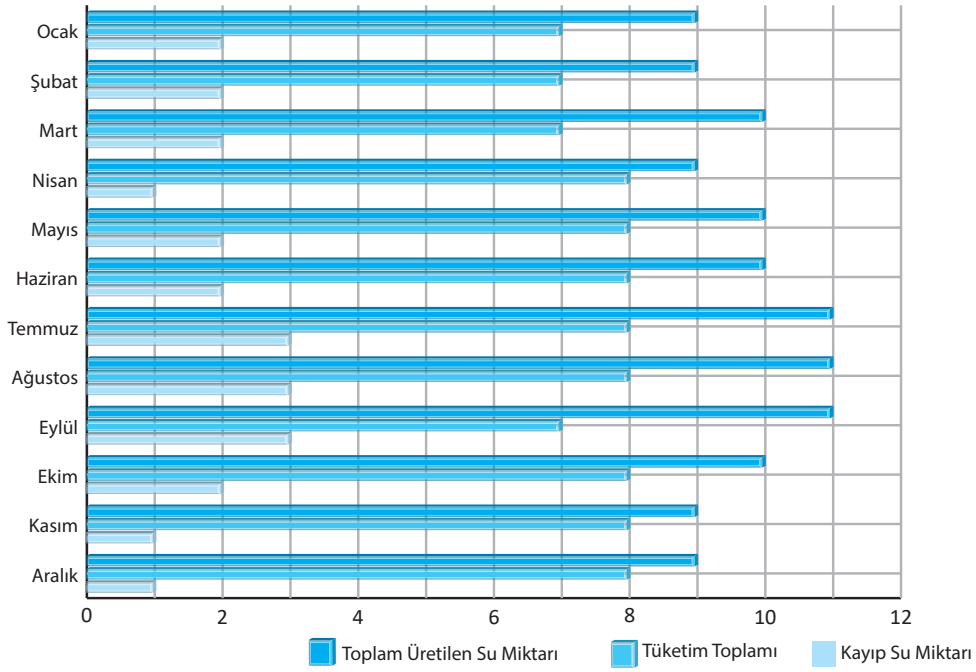

İlçe Bazında Kanalizasyon Şebeke İmalat Oranları

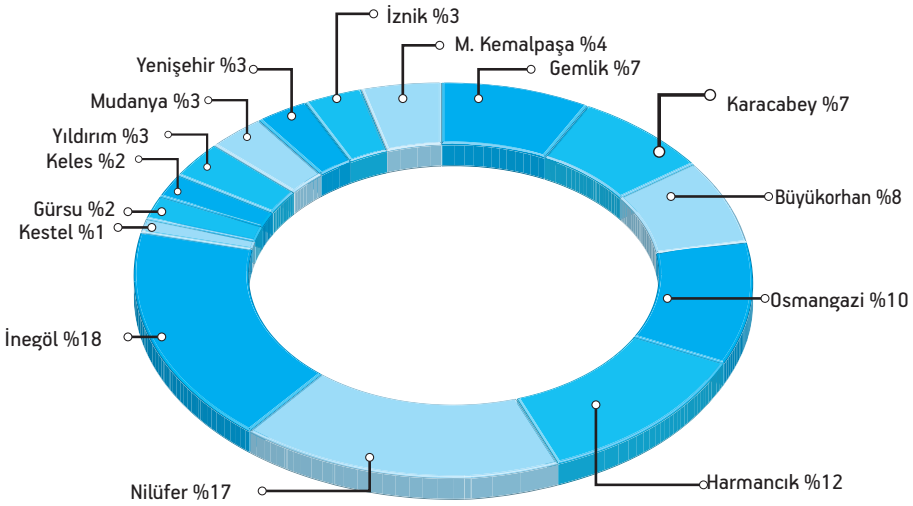

İlçe Bazında Dere Islahı

İlçeler	m
Yıldırım	736
Mudanya	262
Nilüfer	58
TOPLAM	**1.056**

İlçe Bazında Dere Islahı (m)

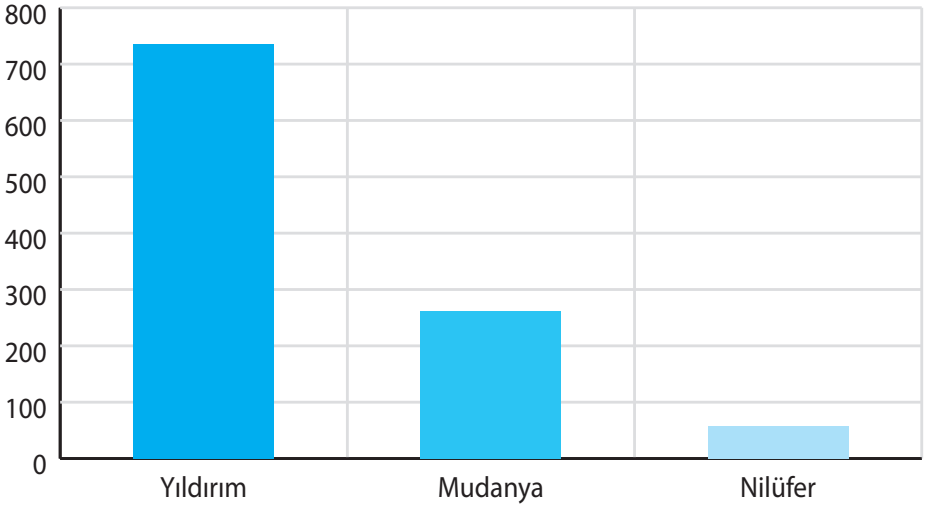



Çaydarbe Islah Çalışması

c. Çevre Koruma ve Arıtma Hizmetleri

İçme Suyu Laboratuvarında Yapılan Analiz Sayıları

	Adet
Genel (40 parametre)	157.628
Ağır Metal (12 parametre)	27.714
Mikrobiyolojik (8 parametre)	37.456
Toplam (60 parametre)	227.176

Atıksu Laboratuvarında Yapılan Analiz Sayıları

	Adet
Genel (36 parametre)	23.722
Ağır Metal (15 parametre)	12.981
Toplam (51 parametre)	36.703

Atıksu Kalite Ruhsatlandırma ve Denetleme İşlemi Yapılan İşyeri Sayıları

	Adet
Yeni Tepit Edilen İşyeri	526
Kapanan İşyeri Sayısı	77
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Sevk Edilen Toplam İşyeri Sayısı*	13
Ruhsat Kapsam Dışı Yazısı Verilen İşyeri Sayısı	323
İşlemlerini Tamamladığından Dolayı Ruhsat Kapsam Dışı YazısıVerilmeyen /Belgesiz Ruhsat Dışı Bırakılan İşyeri Sayısı	20
Genel Toplama Göre AKKR Kapsamında Olan Toplam İşyeri	735
AKKR Onaylanan İşyeri	163
Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Olan Toplam İşyeri	393
Genel Toplamlara Göre AKKR Onaylanma Oranı (%)	53,47
AKKR Süresi Dolan İşyeri (2018 yılı içerisinde Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı süresi dolacak toplam işletme sayısı 10 ‘ dur.)	-
KÖP Tahakkuku Yapılan İşletme sayısı	141
KÖP Tahakkuku Yapılan Toplam İşletme sayısı	292
AKKR Belgesini Alan Toplam İşletme Sayısı ve Yüzdeliği	145-%49,65
Tahakkuk Ettirilen Toplam KÖP Bedeli (TL)	20.732.156,13
Tahsilatı Yapılan Toplam KÖP Bedeli ve Yüzdeliği (TL)	3.059.914,82 - %15

Çamur Bertarafı

Kentimizde oluşan atıksu arıtma çamurlarının çevresel ve ekonomik etkiler dikkate alınarak en uygun şekilde bertaraf edilmesi, tüm büyükşehirlerde olduğu gibi bizim için de önemli bir problemdir. Çamur bertarafı için akışkan yataklı yakma teknolojisi günümüzde AB ülkelerinde, Japonya ve ABD'de en çok kullanılan uygulamadır. Bu tesislerin İleri teknoloji ile emisyon kontrol uygulamaları, çevresel hassasiyetleri daha kolay karşılayabilmekte ve bu durum yanma ve enerji elde etme eğilimini öne çıkarmaktadır.

Bursa'mızda Temmuz 2017 itibariyle işletilmesine başlanan Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Tesisimiz çamurun yerinde en az çevresel etki oluşturarak ve tüm çevresel sınırlamaları karşılayacak şekilde bertaraf edildiği örnek bir tesistir. Toplam 96 ton kuru-katı madde/gün içerikli çamur yakma kapasitesine göre çift hat olarak tasarlanan sistemde yakma gerçekleştirilmektedir. Tesisin devreye girmesiyle arıtma çamurları artık lagünlerde depolanmamakta ve bu şekilde çamur depolanırken verilen çevresel açıdan zararlı etkilerin ve rahatsızlıkların önüne geçilmiştir.

Tesis çevre izin ve lisansını almaya hak kazanmış olup; son aşamada prosedür olarak eksiklikler tamamlanmaktadır. Emisyon konusunda Türkiye de örnek bir tesis olup; ilgili Türk ve AB kriterleri istisnasız sağlanmaktadır. Emisyonla ilgili değerler için online izleme istasyonu bulunmakta ve tüm değerler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlenmektedir.

Tesisin devreye girmesi ile şuana kadar yaklaşık 35.000 ton çamurun bertarafı gerçekleştirilmiş ve 3.000.000 KW elektrik üretimi sağlanmıştır. Üretilen elektrik atıksu arıtma tesisinin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamak için kullanılmıştır.

Tesisin öne çıkan teknik özellikleri aşağıda yer almaktadır.

- Emisyon arıtım sistemi çok kademeli olarak çoklu siklon, aktif karbon/kireç reaktörü, torba filtre ve dolgu yataklı yıkama kulesinden oluşmakta olup; 4 kademeli arıtım ile ekstra emisyon güvenliği sağlanmıştır. Tesis emisyon arıtım sistemi ile AB Atık Yakma Direktifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik başta olmak üzere tüm ilgili Türk ve Avrupa Yönetmeliklerinde belirtilen hususları istisnasız sağlamaktadır.
- Tesiste elektrik üretimi yakma sonucu oluşan termal güçle atıkısı kazanları vasıtasıyla kızgın buhar üretimi yapılır. Elde edilen kızgın buhar izole ve basınca dayanıklı borular yardımıyla buhar türbinine besleme yapılarak türbin kanatlarının dönmesi sağlanır ve termal enerji mekanik enerjiye dönüştürülerek elektrik enerjisi üretilmektedir.
- Yakma tesisinin yapımı için yurt dışından know-how yöntemi ile teknoloji transferi yapılmış ve bu teknolojinin yerli olarak üretimi sağlanmıştır.
- Ortamın ısıl ataletini artıran bir kum yatağı sayesinde, daha esnek bir yakma işlemi sağlanmaktadır.
- Baca gazındaki enerjinin en iyi şekilde geri kazanımı temin edilerek akışkanlaştırma havasının yaklaşık 670°C'de kazana geri beslenerek fosil yakıt kullanımı asgariye düşürülmektedir.
- Kolayca başlatılabilen ve durdurulabilen bir sistemdir. Bu özelliği bakım süresi için çok büyük bir avantaj teşkil etmektedir.



Çamur Bertarafı Tesisi

d. Kamulaştırma Faaliyetleri

İlçe Bazında Kamulaştırılan Alan (m²)

İlçeler	Toplam	İlçeler	Toplam
M. Kemalpaşa	43.337	İznik	2.557
İnegöl	39.633	Yenişehir	1.475
Karacabey	32.506	Osmangazi	1.332
Keles	15.794	Orhaneli	1.198
Mudanya	8.324	Orhangazi	208
Nilüfer	5.059	Gemlik	1
Kestel	4.935		
TOPLAM			**156.358**

Altyapı Türüne Göre Kamulaştırılan Alan (m²)

Altyapı Türü	M.K.Paşa	İnegöl	Karacabey	Keles	Mudanya	Nilüfer	Kestel	İznik	Yenişehir	Osmangazi	Orhaneli	Orhangazi	Gemlik	Genel Toplam
Atıksu	9.800	97	18.178		5.083	5.027		310		1.332		208		**40.035**
Hizmet Binası	-	-	-	2.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.575**
İçmesuyu	33.537	17.366	3.928	13.220	1.261	32	109		1.475		1.198		1	**72.125**
Sulama	-	22.169	10.400	-	1.980	-	4.826	2.248	-	-	-	-	-	**41.623**
Toplam	**43.337**	**39.633**	**32.506**	**15.794**	**8.324**	**5.059**	**4.935**	**2.557**	**1.475**	**1.332**	**1.198**	**208**	**1**	**156.358**

İlçe Bazında Altyapı Türüne Göre Kamulaştırılan Alan Dağılımı

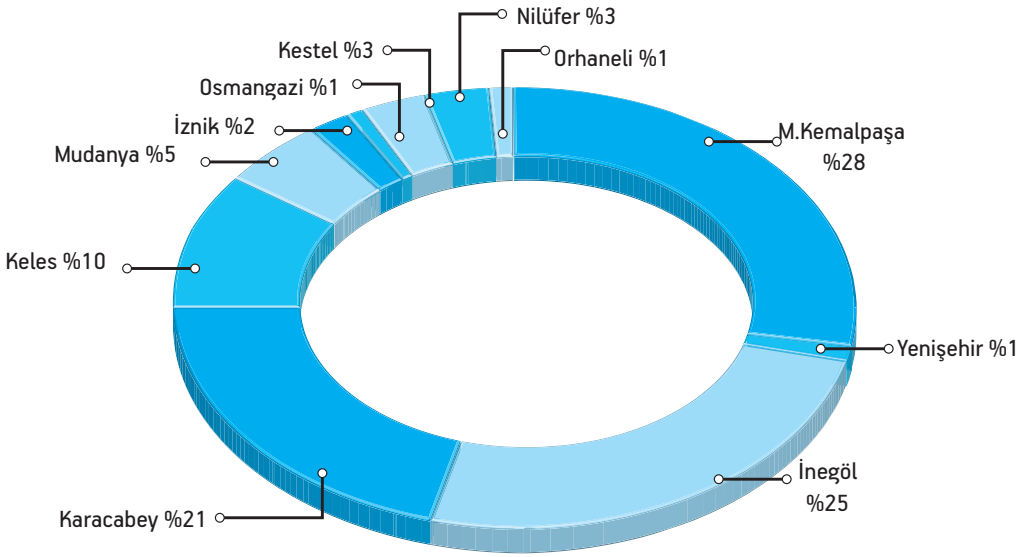

Fotogrametrik Harita Üretimi Projesi M5

"Bursa mülki il sınırını kapsayan yaklaşık 12 000 km² alan içinde 1/1000 ölçekli ortofoto haritalar ile yaklaşık 8500 km² lik alan içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli vektör haritaların üretimi (M5) projesi" 29.05.2014 tarihinde sözleşme imzalanıp 04.06.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 12000 km² lik M5 Proje Alanındaki 133 Adet Blokta; 2014-2015 yıllarında tesisleri tamamlanan 69 Adet C1, 100 Adet C2, 1447 Adet C3 yer kontrol noktaları ile 880 km uzunluğunda geometrik nivelman gerçekleştirildi ve tüm hesapları tamamlandı.2016 ve 2017 yıllarında toplam 8500 km²'lik alan değerlendirildi ve bütünleme çalışmaları tamamlandı. Müşavirin; Stereo, bütünleme, ortofoto, kartografik, geometri kontrolleri tamamlanmasının ardından, onaylanan toplam 21820 adet 1/1000 ölçekli Sayısal Ortofoto görüntü ile onaylı 1/1000 ölçekli polyester pafta ve 1417 adet 1/5000 ölçekli Sayısal Ortofoto görüntü ile onaylı 1/5000 ölçekli polyester pafta BUSKİ Harita Bilgi ve Belgeleri Arşivine kazandırıldı.

2018 yılında M5 projesi iş artışı kapsamında 2500 km²'lik alanda halihazır haritaların güncellenmesine başlanmıştır. Güncelleme işlemleri için 1050 km²'lik alanda fotogrametrik uçuş gerçekleştirilmiş, 59 adet yeni C3 noktası tesis edilmiş ve 107 adet noktada yenileme çalışması gerçekleştirilmiştir. İş artışı kapsamında yüklenici tarafından 2500 km²'lik alan değerlendirildi ve bütünleme çalışmaları tamamlandı. Daire Başkanlığımız tarafından Stereo, bütünleme, ortofoto, kartografik, geometri kontrollerin tamamlanmasının ardından, onaylanan toplam 6775 adet 1/1000 ölçekli Sayısal Ortofoto görüntü ile onaylı 1/1000 ölçekli polyester pafta ve 450 adet 1/5000 ölçekli Sayısal Ortofoto görüntü ile onaylı 1/5000 ölçekli polyester pafta BUSKİ Harita Bilgi ve Belgeleri Arşivine kazandırıldı. 13/11/2018 tarihinde M5 Projesinin Kesin Kabulü yapılarak proje tamamlanmıştır.

Proje Kontrol ve Aplikasyon Faaliyetleri

Aplikasyon (Adet Nokta)	457
Proje Kontrol ölçmeleri (Adet Proje)	6
Boykesit ve Enkesit Ölçmeleri (m)	29410
Detay,Plankote ve Hacim Belirleme Ölçmeleri (m²)	724.184



İlçe Bazında Tahsis Alınan Alanlar

İlçeler	m²	İlçeler	m²
Karacabey	64.070	Orhangazi	5.929
Harmancık	41.835	Gemlik	11.263
Kestel	40.099	Keles	5.092
İnegöl	29.254	Orhaneli	634
Mudanya	17.716	M.Kelmalpaşa	198.859
Yenişehir	16.543	İznik	127.262
TOPLAM			**558.556**

İlçe Bazında Tahsis Alınan Alan Oranları

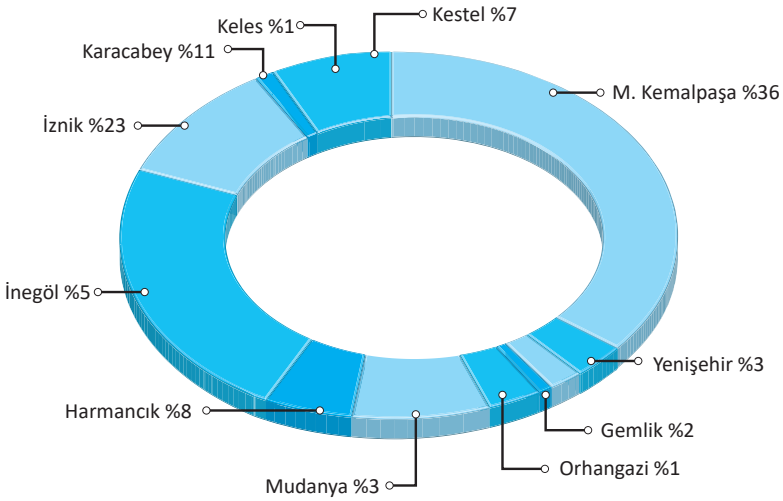

İlçe Bazında Tahsis Sayısı

İlçeler	Adet	İlçeler	Adet
M.Kelmalpaşa	9	Kestel	2
İznik	8	Karacabey	2
İnegöl	5	Harmancık	2
Yenişehir	5	Orhaneli	2
Mudanya	5	Orhangazi	1
Gemlik	3	Keles	1
TOPLAM			**45**

İlçe Bazında Tahsis Sayısı Oranları

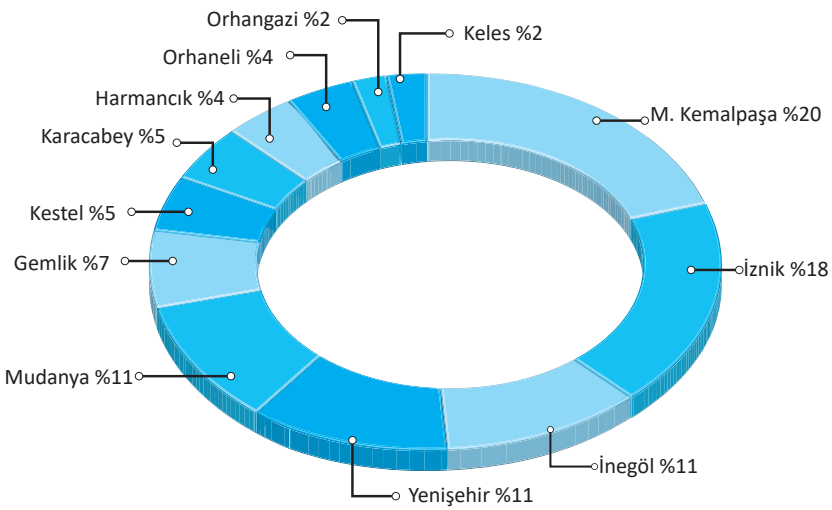

İlçe Bazında Tescil Sayısı

İlçeler	Adet	İlçeler	Adet
Kestel	44	Osmangazi	5
Nilüfer	32	Karacabey	4
İnegöl	27	Gemlik	3
Keles	26	Yenişehir	2
M.K.Paşa	21	İznik	1
Mudanya	17	Orhaneli	1
TOPLAM			**183**

İlçe Bazında Tescil Oranları

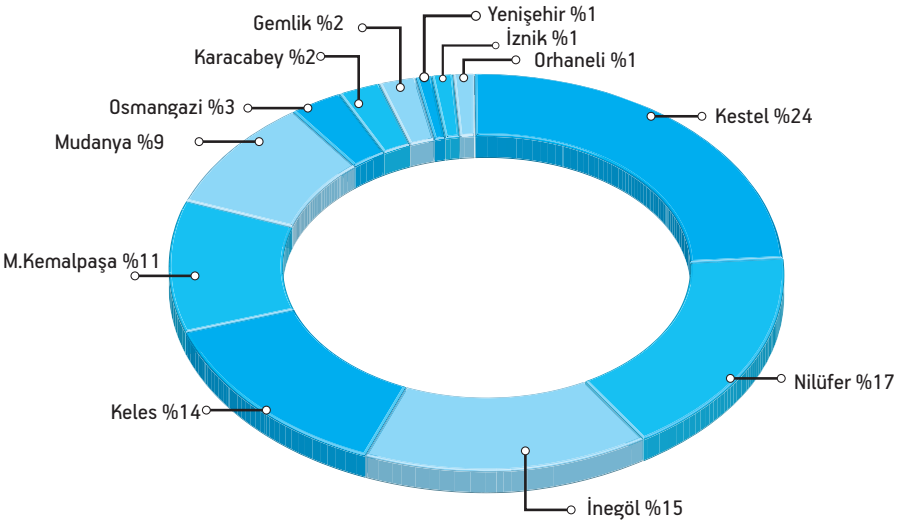

İlçe Bazında İrtifak Alanları

İlçeler	m²
Mudanya	2.067
Nilüfer	1.667
Osmangazi	1.060
Kestel	239
Orhaneli	87
Toplam	**5.120**

İlçe Bazında İrtifak Alan Oranları

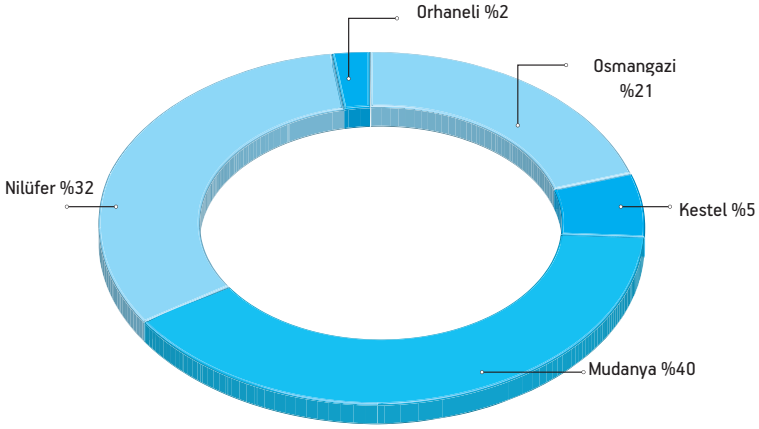

Altyapı Türüne Göre İrtifak Sayısı

İlçeler	Adet
Nilüfer	12
Mudanya	6
Kestel	2
Osmangazi	3
Orhaneli	1
Toplam	**24**

İlçe Bazında Altyapı Türüne Göre İrtifak Oranları

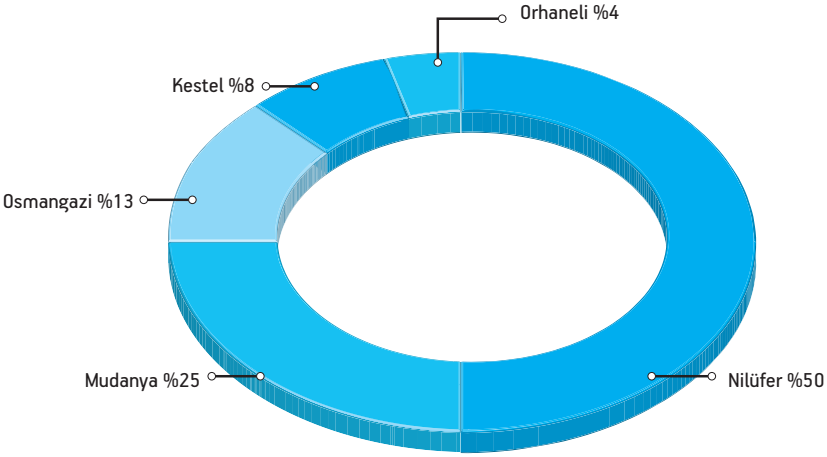



e. Asfalt Yama ve Kaplama Çalışmaları

İlçe Bazında Yapılan Asfalt Yama ve Kaplama Çalışmaları (Ton)

İlçe	Asfalt Yama	Asfalt Kaplama	Toplam
Osmangazi	30.667	16.107	46.774
Karacabey	3.447	23.166	26.613
Nilüfer	15.053	5.647	20.700
Yıldırım	12.197	3.475	15.672
İnegöl	8.424	6.306	14.729
Yenişehir	1.707	10.862	12.569
Keles	1.220	8.706	9.926
Orhangazi	2.690	4.400	7.090
Mudanya	4.477	2.458	6.935
Gemlik	2.711	2.645	5.356
M.Kemalpaşa	1.975	2.436	4.412
Büyükorhan	0	3.619	3.619
Kestel	3.166	281	3.447
Gürsu	2.182	0	2.182
İznik	1.403	0	1.403
Orhaneli	-	-	-
Harmancık	-	-	-
Toplam	**91.320**	**90.109**	**181.429**

İlçe Bazında Yapılan Asfalt Yama ve Kaplama Çalışmaları (Ton)

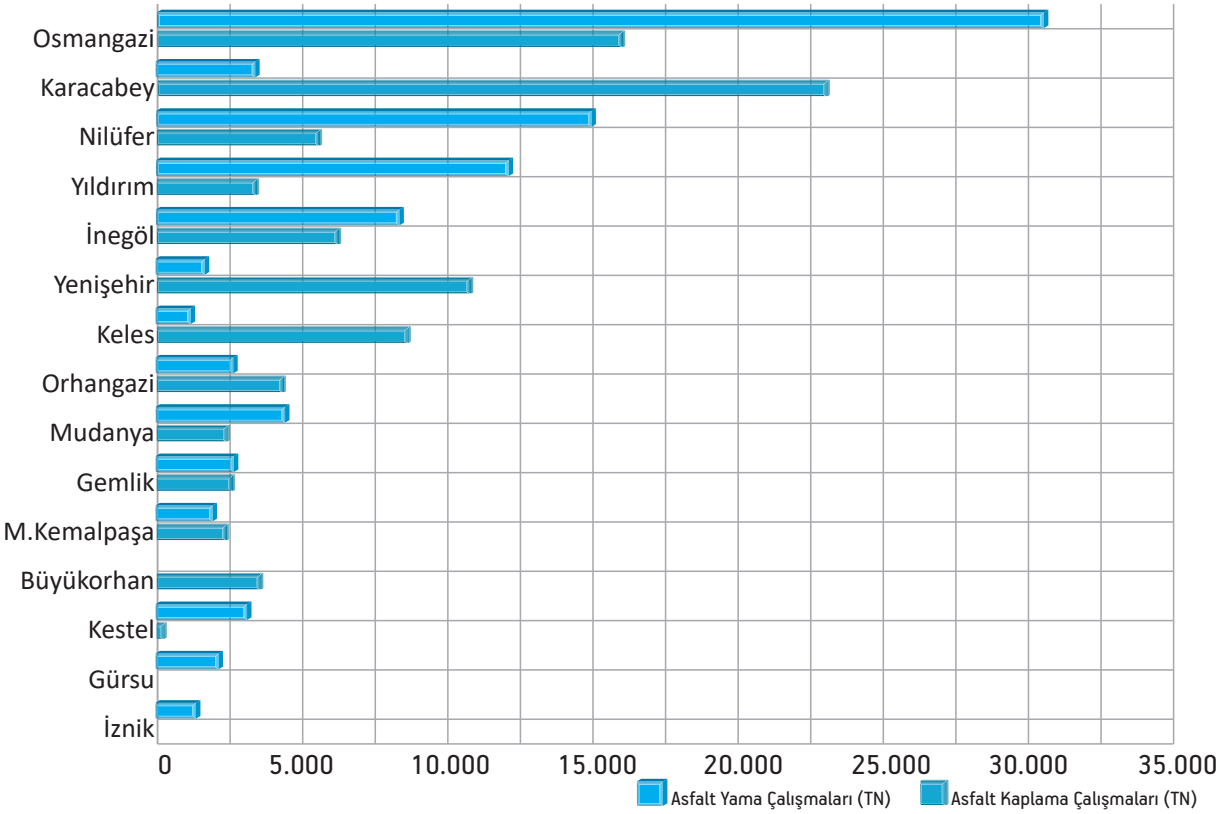

f. Abonelik Çalışmaları

İlçe Bazında Abonelik Çalışmaları (Adet)

İlçe	Yeni Abonelik	Takılan Sayaç
Nilüfer	5.738	5.498
İnegöl	4.315	4.315
Orhangazi	1.262	4.955
Mudanya	3.009	1.952
Kestel	1.611	3.134
Gemlik	2.455	2.081
Karacabey	1.766	1.751
Osmangazi	1.447	1.664
Yıldırım	975	1.889
Gürsu	1.306	1.114
Yenişehir	616	1.595
İznik	712	1.256
Mustafakemalpaşa	1.275	136
Orhaneli	321	1.049
Harmancık	54	629
Büyükorhan	70	593
Keles	242	278
TOPLAM	**27.174**	**33.889**

İlçe Bazında Abonelik Çalışmaları (Adet)

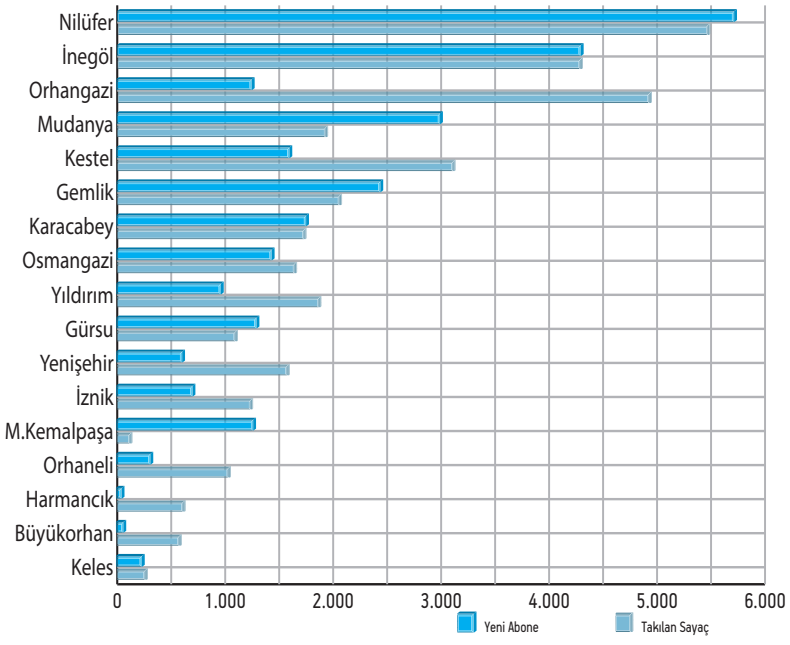

Abonelik Çalışmaları Dağılımı

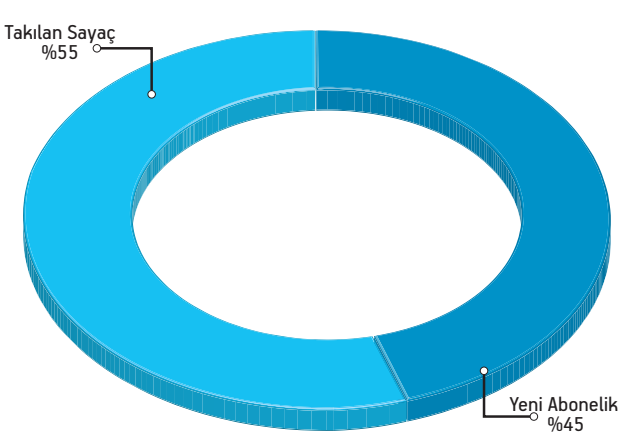

g. İçmesuyu ve Kanal Evsel Bağlantı Çalışmaları

İlçe Bazında İçmesuyu ve Kanal Evsel Bağlantı Çalışmaları (m)

İlçe	İçmesuyu	Kanal	Toplam
Osmangazi	8.801	8.637	**17.438**
Nilüfer	4.013	8.658	**12.672**
Yıldırım	4.649	4.864	**9.513**
İnegöl	4.473	4.686	**9.159**
Gemlik	7.813	0	**7.813**
Yenişehir	3.211	3.063	**6.274**
M. Kemalpaşa	2.223	1.135	**3.358**
Gürsu	2.892	0	**2.892**
Keles	2.068	765	**2.833**
Toplam			

İlçe	İçmesuyu	Kanal	Toplam
Karacabey	1.225	461	**1.686**
Orhangazi	829	490	**1.319**
Büyükorhan	693	410	**1.103**
Kestel	638	0	**638**
Orhaneli	240	179	**419**
Mudanya	289	34	**323**
İznik	164	133	**297**
Harmancık	54	13	**67**
Toplam	**44.276**	**33.528**	**77.804**

İlçe Bazında İçmesuyu ve Kanal Evsel Bağlantı Çalışmaları (m)

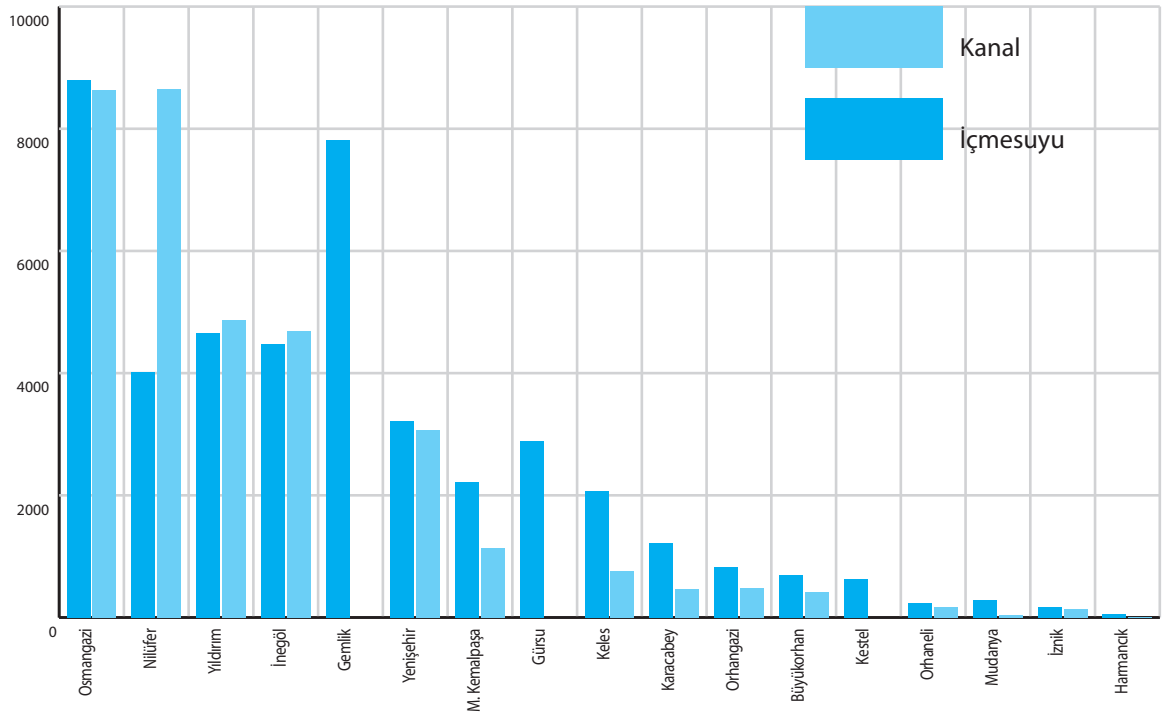

İçmesuyu ve Kanal Evsel Bağlantı Dağılımı

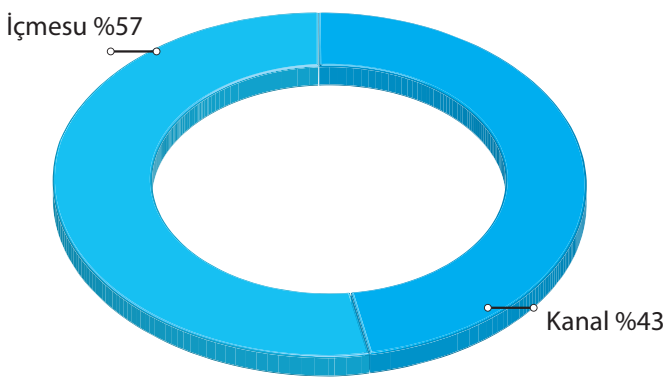

h. Arıza Tamir Çalışmaları

İlçe Bazında Arıza Tamir Çalışmaları (Adet)

İlçeler	İçmesuyu Arıza	Kanal Arıza	Toplam
Osmangazi	10.846	2.686	**13.532**
İnegöl	6.492	6.492	**12.984**
Yıldırım	5.629	5.629	**11.258**
Nilüfer	5.331	5.331	**10.662**
Mudanya	4.420	4.420	**8.840**
M.Kemalpaşa	4.372	4.372	**8.744**
Orhangazi	3.780	3.780	**7.560**
Büyükorhan	2.720	2.720	**5.440**
Karacabey	2.365	2.365	**4.730**
Gemlik	2.353	2.353	**4.706**
Orhaneli	2.276	2.276	**4.552**
İznik	1.921	1.921	**3.842**
Yenişehir	1.132	1.132	**2.264**
Keles	1.055	1.055	**2.110**
Kestel	954	954	**1.908**
Gürsu	937	937	**1.874**
Harmancık	897	897	**1.794**
Toplam		**57.480**	**49.320**	**106.800**

İlçe Bazında Arıza Tamir Çalışmaları (Adet)

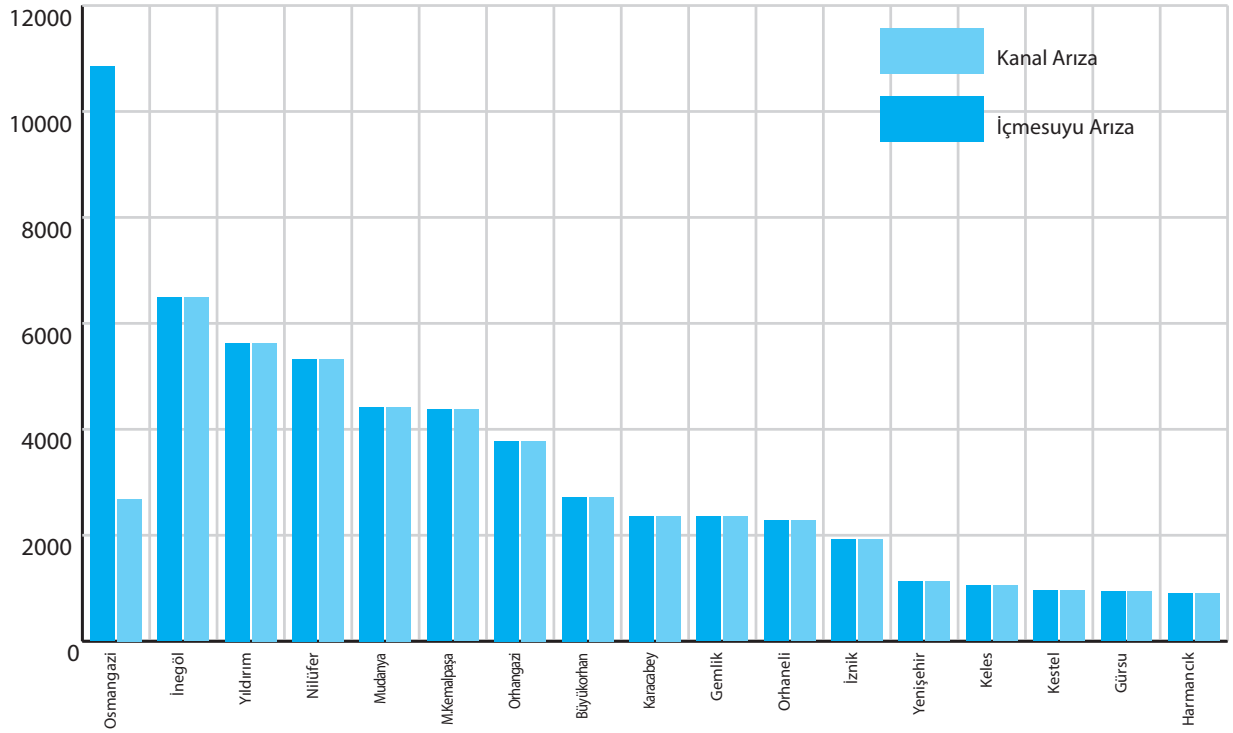

Arıza Tamir Çalışmaları Dağılımı

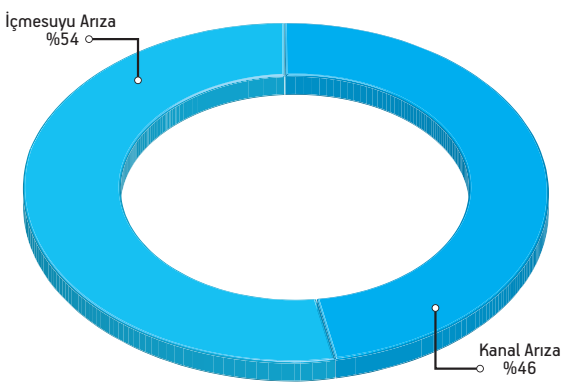

I. Proje Hizmetleri

Proje Metrajları (Km)

İlçe	İ. Suyu	Atıksu	Y. Suyu	Dere Islahı	Toplam
Büyükorhan	240	-	-	2	**242**
İnegöl	5	152	61	-	**217**
Nilüfer	1	33	14	-	**47**
Yenişehir	37	3	2	-	**42**
Harmancık	15	8	-	-	**23**
Mudanya	-	18	2	-	**20**
Yıldırım	8	-	-	8	**16**
Gemlik	6	6	-	-	**13**
Osmangazi	1	9	1	-	**12**
M. Kemalpaşa	4	6	-	-	**10**
Karacabey	9	-	-	-	**9**
Keles	4	2	-	2	**8**
Gürsu	-	4	2	1	**7**
İznik	2	-	-	-	**2**
Orhangazi	2	-	-	-	**2**
Orhaneli	-	2	-	-	**2**
Kestel	-	1	-	-	**2**
Toplam	**332**	**246**	**82**	**13**	**673**

Onaylanan Projelerin Dağılımı

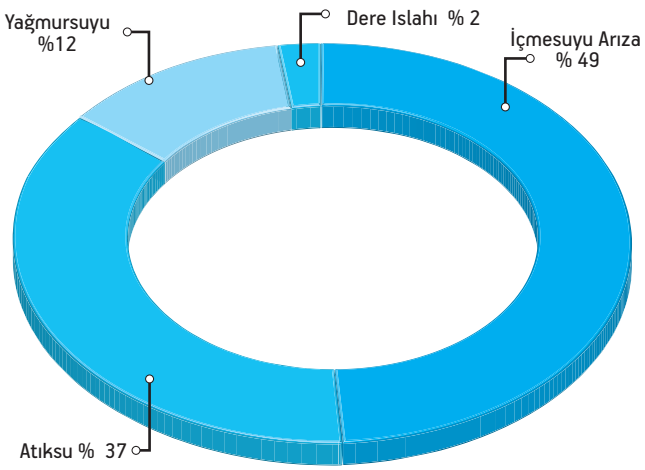

i. Tarımsal Sulamaya Yönelik Gölet ve Sulama Hizmetleri

İlçe Bazında Gölet ve Sulama Tesisleri (Adet ve Alanları)

İlçeler	Gölet		Sulama Havuzu	Sulama Tesisi	
	Adet	Depolama Hacmi (m³)	Adet	Adet	Tamamlanan İsale Hat Uzunluğu (m)
İznik	4	511.048	-	2	20.670
Orhaneli	2	277.391	1	2	11210
İnegöl	3	269.920	1	6	32093
Keles	2	258.389	-	1	11.014
M. Kemalpaşa	1	183.627	-	-	-
Nilüfer	1	122.208	-	-	-
Kestel	2	88.221	-	3	22489
Gemlik	1	82.631	2	1	11.496
Gürsu	-	-	1	-	-
Mudanya	-	-	3	-	-
Osmangazi	-	-	1	-	-
Yenişehir	-	-		1	14.093
Toplam	**16**	**1.793.435**	**9**	**16**	**112.051**

İlçe Bazında Gölet Dağılımı

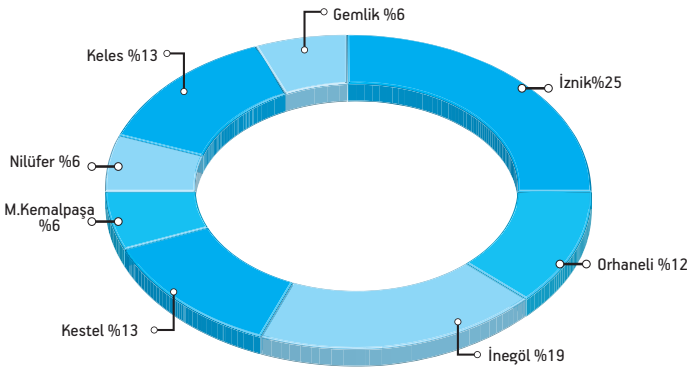

İlçe Bazında Sulama Tesisi Dağılımı

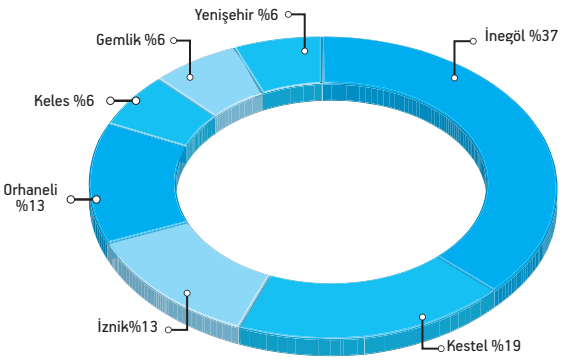

İlçe Bazında Sulama Havuzu Dağılımı

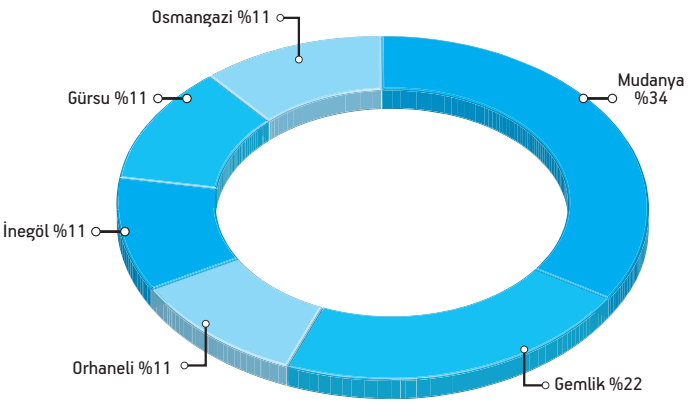

j. Doğal Kaynak Suyu Hizmetleri

74 adet, toplam 121,05 lt/sn debide su kaynağı, güncel ihale bedelleri toplamı 36.306.620,21 - TL olmuştur. 2018 yılında 8 adet ticari su kaynağı kiralama başvurusunda bulunulmuş olup bunlardan 3 adedi sözleşme süresi sona erip yeniden talepte bulunan dosyalardır. 4 adedi yeni kaynak kiralama başvuru dosyasıdır. 2 adet başvuru dosyası ihale aşamasına gelmiştir. 4 adet başvuru dosyasının ihalesi yapılmış olup sözleşme imzalanmıştır.

k. Scada (Supervisory Control and Data Acquisition)

Scada veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemidir.

Scada sistemi ile bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlanabilmektedir. Yeni eklenecek olan uzak istasyonların saha ekipmanlarının testleri, donanımsal ve yazılımsal yapılarının kontrolleri ve HMI ekranlarında görüntülenecek olan istasyon tasarımları test panoları üzerinde BUSKİ Scada personeli tarafından yapıldıktan sonra saha ortamına entegre edilmektedir.

Scada Kapsamında İşletilen İstasyonlar

İstasyonlar	Toplam (adet)
Alt Bölge Debimetre Ölçüm İstasyonları	5
İçme Suyu Depoları	40
Kontrol Debimetre Ölçüm İstasyonları	5
Pompa İstasyonları	5
Şebeke Vanaları Konrol İstasyonları	2
Dağınık Debimetre Ölçüm İstasyonları	-
Kuyu Debimetre	-
Kuyu	3
Su Arıtma Tesisi Ara Yüzü	-
Barajlar	-
Kano Parkuru Bal.	-
Toplam	**60**

l. Güneş Enerjisi Sistemi (GES)

GES	Toplam (KWH)
D46 Görükle (250 kWp)	331.888,49
Batı Atık Su Arıtma Tesisi (130 kWp)	172.047,20
Doğu Atık Su Arıtma Tesisi (30 kWp)	39.078,10
D12/2 (250 kWp)	272.323,40
GENEL TOPLAM	**815.337,19**

m. Hidroelektrik Santral (HES)

HES	Toplam (KWH)
D0 Deposu (500 kWp)	3.124.279
D12/2 Deposu (650 kWp)	4.072.029
D13 Deposu (1200 kWp)	9.292.306
TOPLAM	**16.488.614**

n. Kredi Finansman İşlemleri

Dış Kredi Finansman İşlemleri

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi (AYB - 1)

İçme suyu, yağmur suyu ve atık su yatırımları ile bu yatırımlar için kullanılan malzemelerin temini için 1993 - 2001 arasında Dünya Bankası' ndan Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi" kapsamında alınan kredi ile yapılan yatırımların devamı niteliğinde, 05.12.2000 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 2006 yılında kullanımı tamamlanan 80.000.000,00 Avro tutarında AYB' den kredi alınmıştır. Bahsi geçen kredinin geri ödemesi 30 Kasım 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

	31.12.2018' ya Kadar (€)	31.12.2018 Sonrası (€)	Genel Toplam (€)
Borç Tutarı	91.670.815,00	-	**91.670.815,00**
Ödenen	91.670.815,00	-	91.670.815,00
Ödenecek	-	-	-

Alman Kalkınma Bankası Kredisi (KFW)

"Bursa Kanalizasyon III. Merhale Projesi" kapsamında aşağıdaki tabloda detayları verilen Atık Su Arıtma Tesisleri'nin (A.A.T.) finansmanında kullanılmak üzere toplam 30 milyon Avro KFW kredisi alınmak üzere 28.05.2010 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ve Hazine Müsteşarlığı arasında ikraz anlaşması ve aynı tarihte KFW ile kredi anlaşması imzalanmıştır. Kredinin kullanımı Aralık 2011' de başlamış olup, 30.06.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

İşin Adı	Firma Adı	İşin Durumu	Sözleşme Tutarı (Keşif Artışları Dahil) (€)	Gerçekleşme Tutarı (€)	İş Bitim Tarihi
İş Paketi 1 Gemlik, Mudanya, Kurşunlu A.A.T	Passavant Energy And Environment GmbH	Söz. Tar. 14.04.2016	16.576.676,08	12.482.015,80	23.11.2019
İş Paketi 2 K.Kumla, Akçalar, Nilüfer,(Badırga) A.A.T	Emit-Alkataş İş Ortaklığı	Söz. Tar. 12.04.2016	14.785.474,84	12.066.991,09	17.08.2019
İş Paketi 3 K.Kumla,Kurşunlu D.D.D	Çeltikçioğlu İnşaat Tic. Ltd.Şti.	Söz. Tar. 14.07.2017	10.870.262,28	2.634.753,91	28.01.2019
Bursa Atıksu Projesi III. Merhale Detaylı Tasarım ve İhale için Müş.Hiz. Proje Yürütücü Kur. İhale ve Sözleşme Yapılması ve Kontrollük Konularında Destek için Müşavirlik İşi (KMH-2010/1K)	IGIP MbH	Söz. Tar. 14.12.2011	3.869.952,14	2.816.239,20	15.07.2019

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi (AYB - 2)

"Bursa Kanalizasyon III. Merhale Projesi" kapsamında muhtelif kanalizasyon ve içmesuyu projeleri ile bu projelerde kullanılacak malzemelerin finanse edilmesi amacıyla toplam 50 milyon Avro tutarında AYB kredisi alınmıştır. 25.11.2010 tarihinde imzalanan Garanti Protokolü ve Kredi Sözleşmesi gereği ilk dilimin kullanımı 2012 yılında başlamıştır. 24.02.2036 tarihinde kredi geri ödemesi tamamlanacaktır.

	31.12.2018' ya Kadar (€)	31.12.2018 Sonrası (€)	Genel Toplam (€)
Borç Tutarı	4.635.192,86	58.843.914,65	**63.479.107,51**
Ödenen	4.635.192,86	-	4.635.192,86
Ödenecek	-	58.843.914,65	58.843.914,65

Japon Kalkınma Bankası Kredisi (JICA)

Orhangazi kanalizasyon projesi, Orhangazi AAT Projesi ve Orhangazi Yağmursuyu projesi kapsamında alınan kredinin faiz geri ödemeleri yapılmakta olup 30.12.2036 tarihinde geri ödemesi tamamlanacaktır.

	31.12.2018' ya Kadar (JPY)	31.12.2018 Sonrası (JPY)	Genel Toplam (JPY)
Borç Tutarı	225.792.223,00	1.572.140.863,00	**1.797.933.086,00**
Ödenen	225.792.223,00	-	225.792.223,00
Ödenecek	-	1.572.140.863,00	1.572.140.863,00

İç Kredi Finansman İşlemleri

Garanti Bankası

Devam eden yatırımlarının finansmanı amacıyla toplam 50.000.000,00 - TL kredi temin edilmiştir. 23.12.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 25.08.2020 tarihinde geri ödemesi bitecektir.

	31.12.2018'ye Kadar (TL)	31.12.2018 Sonrası (TL)	Genel Toplam (TL)
Borç Tutarı	**47.536.294,73**	**20.190.111,63**	**67.726.406,36**
Ödenen	47.536.294,73	-	**47.536.294,73**
Ödenecek	-	20.190.111,63	**20.190.111,63**

6360 Sayılı On ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Bulunması ile Bazı Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun ile yeni katılan on ilçenin altyapı yatırımlarına ait yapım işlerinde kullanılmak üzere 23.06.2016 tarihinde 100.000.000,00 - TL kredi kullanılmış olup; 27.02.2020 tarihinde geri ödemesi bitecektir.

	31.12.2018'ye Kadar (TL)	31.12.2018 Sonrası (TL)	Genel Toplam (TL)
Borç Tutarı	87.164.049,90	40.676.557,06	**127.840.606,96**
Ödenen	87.164.049,90	-	**87.164.049,90**
Ödenecek	-	40.676.557,06	**40.676.557,06**

30.04.2018 tarihinde nakit kredi teminine ihtiyaç duyulmuş olup; 30.000.000,00 - TL kredi kullanılmıştır. 30.04.2020 tarihinde geri ödemesi tamamlanacaktır.

	31.12.2018'ye Kadar (TL)	31.12.2018 Sonrası (TL)	Genel Toplam (TL)
Borç Tutarı	12.955.432,79	22.471.404,63	**35.426.837,42**
Ödenen	12.955.432,79	-	**12.955.432,79**
Ödenecek	-	22.471.404,63	**22.471.404,63**

Türkiye Ekonomi Bankası

Devam eden yatırımlarının finansmanı amacıyla temin edilen toplam 100.000.000,00 - TL kredinin 04.08.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 04.08.2020 tarihinde geri ödemesi bitecektir.

	31.12.2018'ye Kadar (TL)	31.12.2018 Sonrası (TL)	Genel Toplam (TL)
Borç Tutarı	62.298.037,16	62.783.070,16	**125.081.107,32**
Ödenen	62.298.037,16	-	**62.298.037,16**
Ödenecek	-	62.783.070,16	**62.783.070,16**

2018 Temmuz ayında 30.000.000,00 - TL nakit kredinin 19.07.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Kredinin geri ödemesi 19.07.2021 tarihinde bitecektir.

	31.12.2018'ye Kadar (TL)	31.12.2018 Sonrası (TL)	Genel Toplam (TL)
Borç Tutarı	7.128.146,30	34.426.014,30	**41.554.160,60**
Ödenen	7.128.146,30	-	**7.128.146,30**
Ödenecek	-	34.426.014,30	**34.426.014,30**

İller Bankası

23.06.2016 tarihli Meclis toplantısı ile 889.987.352,70 - TL tutarındaki 52 adet iş için kredi talep edilmiş olup, talep edilen kredinin 2018 yılı sonuna kadar faiz dahil 289.234.275,43 - TL'lik kısmı geri ödenmişir. Tüm geri ödemeler 2036 yılında tamamlanacaktır.

	31.12.2018'ye Kadar (TL)	31.12.2018 Sonrası (TL)	Genel Toplam (TL)
Borç Tutarı	289.234.275,43	870.828.628,84	**1.160.062.904,27**
Ödenen	289.234.275,43	-	**289.234.275,43**
Ödenecek	-	870.828.628,84	**870.828.628,84**



o. Diğer Hizmetler

Kurum İçi Denetim

Genel Müdürlük Makamı'nın 09.06.2016 tarihli oluru ile yürürlüğe giren 2016/2 genelge gereğince birimlerin mevcut yönetmelik ve yönergelerini hizmetleri gerektirdiği ihtiyaçlar ve değişen mevzuat hükümlerini dikkate alarak yeniden gözden geçirerek hazırlanacak tüm yönetmelik ve yönerge taslaklarının tetkik için iç denetim birimine gönderilmesi hüküm altına alındığından, anılan genelge gereğince gönderilen yönetmelik ve yönergelere danışmanlık faaliyeti kapsamında görüş verilmiştir.

Eğitim faaliyetleri kapsamında 3 saat TSE ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından 10 saat olmak üzere toplam 13 saat eğitim verilmiştir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca 2018 yılında 8 adet inceleme raporu, 17 adet soruşturma raporu, 2 adet cevaplı teftiş raporu ve 10 adet Valilik Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Hukuk İşlemleri

1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında; 6.446 adet evrak gelmiş, 2.377 adet evrak çıkış yapılmıştır.

1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında; 359 adet kurumumuzca, 6.232 adet kurumumuz özel avukatlarınca olmak üzere toplam 6.591 adet ilamsız takip yapılmış ve 41 adet dava neticelendirilip işlemden kaldırılmıştır.

İcra takiplerinden 7.924.914,40 - TL tahsilat yapılmıştır.

Sağlık Hizmetleri

2018 yılı içerisinde 1.626 kişinin hasta kaydı yapılmış, muayenesi sonucu reçete verilmiştir. Gereken hastaların enjeksiyon, pansuman, kulak lavajı, tansiyon takipleri yapılmıştır.

Eğitim Faaliyetleri

2018 yılı içerisinde 2.572 kişiye kurum içi, 241 kişiye de kurum dışı eğitim verilmiştir.
Muhtelif meslek liselerinden 68 öğrenciye bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla haftanın 3 günü ücretli, 2018 yılı yaz döneminde de 183 üniversite ve 24 meslek lisesi öğrencisine 20-30 iş günü staj yapması sağlanmıştır. Ayrıca üniversitelerin MYO İşyeri Beceri Eğitim Programı kapsamında 19 öğrenci ücretli staj görmüştür.

Kesin Hesap

Kesin Hesap Şube Müdürlüğü'nce 2018 yılında 80 adet kesin hesap, 1.065 adet hakediş ve 485 adet yeni fiyat analizi incelemesi yapılmıştır.

C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 31.12.2014 tarih ve 45953 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile yürürlüğe konulmuştur. 2015 yılında; İç Kontrol Eylem Planı'yla planlanan eylemlerin uygulanması çalışmaları yürütülmüştür. İç Kontrol Standartları Risk Değerlendirme Bileşeni kapsamında kurumumuzun risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla bütün birimlerde Risk Koordinatörleri, Birim Risk Sorumluları ve Alt Birim Risk Sorumluları belirlenerek, risk yönetim ekipleri oluşturulmuştur. Ayrıca birimlerin oluşturacağı risk eylem planlarının değerlendirilmesi, kurumun risk strateji ve politikalarının belirlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla kurumda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı'nın başkanlığında, tüm birim yöneticilerinin üyesi olduğu Risk Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

2015 yılında uygulaması yapılan eylem plan, izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında, 2016 yılı başında İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak üst yöneticilere sunulmuştur. Bu raporda eylem planının revize edilmesi ön görülmüş ve 2016 yılında yeni İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanarak 09.06.2016 tarih ve 21460 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile uygulanmaya başlamıştır. Plan 2018 yılında uygulanmaya devam edilmiştir.

İç kontrol sistemi kurulmuş olup, uygulama yönünden; Mali işlemler süreç akış yönergesi, Etik Kurallar ile ilgili eğitim semineri, görev ve çalışma yönergeleri, BUSKİ teşkilat yönetmeliği, görev dağılım şemaları, kurum içi kalite tetkikleri ve gözden geçirme toplantısı çalışmaları tamamlanmış; imza yetkileri yönergesi, BUSKİ bilgi sistemi, hassas görev prosedürleri, çalışma kontrol prosedürleri, görev teslim raporu çalışmaları ise devam etmektedir.



2. AMAÇ ve HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

II. AMAÇ VE HEDEFLER
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

2015-2019 Stratejik Plan döneminde BUSKİ Genel Müdürlüğü **2 Alan, 5 Amaç ve 52 Hedef** belirlenmiştir. Belirlenen amaç ve hedeflere ilişkin başlıklar aşağıda yer almaktadır.

Amaç-1 :	**Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.**
A1 H1:	Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 200 km. pınar kaynağı ıslahının, 2019 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.
A1 H2:	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisi yapmak.
A1 H3:	2019 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarında bulunan yerleşim alanlarındaki atıksuların arıtılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak.
A1 H4:	Kuraklık ve ihtiyaç artışı nedeniyle 2019 yılı sonuna kadar toplam 100 adet sondaj kuyusu açmak.
A1 H5:	İçmesuyu kalitesini 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.
A1 H6 :	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut 213 adet kuyuyu aktif halde tutmak.
A1 H7:	Her yıl 120 adet köye dezenfeksiyon sistemini kurmak veya iyileştirmek.
Amaç-2 :	**Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.**
A2 H1:	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale getirmek ve iyileştirmek.
A2 H2:	4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını 2019 yılı sonuna kadar %31'e düşürmek.
A2 H3:	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde %23 kaçak su oranını 2019 yılı sonuna kadar %20'ye düşürmek .
A2 H4:	2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 208 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.
Amaç-3 :	**Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.**
A3 H1:	2019 yılı sonuna kadar 2.000 km şebeke inşaatı yapmak.
A3 H2:	2019 yılı sonuna kadar 500 km isale hattı inşaatı yapmak.
A3 H3:	2019 yılı sonuna kadar 175 adet depo inşaatı yapmak.

A3 H4:	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 5.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.
A3 H5:	İçme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini 2019 yılı sonuna kadar ortalama 30 saate düşürmek.
A3 H6:	2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.
A3 H7:	2019 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.
A3 H8:	Otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaları çalışır halde tutmak.
A3 H9:	2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve depoyu otomatik çalışır hale getirmek.
A3 H10:	2015 yılı sonuna kadar 320.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların tamamını değiştirmek, sonraki yıllarda da her yıl, bir önceki yıl sonu itibariyle, 10 yılını doldurmuş sayaçların tamamını değiştirmek.
A3 H11:	Abonelik müracatından itibaren keşif işlemlerini 2017 itibariyle 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.
A3 H12:	2014 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının 2019 yılı sonuna kadar %80'ini tahsil etmek.
A3 H13:	Dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %80'den %90'a çıkarmak.
A3 H14:	2015 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımını yapmak.
A3 H15:	2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisi faal halde tutmak.
A3 H16:	2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisi scada sistemine almak.
A3 H17:	2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatını tamamlamak.
A3 H18:	Her yıl sonunda bir sonraki yıl için yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve içmesuyu paket arıtmaların bakım ve onarımlarını yapmak.
A3 H19:	2019 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının katodik korumasını yapmak.
Amaç-4 :	**Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.**
A4 H1:	Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 2019 yılı sonuna kadar 5.000 km'sini hazırlamak.
A4 H2:	2015-2019 yılları arasında 525 Km yağmursuyu hattı döşemek.
A4 H3:	2015-2019 yılları arasında sel taşkınlarını önlemek için derelerin 19 km'sini ıslah etmek.
A4 H4:	2015-2019 yılları arasında 1.000 km kanalizasyon hattı döşemek.

A4 H5:	2019 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 25 adet paket atıksu arıtma tesisi yapmak.
A4 H6:	2015 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu online izleme sistemi kurmak ve izleyebilir hale gelmek.
A4 H7:	2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.
A4 H8:	AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.
Amaç-5 :	**Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.**
A5 H1:	İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini sağlamak.
A5 H2:	Plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını karşılamak.
A5 H3:	Plan dönemi içerisinde her yıl lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini gerçekleştirmek.
A5 H4:	Bilgisayar teknolojisini ve altyapısını her yıl %20 geliştirmek.
A5 H5:	Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısını fiber hatlara taşımak.
A5 H6:	Her yıl 4 daire başkanlığının teftişini yapmak.
A5 H7:	2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 6400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.
A5 H8:	Satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda sistem kurmak.
A5 H9:	Yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesini 2017 yılına kadar tamamlamak ve 2018 yılı içinde projenin tümünün Buski'de kullanılmasını ve programlara uyarlanmasını sağlamak.
A5 H10:	Kurumu tanıtmak, su bilinci ve kültürü düzeyini arttırmak.
A5 H11:	Yıllık ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.
A5 H12:	Kurumda istatistik ve raporlama sistemini 2016 sonuna kadar kurmak.
A5 H13:	Sağlık hizmetlerine müraacaat eden tüm talepleri gün içerisinde karşılamak.
A5 H14:	Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.
A5 H15:	Kurumda iç kontrol sistemini 2015 sonuna kadar kurmak ve uygulanmasını sağlamak.

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

*** Kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi,**

İyi yönetişim; bütün vatandaşların gerekli bilgiye kolayca ulaşabildiği saydam yönetimi, katılımcılığı, hesap verebilir ve sorumlu biçimde yönlendiren etkin süreç ve yapıları içermektedir.

Yönetim, hukuk kuralları içinde kalarak, objektif bilgiye dayalı karar vermekte ,hukuk yolu ile denetlenmektedir.

Kurumsal gelişim; kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı, bütçelendiği ve raporlandığı konularında sorumlu ve gerektiğinde hesap verebilir bir yönetim anlayışı, serbest bilgi akışının sağlanması ile mümkün olabilmektedir.

*** Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,**

Doğal kaynaklarımızın korunması, atık miktarlarında azalma ve ekonomiye katkı sağlanması, kentimizde yaşayanlara su ve temiz çevre kültürü kazandırılması ile mümkün olacaktır. Su kültürünün ve su tasarrufu bilincinin oluşturulması hedeflerimizdir.

*** Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda altyapı (içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması**,

Kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan yeni yerleşim birimlerinde planlı altyapı hizmeti sunulmakta ve eski yerleşim yerlerinde ise altyapıların rehabilitasyonun sağlanmasına yönelik yenileme projelerine ağırlık verilmektedir.

*** Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,**

Su kaynakları ve çevre ile ilgili konuların, kamuoyu ve hemşerilerimizin gündeminde daha çok yer bulması sağlanmakta ve kent sakinlerinin çevre bilincini artıracak etkinlik ve faaliyetlere öncülük yapılmakta ve destek sağlanmaktadır. Her türlü kirliliği oluşmadan önlemek, tüm kirletici parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek.

*** Bilgi teknolojileri takip edilmesi ve kullanımının sağlanması.**

E-Buski uygulaması, hizmetlere erişmede etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Bilgi teknolojilerinin kullanımının sağlanması ile esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetişim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır.





3. FAALİYETLERE İLİŞKİN

A. Mali Bilgiler

B. Performans Bilgileri

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2016 - 31.12.2018 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		Bütçe Giderinin Türü	2016	2017	2018
	Kod 1	Kod 2				
830			**BÜTÇE GİDERLERİ HESABI**	**1.120.256.326,71**	**1.465.398.750,86**	**975.419.212,53**
830	**01**		**Personel Giderleri.**	**68.757.500,76**	**58.802.604,49**	**68.275.142,08**
830	01	01	Memurlar.	29.832.147,12	32.558.753,94	35.869.829,78
830	01	02	Sözleşmeli Personel	544.927,51	691.669,46	5.108.822,81
830	01	03	İşçiler	38.209.113,78	25.327.239,51	26.906.225,78
830	01	04	Geçici Personel.	171.312,35	224.941,58	390.263,71
830	**02**		**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi**	**10.147.885,39**	**9.966.604,46**	**10.872.651,48**
830	02	01	Memurlar.	4.581.893,33	5.055.332,84	5.557.225,87
830	02	02	Sözleşmeli Personel	89.733,08	113.873,86	850.455,59
830	02	03	İşçiler	5.476.258,98	4.797.397,76	4.464.970,02
830	**03**		**Mal Ve Hizmet Alım Giderleri**	**263.561.378,65**	**341.780.623,93**	**365.415.923,14**
830	03	01	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.072.979,19	851.139,01	905.188,53
830	03	02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	45.883.712,93	66.670.251,46	86.643.504,53
830	03	03	Yolluklar.	424.365,91	304.775,29	348.257,02
830	03	04	Görev Giderleri.	6.361.046,92	13.832.823,81	7.519.407,46
830	03	05	Hizmet Alımları	201.224.691,26	250.850.549,53	256.701.545,89
830	03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	822.497,24	1.510.287,52	1.009.177,18
830	03	07	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım	7.663.656,22	6.900.683,65	10.939.819,53
830	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	107.725,52	697.504,10	1.348.939,84
830	03	09	Tedavi Ve Cenaze Giderleri.	703,46	162.609,56	83,16
830	**04**		**Faiz Giderleri.**	**27.728.508,86**	**67.237.587,93**	**98.142.762,01**
830	04	02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	22.825.624,79	59.983.399,97	89.697.943,88

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		Bütçe Gelirinin Türü	2016	2017	2018
	Kod 1	Kod 2				
800			**BÜTÇE GELİRLERİ HESABI**	**752.604.837,62**	**910.333.366,68**	**1.006.837.967,21**
800	**03**		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**641.311.827,56**	**736.773.421,15**	**818.028.132,06**
800	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	616.968.928,00	690.649.262,79	748.323.223,25
800	03	02	Malların Kullanma veya Faaliyette	0,00	0,00	59,32
800	03	06	Kira Gelirleri	24.342.899,56	46.124.158,36	69.704.849,49
800	**04**		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel**	**3.914.908,60**	**6.902.649,81**	**18.258.349,84**
800	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil	3.593.927,06	0,00	4.205.709,05
800	04	05	Proje Yardımları	320.981,54	6.902.649,81	14.052.640,79
800	**05**		**Diğer Gelirler**	**107.337.719,96**	**166.657.295,72**	**164.695.244,26**
800	05	01	Faiz Gelirleri	11.288.895,80	12.184.347,84	13.617.351,81
800	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	92.212.128,90	108.873.006,97	128.238.157,12
800	05	03	Para Cezaları	18.378,22	87.715,25	4.070.489,19
800	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	3.818.317,04	45.512.225,66	18.769.246,14
800	**06**		**Sermaye Gelirleri**	**40.381,50**	**0,00**	**5.856.241,05**
800	06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	0,00	5.779.050,00
800	06	02	Taşınır Satış Gelirleri	40.381,50	0,00	77.191,05
Bütçe Gelirleri Toplamı				**752.604.837,62**	**910.333.366,68**	**1.006.837.967,21**
Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadenin Türü						
810			**BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE**	**1.715.630,44**	**1.891.421,59**	**1.871.235,51**
810	**03**		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**1.467.298,98**	**1.689.806,14**	**1.240.040,92**
810	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.396.495,53	1.278.765,15	1.189.591,93
810	03	06	Kira Gelirleri	70.803,45	411.040,99	50.448,99

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		Bütçe Giderinin Türü	2016	2017	2018
	Kod 1	Kod 2				
830	04	03	Dış Borç Faiz Giderleri	4.902.884,07	7.254.187,96	8.444.818,13
830	**05**		**Cari Transferler.**	**6.555.536,91**	**7.603.763,42**	**10.403.542,02**
830	05	01	Görev Zararları	1.387.086,82	1.780.046,59	4.694.730,14
830	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan	74.676,10	78.409,90	82.330,40
830	05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	5.093.773,99	5.745.306,93	5.626.481,48
830	**06**		**Sermaye Giderleri.**	**737.825.516,14**	**980.007.566,63**	**419.807.731,80**
830	06	01	Mamul Mal Alımları	41.038.848,42	30.776.504,28	12.523.682,80
830	06	02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00
830	06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	6.648.180,79	6.322.575,66	3.901.419,55
830	06	04	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	12.313.065,82	6.654.763,05	3.872.161,51
830	06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri.	666.886.445,52	797.489.807,93	378.110.131,83
830	06	06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.714.390,14	3.178.715,65	1.920.309,87
830	06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	8.224.585,45	135.585.200,06	19.480.026,24
830	**07**		**Sermaye Transferleri**	**5.680.000,00**	**0,00**	**2.501.460,00**
830	07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	5.680.000,00	0,00	2.501.460,00
Bütçe Giderleri Toplamı				**1.120.256.326,71**	**1.465.398.750,86**	**975.419.212,53**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		Bütçe Gelirinin Türü	2016	2017	2018
	Kod 1	Kod 2				
810	05		**Diğer Gelirler**	**248.331,46**	**201.615,45**	**631.194,59**
810	05	01	Faiz Gelirleri	219.988,33	121.405,81	488.274,74
810	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	28.343,13	60.614,87	113.464,54
810	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	19.594,77	29.455,31
Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Toplamı				**1.715.630,44**	**1.891.421,59**	**1.871.235,51**
Net Bütçe Geliri				**750.889.207,18**	**908.441.945,09**	**1.004.966.731,70**
Bütçe Gelir-Gider Farklı				**369.367.119,53**	**556.956.805,77**	**-29.547.519,17**

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2018 - 31.12.2018 FALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		Giderin Türü	2016	2017	2018
	Kod 1	Kod 2				
630			**GİDERLER HESABI**	**789.444.554,06**	**990.603.032,18**	**996.160.748,52**
630	**01**		**Personel Giderleri.**	**57.693.323,83**	**70.144.011,15**	**68.625.012,04**
630	01	01	Memurlar.	30.161.491,65	32.559.580,60	35.870.443,80
630	01	02	Sözleşmeli Personel	544.927,51	691.669,46	5.108.822,81
630	01	03	İşçiler	26.815.592,32	36.667.819,51	27.255.481,72
630	01	04	Geçici Personel.	171.312,35	224.941,58	390.263,71
630	**02**		**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi**	**10.147.885,39**	**9.966.604,46**	**10.872.651,48**
630	02	01	Memurlar.	4.581.648,20	5.055.332,84	5.557.225,87
630	02	02	Sözleşmeli Personel	90.073,72	113.873,86	850.455,59
630	02	03	İşçiler	5.476.163,47	4.797.397,76	4.464.970,02
630	**03**		**Mal Ve Hizmet Alım Giderleri**	**375.074.502,85**	**411.602.615,41**	**375.937.844,57**
630	03	01	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	12.604,00	2.875,00	0,00
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	28.965.237,90	42.709.678,14	58.602.278,18
630	03	03	Yolluklar	424.365,91	292.986,97	348.257,02
630	03	04	Görev Giderleri	7.016.659,55	16.771.141,24	9.554.537,63
630	03	05	Hizmet Alımları	325.272.077,83	342.109.289,13	300.040.000,85
630	03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	335.791,57	581.201,41	549.686,08
630	03	07	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım	4.881.300,71	5.786.126,05	5.550.481,47
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	8.166.465,38	3.334.652,72	1.292.526,34
630	03	09	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	0,00	14.664,75	77,00
630	**04**		**Faiz Giderleri.**	**138.212.288,62**	**190.448.542,40**	**56.517.562,22**
630	04	01	Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz	0,00	0,00	0,00
630	04	02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	124.834.495,42	188.185.571,10	51.732.932,28
630	04	03	Dış Borç Faiz Giderleri	13.377.793,20	2.262.971,30	4.784.629,94
630	**05**		**Cari Transferler.**	**5.002.898,77**	**30.831.572,43**	**19.804.971,31**
630	05	01	Görev Zararları	-165.551,32	25.007.855,60	14.096.159,43
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan	74.676,10	78.409,90	82.330,40
630	05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	5.093.773,99	5.745.306,93	5.626.481,48
630	**11**		**Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri**	**64.716.188,25**	**127.457.418,82**	**315.396.357,78**
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde	64.715.723,85	16.696.051,20	16.556.756,60

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		Gelirin Türü	2016	2017	2018
	Kod 1	Kod 2				
600			**GELİRLER HESABI**	**988.118.264,36**	**1.103.390.181,18**	**1.125.297.658,70**
600	**03**		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**592.119.214,74**	**665.404.781,90**	**705.277.073,03**
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	559.948.032,65	634.497.396,90	676.420.239,49
600	03	02	Malların Kullanma veya Faaliyette	0,00	0,00	59,32
600	03	06	Kira Gelirleri	32.171.182,09	30.907.385,00	28.856.774,22
600	**04**		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel**	**3.914.908,60**	**6.921.213,16**	**18.246.427,70**
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil	3.593.927,06	0,00	4.205.709,05
600	04	05	Proje Yardımları	320.981,54	6.921.213,16	14.040.718,65
600	**05**		**Diğer Gelirler**	**377.518.310,51**	**376.425.916,25**	**238.879.761,92**
600	05	01	Faiz Gelirleri	11.139.696,68	12.183.248,42	14.526.152,35
600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	99.400.381,40	119.271.389,92	134.734.158,12
600	05	03	Para Cezaları	18.378,22	183.263,20	4.100.044,52
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	266.959.854,21	244.788.014,71	85.519.406,93
600	**11**		**Değer ve Miktar Değişimleri**	**14.565.829,51**	**54.228.772,09**	**162.815.831,34**
600	11	01	Döviz Mevcudunun	14.565.829,51	47.157.844,30	80.783.248,39
600	11	02	Kur Degisikligi Nedeniyle Döviz	0,00	0,00	0,00
600	11	06	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz	0,00	7.070.927,79	81.540.386,02
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri	0,00	0,00	492.196,93
600	**25**		**Kamu İdarelerinden Bedelsiz**	**1,00**	**409.497,78**	**78.564,71**
600	25	01	Kamu İdarelerinden Bedelsiz	1,00	409.497,78	78.564,71

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		Giderin Türü	2016	2017	2018
	Kod 1	Kod 2				
630	11	06	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç	464,40	110.721.981,70	293.262.892,86
630	11	07	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsinden	0,00	0,00	212.483,98
630	11	08	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar	0,00	39.385,92	0,00
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00	0,00	5.364.224,34
630	**12**		**Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan**	**3.643.194,23**	**16.129.621,68**	**10.472.846,88**
630	12	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	12.751.840,48	7.045.056,79
630	12	05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden	3.643.194,23	3.377.781,20	3.427.790,09
630	**13**		**Amortisman Giderleri**	**91.569.957,51**	**83.790.456,36**	**94.194.268,44**
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman	65.667.901,03	74.064.269,15	88.398.172,05
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların	25.902.056,48	9.726.187,21	5.796.096,39
630	**14**		**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	**43.168.365,43**	**50.220.349,33**	**44.339.232,80**
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	1.962.074,93	1.921.265,44	1.807.615,87
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta	25.110,44	83.345,18	689,24
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	349.473,01	581.395,80	580.152,36
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	7.603.155,87	10.009.902,72	13.989.309,96
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	236.205,61	198.839,13	850.668,10
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	1.175.352,95	1.646.456,21	78.920,60
630	14	07	Yiyecek	127.096,20	72.738,00	0,00
630	14	08	İçecek	535,50	0,00	0,00
630	14	10	Zirai Maddeler	16.310,00	24.655,00	720,00
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	8.295.390,23	9.278.039,87	6.385.287,70
630	14	13	Yedek Parçalar	21.167.372,43	25.101.668,32	18.291.901,27
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	118.246,56	164.216,33	151.753,46
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	1.137.530,99	844.144,48	2.076.855,24
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	954.510,71	293.682,85	125.359,00
630	**25**		**Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak**	**213.316,00**	**11.840,14**	**1,00**
630	25	01	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu	0,00	5.343,63	1,00
630	25	03	Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara	0,00	3.181,15	0,00
630	25	05	Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak	213.316,00	3.315,36	0,00
Giderler Toplamı				**789.444.554,06**	**990.603.032,18**	**996.160.748,52**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		Gelirin Türü	2016	2017	2018
	Kod 1	Kod 2				
Gelirler Toplamı				**988.118.264,36**	**1.103.390.181,18**	**1.125.297.658,70**
Faaliyet Sonucu (+/-)				**198.673.710,30**	**112.787.149,00**	**129.136.910,18**

A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR				2016	2017	2018
1			**Dönen Varlıklar**	**478.679.382,28**	**836.786.708,26**	**468.141.528,35**
	10		**Hazır Değerler**	**28.632.139,89**	**14.979.568,93**	**18.022.093,47**
		102	Banka Hesabı.	17.532.033,02	6.442.931,47	9.900.065,23
		104	Proje Özel Hesabı	2.452.063,96	0,00	0,00
		105	Döviz Hesabı	209.872,56	202.102,21	47.161,64
		108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	1.995.947,35	2.974.394,94	3.449.645,14
		109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	6.442.223,00	5.360.140,31	4.625.221,46
	12		**Faaliyet Alacakları**	**264.318.531,31**	**355.338.839,68**	**221.691.609,75**
		120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	93.331.253,76	127.131.725,98	161.798.715,63
		121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	46.208.128,34	40.810.374,98	37.743.214,72
		122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	22.474.934,22	18.046.135,37	12.206.211,40
		126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	102.175.764,44	169.267.627,63	9.943.468,00
		127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	128.450,55	82.975,72	0,00
	13		**Kurum Alacakları**	**7.000.000,00**	**203.187.366,62**	**35.275.384,46**
		132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar	7.000.000,00	3.187.366,62	0,00
		139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	200.000.000,00	35.275.384,46
	14		**Diğer Alacaklar**	**456.382,40**	**597.158,49**	**1.458.116,98**
		140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	456.382,40	597.158,49	1.458.116,98
	15		**Stoklar**	**56.333.951,77**	**61.514.255,46**	**46.854.149,53**
		150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	56.333.951,77	61.514.255,46	46.854.149,53
	16		**Ön Ödemeler**	**1.391.139,10**	**1.453.396,96**	**2.235.802,17**
		162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	1.391.139,10	1.431.365,96	2.218.202,17
		165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve	0,00	22.031,00	17.600,00
	19		**Diğer Dönen Varlıklar**	**120.547.237,81**	**199.716.122,12**	**142.604.371,99**
		190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	120.547.237,81	199.716.122,12	142.604.371,99
		191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	0,00	0,00
2			**Duran Varlıklar**	**2.548.028.510,26**	**3.154.688.837,06**	**3.588.897.357,57**
	22		**Faaliyet Alacakları**	**12.240,00**	**204.455,85**	**50.000,00**
		220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	0,00	50.000,00

PASİF HESAPLAR				2016	2017	2018
3			**Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**483.110.538,81**	**860.760.640,50**	**718.663.436,20**
	30		**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**80.668.645,67**	**165.122.357,65**	**194.871.333,64**
		300	Banka Kredileri Hesabı	73.267.445,67	153.552.182,72	182.908.958,35
		303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	7.401.200,00	11.570.174,93	11.962.375,29
	31		**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**26.410.442,08**	**34.663.008,76**	**3.343.714,31**
		310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	26.410.442,08	34.663.008,76	3.343.714,31
	32		**Faaliyet Borçları**	**67.105.008,36**	**137.256.288,23**	**124.469.685,34**
		320	Bütçe Emanetleri Hesabı	67.105.008,36	137.256.288,23	124.469.685,34
	33		**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**238.666.452,78**	**352.462.836,13**	**200.664.114,82**
		330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	91.313.199,83	118.936.051,16	139.959.128,99
		333	Emanetler Hesabı	147.353.252,95	233.526.784,97	60.704.985,83
	36		**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**23.171.403,82**	**42.353.223,05**	**55.815.377,47**
		360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	6.552.443,47	9.934.535,57	4.516.813,55
		361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.062.021,81	379.381,86	311.623,23
		362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan	15.131.511,36	31.576.266,07	50.986.940,69
		363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	425.427,18	463.039,55	0,00
	37		**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**6.119.354,74**	**34.076.020,88**	**24.713.723,75**
		372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	517.524,93	28.366.462,22	19.188.767,72
		379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	5.601.829,81	5.709.558,66	5.524.956,03
	38		**Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider**	**40.969.231,36**	**94.826.905,80**	**114.785.486,87**
		380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00	15.076.647,62	19.098.600,10
		381	Gider Tahakkukları Hesabı	40.969.231,36	79.750.258,18	95.686.886,77
4			**Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**1.042.020.764,41**	**1.510.646.592,75**	**1.597.456.694,03**
	40		**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**462.473.241,24**	**823.405.627,55**	**826.472.021,11**
		400	Banka Kredileri Hesabı	401.786.556,99	709.201.240,21	636.732.475,55
		403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	60.686.684,25	114.204.387,34	189.739.545,56
	41		**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**211.872.672,16**	**226.184.392,84**	**296.439.571,39**
		410	Dış Mali Borçlar Hesabı	211.872.672,16	226.184.392,84	296.439.571,39
	43		**Diğer Borçlar**	**4.697.512,25**	**3.917.991,81**	**7.805.409,91**

AKTİF HESAPLAR				2016	2017	2018
		227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	12.240,00	204.455,85	0,00
	23		**Kurum Alacakları**	**254.269.587,29**	**271.987.387,10**	**326.847.980,29**
		239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	254.269.587,29	271.987.387,10	326.847.980,29
	24		**Mali Duran Varlıklar**	**17.886.609,00**	**29.807.482,49**	**25.221.863,37**
		240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	8.528.667,40	8.895.100,89	3.349.863,37
		241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan	9.357.941,60	22.913.841,60	21.872.000,00
		247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00	-2.001.460,00	0,00
	25		**Maddi Duran Varlıklar**	**2.275.860.073,97**	**2.852.689.511,62**	**3.236.777.513,91**
		250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	118.083.900,03	124.239.309,32	321.825.165,62
		251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	1.583.144.227,25	1.848.900.798,95	2.138.089.883,56
		252	Binalar Hesabı	49.285.601,11	129.744.056,97	130.042.567,51
		253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	267.464.295,54	305.065.392,80	450.406.565,82
		254	Taşıtlar Hesabı	31.981.644,54	37.273.704,28	37.473.949,43
		255	Demirbaşlar Hesabı	13.779.667,18	17.064.728,06	17.181.450,93
		257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-550.187.270,25	-623.811.755,37	-710.929.857,40
		258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı.	744.793.985,03	1.013.451.530,39	852.687.788,44
		259	Yatırım Avansları Hesabı	17.514.023,54	761.746,22	0,00
		260	Haklar Hesabı.	70.723.814,60	80.450.001,81	86.246.098,20
		268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-70.723.814,60	-80.450.001,81	-86.246.098,20
		294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	3.010,09
		299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00	0,00	-3.010,09
AKTİF HESAPLAR TOPLAMI				**3.026.707.892,54**	**3.991.475.545,32**	**4.057.038.885,92**

PASİF HESAPLAR				2016	2017	2018
		430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	4.697.512,25	3.917.991,81	7.805.409,91
	47		**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**221.156.447,14**	**223.168.064,53**	**238.073.168,76**
		472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	46.502.896,77	40.588.069,37	59.516.449,10
		479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	174.653.550,37	182.579.995,16	178.556.719,66
	48		**Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider**	**141.820.891,62**	**233.970.516,02**	**228.666.522,86**
		480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00	0,00	38.220.533,53
		481	Gider Tahakkukları Hesabı	141.820.891,62	233.970.516,02	190.445.989,33
5			**Öz Kaynaklar**	**1.501.576.589,32**	**1.620.068.312,07**	**1.740.918.755,69**
	50		**Net Değer**	**782.172.036,57**	**833.551.702,13**	**1.006.758.514,84**
		500	Net Değer Hesabı	782.172.036,57	833.551.702,13	1.006.758.514,84
	57		**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**520.730.842,45**	**673.729.460,94**	**605.023.330,67**
		570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	520.730.842,45	673.729.460,94	605.023.330,67
	59		**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**198.673.710,30**	**112.787.149,00**	**129.136.910,18**
		590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	198.673.710,30	112.787.149,00	129.136.910,18
PASİF HESAPLAR TOPLAMI				**3.026.707.892,54**	**3.991.475.545,32**	**4.057.038.885,92**

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU

Gelir Bütçesi		Bütçe	Gerçekleşme	Kalan	Oran
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	798.388.000,00	816.788.091,14	-18.400.091,14	102
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.500.000,00	18.258.349,84	-5.758.349,84	146
05	Diğer Gelirler	179.112.000,00	164.064.049,67	15.047.950,33	92
06	Sermaye Gelirleri	0,00	5.856.241,05	-5.856.241,05	
08	Alacaklardan Tahsilat	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	
Gelir Bütçesi Toplamı		**1.180.000.000,00**	**1.004.966.731,70**	**175.033.268,30**	**85**

Gider Bütçesi		Bütçe	Aktarım Sonrası	Gerçekleşme	Kalan	Oran
01	Personel Giderleri	79.000.000,00	68.275.142,08	68.275.142,08	0,00	100
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	13.000.000,00	10.872.651,48	10.872.651,48	0,00	100
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	367.150.000,00	365.445.493,98	365.415.923,14	29.570,84	100
04	Faiz Giderleri	81.000.000,00	98.142.762,01	98.142.762,01	0,00	100
05	Cari Transferler	8.850.000,00	10.403.542,02	10.403.542,02	0,00	100
06	Sermaye Giderleri	354.000.000,00	419.807.731,80	419.807.731,80	0,00	100
	Genel Bütçe	96.445.000,00	76.924.702,33	76.924.702,33	0,00	100
	Mahalli İdareler	220.555.000,00	304.826.815,50	304.826.815,50	0,00	100
	Dış Proje Kredileri	37.000.000,00	38.056.213,97	38.056.213,97	0,00	100
07	Sermaye Transferleri	0,00	2.501.460,00	2.501.460,00	0,00	100
09	Yedek Ödenek	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gider Bütçesi Toplamı		**962.000.000,00**	**975.448.783,37**	**975.419.212,53**	**29.570,84**	**100**

Finansman Bütçesi		Bütçe	Gerçekleşme	Kalan	Oran
01.08.01.01	İç Borçlanma	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00	
	Garanti	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	
	TEB	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	
01.08.01.02	Ödeme	-72.000.000,00	-86.119.371,63	14.119.371,63	120
	Garanti	-38.400.000,00	-48.352.706,63	9.952.706,63	126
	TEB	-33.600.000,00	-37.766.665,00	4.166.665,00	112
01.08.02.01	İç Borçlanma	96.445.000,00	76.924.702,33	19.520.297,67	80
	İLBANK	96.445.000,00	76.924.702,33	19.520.297,67	80
01.08.02.02	Ödeme	-71.000.000,00	-77.851.367,68	6.851.367,68	110
	İLBANK	-71.000.000,00	-77.851.367,68	6.851.367,68	110
01.09.09.02	Ödeme	-167.000.000,00	-133.880.137,61	-33.119.862,39	80
	Diğer Yükümlülükler	-167.000.000,00	-133.880.137,61	-33.119.862,39	80
02.08.01.01	Dış Borçlanma	37.000.000,00	32.567.104,76	4.432.895,24	88
	AYB	0,00	0,00	0,00	
	KfW	37.000.000,00	32.567.104,76	4.432.895,24	88
02.08.01.02	Ödeme	-41.445.000,00	-64.089.042,86	22.644.042,86	155
	AYB	-29.190.000,00	-46.985.291,38	17.795.291,38	161
	KfW	-8.000.000,00	-11.444.600,00	3.444.600,00	143
	JICA	-2.900.000,00	-3.340.865,75	440.865,75	115
	AYB-II	-1.355.000,00	-2.318.285,73	963.285,73	171
Finansman Bütçesi Toplamı		**-218.000.000,00**	**-192.448.112,69**	**-25.551.887,31**	**88**

BÜTÇE DENGESİ

Gelir & Finansman Bütçesi	Bütçe	Gerçekleşme	Kalan	Oran
	962.000.000,00	**812.518.619,01**	**149.481.380,99**	**84**

Gider Bütçesi	Bütçe	Aktarım Sonrası	Gerçekleşme	Kalan	Oran
	962.000.000,00	**975.448.783,37**	**975.419.212,53**	**29.570,84**	**100**

A.3. Mali Denetim Sonuçları

Sayıştay Başkanlığı denetçileri tarafından kurumumuzda her yıl bir önceki yılın denetimi yapılmaktadır.



Koza Han

B. PERFORMANS BİLGİLERİ
B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşin Adı	BUSKİ Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme ve Bakımı Hizmetleri Alım İşi (ARITMA 6)
Sözleşme Bedeli	73.654.520,05 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Bursa İl sınırları
Gerçekleşme Düzeyi	% 66
İşin Tamamlanma Tarihi	12.09.2019

İşin Adı	S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletmesi Kooperatifi İşi
Sözleşme Bedeli	(13.214 m3/gün) * 0,45 - TL/m³ - KDV
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım, Gürsu, Kestel
Gerçekleşme Düzeyi	% 0
İşin Tamamlanma Tarihi	Her yıl protokol yapılıyor, düzenli devam ediyor.

İşin Adı	İnegöl Belediyesi ve İnegöl OSB Ortak AAT-Çamur Kurutma Tesisi İşletme
Sözleşme Bedeli	AAT İşletme ile Çamur Kurutma ve Bertaraf için aylık 408.804,16 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 0
İşin Tamamlanma Tarihi	Her yıl protokol yapılıyor, düzenli devam ediyor.

İşin Adı	400 Ton/Gün kapasiteli Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde
Sözleşme Bedeli	68.000.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 93
İşin Tamamlanma Tarihi	13.04.2019



İşin Adı	Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi Yapım İşi Teknik Danışmanlık ve Araştırma Geliştirme Hizmeti Alımı İşi
Sözleşme Bedeli	525.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 40
İşin Tamamlanma Tarihi	01.11.2019

İşin Adı	KMH-2010/1K Bursa Atıksu Projesi 3. Merhale Müşavirlik Hizmetleri
Sözleşme Bedeli	3.560.810,42 - EURO + 309.141,72 - EURO
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik, Mudanya, Nilüfer Mevkii
Gerçekleşme Düzeyi	% 98
İşin Tamamlanma Tarihi	15.07.2019

İşin Adı	İş Paketi- 1 Kurşunlu, Gemlik ve Mudanya Atıksu Arıtma Tesisleri
Sözleşme Bedeli	16.576.679,08 - EURO
Çalışma Yapılan İlçe	Kurşunlu, Gemlik ve Mudanya
Gerçekleşme Düzeyi	% 89
İşin Tamamlanma Tarihi	16.02.2019



İşin Adı	İş Paketi- 2 Akçalar, Küçükkumla ve Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisleri
Sözleşme Bedeli	14.785.474,84 - EURO
Çalışma Yapılan İlçe	Akçalar, Küçükkumla ve Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 93
İşin Tamamlanma Tarihi	28.01.2019

İşin Adı	İş Paketi- 3 Kurşunlu ve Küçük Kumla Derin Deniz Deşarjı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.669.711 - EURO
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
Gerçekleşme Düzeyi	% 99
İşin Tamamlanma Tarihi	21.04.2018



İşin Adı	Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	14.474.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	% 108
İşin Tamamlanma Tarihi	24.02.2019

İşin Adı	Bursa İli Muhtelif İlçelerinde 14 Adet Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi ve Yapıma Esas İhale Dokümanlarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi
Sözleşme Bedeli	1.995.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Bursa İli mülki sınırları
Gerçekleşme Düzeyi	% 86
İşin Tamamlanma Tarihi	27.02.2018



İşin Adı	Muhtelif İlçelerde (Harmancık, Keles, Yenişehir, İnegöl) Bölgesel Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.266.125,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
Gerçekleşme Düzeyi	% 81
İşin Tamamlanma Tarihi	16.09.2019

İşin Adı	Debimetre Odası Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	650.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif İlçeler
Gerçekleşme Düzeyi	% 0
İşin Tamamlanma Tarihi	11.01.2020



İşin Adı	Muhtelif Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	584.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Kirazlı Mahallesi
Gerçekleşme Düzeyi	% 20
İşin Tamamlanma Tarihi	01.09.2019

İşin Adı	Arıtma Tesislerine Betonarme Direkli Kafes Tel Çit, Himaye Kapısı ve Muhtelif Betonarme İmalatın Yapılması İşi
Sözleşme Bedeli	224.500,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Bursa İl sınırları
Gerçekleşme Düzeyi	% 81
İşin Tamamlanma Tarihi	24.12.2018

İşin Adı	Muhtelif Terfi Merkezi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.184.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik, Yenişehir, Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 20
İşin Tamamlanma Tarihi	10.08.2019

İşin Adı	320 Adet İçmesuyu Deposuna Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması
Sözleşme Bedeli	4.382.800,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Bursa İli Muhtelif İçmesuyu Depoları
Gerçekleşme Düzeyi	% 70
İşin Tamamlanma Tarihi	12.05.2019

İşin Adı	Narlı-Çınarcık Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.324.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik İlçesi Narlı ve Fadıllı Mahallesi
Gerçekleşme Düzeyi	% 97
İşin Tamamlanma Tarihi	15.01.2018





İşin Adı	Kestel İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.997.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Kestel İlçesi
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	06.07.2018

İşin Adı 42	Tatkavaklı (Mustafakemalpaşa Arsenik) İçmesuyu Arıtma Tesisi
Sözleşme Bedeli	3.058.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa İlçesi
Gerçekleşme Düzeyi	% 99
İşin Tamamlanma Tarihi	01.11.2018

İşin Adı	Çan İçmesuyu Arıtma Tesisi Revizyonu Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.682.996,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa İlçesi
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	02.11.2018



Ulu Cami

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşin Adı	55 Adet Otomatik Ödeme Vezneleri Bakımı ve Arıza Giderimi Alınması İşi
Sözleşme Bedeli	220.000,00 - - TL - KDV
Çalışma Yapılan İlçe	-
Gerçekleşme Düzeyi	%50
İşin Tamamlanma Tarihi	29.06.2019

İşin Adı	Omurga Anahtarı Cihazı ve Ağ Alt Yapısının Revize Edilmesi İşi
Sözleşme Bedeli	437.000,00 - TL - KDV
Çalışma Yapılan İlçe	-
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	20.12.2018

İşin Adı	Mobil Görüntüleme ve Araç Takip Sistemi Alımı İşi
Sözleşme Bedeli	630.602,00 - TL - KDV
Çalışma Yapılan İlçe	-
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	29.01.2018

İşin Adı	Scada Bilgi Sistemi Donanım Alımı ve Veri Aktarımı İşi
Sözleşme Bedeli	993.000,00 - TL - KDV
Çalışma Yapılan İlçe	-
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	30.03.2018

İşin Adı	Bentley Microstation Yazılımları Lisans Kiralama
Sözleşme Bedeli	155.000,00 - TL - KDV
Çalışma Yapılan İlçe	-
Gerçekleşme Düzeyi	% 80
İşin Tamamlanma Tarihi	30.05.2019

İşin Adı	Netcad Yazılımlarının Güncellenmesi ve Satın Alınması İşi
Sözleşme Bedeli	7.500,00 - TL - KDV
Çalışma Yapılan İlçe	-
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	31.12.2018

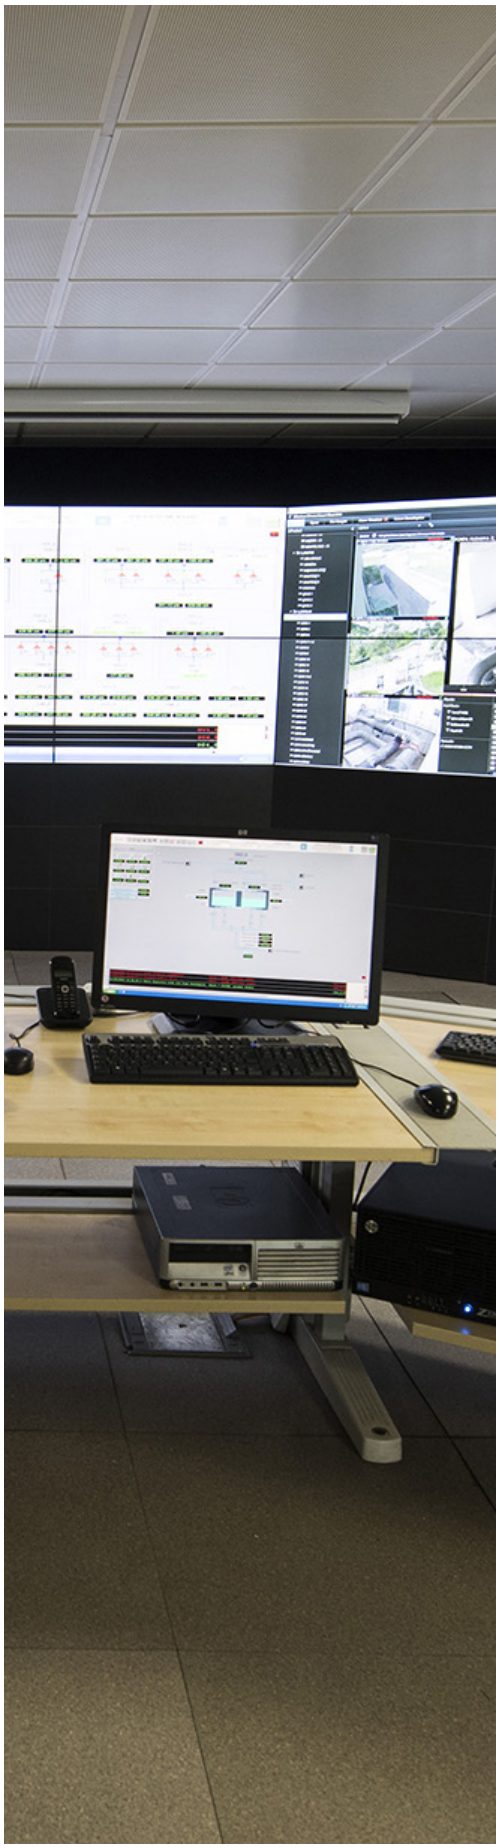

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşin Adı	36 Ay Süre İle Muhtelif Binek Araç, Çift Kabin Kamyonet, 4x4 Kamyonet, Kamyon, Kazıcı Yükleyici İş Makinası Ve Treyler Kiralanması Hizmet Alım İşi.
Sözleşme Bedeli	83.553.304,84
Çalışma Yapılan İlçe	17 Adet İlçe
Gerçekleşme Düzeyi	%114
İşin Tamamlanma Tarihi	21.04.2018

İşin Adı	3 Ay Süreli Muhtelif Binek Araç, Muhtelif Kamyonet,Minibüs,Motosiklet,Kamyon Ve İş Makinesi Kiralanması İşi
Sözleşme Bedeli	7.657.011,10
Çalışma Yapılan İlçe	17 Adet İlçe
Gerçekleşme Düzeyi	%88
İşin Tamamlanma Tarihi	30.06.2018

İşin Adı	15 Ay Süre İle Muhtelif Binek Araç Çift Kabin Kamyonet, 4x4 Çift Kabin Kamyonet,Minibüs, Kamyon, Ve Kazıyı Yükleyici İş Makinası Kiralanması Hizmet Alımı İşi
Sözleşme Bedeli	10.331.400,12
Çalışma Yapılan İlçe	17 Adet İlçe
Gerçekleşme Düzeyi	%25
İşin Tamamlanma Tarihi	30.09.2019

İşin Adı	Havuz Yapıları Ve Ekipmanlarının Bakım, Onarım Ve İşletilmesi İşi
Sözleşme Bedeli	798.898,50 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%73
İşin Tamamlanma Tarihi	07.12.2018

İşin Adı	2016 Yeşil Alanların Bakımının Yaptırılması Hizmet Alım İşi.
Sözleşme Bedeli	1.584.504,42 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%111
İşin Tamamlanma Tarihi	24.05.2018





İşin Adı	Bursa Merkez İlçeler Ve İlçelere Bağlı Köylere Enerji Nakil Hattı Yapılması İşi.
Sözleşme Bedeli	1.812.461,66 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%120
İşin Tamamlanma Tarihi	24.05.2018

İşin Adı	Bursa Merkez Ve Doğu İlçelere Enerji Nakil Hattı Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	2.232.019,17 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	25.08.2019

İşin Adı	Bursa Merkez Ve Batı İlçelere Enerji Nakil Hattı Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	2.711.989,34 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%90
İşin Tamamlanma Tarihi	25.08.2019

İşin Adı	İçmesuyu Ve Atıksu Terfi Tesisleri İle Su Kuyularının Bakımı, Onarımı Ve İşletilmesi İşi.
Sözleşme Bedeli	1.323.739,20 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%72
İşin Tamamlanma Tarihi	02.08.2019

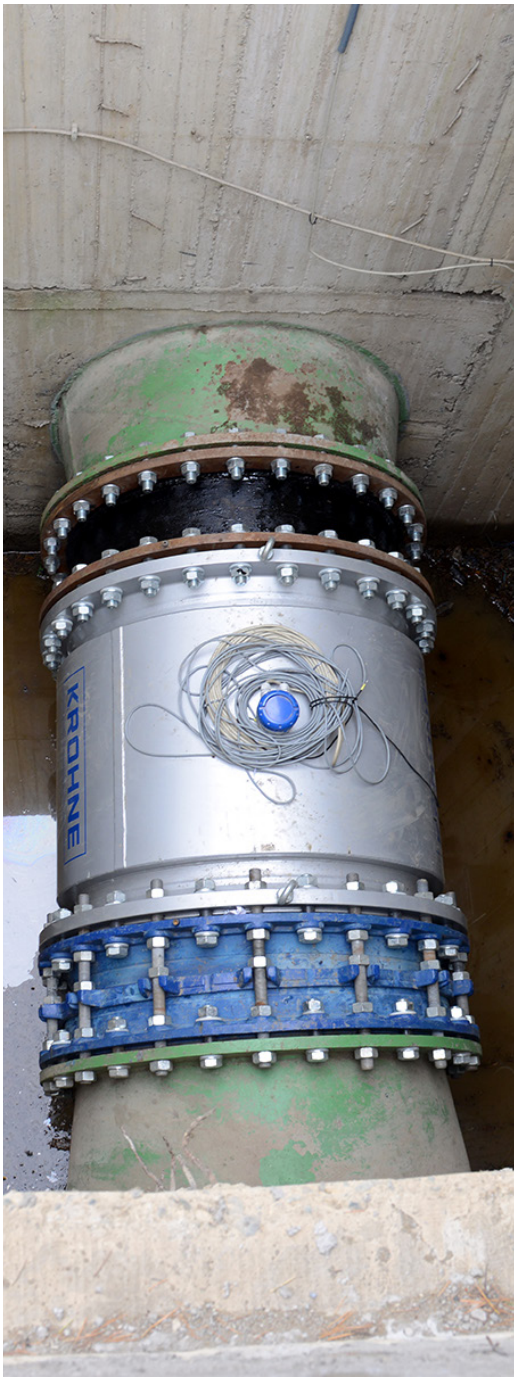



İşin Adı	D12 Su Deposuna Hes Tesisi Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	3.677.999,98 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	21.04.2018

İşin Adı	D13 Su Deposuna Hes Tesisi Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	4.503.363,70 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%98
İşin Tamamlanma Tarihi	15.11.2018

İşin Adı	Katodik Koruma Sistemi Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	1.067.325,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%49
İşin Tamamlanma Tarihi	24.07.2019

İşin Adı	İçmesuyu Scada Sisteminde Kullanılan Oasys Dna Scada Sistemi Yazılım Güncellemesi (Upgrade) Hizmet Alım İşi.
Sözleşme Bedeli	776.990,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%40
İşin Tamamlanma Tarihi	15.02.2019

İşin Adı	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi.
Sözleşme Bedeli	61.464.664,01 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%105
İşin Tamamlanma Tarihi	31.08.2018

İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşin Adı	2017 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	5.287.801,50 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 115
İşin Tamamlanma Tarihi	17.05.2019

İşin Adı	2017/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.662.638,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 95
İşin Tamamlanma Tarihi	07.02.2019



İşin Adı	2017/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	4.375.146,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
Gerçekleşme Düzeyi	% 75
İşin Tamamlanma Tarihi	18.04.2019

İşin Adı	2018 Yıldırım Üst Bölge Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı İşi
Sözleşme Bedeli	4.698.801,40 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
Gerçekleşme Düzeyi	% 0
İşin Tamamlanma Tarihi	10.12.2020

İşin Adı	2015/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	4.750.239,23 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 118
İşin Tamamlanma Tarihi	19.07.2018

İşin Adı	2018 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.122.352,94 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 0
İşin Tamamlanma Tarihi	06.10.2020

İşin Adı	Gemlik İlçesi Şahinyurdu Ve Umurbey Mahalleleri Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi
Sözleşme Bedeli	2.635.784,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
Gerçekleşme Düzeyi	% 0
İşin Tamamlanma Tarihi	17.02.2020





İşin Adı	2018 Mudanya Kanalizasyon Bakım Onarım İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.893.384,90 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya
Gerçekleşme Düzeyi	% 0
İşin Tamamlanma Tarihi	08.04.2020

İşin Adı	2018 Kestel İlçesi Derekızıkile Osmangazi İlçesi Yiğitali Mahallelerinde Parke Taşı Temini Ve Döşenmesi İşi
Sözleşme Bedeli	363.450,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Kestel
Gerçekleşme Düzeyi	% 0
İşin Tamamlanma Tarihi	24.02.2019

İşin Adı	2017 İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığına Bağlı Muhtelif İlçe Ve Mahallelerde İçmesuyu Şebekesinin Döşenmesi İşi
Sözleşme Bedeli	3.462.640,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 33
İşin Tamamlanma Tarihi	25.10.2018

İşin Adı	2016 Osmangazi, Yıldırım Ve Nilüfer İlçeleri İçmesuyu Evsel Bağlantı Yapılması İşi
Sözleşme Bedeli	2.492.050,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 111
İşin Tamamlanma Tarihi	20.12.2018

İşin Adı	2015 Buski Nilüfer İlçesi Ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolunun Batısı İçmesuyu Evsel Bağlantı Ve Arızaları Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.178.985,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi / Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 89
İşin Tamamlanma Tarihi	22.08.2018

İşin Adı	2018 Yılı Bursa Merkez İlçelerinde İçme Suyu (Evsel) Bağlantıları Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.276.532,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi / Yıldırım / Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 1
İşin Tamamlanma Tarihi	11.09.2019

İşin Adı	2017/2 2. Bölge Asfalt Yapım Ve Onarımı
Sözleşme Bedeli	74.304.840,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım,Gürsu,Kestel,Gemlik,Orhangazi,İznik,Yenişehir,İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 17
İşin Tamamlanma Tarihi	04.05.2020

İşin Adı	2017/1 1. Bölge Asfalt Yapım Ve Onarım Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	75.970.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, M.K.Paşa, B.Orhan, Harmancık, Keles, Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	% 44
İşin Tamamlanma Tarihi	04.05.2020

İşin Adı	2016 Yılı 2.Bölge Asfalt Yapımı Ve Onarımı İşi
Sözleşme Bedeli	49.618.900,00 - TL





Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 120
İşin Tamamlanma Tarihi	23.08.2018

İşin Adı	2018 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları Ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi
Sözleşme Bedeli	2.253.170,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 16
İşin Tamamlanma Tarihi	02.03.2020

İşin Adı	2017 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantı Ve Izgara Yapım Onarım İşi
Sözleşme Bedeli	2.762.855,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
Gerçekleşme Düzeyi	% 95
İşin Tamamlanma Tarihi	06.02.2019

İşin Adı	2018 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları Ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi
Sözleşme Bedeli	2.499.997,99 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
Gerçekleşme Düzeyi	% 0
İşin Tamamlanma Tarihi	01.12.2020

İşin Adı	2016/1 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları Ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.795.665,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 106
İşin Tamamlanma Tarihi	09.06.2018

İşin Adı	2016 Bbb Sınırları İçerisinde Atıksu Deposu (Fosseptik) İnş. Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.098.365,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Bursa Büyükşehir sınırları
Gerçekleşme Düzeyi	% 53
İşin Tamamlanma Tarihi	21.02.2019

İŞLETMELER 2. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşin Adı	2015/2 İnegöl Altyapı İnşaatı
Sözleşme Bedeli	2.367.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	%82
İşin Tamamlanma Tarihi	31.08.2018

İşin Adı	2017/1 İnegöl Muhtelif Mah. Altyapı İnşaatı
Sözleşme Bedeli	3.473.790,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	%37
İşin Tamamlanma Tarihi	01.09.2018

İşin Adı	2015/2 İnegöl Altyapı İnşaatı
Sözleşme Bedeli	2.367.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	%82
İşin Tamamlanma Tarihi	31.07.2018

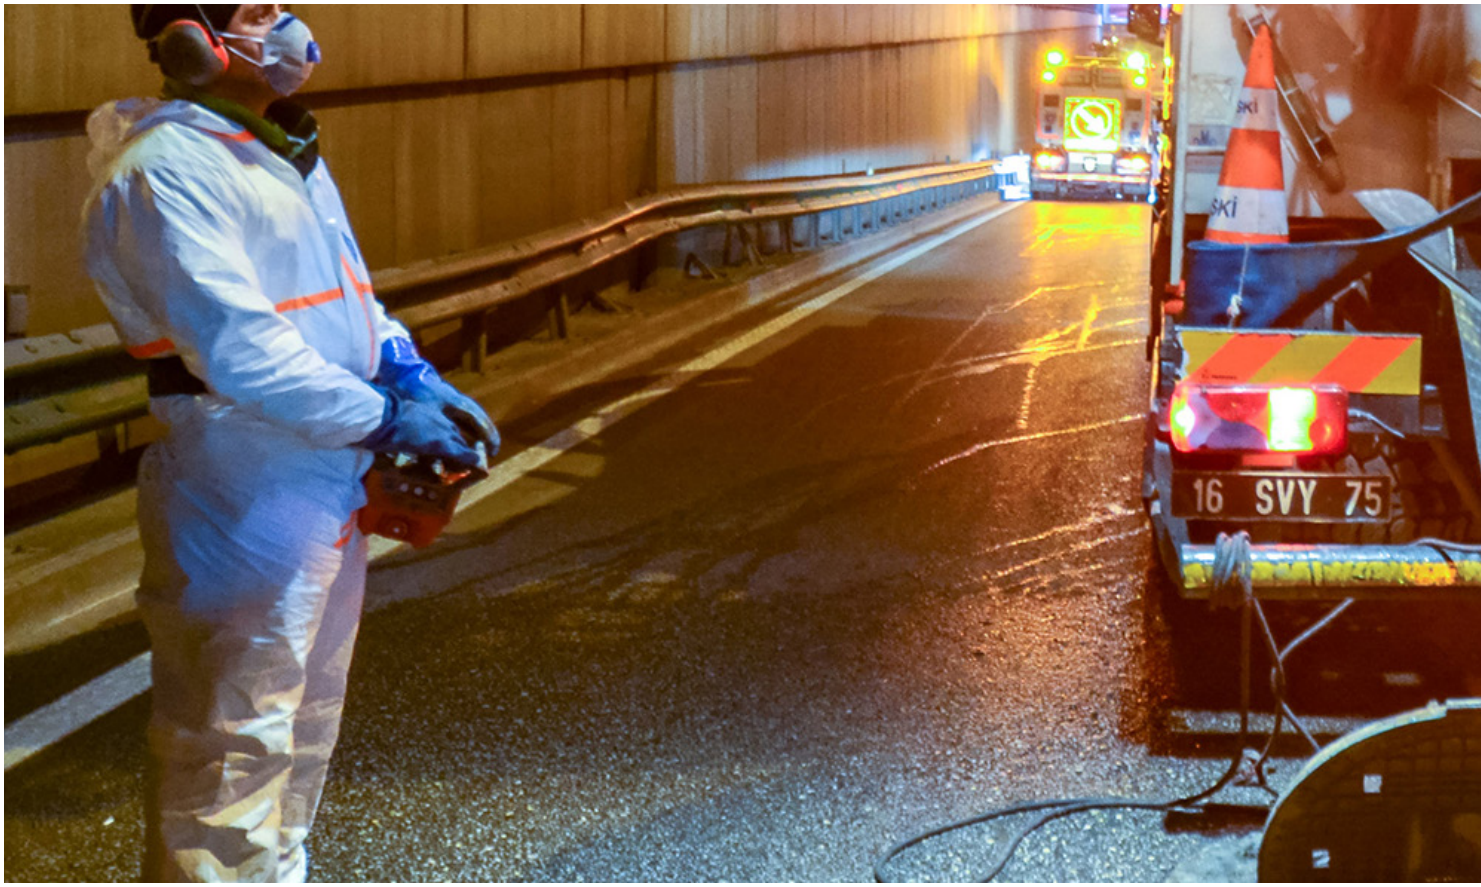

İşin Adı	2016/2 Bursa İli İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu Ve Kanal İlaveleri Ve Evsel Bağlantılarının Yapılması İşi
Sözleşme Bedeli	2.976.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	%87
İşin Tamamlanma Tarihi	13.10.2018

İşin Adı	2018/1 Bursa İli İnegöl İlç. Muhtelif Mah. İçmesuyu Ve Kanalizasyon Ana Hat İlaveleri Ve Evsel Bağlantılarının Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.252.917,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	%13
İşin Tamamlanma Tarihi	02.04.2020

İşin Adı	Bursa İli İnegöl İlçesi Merkez Ve Mahallelerinde Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	611.100,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	%23
İşin Tamamlanma Tarihi	10.08.2018



İşin Adı	2016\1 Karacabey İlçesi Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.579.930,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
Gerçekleşme Düzeyi	%22
İşin Tamamlanma Tarihi	16/09/2018



İşin Adı	2015\2 Mustafakemalpaşa İlçesi Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.679.772,30 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	M.Kemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	%112
İşin Tamamlanma Tarihi	13.10.2018

İşin Adı	2016\1 Mustafakemalpaşa İlçesi Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.477.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	M.Kemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	%112
İşin Tamamlanma Tarihi	15.10.2018

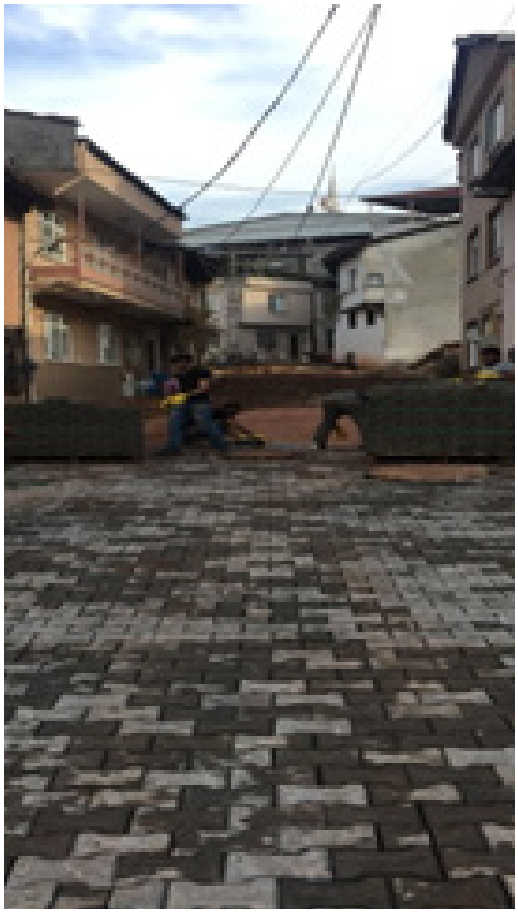

İşin Adı	2016 Bursa İli İznik İlçesi Merkez Ve Mahallelerinde Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	989.500,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	%97
İşin Tamamlanma Tarihi	15.02.2019

İşin Adı	2016 Bursa İli İznik İlçesi Merkez Ve Mahallelerinde Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.034.265,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	%53
İşin Tamamlanma Tarihi	20.02.2019

İşin Adı	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.398.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	%89
İşin Tamamlanma Tarihi	05.04.2018

İşin Adı	İznik İlçesi Kanalizasyon Ve Evsel Bağlantı İşi
Sözleşme Bedeli	1.389.250,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	%28
İşin Tamamlanma Tarihi	18.09.2019

İşin Adı	2016/1 Yenişehir Altyapı İnşaatı
Sözleşme Bedeli	3.274.524,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	%62
İşin Tamamlanma Tarihi	11.04.2019

İşin Adı	2016/2 Yenişehir İlçesi Muh. Mah. İç.su-yu Kan. Yağmursuyu Ve Ev. Bağ. Yap. İşi (Demir Tuna Altyapı İnş. Ltd. Şti.)
Sözleşme Bedeli	2.384.000.000 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	%62
İşin Tamamlanma Tarihi	17.02.2019

İşin Adı	2016/2 Yenişehir İlçesi Muh. Mah. İç.su-yu Kan. Yağmursuyu Ve Ev. Bağ. Yap. İşi (Demir Tuna Altyapı İnş. Ltd. Şti.)
Sözleşme Bedeli	2.384.000.000 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	%96
İşin Tamamlanma Tarihi	08.07.2018



İşin Adı	Yenişehir İlçesine Bağlı Toprak Ocak Mah. 250 Kişilik Foseptik Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	59.891,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	24.09.2018

İşin Adı	2015/2 Orhangazi Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.398.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi
Gerçekleşme Düzeyi	%89
İşin Tamamlanma Tarihi	05.04.2018

İşin Adı	Orhangazi İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu , Yağmursuyu , Kanalizasyon Hat İlavesi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.747.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi
Gerçekleşme Düzeyi	%46
İşin Tamamlanma Tarihi	16.05.2018

İşin Adı	2017/1 Orhaneli Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.652.845,55 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	%17
İşin Tamamlanma Tarihi	23.05.2018

İşin Adı	2018/1 Orhaneli İlç. Muh. Mah. Altyapı İnş. Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	942,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	%16
İşin Tamamlanma Tarihi	20.09.2018





İşin Adı	2016/1 Büyükorhan Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.801.180,20 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Büyükorhan
Gerçekleşme Düzeyi	%50
İşin Tamamlanma Tarihi	31.05.2018

İşin Adı	2015/2 Büyükorhan Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.840.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Büyükorhan
Gerçekleşme Düzeyi	%74
İşin Tamamlanma Tarihi	17.04.2018

İşin Adı	2015/2 Harmancık Altyapı İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.287.692,36 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Harmancık
Gerçekleşme Düzeyi	%88
İşin Tamamlanma Tarihi	31.08.2018

İşin Adı	Gedikören Mah. Fosseptik İnş. Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	64.956,50 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Harmancık
Gerçekleşme Düzeyi	%31
İşin Tamamlanma Tarihi	04.10.2018

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşin Adı	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Orhangazi ve İznik İlçeleri)
Sözleşme Bedeli	4.288.117,50 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Orhangazi ve İznik
Gerçekleşme Düzeyi	%15
İşin Tamamlanma Tarihi	06.04.2020

İşin Adı	2017 Yatay Delgi İnş Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	1.962.379,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%23
İşin Tamamlanma Tarihi	07.06.2019

İşin Adı	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)
Sözleşme Bedeli	4.395.570,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%49
İşin Tamamlanma Tarihi	05.03.2019

İşin Adı	2016/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Merkez Muhtelif İlçeler)
Sözleşme Bedeli	5.939.990,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%49
İşin Tamamlanma Tarihi	23.11.2019

İşin Adı	2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.
Sözleşme Bedeli	7.187.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%5
İşin Tamamlanma Tarihi	20.08.2019

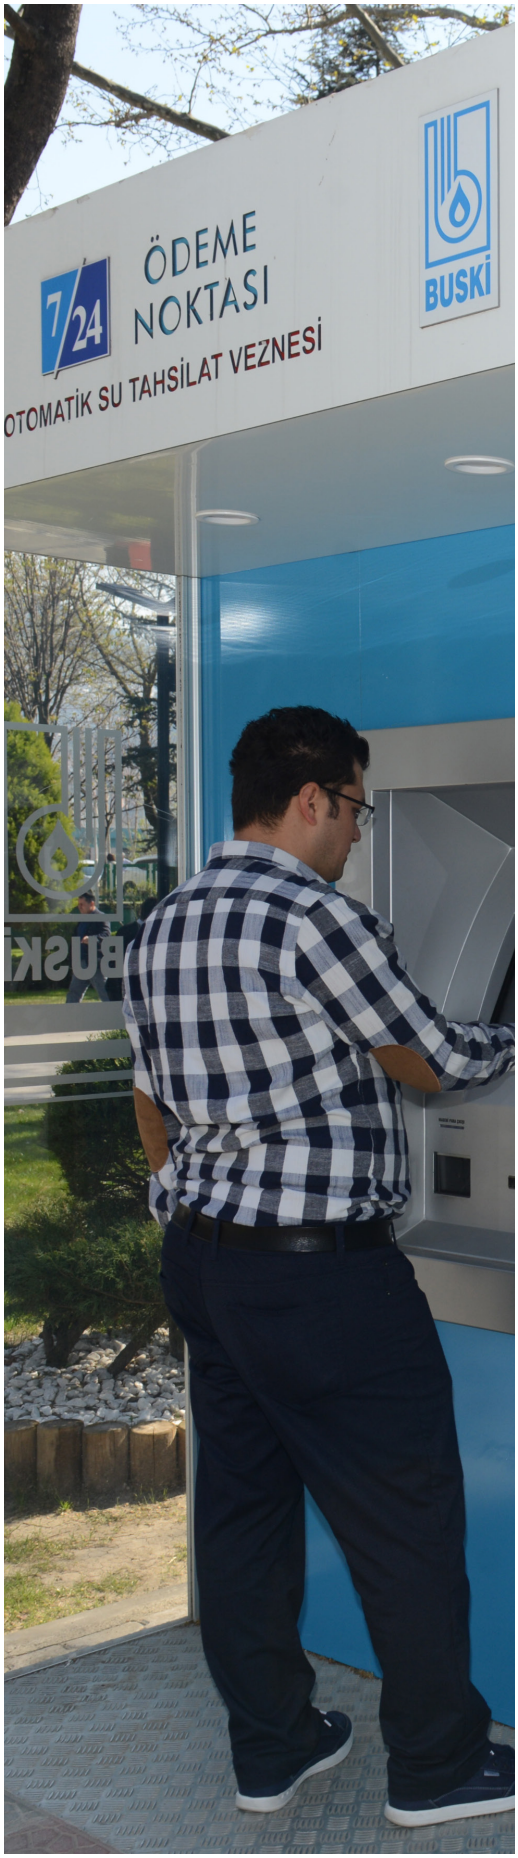

İşin Adı	2016/1 Muh.Depo İnş.İşi.
Sözleşme Bedeli	7.870.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%70
İşin Tamamlanma Tarihi	11.01.2019

İşin Adı	2017/6 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi (İnegöl - Yenişehir İlçeler)
Sözleşme Bedeli	6.662.900,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	%18
İşin Tamamlanma Tarihi	01.10.2019

İşin Adı	2017/1 Muh.Abone Talepleri İçm. Şbk. İşi. (DOĞU Muhtelif İlçeler)
Sözleşme Bedeli	1.483.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%68
İşin Tamamlanma Tarihi	25.03.2019

İşin Adı	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Orhangazi ve İznik İlçeleri)
Sözleşme Bedeli	3.223.896,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir, İnegöl, Gemlik
Gerçekleşme Düzeyi	%17
İşin Tamamlanma Tarihi	27.08.2019

İşin Adı	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhangazi - İznik)
Sözleşme Bedeli	8.864.306,16 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi İznik
Gerçekleşme Düzeyi	%31
İşin Tamamlanma Tarihi	07.07.2019



İşin Adı	2016/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)
Sözleşme Bedeli	4.459.324,59 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	%68
İşin Tamamlanma Tarihi	23.09.2019



İşin Adı	2016/5 Muhtelif Köylere Su Depoları İnşaatı İşi.(Orhaneli-Keles-B.Orhan-Harmancık)
Sözleşme Bedeli	5.455.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık
Gerçekleşme Düzeyi	%47
İşin Tamamlanma Tarihi	04.04.2020

İşin Adı	2016/6 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke ve İsale Hattı İnşaatı İşi. (Orhaneli-B. Orhan - Harmancık)
Sözleşme Bedeli	4.744.599,03 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli-B.Orhan-Harmancık
Gerçekleşme Düzeyi	%33
İşin Tamamlanma Tarihi	19.04.2020



İşin Adı	Karacabey İlçesi Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı
Sözleşme Bedeli	3.695.454,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
Gerçekleşme Düzeyi	%109,12
İşin Tamamlanma Tarihi	02.06.2019

İşin Adı	2015/1 Muhtelif Depo İnşaatı (Mustafakemalpaşa-Karacabey)
Sözleşme Bedeli	5.679.739,39 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	MKP Karacabey
Gerçekleşme Düzeyi	%117
İşin Tamamlanma Tarihi	12.08.2018



İşin Adı	2016/2 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu
Sözleşme Bedeli	3.979.050,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%110
İşin Tamamlanma Tarihi	20.04.2018

İşin Adı	2016/4 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı
Sözleşme Bedeli	6.450.050,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	%97
İşin Tamamlanma Tarihi	21.05.2019



İşin Adı	Orhangazi- Keles İlçeleri Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı
Sözleşme Bedeli	3.690.065,50 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi, Keles
Gerçekleşme Düzeyi	%95
İşin Tamamlanma Tarihi	28.10.2018

İşin Adı	Mustafakemalpaşa İlçesi II. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı
Sözleşme Bedeli	3.894.383,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	%102
İşin Tamamlanma Tarihi	10.06.2019

İşin Adı	Mustafakemalpaşa İlçesi I. Grup Muhtelif Su Alma Yapıları İnşaatı
Sözleşme Bedeli	3.939.390,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	%92
İşin Tamamlanma Tarihi	13.10.2018

İşin Adı	Keles İçmesuyu İnşaatı işi (SUKAP)
Sözleşme Bedeli	8.888.170,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Keles
Gerçekleşme Düzeyi	%89
İşin Tamamlanma Tarihi	26.11.2018

İşin Adı	Harmancık İlçesi İçmesuyu Temini yapım işi. (SUKAP)
Sözleşme Bedeli	7.312.257,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Harmancık
Gerçekleşme Düzeyi	%24
İşin Tamamlanma Tarihi	23.03.2019



KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşin Adı	2015_12_Gemlik Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	7.095.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik-Orhangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 103
İşin Tamamlanma Tarihi	07.09.2019

İşin Adı	2015_14_Muhtelif Betonarme Kutu Kesit İmalatı Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	12.412.850,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 112 (Bitti)
İşin Tamamlanma Tarihi	12.03.2019



İşin Adı	2016_03_İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	16.929.273,95 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 115)
İşin Tamamlanma Tarihi	25.02.2020

İşin Adı	2016_04_Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	10.160.626,80 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Karacabey
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 112)
İşin Tamamlanma Tarihi	08.06.2019

İşin Adı	2017_01_Mustafakemalpaşa - Karacabey Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	7.855.957,91 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 24)
İşin Tamamlanma Tarihi	12.07.2020

İşin Adı	2017_03_Büyükorhan-Keles-Harmancık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	4.273.920,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Büyükorhan – Keles - Harmancık
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 27)
İşin Tamamlanma Tarihi	05.06.2020

İşin Adı	2017_05_Osmangazi 1.Bölge Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	4.979.835,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 44)
İşin Tamamlanma Tarihi	10.12.2020

İşin Adı	2017_07_Nilüfer 1.Bölge Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	5.977.950,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 35)
İşin Tamamlanma Tarihi	01.12.2020

İşin Adı	2017_08_Nilüfer 2.Bölge Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	4.943.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 55)
İşin Tamamlanma Tarihi	14.07.2020

İşin Adı	2017_09_Kumsaz Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	10.446.520,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 88)
İşin Tamamlanma Tarihi	23.04.2021



İşin Adı	2017_10_Yıldırım – Kestel - Gürsu Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	6.290.578,60 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım – Kestel - Gürsu
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 61)
İşin Tamamlanma Tarihi	28.08.2021



İşin Adı	A3.2_Gemlik Körfezi Havzası Yağmursuyu ve Kanalizasyon Drenajı Yapım İşleri.
Sözleşme Bedeli	54.490.842,55 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik - Mudanya
Gerçekleşme Düzeyi	% 163
İşin Tamamlanma Tarihi	04.02.2019



İşin Adı	A3.4.1_Batı Nilüfer Ana Kollektörleri Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	58.675.819,98 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer -Mudanya
Gerçekleşme Düzeyi	% 138
İşin Tamamlanma Tarihi	22.01.2019

İşin Adı	A3.4.2_Ovaakça - Hasanağa Kollektörleri Yapım İşi.
Sözleşme Bedeli	78.085.011,97 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi - Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 99)
İşin Tamamlanma Tarihi	12.03.2019



İşin Adı	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	5.568.250,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım - Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 17)
İşin Tamamlanma Tarihi	18.03.2020

İşin Adı	İnegöl Huzur Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	7.823.636,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 50)
İşin Tamamlanma Tarihi	13.02.2020

İşin Adı	Nilüfer (Üçevler) Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.545.042,50 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 115
İşin Tamamlanma Tarihi	27.09.2018

İşin Adı	Keles (Bursa) Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	9.085.011,97 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Keles
Gerçekleşme Düzeyi	% 75
İşin Tamamlanma Tarihi	11.05.2018

İşin Adı	Harmancık (Bursa) Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	10.969.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Harmancık
Gerçekleşme Düzeyi	% 91
İşin Tamamlanma Tarihi	10.12.2018

İşin Adı	Büyükorhan (Bursa) Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	11.038.453,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Büyükorhan
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 21)
İşin Tamamlanma Tarihi	05.08.2019





İşin Adı	Kaplıkaya Deresi Islahı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	8.057.357,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım
Gerçekleşme Düzeyi	% 102
İşin Tamamlanma Tarihi	07.08.2019

İşin Adı	Gökdere Dere Islahı 3 Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.474.975,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yıldırım - Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 14)
İşin Tamamlanma Tarihi	11.05.2020

İşin Adı	Mudanya İlçesindeki Derelerin Islahı Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.104.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 15)
İşin Tamamlanma Tarihi	05.05.2020

İşin Adı	İnegöl – Oylat Kaplıca Dere Düzenlemesi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	744.074,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	İmalat çalışmaları devam etmektedir. (% 55)
İşin Tamamlanma Tarihi	15.06.2020

PLAN YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşin Adı	2017 Muhtelif İlçelerde Çeşme Yapılması Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.469.439,35 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 12
İşin Tamamlanma Tarihi	28.09.2019

İşin Adı	Muhtelif Bölgelerde Acil Dere Islah ve Atıksu Kollektörü Projelerinin Yapılarak Gerekli Detay Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
Sözleşme Bedeli	105.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gürsu, Mudanya, Keles, Harmancık, Büyükorhan
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	15.05.2018

İşin Adı	Nilüfer Çayı ile Yan Derelerinin Yerleşim Yerleri İle Arazilerinin Taşkından Korunması Master Plan Raporu ile Aplikasyona Dayalı Uygulama Projelerinin ve İnşaat İhale Dosyalarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmet İşi
Sözleşme Bedeli	3.300.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 96
İşin Tamamlanma Tarihi	31.12.2018

İşin Adı	Bursa İli Gemlik Körfez Havzasındaki Dere ve Yan Derelerin Yerleşim Yerleri İle Arazilerinin Taşkından Korunması ve Aplikasyona Dayalı Uygulama Projelerinin Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti Alım İşi
Sözleşme Bedeli	1.056.100,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
Gerçekleşme Düzeyi	% 95
İşin Tamamlanma Tarihi	12.02.2019





İşin Adı	Bursa İli Muhtelif Bölgelere Ait Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projeleri Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
Sözleşme Bedeli	525.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhangazi, İznik, Mudanya, Kestel, Gürsu, Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 0
İşin Tamamlanma Tarihi	04.12.2019

İşin Adı	Yaylacık , Kayapa ve Hasanağa Baraj Havzaları Fizibilite Raporunun Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
Sözleşme Bedeli	790.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	% 58
İşin Tamamlanma Tarihi	07.05.2018

İşin Adı	İçme Suyu Temini İçin Bursa İli Muhtelif Yerlerde Su Sondajı Çalışmalarının Yapılması
Sözleşme Bedeli	1.777.500.00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 45
İşin Tamamlanma Tarihi	07.01.2020

İşin Adı	Muhtelif Yerlerde Gözlemsel Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının ve Sondaja Dayalı Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alım İşi
Sözleşme Bedeli	599.880,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 83
İşin Tamamlanma Tarihi	16.05.2019

TARIMSAL PLAN VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşin Adı	Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.319.262,80 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
Gerçekleşme Düzeyi	% 29
İşin Tamamlanma Tarihi	07.06.2018

İşin Adı	İnegöl Dipsizgöl Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.293.783,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 62
İşin Tamamlanma Tarihi	26.03.2019

İşin Adı	İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Memranlı) Ve Derivasyon Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.516.300,05 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 23
İşin Tamamlanma Tarihi	18.09.2018

İşin Adı	İnegöl Sarıpınar Sulama Göleti (Membranlı) Ve Sulama Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.985.683,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	16.10.2018

İşin Adı	İznik Aydınlar Sulama Göleti (Membranlı)
Sözleşme Bedeli	2.487.057,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 61
İşin Tamamlanma Tarihi	26.03.2019





İşin Adı	İznik Candarlı Sulama Göleti (Membranlı)
Sözleşme Bedeli	2.888.083,20 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Iznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 70
İşin Tamamlanma Tarihi	02.04.2019

İşin Adı	İznik Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Ve Derivasyon Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.417.572,10 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	%33
İşin Tamamlanma Tarihi	30.10.2019

İşin Adı	İznik Mustafalı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.080.433,56 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	11.10.2020

İşin Adı	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.911.428,8 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Keles
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	30.08.2020

İşin Adı	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.608.240,9 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Keles
Gerçekleşme Düzeyi	% 53
İşin Tamamlanma Tarihi	21.06.2019

İşin Adı	Kestel Kozluören Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.197.522,11 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Kestel
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	08.03.2018

İşin Adı	Kestel Ümitalan Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.875.941,29 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Kestel
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	15.07.2020

İşin Adı	Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç Göleti (Membranlı) Ve Sulama Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	4.447.000 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mustafakemalpaşa
Gerçekleşme Düzeyi	% 8
İşin Tamamlanma Tarihi	13.08.2020

İşin Adı	Nilüfer İnegazi-Atlas Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.595.135,30 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	11.10.2020

İşin Adı	Orhaneli Gümüşpınar Göleti Ve Derivasyon Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.396.362,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	%27
İşin Tamamlanma Tarihi	09.07.2019



İşin Adı	Orhaneli İkizoluk-Yeşiller Göleti (Membranlı) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	3.196.315,45 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	17.08.2020

İşin Adı	Gemlik Şükriye Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	666.100,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	15.12.2019

İşin Adı	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.067.471,24 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	26.11.2019

İşin Adı	İnegöl Doğanyurdu Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	449.353,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	05.07.2018

İşin Adı	İnegöl Hasanpaşa (Yas) Sulama Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	848.951,60 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Inegöl
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	24.11.2019

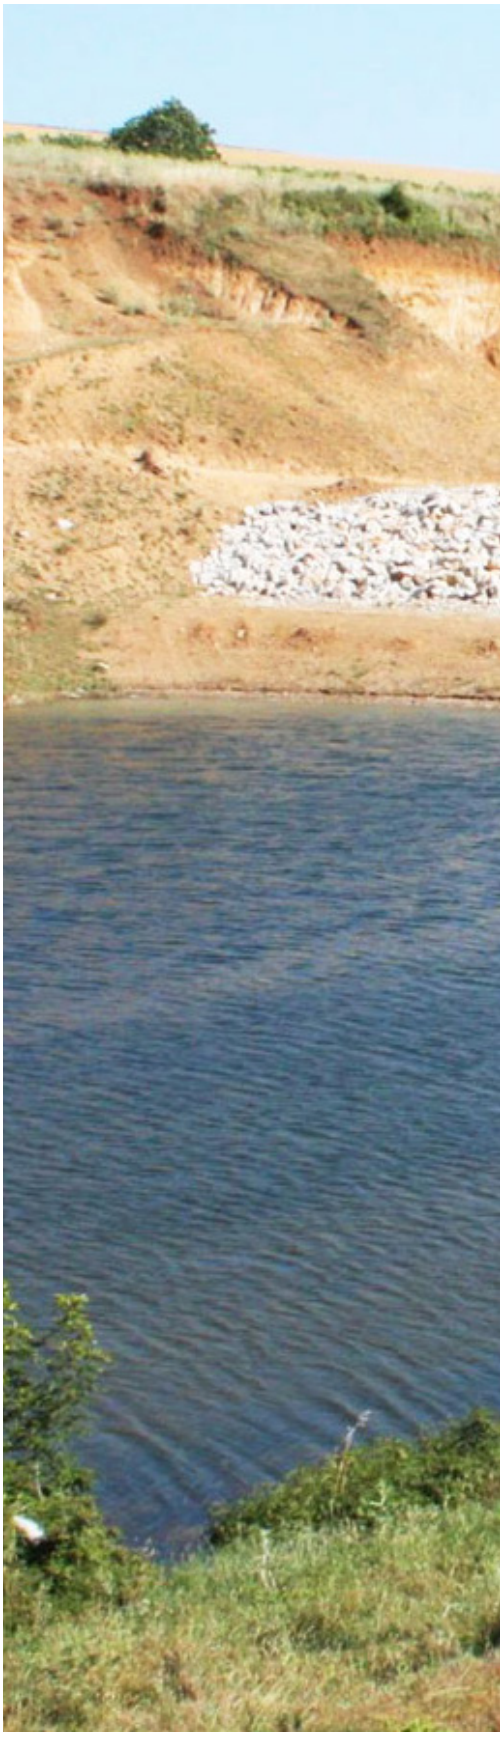

İşin Adı	İznik Candarlı Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	775.032,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	30.11.2018

İşin Adı	İznik Tacir (Göletten) Sulama Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	744.063,60 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İznik
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	23.05.2018

İşin Adı	Kestel Gözede Sulama Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.632.300,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Kestel
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	24.04.2020

İşin Adı	Kestel Kozluören Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	552.864,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Kestel
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	04.09.2018

İşin Adı	Kestel Osmaniye Sulama Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	536.884,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Kestel
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	18.04.2018





İşin Adı	Keles Menteşe Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	603.730,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Keles
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	05.03.2018

İşin Adı	Orhaneli Akalan Sulama Göleti Ve Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	2.439.535,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	% 95
İşin Tamamlanma Tarihi	23.10.2018

İşin Adı	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	856.655,70 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	17.11.2018

İşin Adı	Yenişehir Terziler (Göletten) Sulama Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	1.944.777,60 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Yenişehir
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	14.03.2020

İşin Adı	Mudanya Göynüklü - Gemlik Kurşunlu - Gemlik Yeniköy Sulama Ve İlaçlama Havuzları Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	180.224,50 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya - Gemlik
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	30.09.2018

İşin Adı	Gürsu Kumlukalan Tanker Dolum Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	51.160,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gürsu
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	30.07.2018

İşin Adı	Osmangazi Tuzaklı Sulama Havuzu Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	66.864,73 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	%100
İşin Tamamlanma Tarihi	05.10.2018

İşin Adı	Mudanya Dereköy Zirai İlaçlama Ve İnegöl Eskiköy Sulama Havuzu Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	188.174,5 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya Ve İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	19.06.2019

İşin Adı	Mudanya Altıntaş Zirai İlaçlama Deposu Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	65.903,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Mudanya
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	28.06.2018

İşin Adı	Orhaneli Girecik Sulama Havuzu Ve Sulama Tesisi İle Osmangazi Doğancı Sulama Tesisi Bakım Onarım Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	444.460,60 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Orhaneli Ve Osmangazi
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	16.08.2019

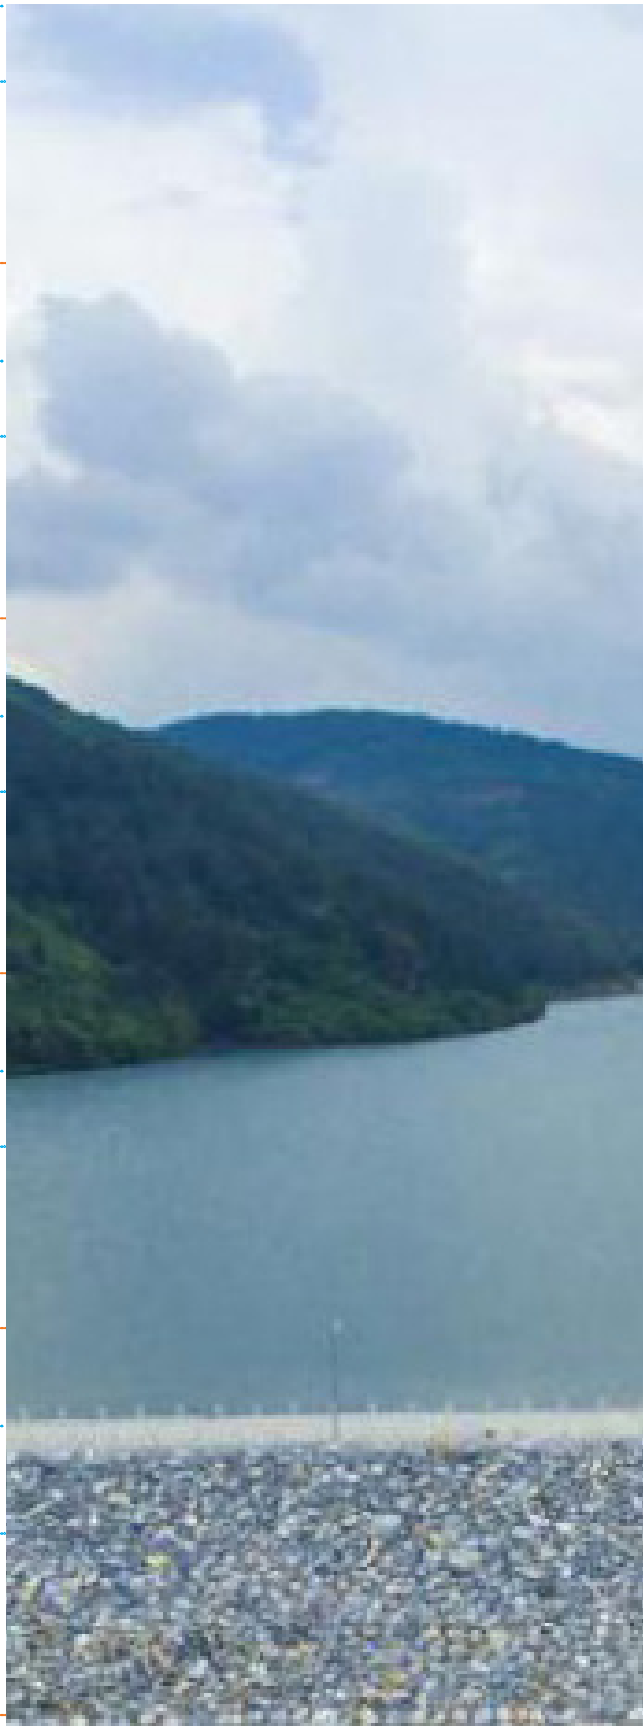



İşin Adı	Gemlik Kurtul Tanker Dolum Tesisi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	43.861,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gemlik
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	13.06.2018

İşin Adı	Gürsu - Ericek, Gemlik - Katırlı, Orhangazi- Gölyaka Sulama havuzları Membran Kaplama Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	57.535,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Gürsu - Gemlik - Orhangazi
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	09.04.2018

İşin Adı	Harmancık Yayabaşı Sulama Tesisi Bakım-Onarım Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	53.790,10 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Harmancık
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	30.04.2018

İşin Adı	İnegöl İclaliye –Kestanealan – Karakadı Sulama Tesisi Bakım-Onarım Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	180.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	31.07.2018

İşin Adı	İnegöl Kurşunlu Su Alım Yapısı Rehabilitasyon Projesi Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	417.475,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 90
İşin Tamamlanma Tarihi	19.07.2019

İşin Adı	Kestel Kozluören Sulama Göleti Drenaj Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	450.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Kestel
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	02.10.2019

İşin Adı	Muhtelif Yerlerde Sulama Havuzları Epdm Membran Kaplaması Ve Sulama Göletlerinde Hdpe Membran Bakım-O-narım Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	45.120,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	31.10.2018

İşin Adı	Nilüfer Dağyenice Sulama Tesisi Bakım Onarım, Yenişehir Mecidiye Tanker Dolum Tesisi, İnegöl Kıran Sulama Tesisi Rehabilitasyonu Ve İnegöl Kestanealan Sulama Tesisi Bakım-Onarım Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	65.209,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Nilüfer-Yenişehir-İnegöl
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	31.07.2018

İşin Adı	Muhtelif Yerlerde Su Sondajı Ve Hidroje-olojik Etüt Yapılması Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	488.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 100
İşin Tamamlanma Tarihi	31.07.2018

İşin Adı	Muhtelif Yerlerde Sulama Göleti Temel Etüt Sondajları Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	190.000,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	% 85
İşin Tamamlanma Tarihi	05.08.2019



İşin Adı	Muhtelif Yerlerde Su Sondajı Ve Hidroje-olojik Etüt Yapılması Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	692.100,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	12.04.2021

İşin Adı	Muhtelif Yerlerde Sulama Göleti Temel Etüt Sondajları Yapım İşi
Sözleşme Bedeli	422.500,00 - TL
Çalışma Yapılan İlçe	Çalı Muhtelif
Gerçekleşme Düzeyi	Uygulama Aşamasında
İşin Tamamlanma Tarihi	18.05.2021



B.2. Performans Sonuçları Tablosu

STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ
2	5	52	55

YIL SONU GERÇEKLEŞME			
STRATEJİK AMAÇ 1:	Mevcut su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilirliğini ve alternatif su kaynaklarını tespit ederek geliştirilmesini sağlamak.		
STRATEJİK HEDEF 1.1:	Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 200 km. pınar kaynağı ıslahının, 2019 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 :2018 yılı sonuna kadar 30 km pınar kaynağı ıslahının tamamını gerçekleştirmek.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	30	31	İçmesuyu D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 1.2:	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu Şişeleme Tesisi yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1 :	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
			Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
AÇIKLAMA	2018 yılından önce tamamlanmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 1.3:	2017 yılı sonuna kadar Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarında bulunan yerleşim alanlarındaki atıksuların arıtılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1 :	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
			Arıtma Tesisleri D.B., Plan Yat. ve İnşaat D.B., Kan. D.B.
AÇIKLAMA	2018 yılından önce tamamlanmıştır. 2018 yılı için havzalardaki yerleşimlerin atıksuları vidanjör aracılığı ile uzaklaştırılmaktadır. Tedbir amaçlı olarak da muhtelif noktalarda paket atıksu arıtma tesisleri çalıştırılmak (Küçükdeliler, Çaybaşı gibi) suretiyle % 10 hedefe ulaşılmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 1.4:	Kuraklık ve ihtiyaç artışı nedeniyle 2019 yılı sonuna kadar toplam 100 adet sondaj kuyusu açmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1 :2018 yılı sonuna kadar toplam 20 adet sondaj kuyusu açmak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	20	28	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir. İçmesuyu kuyusu ihtiyacı doğrultusunda; performans hedefinde 2015-2018 yılları arasında açılması öngörülen toplamda 100 adet su sondaj kuyusu sayısından fazla sayıda ihale kapsamında su sondaj kuyusu açılmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 1.5:	İçmesuyu kalitesini 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.		

PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1 :2018 yılında 3 ayda bir kimyasal veya bakteriyolojik numune alarak denetlemek.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir. 2018 yılı için İçmesuyu şebekemiz üzerinden denetim amaçlı toplam 20527 adet numune alınarak, " İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında analizler yapılarak % 100 hedefe ulaşılmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 1.6:	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut 213 adet kuyuyu aktif halde tutmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1 :2018 yılında olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere mevcut kuyuların %100'ünü aktif halde tutmak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	97%	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
AÇIKLAMA	Elektrik enerjisi geçici olarak kesilen ya da sondajla yeniden açılması gereken kuyular vardır.		
STRATEJİK HEDEF 1.7:	Her yıl 120 adet köye dezenfeksiyon sistemini kurmak veya iyileştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1 : 2018 yılında 120 adet köyün dezenfeksiyon sisteminin %100'ünü kurmak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir. 2018 yılında 242 adet, 2015 yılı itibariyle toplamda 918 adet dezenfeksiyon sistemi kurulumu yapılmıştır.		
STRATEJİK AMAÇ 2:	Su kaybını önlemede kaçak su oranını azaltmak ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.		
STRATEJİK HEDEF 2.1:	Yeni bağlanan 10 ilçeye ait kaçak su oranlarını 2017 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale getirmek ve iyileştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1 : PERFORMANS HEDEFİ	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
			Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., İçmesuyu D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B
AÇIKLAMA	2018 yılından önce tamamlanmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 2.2:	4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını 2019 yılı sonuna kadar %31'e düşürmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1 :2018 yılı sonuna kadar 4 ilçede (Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik) kaçak su oranlarını %32'e düşürmek. PERFORMANS HEDEFİ	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	32%	31%	Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.İçmesuyu D.B., İşletmeler 1.Bölge D.B., Abone İşleri D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 2.3:	Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde %23 kaçak su oranını 2019 yılı sonuna kadar %20'ye düşürmek .		
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1 :2018 yılı sonuna kadar Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranlarını %21,0 oranında düşürmek. PERFORMANS HEDEFİ	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	21%	21%	İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		

STRATEJİK HEDEF 2.4:	2019 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 208 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1 :2018 yılı sonuna kadar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 40 adet alt bölgenin eşzamanlı okunmasını sağlamak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	40	40	İşletmeler 1. Bölge D.B., İçmesuyu D.B., Abone İş. D.B., Elekt. Mak. Ve Mlz. İkmal D.B., Emlak İst. D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK AMAÇ 3:	Abonelerin içmesuyu ile tarımsal arazilerin sulama suyu ihtiyacını etkin ve verimli şekilde karşılamak.		
STRATEJİK HEDEF 3.1:	2019 yılı sonuna kadar 2.000 km şebeke inşaatı yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1 :2018 yılı sonuna kadar 400 km şebeke inşaatı yapmak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	400	369	İçmesuyu D.B.
AÇIKLAMA	2018 yılı için gerçekleşen metrajın, hedefin altında kaldığı görülmektedir. Ancak Stratejik Planda belirtilen 2015-2018 yılları arası hedeflenen toplam metraj 2000 km, 2015-2018 yılları arası gerçekleşen toplam metraj 2000 km'yi geçtiğinden toplamda hedefin üstüne çıkmış bulunmaktayız.		
STRATEJİK HEDEF 3.2:	2019 yılı sonuna kadar 500 km isale hattı inşaatı yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1 :2018 yılı sonuna kadar 100 km isale hattı inşaatı yapmak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	100	53	İçmesuyu D.B.
AÇIKLAMA	2018 yılı için gerçekleşen metrajın, hedefin altında kaldığı görülmektedir. Ancak Stratejik Planda belirtilen 2015-2018 yılları arası hedeflenen toplam metraj500 km, 2015-2018 yılları arası gerçekleşen toplam metraj 500 km'yi geçtiğinden toplamda hedefin üstüne çıkmış bulunmaktayız.		
STRATEJİK HEDEF 3.3:	2019 yılı sonuna kadar 175 adet depo inşaatı yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1 :2018 yılı sonuna kadar 35 adet depo inşaatı yapmak	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	35	36	İçmesuyu D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.4:	2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 5.000 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1 :	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
			Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
AÇIKLAMA	2018 yılından önce tamamlanmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 3.5:	İçme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini 2019 yılı sonuna kadar ortalama 30 saate düşürmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1 : 2018 yılı sonuna kadar içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresini ortalama 34 saate düşürmek.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	34	30	İşletmeler 1. Bölge D.B.
			İşletmeler 2. Bölge D.B

AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.6:	2019 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 2 iş günü içinde takmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1 : 2018 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sayaçlarını ortalama 3 iş günü içinde takmak	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	3	2	İşletmeler 1. Bölge D.B.
			İşletmeler 2. Bölge D.B
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.7:	2019 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 5 iş günü içinde tamamlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1 :2018 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin şebeke bağlantılarını ortalama 6 iş günü içinde tamamlamak	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	6	6	İşletmeler 1. Bölge D.B.
			İşletmeler 2. Bölge D.B
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.8:	Otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaları çalışır halde tutmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.8.1: 2018 yılında otomatik kumanda sistemine bağlı 131 adet pompaların %100'ünü çalışır halde tutmak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.9:	2019 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve depoyu otomatik çalışır hale getirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.9.1 :2018 yılı sonuna kadar toplam 285 adet pompa ve deponun %100'ünü otomatik çalışır hale getirmek.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.10:	2015 yılı sonuna kadar 320.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların tamamını değiştirmek, sonraki yıllarda da her yıl, bir önceki yıl sonu itibariyle, 10 yılını doldurmuş sayaçların tamamını değiştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.10.1 :2018 yılı sonuna kadar 42.000 adet kalibrasyonu gelmiş sayaçların %100'ünü değiştirmek.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Abone İşleri D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.11:	Abonelik müracatından itibaren keşif işlemlerini 2017 itibariyle 2 iş günü içinde gerçekleştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.11.1 :	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
AÇIKLAMA	2018 yılından önce tamamlanmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 3.12:	2014 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının 2019 yılı sonuna kadar %80'ini tahsil etmek.		

PERFORMANS HEDEFİ 3.12.1 :2018 sonu itibariyle tahsili mümkün olan su alacaklarının %10'unu tahsil etmek.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%10	%15	I. Hukuk Müşavirliği
AÇIKLAMA	2014 yılı sonu itibariyle 40 milyon TL'lik tahsilatı mümkün alacağın önceki yıllarda gerçekleştirilen %40'lık tahsilat tutarı üzerine %15 daha ilave edilerek 2018 yılı sonuna kadar %55 oranında 6 milyon TL tahsilat yapılmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 3.13:	Dönemi içerisindeki tahakkuk/tahsilat oranını %80'den %90'a çıkartmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.13.1 :2018 yılında dönemi içerisindeki tahakkuk/ tahsilat oranını %86'dan %88'e çıkarmak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%88	%85	Abone İşl. D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B.,Strateji Gel. D.B.
AÇIKLAMA	Hedefin gerçekleştirilmesi için tahsilat araçları ve alternatiflerinin çeşitlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir.		
STRATEJİK HEDEF 3.14:	2015 yılı sonuna kadar Kestel ve Mudanya'daki hizmet binalarını tamamlamak, 2019 yılı sonuna kadar her yıl 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımını yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.14.1 :2018 yılında 10 adet su deposu ile 5 adet hizmet tesisinin inşaatı ile bakım onarımının %100'ünü tamamlamak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Planlama Yatırım ve İnşaat D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.15:	2019 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisi faal halde tutmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.15.1 :2018 yılı sonuna kadar scada sisteminde çalışan 187 adet tesisisin %100'ünü faal halde tutmak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.16:	2019 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisi scada sistemine almak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.16.1 :2018 yılı sonuna kadar otomasyonda çalışan 96 adet tesisin %100'ünü scada sistemine almak	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.17:	2019 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatını tamamlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.17.1 :2018 yılı sonuna kadar her yıl planlanan sulama suyu proje ve inşaatının %100'ünü tamamlamak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Tarımsal Planlama ve Yat. D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 3.18:	2017 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100 ünü yapmak.		

PERFORMANS HEDEFİ 3.18.1 :2018 yılında yapılacak içmesuyu arıtma tesislerinin ve paket arıtmaların bakım ve onarımlarının %100'ünü yapmak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir. Tüm İçmesuyu arıtma tesislerimiz sorunsuz olarak işletilmekte olup, rutin bakım ve onarımları yapılmaya devam etmektedir.		
STRATEJİK HEDEF 3.19:	2019 yılı sonuna kadar mevcut çelik boru hatlarını her yıl %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının katodik korumasını yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 3.19.1 :2018 yılında mevcut çelik boru hatlarının %100 işletmek ve yeni çelik boru hatlarının 550 km.'lik kısmının %100'ünün katodik korumasını yapmak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%98	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
AÇIKLAMA	Yol kazı çalışmalarından dolayı zarar gören İznik-Sakarya Hattının devreye alınması için yapılan inceleme ve çalışmalarda anot yataklarının dağıldığı ve asfalt altında kaldığı tespit edilmiştir. Ölçü kutuları da zarar görmüştür. Yeni bir yatak sisteminin yapılması ileri çalışmalarda programa alınmış olup periyodik bakım listesinden çıkarılmıştır.		
STRATEJİK AMAÇ 4:	Yağmursuyu ve atıksuları çevreye zarar vermeden kontrol altına almak.		
STRATEJİK HEDEF 4.1:	Kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerinin 2019 yılı sonuna kadar 5.000 km'sini hazırlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1 :2018 yılı sonuna kadar kanalizasyon, yağmursuyu, dere ıslah avan/ uygulama projelerinin 750 km'sini hazırlamak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	750	327	Planlama Yat. ve İnş. D.B.
AÇIKLAMA	2018 yılı için gerçekleşen metrajın, hedefin altında kaldığı görülmektedir. Ancak Stratejik Planda belirtilen 2015-2018 yılları arası hedeflenen toplam metraj 4250 km, 2015-2018 yılları arası gerçekleşen toplam metraj 4476 km'dir.		
STRATEJİK HEDEF 4.2:	2015-2019 yılları arasında 525 Km yağmursuyu hattı döşemek.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1 :2018 yılı sonuna kadar 105 km yağmursuyu hattı döşemek.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	105	60	Kanalizasyon D.B.
AÇIKLAMA	Hedefe yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.		
STRATEJİK HEDEF 4.3:	2015-2019 yılları arasında sel taşkınlarını önlemek için derelerin 19 km'sini ıslah etmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1 :2018 yılı sonuna kadar sel taşkınlarını önlemek için derelerin 5 km'sini ıslah etmek.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	5	1	Kanalizasyon D.B.
AÇIKLAMA	Hedefe yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.		
STRATEJİK HEDEF 4.4:	2015-2019 yılları arasında 1.000 km kanalizasyon hattı döşemek.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1 :2018 yılı sonuna kadar 200 km kanalizasyon hattı döşemek.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	200	127	Kanalizasyon D.B.
AÇIKLAMA	Hedefe yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.		

PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1 :2018 yılı sonuna kadar 17 ilçede 16 adet atıksu arıtma tesisi ve mahallelerde toplam 5 adet paket atıksu arıtma tesisinin %10'sini tamamlamak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%10	%10	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 4.6:	2015 yılı sonuna kadar seçilen 40 adet işletmede atıksu online izleme sistemi kurmak ve izleyebilir hale gelmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.6.1 :	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
			Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Tamamlandı.		
STRATEJİK HEDEF 4.7:	2017 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1 :	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
			Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	2018 yılından önce tamamlanmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 4.8:	AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1 :2018 yılı sonuna kadar AKKR başvurusunda bulunan işyerlerinin 10 iş günü içerisinde %100'ünü yerinde tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK AMAÇ 5:	Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesinde kalite ve etkinliği arttırmak.		
STRATEJİK HEDEF 5.1:	İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1 :2018 yılında İçmesuyu ve atıksu laboratuvarlarının TSEN 17025 sistemine göre akreditasyon etkin sürdürümü ve gelişimini %100 sağlamak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Arıtma Tesisleri D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 5.2:	Plan dönemi içerisinde her yıl üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını karşılamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1 :2018 yılında üst yönetimin belirlediği sayıda kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için personel ihtiyacını %100 karşılamak	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	İnsan Kay. Ve Eğitim D.B., Abone İşleri D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 5.3:	Plan dönemi içerisinde her yıl lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini gerçekleştirmek.		

PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1 :2018 yılı sonuna kadar plan dönemi içerisinde lisanslı programların ve yazılımların yenilenmesi ve iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Bilgi İşlem D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 5.4:	Bilgisayar teknolojisini ve altyapısını her yıl %20 geliştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1 :2018 yılı sonuna kadar bilgisayar teknolojisini ve altyapısını %20 geliştirmek.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%20	%20	Bilgi İşlem D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 5.5:	Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısını fiber hatlara taşımak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1 :2018 yılı sonuna kadar Kurumdaki Şube Müdürlükleri ve tahsilat şubelerinin WAN (uzak bağlantı) altyapısının %20 'sini fiber hatlara taşımak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%20	%20	Bilgi İşlem D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 5.6:	Her yıl 4 daire başkanlığının teftişini yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1 :2018 yılı sonuna kadar 4 daire başkanlığının teftişini yapmak	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	4	4+33	Teftiş Kurulu Başkanlığı
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 5.7:	2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 6400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1 :2018 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 1400 kw/saat kapasiteli tesis kurmak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	1.400	520	Elektrik Mak. Ve Mlz. İkm. D.B.
AÇIKLAMA	Haziran ayında Gürsu Karapınar TR ünitesinin bir çok ekipman ve kabloları olup çalındığından, yakın hattan şöntlemesi yapılmış ölçümler istenilen seviyelerde, hat korunmaktadır. Duruma göre ileri ki zamanlarda yeni trafo korunabilecektir. Periyodik bakım listesinden çıkarıldı.		
STRATEJİK HEDEF 5.8:	Satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda sistem kurmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.8.1 :2018 yılı sonuna kadar satınalma süreçlerinin kısaltılması konusunda %20 sistemi kurmak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%20	**%20**	Ticaret İşleri D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 5.9:	Yeni hizmet sınırlarımız içerisinde 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritaları projesini 2017 yılına kadar tamamlamak ve 2018 yılı içinde projenin tümünün Buski'de kullanılmasını ve programlara uyarlanmasını sağlamak.		

PERFORMANS HEDEFİ 5.9.1 :	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
			Emlak ve İst. D.B.
AÇIKLAMA	2018 yılından önce tamamlanmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 5.10:	Kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.10.1:2018 yılı sonuna kurumu tanımak, su bilinci ve kültürü düzeyini %100 arttırmak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Basın ve Halkla İlş. Ş.M., İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 5.11:	Yıllık ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkarmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.11.1 :2018 yılı sonuna kadar ortalama kişi başı eğitim saatini 6 saate çıkartmak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	6	7	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 5.12:	Kurumda istatistik ve raporlama sistemini 2016 sonuna kadar kurmak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.12.1 :	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
			Strateji Gel. D.B.
AÇIKLAMA	2018 yılından önce tamamlanmıştır.		
STRATEJİK HEDEF 5.13:	Sağlık hizmetlerine müraacaat eden tüm talepleri gün içerisinde karşılamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.13.1 :2018 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine müraacaat eden tüm taleplerin %100'ünü gün içerisinde karşılamak	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Uzman Tabiplik
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 5.14:	Kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ 5.14.1 :2018 yılı sonuna kadar kesin hesap işlemlerinin mevzuattaki süreler kapsamında yerine getirilmesini %100 sağlamak.	**2018**		**SORUMLU BİRİM**
	Tahmin	**Yıl Sonu Gerçekleşme**	
	%100	%100	Kesin Hesap Ş.M.
AÇIKLAMA	Hedef gerçekleşmiştir.		
STRATEJİK HEDEF 5.15:	Kurumda iç kontrol sistemini 2015 sonuna kadar kurmak ve uygulanmasını sağlamak.		

PERFORMANS HEDEFİ 5.15.1 :2018 yılı sonuna kadar kurumda iç kontrol sistemini %100 kurmak ve uygulanmasını sağlamak.	2018		SORUMLU BİRİM
	Tahmin	Yıl Sonu Gerçekleşme	
	%100	%73	Strateji Gel. D.B.
AÇIKLAMA	İç kontrol sistemi kurulmuş olup, uygulama yönünden; Mali işlemler süreç akış yönergesi, Etik Kurallar ile ilgili eğitim semineri, görev ve çalışma yönergeleri, BUSKİ teşkilat yönetmeliği, görev dağılım şemaları, kurum içi kalite tetkikleri ve gözden geçirme toplantısı çalışmaları tamamlanmış; imza yetkileri yönergesi, BUSKİ bilgi sistemi, hassas görev prosedürleri, çalışma kontrol prosedürleri, görev teslim raporu çalışmaları ise devam etmektedir.		



Bursa Ulucami



4. KURUMSAL KAABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

B. Zayıflıklar

B. Değerlendirme

IV. KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. ÜSTÜNLÜKLER

Güçlü Yönler

1. Özel bir kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip köklü bir kurum olması,
2. Dünyada tanınır konumda ve Türkiye'de benzer kamu kurum ve kuruluşlara öncülük edecek nitelikte olması,
3. Büyük ölçekli yatırımcı bir kuruluş olması nedeniyle profesyonel hizmet alma ve profesyonel hizmet verme gücü ne sahip olması,
4. Su kalitesinde standartları yakalamış olması,
5. TS-EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip olması,
6. Yatırım ihtiyacının karşılanmasında kredibilitesinin yüksek olması,
7. Abonelere yönelik sanal ortamdaki çözüm ve uygulamalarının gelişmişliği,
8. Tahsilat noktalarının çokluğu ve bölgesel dağılımının dengeli olması,
9. Bursa genelinde atık su ve yağmur suyu hatlarının %99'unun ayrıştırılmış olması,
10. Su kayıplarının düşüklüğü konusunda Türkiye'de öncü olması,
11. Nilüfer ve Doğancı gibi iki adet büyük barajının olması,
12. Tahsilat oranının yüksek olması,
13. Abonelere kaliteli içmesuyu sağlaması,
14. İçmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin varlığı,
15. Abonelere alternatif ödeme seçeneklerinin sunulması,
16. Kurumumuz yazılımlarının çoğunlukla kendi personeli tarafından yapılması,
17. Scada sistemine sahip olması
18. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmesi.

Fırsatlar

1. Su kaynaklarına ulaşma ve kullanma imkânına sahip olunması,
2. Bursa'da su ve atık su konusunda yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip üniversitelerin ve araştırma kurumlarının oluşmaya başlaması,
3. Tedarikçi kullanımı açısından güçlü özel sektörün olması ve alternatif hizmet yöntemlerinin gelişmesi,
4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik yönetim anlayışına geçilmesi zorunluluğu, AB uyum çabalarının ve politikalarının varlığı,
5. Yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki gelişmeler,
6. 6360 Sayılı Kanun ile yetkilerin artması,
7. Teknoloji imkanlarının artması,
8. Personelin gelişen teknolojiye kısa sürede uyum sağlaması,
9. İçmesuyu ve atıksu teknolojilerinde gelişme olması.

B- ZAYIFLIKLAR

Zayıf Yönler

1. Özel bir kanunla kurulmuş olmakla birlikte diğer kanunlarla bazı kısıtlamaların oluşması,
2. Personele yönelik imkanların (lokal, kreş v.b.) yetersiz kalması,
3. Abone bilgi ve adres güncellemesinin devam ediyor olması.

Tehditler

1. Bursa'nın sürekli göç almasına bağlı olarak nüfusun hızla artması,
2. Bursa'nın coğrafi konumu,
3. Su kaynaklarının yüzeysel sulardan oluşması,
4. İçme suyu kaynaklarının bulunduğu arazilerdeki mülkiyet sorunu nedeniyle kamulaştırma bedellerinin giderek yükselmesi ve havzaların korunmasına yönelik kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma mahiyetli davaların ciddi boyutlara ulaşması,
5. Havza çevrelerinin doğal güzelliğinin nitelikli kaçak yapılaşmalar için cazibe merkezleri olması,
6. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri,
7. Bursa'da doğal afet risklerinin varlığı (1.dereceden deprem bölgesi olması),
8. Yağmursuyu ve derelerle ilgili yetki ve görev karmaşası, koordinasyon ve mevzuat eksiklikleri,
9. Diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları sırasında altyapıya zarar vermesi,
10. Hukuki davaların sonuçlanma süresinin uzun olması,
11. Çeşitli mevzuat düzenlemeleri ile kurum gelirlerine yönelik kısıtlayıcı hükümler getirilmesi.

C. DEĞERLENDİRME

- Doğancı Barajı yanında Nilüfer Barajı'nın da devrede bulunması ilimiz açısından bir avantaj olurken, şehrin yoğun göç alarak nüfusun hızla artması nedeniyle yeni yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyacı, planlama ve hizmet kalitesi yönünden dezavantaj oluşturmaktadır.

- İdarece açılacak davalar ve icra takibine konacak dosyalar önceden bilinememektedir. Bu hususlar, tamamıyla diğer birimlerin taleplerine bağlı olduğundan, bu konuları içeren, ileriye dönük plan ve programların yapılma sında güçlük çekilmektedir. İdare faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, üçüncü kişilerle idare arasında doğabile cek ihtilaflarda, kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, üçüncü kişinin haklı olması durumunda, açılan davaların kaybedilmesi riski bulunmaktadır.

- Öğrencilere yönelik bilinçli su kullanım eğitimleri ve BUSKİ tesislerine yapılan teknik geziler devam edecektir.

- Kayıp-kaçak ile ilgili çalışmalara çok yönlü olarak ve kararlılıkla devam edilecektir.

- E-İmzaya paralel olarak dijital arşive geçiş çalışmaları devam edecektir.

- Enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

- Yeni teknoloji ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalara devam edilecektir.

- Halkla ilişkiler ve hizmet masasının güçlendirilmesine, hizmet verilen abonelerin öneri ve şikayetlerine karşılık gerekli tedbirleri almaya, duyarlı olmaya ve kurum hizmetleri hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam edilecektir.

- Kurumsal kültürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, personelin nitelik olarak geliştirilmesi, bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.

- Yeraltı ve yerüstü tüm su kaynaklarının kullanımında kurumlar arası yetki ve sorumlulukların karmaşıklığını giderecek, yeni bir "Su Yasası"na ihtiyaç vardır.

6360 Sayılı Kanun ile görev alanımıza giren tarımsal sulama tesisi ve gölet yapımlarına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgiler güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığı ve iç kontrol sistemin yasallık ve düzeliliğine yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığı beyan ederim.

Güngör GÜLENÇ

BUSKİ Genel Müdürü

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.



Halit KARASU
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
