
2017 FAALİYET RAPORU

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

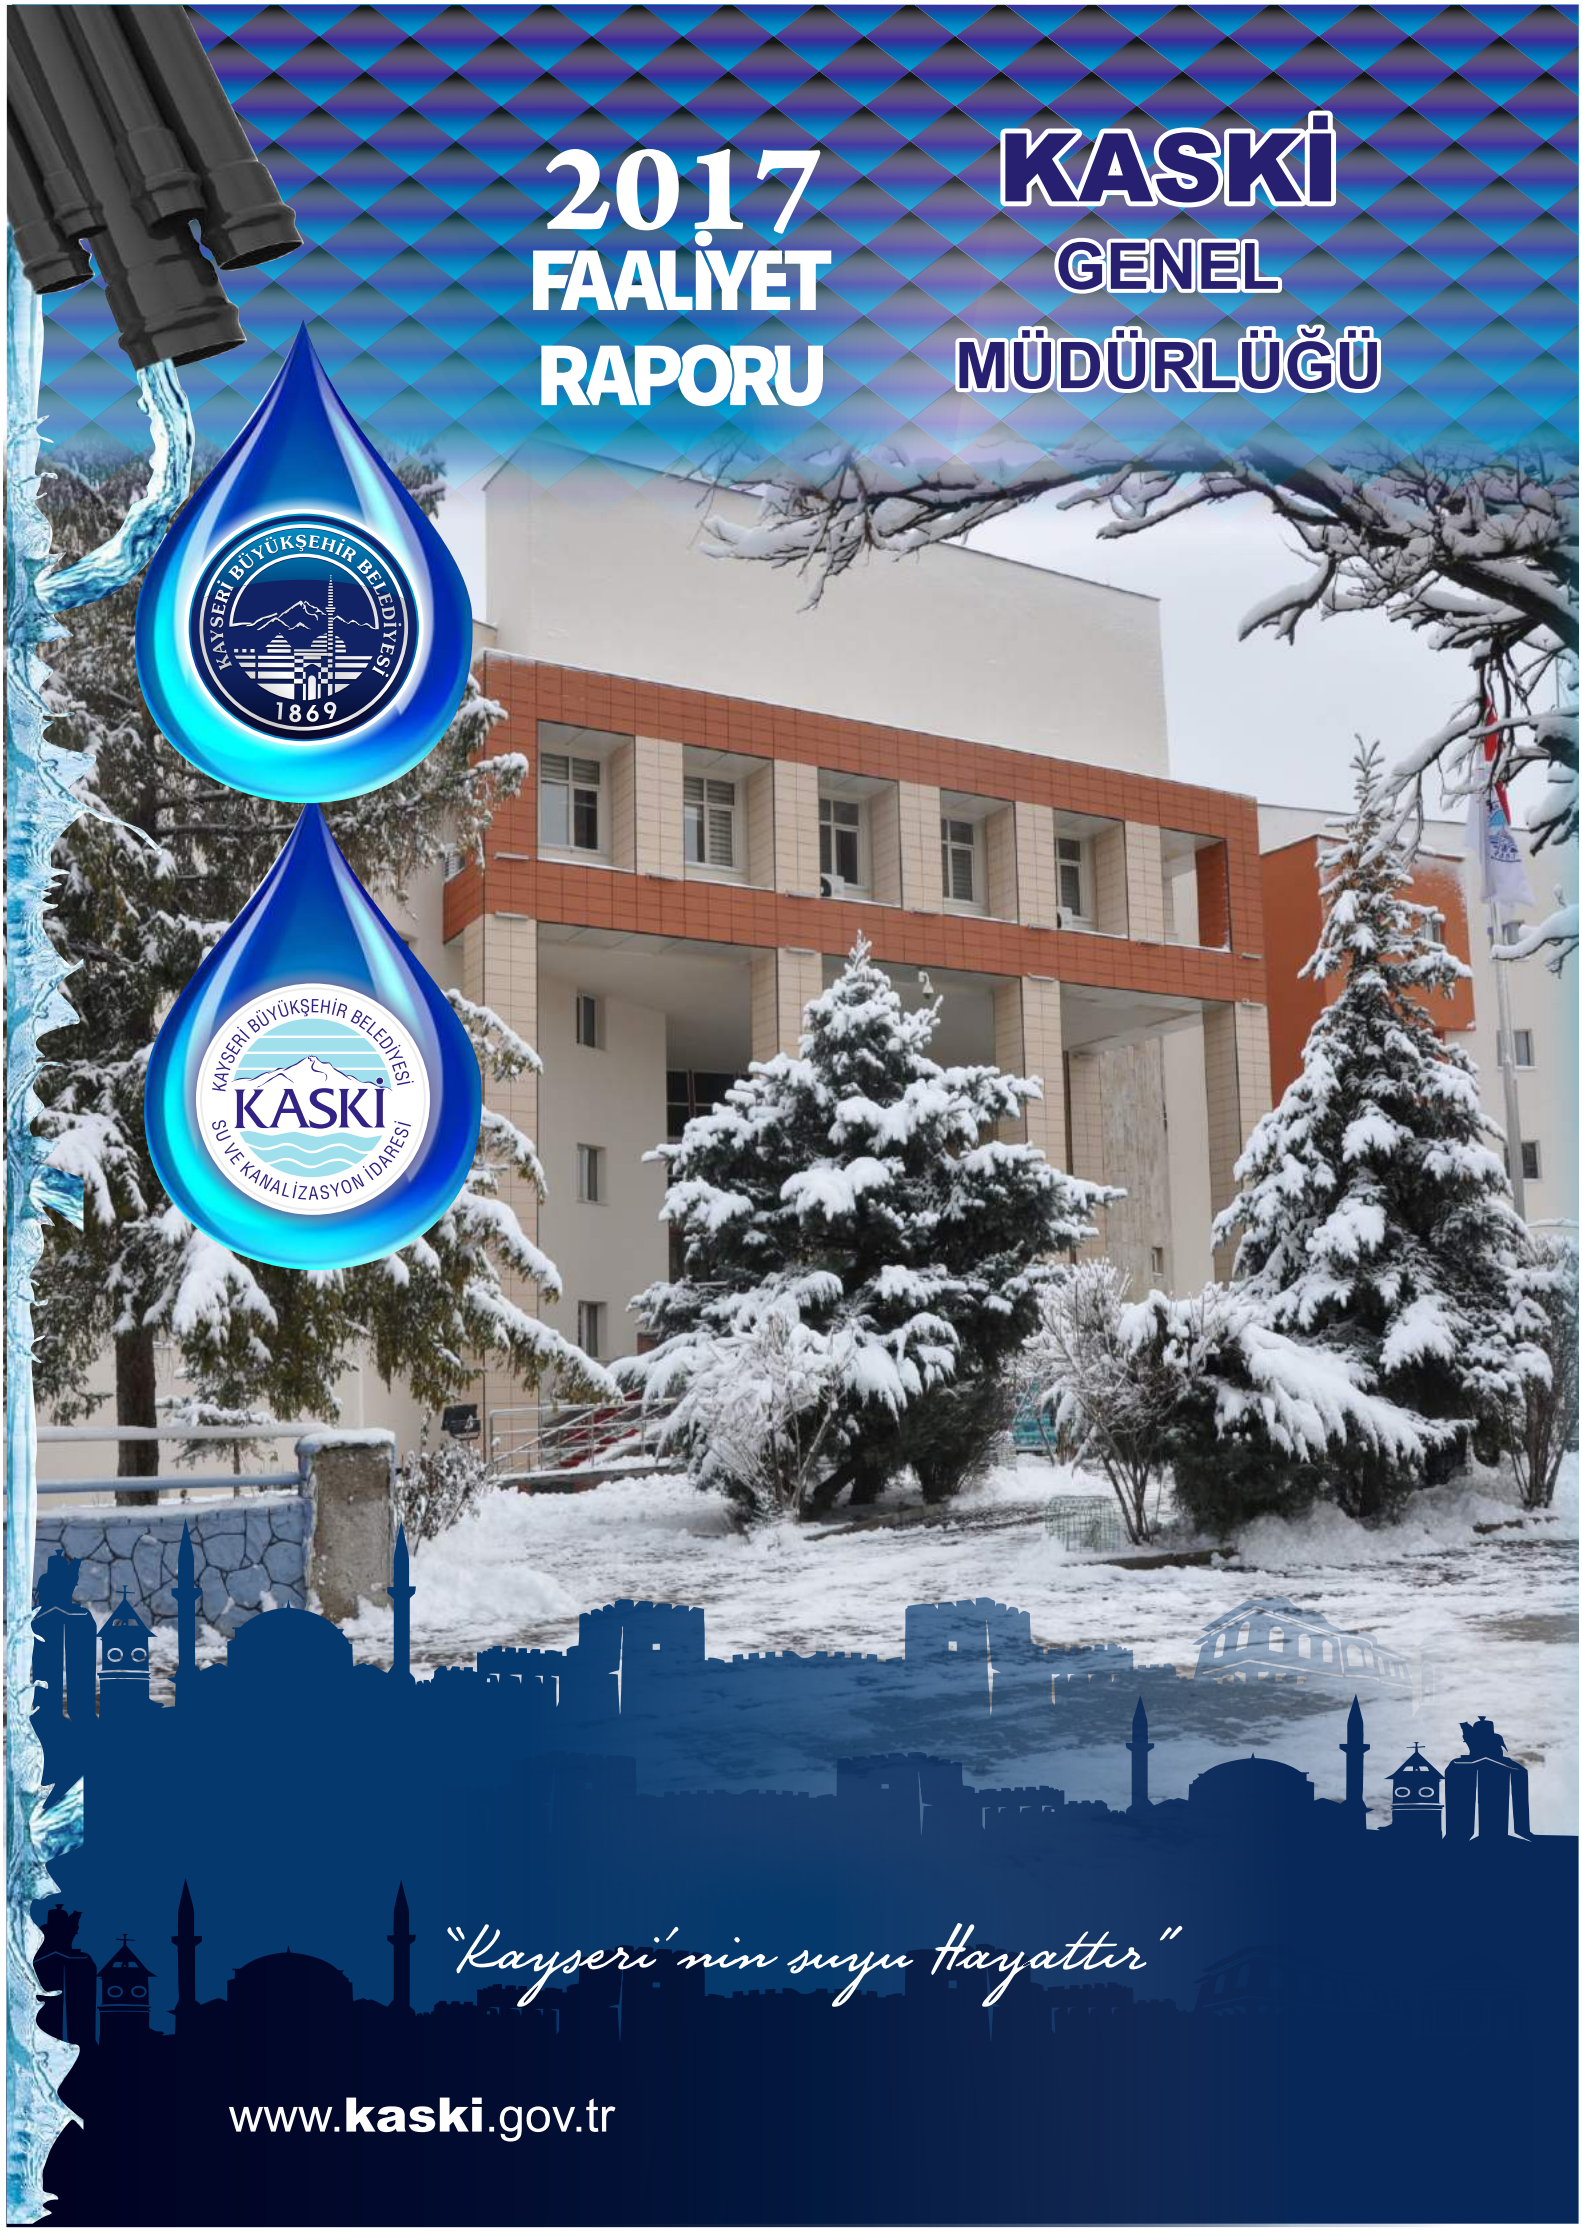

"Kayseri'nin suyu Hayattır"

www.kaski.gov.tr


KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
1869


KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KASKİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ

İÇİNDEKİLER

Sunuşlar	4-5
Genel Kurul Üyeleri	6-7
I.Genel Bilgiler	9
II Amaç ve Hedefler	20
III.Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	22
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	22
Denetim Raporu	30
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri	33
Hukuk Müşavirliği	33
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	39
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	77
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	86
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	93
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	176
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	188
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	190
Tesisler Daire Başkanlığı	191
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	191
Yönetim Kurulu Bürosu	197
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	198
2-Performans Sonuçları Tablosu	217
IV.Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi	229
Güvence Beyanları	230



BAŞKAN SUNUŞ

Kayseri; coğrafi, kültürel, iktisadi değerleri ve gösterdiği gelişimle Türkiye'de adından sıkça söz ettiren bir şehir haline geldi. Kentimize yaptığımız büyük yatırımlarla halkımızın yaşam standartlarını daima ileriye taşıma gayretindeyiz. Şeffaf, hesap verebilir ve modern belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.

Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak; 2017 yılını altyapıda rekorlar kıracağımız yatırım yılı ilan ettik ve tarihimizin en büyük altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi performansını her geçen yıl artırarak daha huzurlu ve daha konforlu bir kent hayatı için yatırımlarını sürdürüyor. Hemen her alanda ve şehrin her noktasında çalışıyoruz. Sosyal, kültürel, sportif ve eğitim alanındaki çalışmalarımız halkımızın büyük takdiriyle karşılanmakta. Bu çalışmalarımızı kent merkezinin dışına çıkararak ilçelerimize de götürmeye başlamamız Kayseri'nin topyekûn kalkınmasına verdiğimiz önemi göstermektedir.

Çevre kirliliğinin, toplum sağlığı açısından oluşturabileceği, büyük tehlikenin bilinci ile hareket ederek, gerek yağmursuyu ve kanalizasyon, gerekse atıksu arıtma tesisleri ile çevre sorunlarını gidermek için farklı çözümler üreterek hayata geçiriyoruz. 2017 yılında temeli atılan 23 tesis ile 37'ye yükselecek Atıksu Arıtma Tesislerimizle şehrimize hizmet vereceğiz.

Gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetlerle, hayata geçirdiğimiz dev yatırımlarla gelecek kuşaklara daha yaşanılır bir kent bırakmak için uzun vadeli plan ve programlar hazırlıyoruz. Kamu hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunmak için projelerimizi özenle belirliyor ve uyguluyoruz. Bu aşamada altyapı hizmetlerini özellikle kanalizasyon ve içmesuyu projelerini çok önemsiyoruz. Çünkü medeni toplumlar sağlıklı ve yeterli su ile buluşmak zorundadır.

Altyapıda hiçbir şehrin yanımıza yaklaşamayacağı rakamlara ulaştık. Kayseri'de nüfus artışına bağlı olarak su tüketimi de hızlı bir artış gösterdi. KASKİ'nin rekor alt yapı yatırımları, tüm projelerimizin önüne koyduğumuz insana yatırım konusundaki çalışmalarımız ivme kazanmış, belediyemiz bünyesindeki birimlerimiz vasıtasıyla büyük kitlelere ulaşır hale geldiğimiz memnuniyetle görülmüştür.

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla tüm hizmetlerimizi, siz kıymetli hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Bu raporun tüm kamuoyunu aydınlatıcı ve yol gösterici bir rapor olmasını temenni ediyorum. Tüm hizmetlerimizde tek dayanak noktamız, aziz hemşerilerimizden aldığımız destektir. Bizlerden desteğini esirgemeyen siz değerli hemşerilerime, bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde görev alan KASKİ personelimize, raporun hazırlanmasında emeği geçenlere sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.

Mustafa ÇELİK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı



GENEL MÜDÜR SUNUŞ

KASKİ Genel Müdürlüğümüz'ce 16 ilçemize kaliteli su ve atıksu hizmetleri ulaştırıyoruz. Temiz ve ulaşılabilir su hizmeti için; içme suyu şebekeleri, depo temizlikleri, arıtma sistemleri alanlarında önemli projeleri hayata geçiriyoruz.

Dünya üzerinde yaşayan her canlının hayat kaynağı şüphesiz ki temiz ve içilebilir sudur. Bizler de 'Önce İnsan' ilkesiyle hareket ederek, hem kaynaklarımızı hem de geleceğimizi koruma yolunda büyük çaba sarf ediyoruz.

Su teminine yönelik büyük yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, su havzalarını korumaya yönelik faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Kayseri'nin içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak yürütüyoruz. Şehrimizin bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını gözeterek, kentimizin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olarak; bürokratik ağırlıklardan uzak, vatandaş memnuniyetini hedefleyen hizmetlerle siz hemşerilerimize ulaşıyoruz.

Dünyadaki temiz suyun, yüzde 1'inin erişilebilir ve kullanılabilir olduğunu düşündüğümüzde, özellikle büyükşehirlerde temiz su temini ve su tasarrufunun önemi bir kat daha artıyor. KASKİ olarak Kayseri'ye ve 16 ilçemize yatırımlarımızı çok yönlü düşünerek planlıyoruz. Çünkü su, yaşam için çok önemli bir kaynak olduğu gibi sürdürülebilir kalkınma için de büyük önem arz etmektedir.

Su ve kalkınma birbirine bağlı, birbirini destekleyici, sosyal, çevresel ve ekonomik değerlere sahiptir. İnsan yaşamında vazgeçilmezliği tartışılmaz olan suyun sürekli artan dünya nüfusuna karşılık, gereksiz kullanımının önlenmesi, su kaynaklarının insanların yararına, etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için daha fazla bilinçlenmek gerektiği açıktır. İdare olarak suyun daha tasarruflu tüketilmesi ve kaynaklarımızın korunması amacıyla öğrencilere verilen eğitimlerden vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ile ilgili programlar düzenliyoruz.

Atıksu arıtma tesisleri; içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları, içme suyu depoları, sondaj, çalışmalarımızla birlikte, 2017 yılında da Kayseri'yi sağlıklı altyapı ağlarıyla donatmaya gayret ettik. Bu azim ve inançla 2018 yılında da hizmetlerimiz devam ederek gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir şehir bırakacağımıza inancım tamdır.


KASKİ olarak her mahallede, her ilçede bir çalışma yapıyoruz. Boş durmuyor, hep çalışarak Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Ender BATUKAN
KASKİ Genel Müdürü

GENEL KURUL ÜYELERİ

BÜYÜKŞEHİR	Mustafa ÇELİK
MELİKGAZİ	Memduh BÜYÜKKILIÇ A.Serdar ALTUNTUĞ Mehmet SAVRUK Zekeriya ERGÜNEŞ Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU Levent BÜYÜKKEÇECİ Sıddık Sami KADIOĞLU Kamuran TEMİR Fatma Meltem MARAŞLIOĞLU İrfan DURSUN
KOCASİNAN	Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR Bekir YILDIZ Arif BALKAYA Metin MERMERKAYA Ahmet Tahir GÜL Mehmet BÜYÜKBAŞ Halil BÜYÜKNALBANT Hayri SOLAK
TALAS	Mustafa PALANCIOĞLU Mehmet Seyhan KALKAN Mustafa İNCEOK Mustafa GENGEÇ Suna ÇAKIR Muzaffer ERCAN Mithat BABACAN
HACILAR	Doğan EKİCİ Yusuf ÖZKAYA Ahmet BOSTANCI
İNCESU	Zekeriya KARAYOL Tuncay ŞAHİN M.Murat KALEM Fatih KIZILIŞIK
DEVELİ	Mehmet CABBAR Ayşe SEYHAN Mustafa TEMUR Osman TURAN Hakan DEMİR Şükrü KALKANLI

BÜNYAN	Şinasi GÜLCÜOĞU Erkan KAYAPINAR Mustafa GÖKTAŞ
PINARBAŞI	Dursun ATAŞ Fazıl DEMİRCİOĞLU Hikmet ŞAHİN Mesut MUCUK
TOMARZA	Fahrettin IŞIK Oğuzhan BERK Hüseyin EKER Osman KOÇ
YEŞİLHİSAR	Abdülkadir AKDENİZ İlyas EMRE Ahmet BİLİCİ
SARIOĞLAN	Lütfi ÜNSAL Yusuf AKBULUT Mustafa SAVAŞ
SARIZ	Ömer Faruk EROĞLU Hacı Ahmet DOĞAN Mustafa AKBULUT
YAHYALI	Esat ÖZTÜRK Ramazan YAPICI Merve SARIOĞLU Ali ŞAHBAZ
FELAHİYE	Vural COŞKUN Cemal ACER
AKKIŞLA	Ali ERGÜL Ömer ÖZUZUN
ÖZVATAN	Halit DEMİR Mustafa AKPINAR

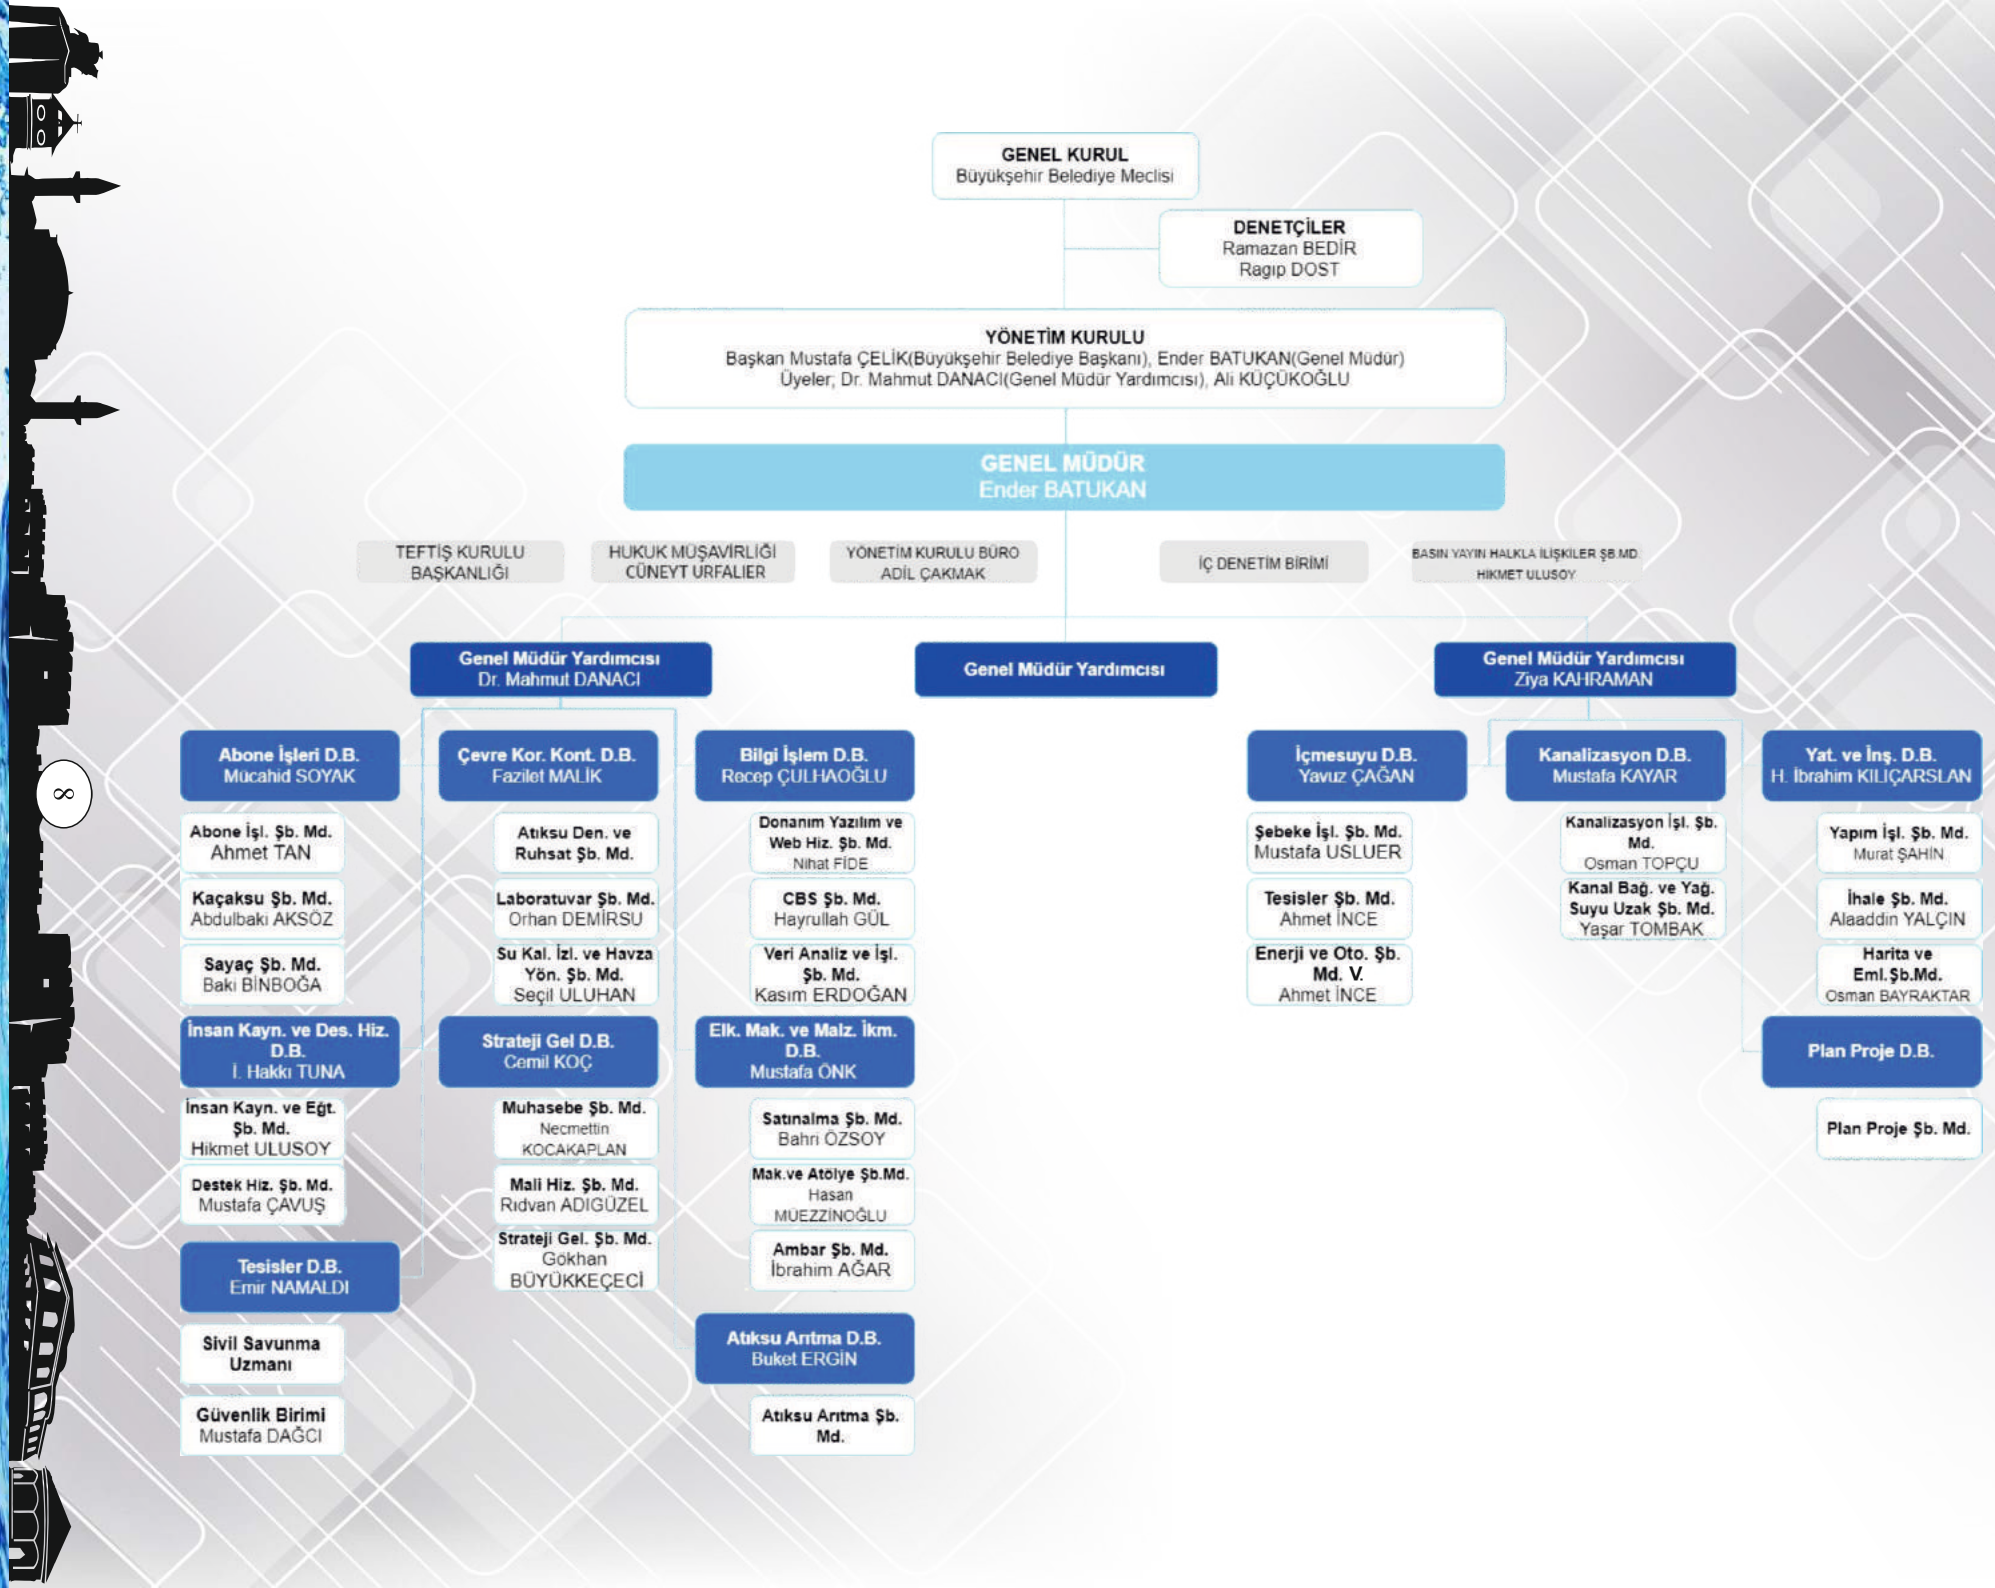
GENEL KURUL
Büyükşehir Belediye Meclisi
DENETÇİLER
Ramazan BEDİR
Ragıp DOST
YÖNETİM KURULU
Başkan Mustafa ÇELİK(Büyükşehir Belediye Başkanı), Ender BATUKAN(Genel Müdür)
Üyeler; Dr. Mahmut DANACI(Genel Müdür Yardımcısı), Ali KÜÇÜKOĞLU
GENEL MÜDÜR
Ender BATUKAN
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ CÜNEYT URFALIER
YÖNETİM KURULU BÜRO ADİL ÇAKMAK
İÇ DENETİM BİRİMİ
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER ŞB.MD. HİKMET ULUSOY
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mahmut DANACI
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı Ziya KAHRAMAN
Abone İşleri D.B. Mücahid SOYAK
Abone İşl. Şb. Md. Ahmet TAN
Kaçaksu Şb. Md. Abdulbaki AKSÖZ
Sayaç Şb. Md. Bakı BİNBOĞA
İnsan Kayn. ve Des. Hiz. D.B. İ. Hakkı TUNA
İnsan Kayn. ve Eğt. Şb. Md. Hikmet ULUSOY
Destek Hiz. Şb. Md. Mustafa ÇAVUŞ
Tesisler D.B. Emir NAMALDI
Sivil Savunma Uzmanı
Güvenlik Birimi Mustafa DAĞCI
Çevre Kor. Kont. D.B. Fazilet MALİK
Atıksu Den. ve Ruhsat Şb. Md.
Laboratuvar Şb. Md. Orhan DEMİRSU
Su Kal. İzl. ve Havza Yön. Şb. Md. Seçil ULUHAN
Strateji Gel D.B. Cemil KOÇ
Muhasebe Şb. Md. Necmettin KOCAKAPLAN
Mali Hiz. Şb. Md. Rıdvan ADIGÜZEL
Strateji Gel. Şb. Md. Gökhan BÜYÜKKEÇECİ
Bilgi İşlem D.B. Recep ÇULHAOĞLU
Donanım Yazılım ve Web Hiz. Şb. Md. Nihat FİDE
CBS Şb. Md. Hayrullah GÜL
Veri Analiz ve İşl. Şb. Md. Kasım ERDOĞAN
Elk. Mak. ve Malz. İkm. D.B. Mustafa ÖNK
Satınalma Şb. Md. Bahri ÖZSOY
Mak.ve Atölye Şb.Md. Hasan MÜEZZİNOĞLU
Ambar Şb. Md. İbrahim AĞAR
Atıksu Arıtma D.B. Buket ERGİN
Atıksu Arıtma Şb. Md.
İçmesuyu D.B. Yavuz ÇAĞAN
Şebeke İşl. Şb. Md. Mustafa USLUER
Tesisler Şb. Md. Ahmet İNCE
Enerji ve Oto. Şb. Md. V. Ahmet İNCE
Kanalizasyon D.B. Mustafa KAYAR
Kanalizasyon İşl. Şb. Md. Osman TOPÇU
Kanal Bağ. ve Yağ. Suyu Uzak Şb. Md. Yaşar TOMBAK
Yat. ve İnş. D.B. H. İbrahim KILIÇARSLAN
Yapım İşl. Şb. Md. Murat ŞAHİN
İhale Şb. Md. Alaaddin YALÇIN
Harita ve Eml.Şb.Md. Osman BAYRAKTAR
Plan Proje D.B.
Plan Proje Şb. Md.

I GENEL BİLGİLER

A-MİSYON-VİZYON

Misyon:

Çevre ve insan sağlığını gözeterek, kaliteli ve temiz içmesuyu sunmak, su kaynaklarını en iyi şekilde korumak ve kullanılmış atıksuların doğaya faydalı dönüşümünü sağlamaktır.

Vizyon:

Yüksek standartlarda hizmet veren, sürekli gelişime açık, çevresi ve yaşayanı ile bütünleşmiş, kesintisiz içmesuyu ve atıksu hizmeti sağlamayı amaçlayan kurum olmaktır.

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Madde 1- (Değişik:07.02.1983-khk/56 m.1;Onay:23.5.1984-3009 s.y.m.1)
İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu kanunda İSKİ olarak anılır.
Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır.

Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine tabidir.

GÖREV VE YETKİLER :

Madde 2- İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır :

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak,kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak,yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ve kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik İdari ve hukuki tedbiri almak.

d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

EK MADDE 5- Bu kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

7.maddenin r fıkrasında belirtilen; Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

MADDE 18 - Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.

Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline gelir. Bu belediyeler hakkında bu Kanun ile Belediye Kanununun belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına veya başka bir belediyeye katılmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir.

Birinci fıkra gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan belediye ve köyler ile, büyükşehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde bulunan köylerden; birinci fıkrada belirtilen mesafelerin dışında kalan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir.

Birinci fıkra gereğince büyükşehir kapsamına alınan belediyelerin sınırlarında yerleşim düzeni gerekleri dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir sene içinde büyükşehir belediye meclisinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca gerekli değişiklikler yapılabilir.

Büyükşehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görevlerine devam ederler.

Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir.

Büyükşehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki sınır değişiklikleri katılma durumuna uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre çözülür.

KASKİ' NİN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR:

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltım yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

c) Bölge içerisindeki su kaynaklarının göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ' nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-FİZİKSEL YAPI

KASKİ BÜNYESİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK MAKİNALAR

BİRİMLER	Server Fiziksel	Server Sanal	Bilgisayar	Yazıcı	Android Tablet	Projeksiyon	Plother	Laptop	Scanner	El Terminali
Üst Yönetim			15	11		1		4		
Bilgi İşlem Dai.Bşk.	9	48	18	65		3	1	6	1	114
Strateji Geliştirme Dai.Bşk.			65	45				2		
Abone İşleri Dai.Bşk.			63	42				1	2	
İçmesuyu Dai.Bşk.			61	12	66		1	4		
İnsan Kayn.ve Des.Hiz.Dai.Bşk.			22	11				1	1	
Elek.Mak.ve Malz. İkmal Dai.Bşk.			21	6				1	1	
Atıksu Arıtma Dai.Bşk.	4		41	5		4		2		
Kanalizasyon Dai.Bşk.			19	5	66		1	1		
Yatırım ve İnşaat Dai.Bşk.			59	6					1	
Hukuk Müşavirliği			3	5						
Sivil Savunma			3	2						
Basın Yayın Şube Müdürlüğü			3	2						
Çevre Kor. Ve Kont. Dai. Bşk.			25	6						

KASKİ HİZMET ARAÇLARI

PİKAP

ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MITSUBISHI KAMYONET (4x2)	38 BZ 430	2007	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	VOLKSWAGEN KAMYONET (4x2)	38 ER 640	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EZ 597	2004	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 DS 248	2002	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EK 375	2002	ÖZVATAN
6	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 282	2000	SARIZ
7	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 283	2000	DEVELİ
8	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 284	2000	YEŞİLHİSAR
9	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 285	2000	DEVELİ
10	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 466	2000	DADALOĞLU
11	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 KD 853	2000	TOMARZA
12	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 KH 893	1999	YAHYALI
13	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 216	1997	YAHYALI
14	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 217	1997	YEMLİHA

MİNİBÜS

ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES-BENZ MİNİBÜS (15+1)	38 AJ 140	2016	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	VOLKSWAGEN MİNİBÜS (OTOMOBİL)	38 RV 079	2007	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
3	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 568	2005	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BAŞ. - VEZNE
4	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 569	2005	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BAŞ. - VEZNE
5	MERCEDES MİNÜBÜS (17+1)	38 KS 413	2004	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
6	IVECO MİNİBÜS (ÖZEL AMAÇLI ARAŞ.) (2+1)	38 VT 891	2003	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	MERCEDES MİNÜBÜS (14+1)	38 AD 936	1999	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YAKIT TANKERİ

ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	ISUZU YAKIT TANKERİ (5530 KG)	38 BZ 689	2013	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	ISUZU YAKIT TANKERİ	38 HZ 975	1992	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.

KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI

ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 JF 045	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 JF 046	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 JF 047	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	MERCEDES BENZ ACTROS 2544 L/6X2	38 FP 856	2013	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 YL 788	2011	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 D 5013	2006	YAHYALI
7	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 ER 623	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 ER 632	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	FORD KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 DT 671	2004	DEVELİ

FAUN

ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 806	2014	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 765	2014	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES BENZ ATEGO 1518 C 4X2 FAUN	38 FN 956	2013	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 RF 570	2005	SARIZ
5	IVECO FAUN	38 LF 583	2001	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 LN 988	1999	SARIOĞLAN
7	FORD KARGO KANAL AÇMA ARACI FAUN	38 F 3235	1992	YEŞİLHİSAR
8	IVECO FAUN	38 KK 995	1992	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SU TANKERİ

ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	BMC SU TANKERİ	38 AC 578	1998	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GREYDER				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	GREYDER 1966		1966	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TIR - TREYLER SAL				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES TIR	38 ER 652	2003	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	EFE SAL KASALI YARI ROMÖRK	38 ER 653	2003	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
BİNEK				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	RENAULT KANGO	38 AK 896	2001	İN. KAY. VE DESTEK HİZ. DAİ. BAŞ.
FORK-LİFT				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	FORKLİFT HYUNDAI		2013	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	FORKLİFT CAT		2011	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORKLİFT DAEVOO	38 KSK 014	2001	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
4	FORKLİFT HYSTER	38 KSK 015		ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
5	FORKLİFT CF30 D ÇUKUROVA HYDROSTATIC	YOK	2000	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
İŞ MAKİNALARI				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	JCB 1 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 002	2002	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	JCB 3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 003	2002	TOMARZA
3	SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 1 (EKS.)	38 KSK 007	1999	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 2 (EKS.)	38 KSK 008	1999	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 009	1991	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	CAT 318 KAZIYICI KEPÇE (kırıcılı)	38 KSK 010	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	CAT 434 E - İŞ MAKİNASI	38 KSK 011	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	JCB 2 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 012	2002	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	KOMATSU 420 KEPÇE	38 KSK 013	2006	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10	HİDROMEK KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 021	2002	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 022	2005	DEVELİ
12	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 023	2009	SARIOĞLAN
13	JCB-3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 024	2006	DEVELİ
14	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 028	2005	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
15	JCB 4CX KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 030	2006	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VİDANJÖR				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	IVECO VİDANJÖR	38 H 2311	2012	BÜNYAN
2	MERCEDES VİDANJÖR	38 ER 633	2003	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
3	FIAT 50 NC VİDANJÖR	38 FA 677	1985	DEVELİ
VİNÇ				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES BENZ ATEGO VİNÇ	38 LZ 043	2014	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD KARGO VİNÇ (B. VİNÇ)	38 KU 881	2008	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
3	FORD KAMYON VİNÇ (K. VİNÇ)	38 DT 670	2004	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
BAKIM ARACI				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	KARGO KAMYON- BAKIM ARACI (Jeneratör)	38 KN 388	1992	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMYON				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	IVECO KAYAR KASALI KAMYON	38 EM 688	2014	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	FORD KARGO KAMYON	38 KN 389	1992	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	BMC FATİH KAMYON	38 FT 310	1992	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	FORD KAMYON	38 PL 522	2004	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		76		

2-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR


Kullanılan Programlar	Kullanıldığı Birim	Programın Kullanım Yeri
ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Yeni abone kaydı, abone tanımlama işlemleri,su tahakkuk ve tahsilat işlemleri, açma kesme işlemleri, icra işlemleri, vezne işlemleri vs. işlemlerinin takibinin yapıldığı yazılım.
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)	Tüm Birimler	Kurumumuzdaki belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan bir sistemdir.
DAYS (Döküman Arşiv Yönetim Sistemi)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Kâğıt ortamındaki evrakları farklı tarama yöntemleri ile sayısallaştıran yönetim sistemleridir.
Logo Tiger Enterprise Muhasebe Programı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Tahsilâtların, çek senet işlemlerinin, ödemelerin, memur, sözleşmeli ve işçi bordro ödemelerinin, banka işlemlerinin yapıldığı yazılım.
İp Santral Programı (3CX)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Ses, veri ve görüntüyü tek bir iletişim altyapısında birleştirir ve işletmeye klasik haberleşme yöntemlerinin yanında, VoIP, FoI P (fax-over-IP), ses kayıt, konferans, görüntülü görüşme, sesli mesajların e-mail ile iletilmesi, durum bilgisi izleyebilme, uzak abone ve uzak ofis iletişimi gibi gelişkin iletişim çözümleri sunan bir yazılım.
Unity Stok Programı	Elek. Mak. Ve Malz. İkmal Dai. Bşk.	Dayanaklı tüketim malzemelerinin zimmet, kayıttan düşme ve raporlarının oluşturulması, taşınır işlem giriş fişi ve fatura girişi yapılarak taşınır kaydı yapılması işlemleri, taşınır 150 grubu tüketim malzemelerinin stok takibi ve çıkış işlemlerinin ve yılsonu sayım raporlarının yapıldığı program.
Akaryakıt Takip Programı	Elek. Mak. Ve Malz. İkmal Dai. Bşk.	Kurumdaki araçların aldığı yakıtları takip ve raporlama için.
İnsan Kaynakları Programı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Memur, sözleşmeli, işçi bordro işlemlerinin, mesai puantajlarının, vizite işlemlerinin, özlük haklarının takibi, SGK kesintilerinin oluşturulduğu program.
Kanal Arıza Programı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kanal ve içmesuyu şebekelerinde oluşan arızaların cinsi, miktarı ve müdahale şeklinin, kullanılan malzemelerin takip edildiği program.
Sudabis Altyapı Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Kent alt yapısının oluşturulması ve takibinde, su ve kanalizasyon bilgilerinin takibi ve güncelleştirilmesi, içmesuyu şebekesi boru arızalarının noktasal olarak tespiti ve onarılması bunlara bağlı olan vana ve diğer bağlantı malzemelerinin grafik ortam üzerinde anında tespiti ve müdahalelerin sağlanmasını sağlayan program.
Autocad Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Altyapı bilgilerinin oluşturulup değerlendirildiği program.
Nedcad Programı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Altyapı bilgilerinin oluşturulup değerlendirildiği program.
MicroStation Programı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	

Arıza Takip Programı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Telefon ve elektronik ortamla bildirilen arızaların yerinin, kim tarafından bildirildiği bilgilerinin ve onarımının ne zaman ve nasıl yapıldığının takip edildiği program.
El Bilgisayarı Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone su kullanım endekslerinin okutulduğu ve işletildiği program.
Sayaç Hareketleri Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Arızalı sayaçlarının takibinin yapıldığı program.
Personel Takip Programı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Personelin giriş çıkış saatlerinin takip edildiği ve kayıt altına alındığı program.
Su Analiz Takip Programı	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	Kentin değişik bölgelerinden alınan suyun analizinin yapıldığı program.
ArcInfo Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Koordinatlı olarak hazırlanan mevcut şebeke ve içmesuyu altlıklarının değerlendirildiği program.
Hukuk Programı	Hukuk Müşavirliği	Davaların takip edildiği program.
e-Borç Sorgulama	Tüm Birimler	Abonelerin borç bilgilerini öğrendikleri program.
e-Tahsilat	Tüm Birimler	Abonelerin borçlarını kredi kartı ile tahsit ettikleri program.
e-Çözüm	Tüm Birimler	Abonelerde meydana gelen sorunların takip edildiği program.
e-Arıza	Tüm Birimler	Abonelerin arızalarının takip edildiği program.
e-Kaçaksu İhbar	Tüm Birimler	Kaçaksu kullananların takip edildiği program.
Bilgi Edinme	Tüm Birimler	Abonelerin kanun çerçevesinde bilgi edinmesini sağlayan program.
Barkod Oluşturma ve Stok Yönetimi	Elek. Mak. ve Malz. İkmal Dai. Bşk.	Dayanıklı tüketim malzemelerinin etiketleme ve barkodlama işlemlerinin yapıldığı program.
Telefon Fatura Takibi	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Telefon faturalarının takîbinin yapıldığı program.
Yaka Kartı	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Kurum personeline yaka kartı hazırlama programı.
SCADA	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	Tüm depoların debi, su miktarı, akım, voltaj, vana açma kapatma işlemlerinin yapıldığı program.
Guvenlik Kamera Takip	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Tüm depoların takibinin yapıldığı ve kayıt altına alındığı program.
Rehber	Tüm Birimler	Telefon rehber programı.


3-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI					
S.NO	BİRİMLER	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
1	Yönetim Kurulu Sekreteryası	5	-	4	9
2	Teftiş Kurulu Başkanlığı	5	-	-	5
3	Hukuk Müşavirliği	3	1	-	4
4	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	53	-	4	57
5	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	9	-	8	17
6	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	10	-	2	12
7	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	31	1	2	34
8	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	28	-	110	138
9	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	11	-	18	29
10	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	12	-	15	27
11	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	40	-	49	89
12	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	11	-	21	32
13	Tesisler Dairesi Başkanlığı	6	-	24	30
14	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	1	-	-	1
15	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	12	2	4	18


PERSONELİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ				
YILLAR	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
2008	109	49	394	552
2009	107	49	387	543
2010	111	47	365	523
2011	105	60	350	515
2012	105	70	331	506
2013	188	1	272	461
2014	274	2	434	710
2015	245	3	331	579
2016	235	3	281	519
2017	237	4	261	502

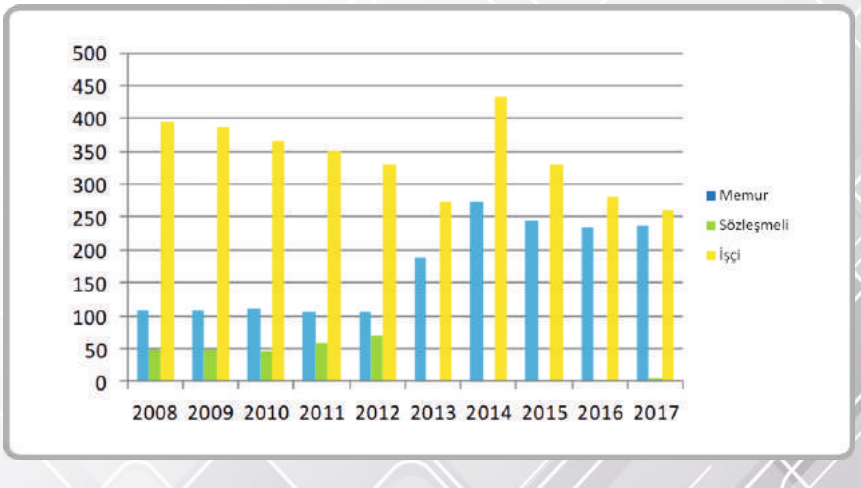


PERSONELİN CİNSİYET DURUMU			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
BAYAN	30	3	7
ERKEK	207	1	254
TOPLAM	**237**	**4**	**261**

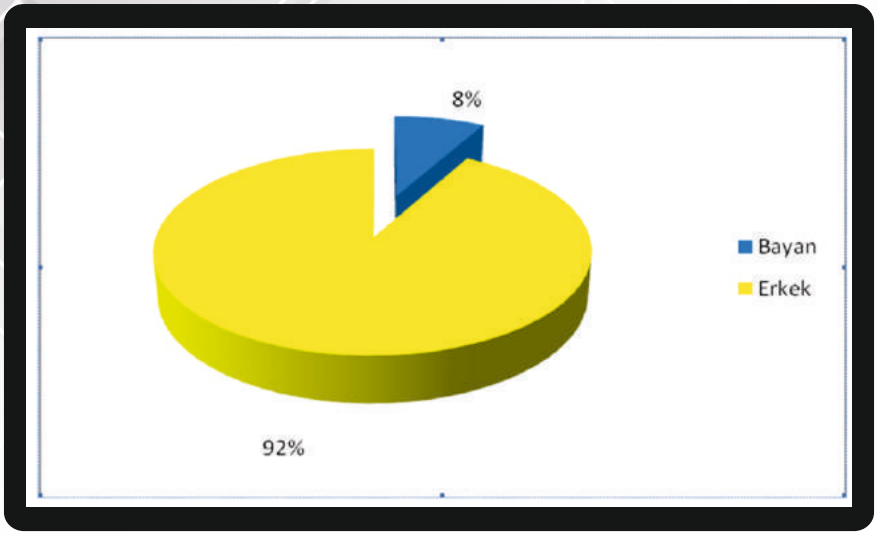


PERSONELİN YAŞ GRUPLARI				
YAŞ GRUPLARI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
18-30	14	2	2	18
31-40	72	2	39	113
41-50	78	-	195	273
51-60	65	-	25	90
61-65	8	-	-	8

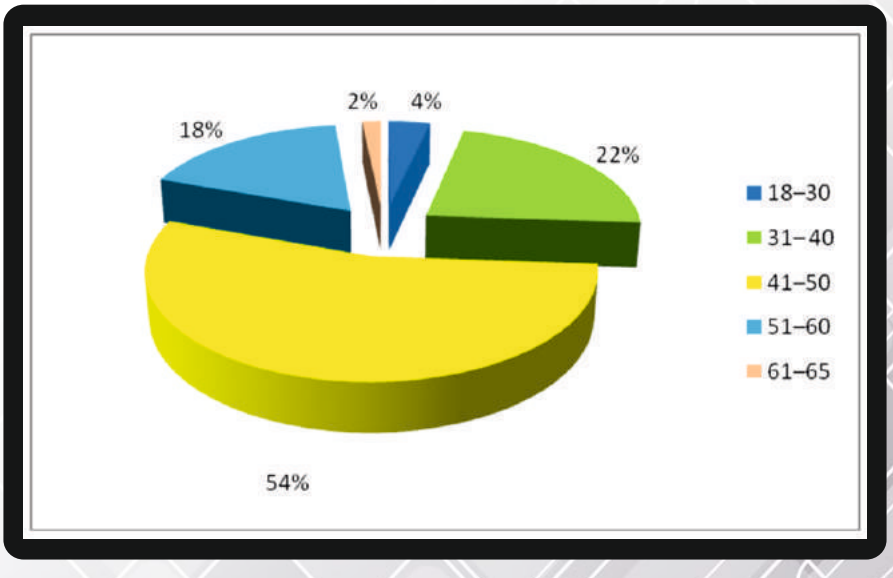

PERSONELİN EĞİTİM VE İSTİHDAM DURUMU				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	4	-	124	128
LİSE	68	-	117	185
M.Y.O - LİSANS	159	4	20	183
YÜKSEK LİSANS	5	-	-	5
DOKTORA	1	-	-	1

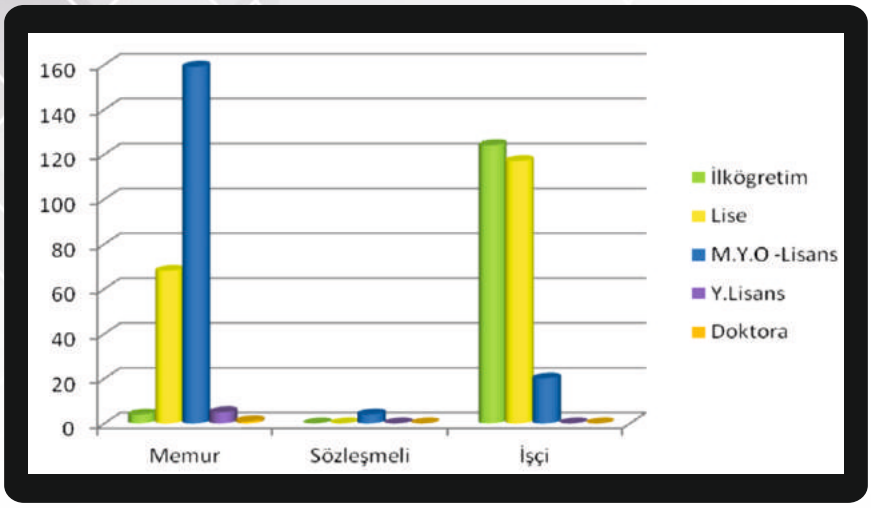

PERSONELİN İSTİHDAM VE HİZMET YILI				
HİZMET YILI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
0-5	10	4	3	17
6-15	85	-	94	179
16-25	92	-	161	253
26-35	46	-	3	49
36 ve sonrası	4	-	-	4
Toplam	**237**	**4**	**261**	**502**

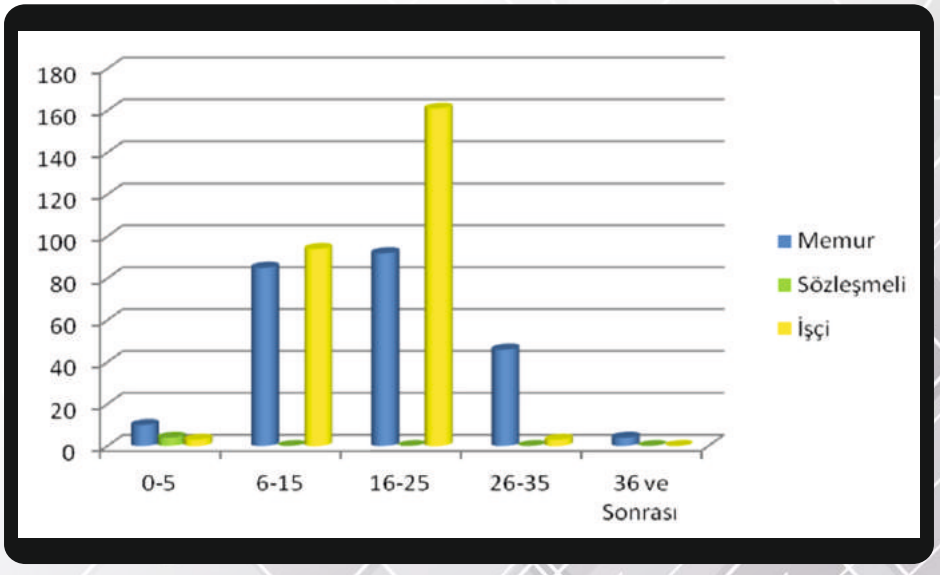

II AMAÇ VE HEDEFLER

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

STRATEJİK AMAÇ	**Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.**
STRATEJİK HEDEF	Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Su kaynaklarını etkin yönetmek.
STRATEJİK HEDEF	Hizmette sürekliliği sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Gelecek yılların planlamasını yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Genel Müdürlüğümüzün su üretip abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını ve analizlerini yaparak sürekli iyileştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Mesleki eğitimler ile ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlere katılımın sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" gereği Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından il genelindeki şebekenin muhtelif yerlerinden alınarak analizi yaptırılan numunelerin sonuçlarını ve analiz bedellerini takip etmek.
STRATEJİK HEDEF	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirleri almak.
STRATEJİK AMAÇ	**Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.**
STRATEJİK HEDEF	Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine" göre denetlemek.
STRATEJİK HEDEF	Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre tehlikeli atıkların uzaklaştırılması.
STRATEJİK HEDEF	Şehir kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı, yapım ve işletmesinin sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışardan taşıt ve iş makinası kiralanması.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.
STRATEJİK HEDEF	Çamur susuzlaştırma ünitelerinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisleri proses kontrolünün yapılması çalışmaları.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesislerinin sürekli çalışmasının sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. kademe inşaatının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Çamur kurutma ve yakma projelerinin hazırlanması.
STRATEJİK HEDEF	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.
STRATEJİK HEDEF	Aboneler için gerekli işlemlerin yapılması.
STRATEJİK AMAÇ	**Kurum tanıtımının daha etkin yapılması.**
STRATEJİK HEDEF	Kurum web sayfasının güncelliğinin sağlanması.
STRATEJİK AMAÇ	**Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.**
STRATEJİK HEDEF	Kullanılan uygulamaların entegrasyonunun sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	Donanım altyapısının güncellenmesi.
STRATEJİK HEDEF	EBYS yazılımının alınması ve entegrasyonu.
STRATEJİK HEDEF	CBS yazılım güncelleme ve abonelerin coğrafi olarak koordinatlandırılması.
STRATEJİK HEDEF	Kurum hizmetindeki iş makinaları ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve madeni yağ alınması.
STRATEJİK HEDEF	Kuruma ait taşıt ve iş makinası alımı.
STRATEJİK HEDEF	Kurum hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmeti alınması.

STRATEJİK HEDEF	Kuruma ait araç ve iş makinaları için muhtelif cins ve miktar yedek parça alınması ve araç ve iş makinalarının gerekli bakım onarımlarının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Dava ve icra takibi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Kurum temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alınması.
STRATEJİK AMAÇ	**Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.**
STRATEJİK HEDEF	Abonelerin talep ve şikayetlerini kısa sürede sonuçlandırmak.
STRATEJİK HEDEF	Abonelere su sayacı takılması ve bozulan sayaçların değiştirilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işleminin geliştirilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Şehir kanalizasyon sisteminin daha verimli çalışmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Yeni meskenlerin kanalizasyon sistemine dahil edilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Abonelere su faturalarını ödemede kolaylık sağlamak.

B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

MEVCUT SU KAYNAKLARININ KORUNMASI

Su, kıt bir kaynaktır. Sanayileşme ve bu bağlamda kimyasal ürün kullanımının artması su kaynakları üzerinde kirlilik baskısını da artırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda su kaynaklarının tehlikeye düşmesi, içilebilir su bulmanın zorlaşacağı gerçeğini doğurmaktadır. Buradan hareketle KASKİ' ye önemli görevler düşmektedir.

Bu amaçla içmesuyu temin edilen tesislerin işletme ve kontrolünün, bakımının yapılarak şebekeye verilecek suların kimyasal ve biyolojik tetkiklerinin yapılarak klorlama işlemine tabi tutulduktan sonra şehre kaliteli ve içilebilir bir suyun verilmesi amaçlanmaktadır.

YENİ SU KAYNAKLARININ BULUNMASI

Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma ve kuraklık bütün dünyada olduğu gibi Kayseri içinde su temini konusunda sıkıntı oluşturacaktır. Kayseri'nin ülkemizde sayılı sanayi şehirlerinden biri oluşu nüfus artışını da beraberinde getirmiştir. Kaski'nin yeni su kaynakları bulması ve bunların şebekeye kazandırılması zorunluluk haline gelmiştir.

Bu amaçla Kaski bünyesinde yapılan çalışmalarda Kayseri'nin uzun seneler içmesuyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.

HİNTERLAND KAPSAMINDA YENİ BAĞLANAN BELDELERİN SU VE KANALİZASYON ALTYAPILARININ TAMAMLANMASI

6360 sayılı 13 Büyükşehir Belediyesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları yeniden düzenlenmiş ve Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı da buna paralel olarak 5 ilçe ve 19 beldeyi kapsayan 2.150 km²'den, 16 ilçe ve 16.917 km²'lik alana ulaşmıştır. Dolayısıyla yeni bağlanan ilçelerde altyapı sorunları ortaya çıkmıştır.

Bu amaçla önümüzdeki yıllarda yeni bağlanan bölgelerde su ve kanalizasyon altyapılarının tamamlanması önceliklerimiz arasındadır.

ATIKSULARI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRMAK VE GERİ KAZANIMLARINI SAĞLAMAK

Daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için çevreyi korumak gerekir.Günümüzde çevreyi kirleten sebeplerin başında atıksular gelmektedir.Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına boşaltılan atıklar,bu kaynakların kirlenmesine ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olmaktadır.

İlkelerimiz arasında yer alan çevreye ve insana saygı çerçevesinde Kaski Arıtma Tesisine ulaşan evsel ve Endüstriyel atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak tesisten çıkan çamurların güvenli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun çıkış noktası kurumlarda kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla gerek otomasyonun geliştirilmesi gerekse de müşteri odaklı yaklaşımlarla hizmet standartlarının sürekli artırılması sağlanacaktır.

III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-MALİ BİLGİLER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğümüz 2017 yılı Bütçesinin Kurumumuz hedeflerine uygun olarak yürütülmesini sağlamakla görevli daire başkanlığımız; Muhasebe Şube müdürlüğü, Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü birimlerimizle stratejik plan, performans programı, bütçe gerçekleşmesi, her türlü gelir ve gider kayıtları, tahsilât işlemleri ile yılsonu faaliyet raporlarının hazırlanması işlemlerini yerine getirmektedir.

MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Mali Yılı içinde abonelerimize tahakkuk eden su ve kanal gelirlerimiz ile yatırım harcamalarımız, işletme giderlerimiz, personel giderlerimize ait muhasebe işlemleri titizlikle takip edilmiş, tedarikçilerimizin hakediş bedelleri zamanında muhasebe kayıtları yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüze ait bütün taşınır ve taşınmaz kayıtlarımız tutulmuş olup ilgili muhasebe hesaplarına intikali yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerimiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi Kamu Kurumu olarak faaliyetlerini yürütmekte olup yıl içinde birçok mali verileri ve mali tabloları ilgili kurumlara bildirmiş ve yılsonu itibari ile de tüm defter ve dökümlerimiz denetime hazır hale getirilmiştir. Dönemler itibari ile raporlamalar ve istatistikî bilgiler ilgili mevzuat gereği resmi sitelere işlenmektedir. 2017 Yılı bilançosu, bütçe kesin hesap tablosu ve diğer yılsonu raporlarımız hazırlanmıştır.

MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz adına tahakkuk eden su, atıksu, kanal, yeni abone ve diğer bütün ücretlerin tahsilâtını yapmaktadır. Kurumumuzun hizmet alanı içerisinde 30 adet gişe tahsilat veznesi, 2 adet seyyar veznemiz ve 51 adet ATM veznesi olmak üzere toplam 83 adet veznemiz bulunmakta ve ayrıca il dışında bulunan abonelerimiz için de KASKİ Genel Müdürlüğümüzün **https://kaskiquery.kaski.gov.tr/** internet sitesinde ve tüm PTT gişelerinden online olarak tahsilât yapılmaktadır. 2017 yılı içerisinde tüm tahsilât kanallarımızda 4.619.522 adet makbuz tahsilâtı yapılmış olup bu tahsilâta bağlı olarak tabloda belirtilen oran ve tutarlarda toplam olarak ₺ 227.275.314,37 gelir elde edilmiştir.

2017 yılı içerisinde T.C. Halk Bankası Kayseri Şubesi ile Kurumumuzun gişe veznelerinden tahsilâtların toplanması ve bankadaki kurum hesabına yatırılması ile ilgili nakit toplama protokolü ile Vakıfbank Kayseri Şubesi ve Yapı Kredi Bankası Kale Şubesi ile de P.O.S kullanım protokolü imzalanmış, bu da halkımıza ödeme kolaylığı, kurumumuz açısından ise tahsilât oranının artırılması bakımından önemli oranda başarı sağlamıştır. Ayrıca 23 adet ticari ve kamu bankaları ile otomatik ödeme talimatı sözleşmesi devam etmekte olup, isteyen abonelerimizin bankaya talimat vererek ödeme yapmasına imkân sağlanmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda 2017 yılı için tahsilât oranımız % 94,39 olarak gerçekleşmiştir.

VEZNE TİPLERİNE GÖRE TAHSİLÂTLAR									
		TAHSİLÂTLAR					AYLARA GÖRE TAHSİLÂT ₺	TAHSİLAT ORANI /AY	MAKBUZ ADEDİ
YIL	AY	VEZNE ₺	BANKA ₺	AVS ₺	PTT ₺	WEB ₺			
2017	1	6.694.344,22	5.488.083,25	1.774.405,00	676.052,95	245.023,72	14.877.909,14	% 6,55	362.238
	2	7.223.381,01	5.212.233,81	1.776.739,00	610.658,06	191.764,15	15.014.776,03	% 6,61	330.456
	3	8.438.256,44	6.187.121,17	2.030.265,00	648.525,07	205.067,05	17.509.234,73	% 7,70	386.418
	4	7.581.794,75	5.766.136,55	2.052.957,00	639.599,40	224.222,60	16.264.710,30	% 7,16	359.234
	5	8.930.882,06	6.713.509,30	2.124.012,00	734.112,82	234.325,42	18.736.841,60	% 8,24	394.953
	6	9.179.534,63	6.569.692,62	2.181.651,00	689.478,42	224.832,37	18.845.189,04	% 8,29	358.457
	7	8.928.062,14	6.969.411,56	2.540.069,00	819.092,53	297.524,02	19.554.159,25	% 8,60	386.833
	8	8.919.286,99	7.693.270,12	2.734.794,00	817.778,56	340.899,64	20.506.029,31	% 9,02	391.555
	9	11.660.094,76	7.703.586,85	2.460.465,00	828.652,40	293.372,44	22.946.171,45	% 10,10	369.727
	10	10.383.158,14	8.929.540,80	2.800.631,00	830.148,28	329.083,17	23.272.561,39	% 10,24	442.428
	11	9.225.700,66	7.496.537,43	2.487.320,00	679.994,30	285.009,61	20.174.562,00	% 8,88	420.631
	12	8.777.131,96	7.420.937,62	2.436.790,00	641.148,97	297.161,58	19.573.170,13	% 8,61	416.592
TOPLAM		**105.941.627,76**	**82.150.061,08**	**27.400.098,00**	**8.615.241,76**	**3.168.285,77**	**227.275.314,37**	**% 100**	**4.619.522**

2017 YILI TAHSİLÂT KANALLARINA GÖRE VERİLER				
	MAKBUZ SAYISI	YÜZDE	TUTAR	YÜZDE
GİŞE VEZNE TAHSİLÂT (KREDİ VE NAKİT)	1.279.299	% 27,69	89.799.205,43	% 39,51
OTOMATİK ÖDEME TAHSİLÂT (BANKALAR)	2.059.697	% 44,59	82.150.061,08	% 36,15
AVS KİOSK TAHSİLÂT (KREDİ VE NAKİT)	872.888	% 18,90	27.400.098,00	% 12,06
İNTERNET TAHSİLÂT (WEB)	52.643	% 1,14	3.168.285,77	% 1,39
PTT TAHSİLÂTI	246.512	% 5,34	8.615.241,76	% 3,79
HESABA HAVALE (RESMİ DAİRE)	14.398	% 0,31	13.010.336,74	% 5,72
AKTİFBANK TAHSİLÂT	94.085	% 2,04	3.132.085,59	% 1,38
TOPLAM	**4.619.522**	**% 100**	**227.275.314,37**	**% 100**

STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Plan'a sadık kalınarak 2018 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Programa uygun şekilde harcama birimlerinden gelen tahmini bütçe konsolide edilerek, Gelir ve Gider Bütçeleri oluşturulmuş ve Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. 2017 yılı harcama birimlerine ait ödeneklerin talep ve aktarmaları yapılmıştır. Yılsonunda kalan ödeneklerin Yönetim Kurulu Kararı ile iptali sağlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun şekilde, yıl içerisinde bütçe ile ilgili bütün kayıtlar tutulmuş, bütçe uygulama sonuç raporları ve ilgili tablolar düzenlenmiştir. TUİK ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının istemiş olduğu istatistikî bilgiler düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilmiştir. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları konsolide edilerek Kurum Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2017 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

HESAP	EKONOMİK			BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	CARİ YIL (2017)
KODU	KOD I	KOD II	KOD III		₺
830	**1**			**Personel Giderleri**	**36.822.440,39**
830		**1**		**Memurlar**	**14.131.769,25**
830			1	Temel Maaşlar	5.215.523,40
830			2	Zamlar Tazminatlar	6.491.899,81
830			4	Sosyal Haklar	2.313.080,04
830			5	Ek Çalışma Karşılıkları	111.266,00
830		**2**		**Sözleşmeli Personel**	**282.926,98**
830			1	Ücretler	197.390,44
830			2	Zamlar Tazminatlar	53.346,97
830			4	Sosyal Haklar	32.189,57
830		**3**		**İşçiler**	**22.302.995,96**
830			1	Ücretler	10.932.511,75
830			2	İhbar Ve Kıdem Tazminatları	2.356.136,78
830			3	Sosyal Haklar	3.486.968,24
830			4	Fazla Mesailer	2.247.082,29
830			5	Ödül Ve İkramiyeler	3.280.296,90
830		**4**		**Geçici Personel**	**104.748,20**
830			1	Ücretler	104.748,20
830	**2**			**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri**	**6.810.616,19**
830		**1**		**Memurlar**	**2.589.829,57**
830			6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	2.589.829,57
830		**2**		**Sözleşmeli Personel**	**17.972,56**
830			6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	17.972,56
830		**3**		**İşçiler**	**4.202.814,06**
830			4	İssizlik Sigortası Fonuna	373.600,11
830			6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	3.829.213,95
830	**3**			**Mal Ve Hizmet Alım Giderleri**	**116.030.746,64**
830		**1**		**Üretime Yönelik Mal Ve Malz.Alımları**	**624.869,63**
830			6	Kimyevi Ürün Alımları	624.869,63
830		**2**		**Tüketime Yönelik Mal Ve Malz.Alımları**	**42.067.478,68**
830			1	Kırtasiye Ve Büro Malzemesi Alımları	146.753,17
830			2	Su Ve Temizlik Malzemesi Alımları	79.064,67
830			3	Enerji Alımları	38.990.062,94
830			4	Yiyecek, İçecek Ve Yem Alımları	513.587,81
830			5	Giyim Ve Kuşam Alımları	257.604,98
830			6	Özel Malzeme Alımları	2.080.405,11
830		**3**		**Yolluklar**	**191.752,54**
830			1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	32.643,13
830			2	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	30.929,28
830			3	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	48.369,24
830			5	Yolluk Tazminatları	79.810,89
830		**4**		**Görev Giderleri**	**663.347,60**
830			2	Yasal Giderler	641.011,94
830			3	Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar Ve Benz. Gid	22.335,66
830		**5**		**Hizmet Alımları**	**66.916.767,43**
830			1	Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler	39.480.565,14
830			2	Haberleşme Giderleri	556.155,16
830			4	Tarifeye Bağlı Ödemeler	396.507,88
830			5	Kiralar	25.390.129,61
830			7	Yargılama Giderleri	1.252,75
830			9	Diğer Hizmet Alımları	1.092.156,89
830		**6**		**Temsil Ve Tanıtma Giderleri**	**30.726,86**
830			1	Temsil Giderleri	30.726,86
830		**7**		**Menkul Mal, G.Maddi Hak Alım, Bak.Gid.**	**5.533.557,04**
830			1	Menkul Mal Alım Giderleri	4.227.279,36
830			3	Bakım Ve Onarım Giderleri	1.306.277,68
830		**8**		**Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Gid.**	**2.246,86**
830			1	Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri	2.246,86
830	**4**			**Diğer Giderler**	**11.553.497,05**
830		**2**		**Diğer İç Borç Faiz Giderleri**	**9.964.868,73**
830			9	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	9.964.868,73
830		**3**		**Dış Borç Faiz Giderleri**	**1.588.628,32**
830			2	Euro Cinsinden Dış Borç Fazi Giderleri	1.588.628,32
830	**5**			**Cari Transferler**	**17.596.817,12**
830		**2**		**Mahalli İdareler Yardımları**	**17.376.005,47**
830			6	Giderlere Katılma Paylar	17.376.005,47
830		**4**		**Hane Halkına Yapılan Transferler**	**220.811,65**
830			9	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	220.811,65
830	**6**			**Sermaye Giderleri**	**116.265.461,32**
830		**1**		**Mamul Mal Alımları**	**2.811.464,35**
830			1	Büro Ve İşyeri Mefruşatı Alımları	97.409,47
830			2	Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2.714.054,88
830		**3**		**Gayri Maddi Hak Alımları**	**410.418,35**
830			1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	229.340,80
830			3	Lisans Alımları	181.077,55
830		**4**		**Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaş.**	**745.068,65**
830			1	Arazi Alım Ve Kamulaştırma	745.068,65
830		**5**		**Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri**	**112.298.509,97**
830			2	Malzeme Giderleri	31.097.638,85
830			7	Müteahhitlik Giderleri	81.200.871,12
830				**BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A)**	**305.079.578,71**

HESAP	EKONOMİK			BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	CARİ YIL (2017)
KODU	KOD I	KOD II	KOD III		₺
800	**3**			**Teşebbüs Ve Mülkiyet Geliri**	**199.977.461,51**
800		**1**		**Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri**	**199.385.729,18**
800			1	Mal Satış Gelirleri	1.193.334,27
800			2	Hizmet Gelirleri	198.192.394,91
800		**6**		**Kira Gelirleri**	**364.733,33**
800			1	Taşınmaz Kiraları	364.733,33
800		**9**		**Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri**	**226.999,00**
800			9	Diğer Gelirler	226.999,00
800	**4**			**Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler**	**1.198.766,19**
800		**4**		**Proje Yardımları**	**1.198.766,19**
800			2	Sermaye	1.198.766,19
800	**5**			**Diğer Gelirler**	**68.526.319,18**
800		**1**		**Diğer Gelirler**	**2.200.163,86**
800			4	Takipteki Kurum Alacakları	1.863.466,11
800			9	Diğer Gelirler	336.697,75
800		**2**		**Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar**	**64.841.475,88**
800			2	Vergi Ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	55.591.050,96
800			4	Kamu Harcamalrına Katılma Payları	9.250.424,92
800		**3**		**Para Cezaları**	**191.087,76**
800			2	İdari Para Cezaları	191.087,76
800		**9**		**Diğer Çeşitli Gelirler**	**1.293.591,68**
800			1	Diğer Çeşitli Gelirler	1.293.591,68
800	**6**			**Sermaye Gelirleri**	**450,76**
800		**2**		**Stok Satış Gelirleri**	450,76
800			3	Stok Satış Gelirleri	450,76
800				**BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (B)**	**269.702.997,64**

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADENİN TÜRÜ					CARİ YIL (2017)
810	**3**			**Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri**	**90.297,63**
810		**1**		**Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri**	**90.297,63**
810			2	Hizmet Gelirleri	90.297,63
810	**5**			**Diğer Gelirler**	**56.282,52**
810		**2**		**Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar**	**27.282,52**
810			4	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	27.282,52
810		**3**		**Para Cezaları**	**29.000,00**
810			2	İdari Para Cezaları	29.000,00
810				**BÜTÇE GEL. RED VE İADELER TOPLAMI (C)**	**146.580,15**

NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C)	269.556.417,49

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD		01	02	03	04	05	06	08	TOPLAM
	AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	DİĞER GİDERLER	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	BORÇ VERME	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	20.313.074,16	3.917.444,52	30.468.265,91	6.478.357,62	1.808.368,14	81.579.036,92	15.788.448,98	**160.352.996,25**
02	SAVUNMA HİZMETLERİ								
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ								
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER								
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4.568.142,82	739.483,05	28.572.040,65	1.454.077,12		7.130.374,31		**42.464.117,95**
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	11.941.223,41	2.153.688,62	56.990.440,08	3.621.062,31		27.556.050,09		**102.262.464,51**
07	SAĞLIK HİZMETLERİ								
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ								
09	EĞİTİM HİZMETLERİ								
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ								
TOPLAM		**36.822.440,39**	**6.810.616,19**	**116.030.746,64**	**11.553.497,05**	**1.808.368,14**	**116.265.461,32**	**15.788.448,98**	**305.079.578,71**

2017 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİMLER	2017 YILI BÜTÇESİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM	GERÇEKLEŞME ORANI
Özel Kalem	1.336.000	118.862,82	99.220,60	91.614,53	90.412,07	93.651,57	107.114,91	91.893,70	100.574,51	86.590,06	76.907,84	85.194,47	104.436,39	1.146.473,47	85,81%
Strateji Gel.Dai.Bşk.	26.412.500	1.125.456,49	447.816,60	459.161,25	443.820,65	477.608,77	474.128,96	552.495,12	3.515.522,80	980.153,26	769.615,22	722.888,83	16.377.296,69	26.345.964,64	99,75%
İnsan Kayn.ve Des.Hiz.Dai.Bşk	6.637.264	626.561,50	662.166,29	652.382,08	562.917,02	794.092,57	680.415,71	659.697,20	340.083,73	585.233,13	418.657,03	191.793,63	441.462,33	6.615.462,22	99,67%
Bilgi İşlem Dai. Bşk.	2.594.000	286.453,63	135.411,43	179.999,84	196.069,24	259.697,81	134.758,36	260.084,04	252.217,87	115.072,06	312.845,81	199.753,77	248.851,36	2.581.215,22	99,51%
Elektrik Mak.ve Malz.Dairesi Bşk.	10.906.500	1.063.060,41	773.969,18	814.910,02	957.771,14	844.511,54	775.416,03	981.794,32	980.292,21	871.848,87	872.080,05	1.080.433,86	870.065,66	10.886.153,29	99,81%
Teftiş Kurulu	347.500	43.171,13	28.520,05	28.520,05	27.075,38	27.061,59	26.719,17	29.495,70	26.084,06	26.084,06	26.392,18	43.304,01	13.042,05	345.469,43	99,42%
Yat.veİnş.Dai. Bşk.	89.864.780,42	3.589.067,30	2.006.067,55	2.751.155,60	2.825.374,61	5.152.499,82	7.863.469,91	6.275.167,97	11.304.271,36	10.933.169,14	12.668.876,56	13.161.966,02	11.317.436,17	89.848.522,01	99,98%
Hukuk Müşavirliği	469.000	60.623,03	44.328,25	32.249,73	35.067,16	37.172,03	37.790,36	40.833,68	40.900,71	37.531,04	34.999,55	32.124,81	28.053,50	461.673,85	98,44%
Basın Yayın Şb.Müd.	103.000	17.036,31	13.194,67	10.783,99	6.549,37	6.748,83	9.388,89	7.081,99	234,50	0,00	469,25	12.039,50	10.636,25	94.163,55	91,42%
Abone İşleri Dai.Bşk.	17.829.500	1.200.986,83	1.178.886,35	1.151.848,67	1.349.974,64	1.241.455,91	1.387.565,07	1.476.510,41	1.415.036,12	1.345.177,69	1.351.541,69	3.100.965,36	1.586.338,08	17.786.286,82	99,76%
İçmesuyu Dai.Bşk.	102.280.500	4.917.266,65	5.663.091,09	5.732.136,11	6.056.284,32	22.069.658,57	12.206.440,27	7.144.675,02	8.247.183,20	8.263.107,82	8.756.809,67	6.268.655,39	6.937.156,40	102.262.464,51	99,98%
Kanalizasyon Dai.Bşk.	25.825.500	2.172.085,88	1.077.873,47	1.446.115,41	1.821.878,37	1.527.309,85	1.565.636,78	2.846.819,20	2.479.181,89	1.559.159,44	5.878.269,65	2.171.798,33	1.259.000,37	25.805.128,64	99,92%
Atıksu Arıtma Dai.Bşk.	16.737.000	1.455.901,67	681.087,06	760.712,74	701.782,32	722.519,30	2.506.850,37	1.686.945,20	1.748.566,33	782.001,32	2.142.031,42	1.242.118,37	2.228.473,21	16.658.989,31	99,53%
Çevre Koruma Ve Kontrol Dai. Bşk.	3.071.000	223.383,51	249.614,46	197.413,32	231.926,96	205.816,53	205.170,98	254.339,17	199.198,65	193.339,39	139.835,56	319.690,50	632.463,79	3.052.192,82	99,39%
Tesisler Dai. Bşk.	1.197.735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.045,80	206.107,46	220.550,59	221.685,32	303.029,76	1.189.418,93	99,31%
TOPLAM	305.611.780,42	16.899.917,16	13.061.247,05	14.309.003,34	15.306.903,25	33.459.804,69	27.980.865,77	22.307.832,72	30.887.393,74	25.984.574,74	33.669.882,07	28.854.412,17	42.357.742,01	305.079.578,71	99,83%

2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BİLANÇOSU

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI BİLANÇOSU

	AKTİF	2016 Yılı ₺		2017 Yılı ₺			PASİF	2016 Yılı ₺		2017 Yılı ₺	
I	**DÖNEN VARLIKLAR**		**73.795.510,35**		**108.589.963,48**	III	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**		**76.548.426,87**		**103.174.792,98**
A	**Hazır Değerler**		4.751.750,43		6.096.960,93	A	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**		29.466.161,34		37.421.351,08
2	Alınan Çekler	130.517,00		0,00		1	İller Bankasına Borçlar	10.375.450,00		20.000.000,00	
3	Bankalar	2.950.381,13		3.743.313,07		2	İş Bankasına Borçlar	4.850.000,00		16.652.767,08	
5	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	1.670.852,30		2.353.647,86		3	Kamu İdarelerine Borçlar	14.240.711,34		768.584,00	
C	**Faaliyet Alacakları**		17.333.739,51		15.116.672,83	B	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**		6.774.550,00		7.767.000,00
1	Gelirlerden Alacaklar (Alıcılar)	16.696.682,82		13.961.246,01		1	Hazine Garantili Borçlar	6.774.550,00		7.767.000,00	
2	Diğ. Menk.Varlıklar (Alacak Senetleri)	10.950,00		10.950,00		C	**Faaliyet Borçları**		22.439.257,46		40.620.700,17
3	Verilen Depozito ve Teminatlar	626.106,69		1.144.476,82		1	Bütçe Emanetleri	16.325.792,94		30.659.351,11	
D	**Kurum Alacakları**		11.558,44		14.458.459,34	2	Alınan Depozito ve Teminatlar	2.773.241,50		750.844,39	
3	Kurumca Verilen Boçlardan Alacaklar	11.558,44		14.451.268,99		3	DiğerTicari Borçlar	1.902.562,54		4.127.733,20	
4	Personelden Alacaklar	11.558,44		7.190,35		4	Personele Borçlar	972.435,01		13.858,15	
E	**Diğer Alacaklar**		219.489,33		450.909,20	5	Diğer Çeşitli Borçlar	465.225,47		5.068.913,32	
5	Diğer Çeşitli Alacaklar	219.489,33		450.909,20		G	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**		4.001.451,47		3.735.918,99
F	**Stoklar**		18.687.476,66		23.783.664,82	1	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	2.059.461,20		1.785.638,19	
1	İlk Madde Ve Malzeme	18.687.476,66		23.783.664,82		2	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	779.465,86		836.885,98	
G	**Ön Ödemeler**		1.463.167,99		725.801,61	4	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.162.524,41		1.113.394,82	
5	İş Avansları	49.000,00		49.000,00		H	**Borç ve Gider Karşılıkları**		3.581.005,94		4.481.005,94
6	Personel Avansı	1.414.167,99		676.801,61		1	Maliyet Giderleri Karşılığı	2.900.000,00		3.800.000,00	
J	**Diğer Dönen Varlıklar**		31.328.327,99		47.957.494,75	4	Dönem Karı Vergi ve diğ.Yas.yük.	681.005,94		681.005,94	
1	Devreden K.D.V.	31.223.469,81		47.775.358,32		I	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**		10.265.177,31		9.142.013,54
2	Sayım Noksanları	104.858,18		182.136,43		1	Gelecek Aylara Ait Gelirler	60.087,60		60.087,60	
II	**DURAN VARLIKLAR**		**422.640.586,04**		**472.909.645,27**	2	Gider Tahakkukları	10.205.089,71		9.081.925,94	
A	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**					J	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**		20.823,35		6.803,26
B	**Faaliyet Alacakları**		5.478.685,44		8.781.228,89	2	Sayım Fazlalıkları	20.823,35		6.803,26	
1	Gelirlerden Alacaklar (Alıcılar)	3.998.646,48		5.056.720,37		IV	**UZUN VADELİ KAYNAKLAR**		**218.948.369,80**		**262.902.596,12**
2	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	1.480.038,96		3.724.508,52		A	**Uzun Vadeli Diğer Kaynaklar**		98.381.493,50		115.843.074,19
E	**Maddi Duran Varlıklar**		417.161.900,60		464.128.416,38	1	İller Bankasına Borçlar	81.731.493,50		85.843.074,19	
1	Arazi Ve Arsalar	9.077.301,22		9.822.368,87		2	Vakıflar Bankasına Borçlar	16.650.000,00		30.000.000,00	
2	Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri	504.561.588,71		532.061.819,41		B	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**		63.729.514,59		70.253.178,28
3	Binalar	42.254.629,75		44.457.177,67		1	Hazine Garantili Borçlar	63.729.514,59		70.253.178,28	
4	Tesis, Makina Ve Cihazlar	102.314.911,51		104.913.234,32		D	**Diğer Kaynaklar**		15.178.576,59		17.966.481,33
5	Taşıtlar	7.122.216,39		7.122.215,39		4	Alınan Depozito Ve Teminatlar	15.178.576,59		17.966.481,33	
6	Demirbaşlar	9.503.510,99		10.220.094,30		G	**Borç ve Gider Karşılıkları**		18.091.688,05		14.835.551,27
7	Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00		0,00		1	Kıdem Tazminatı Karşılığı	18.091.688,05		14.835.551,27	
8	Birikmiş Amortismanlar(-)	-314.025.765,56		-343.529.985,17		I	**Diğer Uzun Vadeli Kaynaklar**		23.567.097,07		44.004.311,05
9	Yapılmakta Olan Yatırımlar	56.353.507,59		99.061.491,59		2	Tesise katılma payları	480.700,80		420.613,20	
F	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**		0,00		0,00	3	Gider Tahakkukları Hesabı	23.086.396,27		43.583.697,85	
1	Haklar	2.755.275,83		3.106.799,85		V	**ÖZ KAYNAKLAR**		**200.939.299,72**		**215.422.219,65**
7	Birikmiş Amortisman (-)	-2.755.275,83		-3.106.799,85		A	**Net Değer**		31.997.645,72		53.187.607,43
						1	Sermaye	214.673,43		214.673,43	
						2	Varlık Envanteri	16.664.365,93		16.664.365,93	
						3	Önceki Dönem Faaliyet Karları	15.118.606,36		36.308.568,07	
						C	**Yeniden Değerleme Farkları**		131.174.521,12		131.174.521,12
						1	M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu	131.174.521,12		131.174.521,12	
						E	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**		61.717.158,47		40.527.196,76
						1	Geçmiş Yıllar Karları	61.717.158,47		40.527.196,76	
						G	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**				-23.950.025,59
						1	Geçmiş Yıllar Zararı (-)			-23.950.025,59	
						H	**Dönem Faaliyet Sonuçları**		-23.950.025,59		14.482.919,93
						1	Dönem Net Karı			14.482.919,93	
						2	Dönem Net Zararı (-)	-23.950.025,59			
			496.436.096,39		**581.499.608,75**				**496.436.096,39**		**581.499.608,75**

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap			GİDERİN TÜRÜ	CARİ YIL 2017	
	Kod.1	Kod.2	Kod.3			
630	**1**			**Personel Giderleri**		**34.466.303,61**
630	1	1		Memurlar	14.131.769,25	
630	1	2		Sözleşmeli Personel	282.926,98	
630	1	3		İşçiler	19.946.859,18	
630	1	4		Geçici Personel	104.748,20	
630	**2**			**Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**		**6.810.616,19**
630	**2**	**1**		**Memurlar**	**2.589.829,57**	
630	2	1	6	Sos.Güvenlik Kurumuna	2.589.829,57	
630	**2**	**2**		**Sözleşmeli Personel**	**17.972,56**	
630	2	2	6	Sos.Güvenlik Kurumuna	17.972,56	
630	**2**	**3**		**İşçiler**	**4.202.814,06**	
630	2	3	4	İşsizlik Sigortası Fonuna	373.600,11	
630	2	3	6	Sos.Güvenlik Kurumuna	3.829.213,95	
630	**3**			**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**		**88.324.938,05**
630	**3**	**2**		**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları**	**29.982.817,72**	
630	3	2	1	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	61.430,66	
630	3	2	3	Enerji Alımları	29.840.728,24	
630	3	2	6	Özel Malzeme Alımları	80.658,82	
630	**3**	**3**		**Yolluklar**	**191.752,54**	
630	3	3	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	32.643,13	
630	3	3	2	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	30.929,28	
630	3	3	3	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	48.369,24	
630	3	3	5	Yolluk Tazminatları	79.810,89	
630	**3**	**4**		**Görev Giderleri**	**649.591,51**	
630	3	4	2	Yasal Giderler	627.264,12	
630	3	4	3	Ödenecek Vergi, Resim ve Harçlar	22.327,39	
630	**3**	**5**		**Hizmet Alımları**	**56.347.489,52**	
630	3	5	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	32.970.784,24	
630	3	5	2	Haberleşme Giderleri	471.698,79	
630	3	5	4	Tarifeye Bağlı Ödemeler	350.405,51	
630	3	5	5	Kiralar	21.523.419,14	
630	3	5	7	Yargılama Giderleri	1.252,75	
630	3	5	9	Diğer Hizmet Alımları	1.029.929,09	
630	**3**	**6**		**Temsil ve Tanıtma Giderleri**	**28.450,80**	
630	3	6	1	Temsil Giderleri	28.450,80	
630	**3**	**7**		**Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Gid.**	**1.123.033,96**	
630	3	7	1	Menkul Mal Alım Giderleri	14.160,42	
630	3	7	3	Bakım ve Onarım Giderleri	1.108.873,54	
630	**3**	**8**		**Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri**	**1.802,00**	
630	3	8	1	Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri	1.802,00	
630	**4**			**Diğer Giderler**		**29.223.316,79**
630	**4**	**2**		**İç Borç Finansman Giderleri**	**29.223.316,79**	
630	4	2	9	Diğer İç Borç Finansman Giderleri	29.223.316,79	
630	**5**			**Cari Transferler**		**1.808.368,14**
630	**5**	**2**		**Hazine Yardımları(Mahalli İdarelerin Yardımları)**	**1.587.556,49**	
630	5	2	6	Giderlere Katılma Payları	1.587.556,49	
630	**5**	**4**		**Hane Halkına Yapılan Transferler**	**220.811,65**	
630	5	4	9	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	220.811,65	
630	**11**			**Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri**		**16.590.287,85**
630	**12**			**Gelirlerin Ret ve İadesinden Kay.Gid.**		**60.277,66**
630	**13**			**Amortisman Giderleri**		**29.855.743,63**
630	**14**			**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**		**31.293.932,01**
630	**14**	**1**		**Kırtasiye Malzemeleri Grubu**	**234.552,10**	
630	**14**	**2**		**Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kull.Malz.**	**13.362,33**	
630	**14**	**3**		**Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu**	**427.608,45**	
630	**14**	**4**		**Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu**	**3.484.216,59**	
630	**14**	**5**		**Temizleme Ekipmanları Grubu**	**67.813,74**	
630	**14**	**6**		**Giyecek Mefruşat ve Tuhafiye Malz. Grubu**	**242.818,69**	
630	**14**	**7**		**Yiyecek Grubu**	**477.882,66**	
630	**14**	**8**		**İçecek Grubu**	**7.612,73**	
630	**14**	**9**		**Canlı Hayvanlar Grubu**	**106,00**	
630	**14**	**10**		**Zirai Maddeler Grubu**	**11.119,71**	
630	**14**	**11**		**Yem Grubu**	**42,37**	
630	**14**	**12**		**Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu**	**1.581.905,87**	
630	**14**	**13**		**Yedek Parçalar Grubu**	**24.401.097,10**	
630	**14**	**14**		**Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu**	**8.178,71**	
630	**14**	**15**		**Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu**	**5.490,00**	
630	**14**	**17**		**Basınçlı Ekipmanlar**	**314.889,06**	
630	**14**	**99**		**Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler**	**15.235,90**	
				GİDERLER TOPLAMI :		**238.433.783,93**

Hesap Kodu	Yardımcı Hes.			GELİRİN TÜRÜ	CARİ YIL 2017	
	Kod.1	Kod.2	Kod.3			
600	**03**			**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**		**183.053.494,26**
600	**03**	**01**		**Mal ve Hizmet Satış gelirleri**	**182.461.761,93**	
600	03	01	01	Mal Satış Gelirleri	1.116.112,64	
600	03	01	02	Hizmet Gelirleri	181.345.649,29	
600	**03**	**06**		**Kira Gelirleri**	**364.733,33**	
600	03	06	01	Taşınmaz Kiraları	364.733,33	
600	**03**	**09**		**Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri**	**226.999,00**	
600	03	09	09	Diğer Gelirler	226.999,00	
600	**04**			**Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler**		**2.519.374,19**
600	**04**	**04**		**Kurumlardan Ve Kişilerden Alınana Yardım Ve Bağışlar**	**1.198.766,19**	
600	04	04	02	Sermaye	1.198.766,19	
600	**04**	**05**		**Proje Yardımları**	**1.320.608,00**	
600	04	05	01	Cari	1.320.608,00	
600	**05**			**Diğer Gelirler**		**67.315.217,63**
600	**05**	**01**		**Diğer Gelirler**	**2.198.170,86**	
600	05	01	04	Takipteki Kurum Alacakları	1.863.466,11	
600	05	01	09	Diğer Gelirler	334.704,75	
600	**05**	**02**		**Kişi ve kurumlardan Alınan Paylar**	**63.660.420,40**	
600	05	02	02	Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	55.591.050,96	
600	05	02	04	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	8.069.369,44	
600	**05**	**03**		**Para Cezaları**	**194.492,45**	
600	05	03	02	İdari Para Cezaları	194.492,45	
600	**05**	**09**		**Diğer Çeşitli Gelirler**	**1.262.133,92**	
600	05	09	01	Diğer Çeşitli Gelirler (Tahs.Büt.Gel.kaydedilen Alac.)	1.262.133,92	
600	**11**			**Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri**		**28.617,78**
600	**11**	**99**		**Diğer Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri**	**28.617,78**	
600	11	99	01	Para Farkları	28.617,78	
				GELİRLER TOPLAMI:		**252.916.703,86**
				FAALİYET SONUCU		**14.482.919,93**

DENETİM RAPORU
(01.01.2017 – 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI)

Kaski Genel Müdürlüğü'nün 2560 sayılı kanun gereğince 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan denetim sonucunda düzenlenen genel inceleme raporunu aşağıda belirtilen başlıklar halinde Genel Kurulun bilgilerine arz ederiz.

A-GENEL İNCELEME

Kaski Yönetim Kurulu 2017 yılı içerisinde 52 toplantı yapmış olup Yönetim Kurulu'nun aldığı kararların dağılımı birimlere göre şöyledir. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 204, Hukuk Müşavirliği 3, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 82, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 17, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 28, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 46, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 21, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 6, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 60, Tesisler Dairesi Başkanlığı 1, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 3, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 1 ve Yönetim Kurulu Bürosu 1 adet olmak üzere toplam 473 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Kaski Genel Kurulu 2017 yılı içerisinde iki toplantı yapmıştır.2017 Mayıs ayında tek oturumda 6 adet, Kasım ayındaki genel kurulda; 9 adet olmak üzere toplam 15 karar almıştır.

B-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Kaski Genel Müdürlüğü'nün 01.01.2017-31.12.2017 dönemi ile ilgili olarak bütçe uygulamaları sonucunda; Bütçe Gelirleri Toplamı: ₺ 269.702.997,64 Bütçe Giderleri Toplamı: ₺ 305.079.578,71 olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde İller Bankası A.Ş.'den ₺ 168.903.896,58 yatırım kredisi temin edilmiş, ₺ 37.611.780,42 'sı kullanılmış ve ₺131.292.116,16 'sının da 2018 yılına devredildiği görülmüştür.

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünce yapılan 5 yıllık Stratejik Plan, Yıllık Performans Programı ve Bütçe İşlemlerinin 5018 sayılı kanun hükümlerine uygun şekilde yürütüldüğü görülmüştür. Mali Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan ödeme ve tahsilat işlemleri ile ilgili belgelerin incelemesi sondaj usulü yapılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nca kasada muhafaza edilmesi gereken teminat mektubu ve diğer kıymetli evrak niteliğinde olan evrakların Muhasebe Müdürlüğünde bulunan kasada muhafaza edildiği teminat mektubu ve değerli evrakın miktar süre ve işin niteliğine göre ihale sözleşmesine uygun olarak alındığı, alınan teminat mektuplarının ilgili bankalardan teyitlerinin alındığı, süreli olanların sürelerinin takip edildiği ve ilgili birimlere gerekli hatırlatmaların yapıldığı görülmüştür.

C-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE İLGİLİ İNCELEME

Kaski Hukuk Müşavirliğince 58'i yeni açılan, 39'u önceki yıllardan devir olmak üzere toplam 97 dava dosyasının olduğu, 45 dava dosyasının sonuçlandığı, 52 davanın ise 2018 yılına devrettiği görülmüştür.

2017 yılında önceki yıldan devir 51 icra takibi ile birlikte 8 adet icra takibi olmak üzere toplam 59 icra takip dosyası olduğu, bunlardan 13 dosya infaz edilmiş olup kalan 46 adet icra dosyası hakkında takibin devam etmekte olduğu görülmüştür.

Kurumun hukuki konularla ilgili olarak ihtiyacı olan konularda şifahi olarak çok sayıda mütalaanın dışında 6 adet yazılı mütalaa verildiği, Hukuk müşavirliğine gelen 427 evrak olduğu 253 adet evrakın ilgili birimlere gönderildiği görülmüştür.

D-İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde 22 adet proje çalışması yapılmış ve 224.387 mt şebeke döşemesi, 15.775 adet arıza onarımı, 7.855 adet yeni bağlanan ilçeler, 1.574 adet abone aktarımı, 1.074 adet fiziki kaybın tespit ve arızanın giderilmesi yapılmış olup ayrıca 301.156 mt iptal edilen içmesuyu borusu olduğu tespit edilmiştir. Su kayıp kontrol ve ölçüm servisince debi ölçümü, ve basınç ölçümü 759 adet olarak gerçekleştirilmiştir. SCADA merkezi denetim ve bilgi toplama sistemiyle içmesuyu üretim ve dağıtımı 24 saat etkin ve verimli olarak kontrolü ve kumandası sağlanmış, puant saat uygulaması tek terimli tarifeden çift terimli tarifeye geçişle de elektrik enerji maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlanmış olup içmesuyu rezervlerinin verimli ve sağlıklı kullanılması ve klorlaması takibi otomatik olarak yapılmıştır.

E-KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde 2017 yılında 135.970 mt. Kanalizasyon hattı yapıldığı tespit edilmiştir. 2017 yılı içerisinde dilekçe ve ALO 185 'e toplam 30.143 adet kanal arızası başvurusu alınmış bu arızaların Merkez İlçe Belediyeleri sınırlarında olan kısmı 2017 yılı boyunca toplam 23.371 adet olup aylık ortalama arıza sayısı 1.948 adettir. Yeni eklenen ilçe sınırlarında olan kısmı ise 2017 yılında toplam 6.772 adet olup aylık ortalama arıza sayısı 564 adettir. Ayrıca 2017 yılında 763 adet bina bağlantısı gerçekleştirilmiş ve toplam 66.552 mt. kanalizasyon hattı ve abone bağlantısı yapıldığı, ayrıca 39.376 mt. yağmur ızgara hattı yapıldığı görülmüştür.

F-ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Atıksu Arıtma Tesisi amacı doğrultusunda 2017 yılında toplam 57.152.706 m^3 atıksuyu arıtarak AB standartlarında bir çıkış suyu sağlamıştır. Arıtma tesisinde günlük 350 ton arıtma çamuru, yaklaşık 18 ton kum ve 7 ton ızgara atığının çıkartılarak Kızılırmak ve çevresinin kirlenmesinin önlenmesi konusunda önemli bir katkıda bulunmuştur. Arıtma tesisi amaçlarını gerçekleştirirken ihtiyacı olan elektrik enerjisinin bir kısmı biogazdan üretilmiştir. Ayrıca kış aylarında tesisisin ısınması ve sıcak su ihtiyacı sürekli olarak karşılanmaktadır. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı'nın ruhsat ve denetim faaliyetleri çerçevesinde 2017 yılında yeni ruhsatlandırma, ruhsat yenileme, periyodik olarak numune alma, analiz yapma, ölçme, periyodik kontrol, görüş ve analizleri Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı laboratuvarlarda yapılmaktadır.

G-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

2017 yılında ihale ve doğrudan temin ile 54 adet kanalizasyon yatırımı, 2 adet yağmursuyu yatırımı, 61 adet içmesuyu yatırımı, 23 adet atıksu arıtma tesisi ve 13 adet muhtelif işler için yatırım yapılmış olup KASKİ' nin ihtiyacı olan her türlü harita emlak kamulaştırma, daimi irtifak, istimlâk, devir ve ifraz işlemleri ile inşaat ve tesisin yapılması için çalışmalarını sürdürmekte olduğu görülmüştür. İhalelerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı, tamamlanan işlerin teslim alınmış olduğu, yıllara sari olan ve tamamlanmayan işlerin devam ettiği görülmüş olup ihalelerle ilgili olarak yapılan inceleme sondaj usulü ile yapılmıştır.

H- ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

2017 yılı içinde 32 adet ihale yolu ile alım yapılmış ayrıca 737 adet doğrudan temin ile mal ve hizmet alımı yapıldığı gözlenmiştir. Sondaj usulü ile ihale dosyaları üzerinde incelemeler yapılmıştır. İhalelerin 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa uygun olarak yapıldığı anlaşılmıştır.

Daire Başkanlığınca 76 adedi KASKİ'nin mülkiyetinde olan ve 39 adedi kiralama yolu ile temin edilen toplam 115 adet araç ve iş makinesi ile hizmetler gerçekleştirilmiştir.

I-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 420 kullanıcılı ağ ortamı ile 61 server 4 dağıtım merkezi ve sisteme bağlı cihazlarla kuruma aktif üç şube müdürlüğü ile bilgi ve destek sağlayıp hizmet vermektedir. 114 adet el bilgisayarı sayesinde abonelerin endeksleri sisteme iletilmektedir. Daire başkanlıkları ile birlikte hareket edilerek istek ve ihtiyaç duyulan konularda teknik destek sağlanmış,web tabanlı yeni sistemle birlikte programlara yeni modül ve raporlamalar eklenmeye devam edilmiştir.İhale ile yapımı tamamlanan şebekelerin sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılması sağlanmıştır.

İ-İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Kaski Genel Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında 237 memur, 4 sözleşmeli, 261 işçi olmak üzere toplam 502 personel görev yapmıştır. 2017 yılında 20 işçi ve 6 memur emekli olmuş, 1 işçi ve 3 memur vefat etmiş, 1 işçi ve 3 memur kamudan ihraç edilmiş ve 3 memur nakil gitmiş olup, 1 sözleşmeli personel, eski hükümlü kadrosuyla 3 işçi ve diğer kurumlardan 15 memur nakil gelerek göreve başlamışlardır. Çalışanların tüm sosyal hakları, ücret kesinti ve istihkakları ile bildirimleri ilgililere süresi içerisinde bildirilmiştir. Ayrıca 2016-2017 eğitim yılında 35 adet meslek lisesi öğrencisi staj yapmıştır. 2016-2017 eğitim yılı yaz döneminde ise 106 üniversite, 86 meslek yüksek okulu, 17 lise öğrencisine staj imkanı sağlanmıştır.

J-ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Vatandaşların farklı işlemleri ile ilgili talepleri doğrultusunda 2017 yılında 36.082 adet evrak işlemi gerçekleşmiştir. 21.098 adet yeni abone kaydı yapılmış olup 2.706 adet abone iptali sonucunda yılsonu itibarıyla abone sayısı 560.568 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılında halkla ilişkiler servisince 12.421 adet abone isim değişikliği, 1.445 adet abone geçici kapama, 2.856 adet yeniden su açma işlemi gerçekleştirilmiştir. Tahakkuk servisinde ise 430 adet tutanaklı fatura düzeltme işlemi yapılmış fen memurluğunca da 24.775 adet kontrol yapılarak raporlandırılmıştır.

1.232 adet yeni inşaat ruhsatı başvurusu yapılmış ve kanal tahakkuk servisince ₺ 6.498.837 Kanal Katılım Payı tahakkuk ettirilmiştir. İmarsız yapılara ait atıksu çıkışlarının kanalizasyon şebekesine bağlanması sonucu ₺176.177 kanal katılım payları abonelerin su tüketim bedellerine ilave edilmiştir. 21.098 adet yeni abone dilekçesinin ilişiği kesilmiştir. Kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılan yeni binaların kanallarından ₺ 151.556 ücret tahakkuku yapılmıştır. Ayrıca inşaatları tamamlanmış binaların (mesken ve işyeri) yapı kullanma izin belgesi ilişikleri, bozulan yol asfalt ve kaldırım bedelleri, ikinci kanal bağlantısı yaptıranların bağlantı ücretleri tahakkuku, eski binalarda kanalizasyon şebekesine bağlantı yaptırmak isteyenlerin yerinde ölçüm ve tahakkuk işlemleri, müteahhitçe bağlanan bölgelerdeki imarlı binaların ölçüm ve tahakkuk işlemleri yapılmıştır. Arızaların giderilmesi sonucunda ₺ 491.790 kanal açma ücreti olarak tahakkuk ettirilmiştir.

Kaçaksu servisine çeşitli yollarla 1.512 adet ihbar gelmiştir. Ayrıca bu ihbarlar değerlendirilerek 94.136 adet kaçaksu tutanağında ₺ 14.595.216,93 tahakkuk ettirilmiştir. Bunun ₺ 12.173.711,77 sı tahsil edilmiş olup ₺311.259,02 sı taksite bağlanmıştır. Geri kalan kısmın takibi devam etmektedir. Kaçaksu tutanaklarında ₺ 18.951,09 sına tekabül eden 56 adet bedel her türlü uyarılara rağmen tahsil edilemediğinden İcra Servisine gönderilmiştir. Ayrıca 656 adet kaçaksu tutanağı su hırsızlığı kapsamında icra şefliği ve sözleşmeli avukatlar kanalıyla Cumhuriyet Savcılığına havalesi yapılmıştır.

2017 yılında sayaç okuma, endeks kontrolü, arızalı sayaç kontrolü ve el ilanlarının abonelere ulaştırılması ile itirazların değerlendirilip kaçaksu kullanımı ile ilgili ihbarlar tespit şefliği tarafından ilgili birimlere iletmiştir. Yıl içinde 96 üniformalı tespit elemanı 6360 sayılı kanun ile Kayseri sınırları il sınırları içinde tüm ilçe ve mahalleler olmak üzere 30 günlük dönemler halinde 12 kez su tüketim bildirimi hazırlanıp abonelere ulaştırılmıştır. 361.542 adet sayaç yeri kilitli, 8.340 adet sayaç için ‘bozuk, 342.958 adet sayaç için (kullanılmıyor sayaç seri no okunmuyor, aparatlı) ‘raporlu okuma 4.375.881 adet abone sayacı normal okunmuş olmak üzere toplam 5.088.721 adet su tüketim bildirimi dağıtılmıştır. İtiraz sonucu 1.612 aboneye ulaşılmış ve sorunlar giderilmiştir.

İcra servisince 2017 yılı içerisinde 12 sözleşmeli avukatla 1.765 adet dosya takibinden 687 adedi neticelendirilerek ₺ 1.609.381,59 tahsilat yapılmış kalan 1.078 adet dosyanın da takip işlemleri devam etmektedir.

K-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Su Kalite ve Havza Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından 2017 yılı içerisinde 8.824 adet şehrin çeşitli bölgelerinden numune alınmıştır.

Kaski laboratuarları 2007 yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘’Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi ’’ ne sahiptir. Labaratuvarlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan analizler kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testleri kapsamaktadır.

Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından 2017 yılı içerisinde atıksuyu açısından 122 firma incelenmiş ve Genel Müdürlüğün görüşü verilmiştir. İncelenen bu firmalardan 353 adet numune alınarak endüstriyel atıksu kaynaklarının periyodik olarak kontrolü sağlanmıştır.

L-TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

KASKİ’ye ait 99 adet içmesuyu depolarının temizliği yapıldı. KASKİ yetkili firmaları tarafından apartman içmesuyu depolarının temizliği yapıldı. Tesislerin otları traktör ile sürülerek temizlendi. İçmesuyu depoları temizliği ve dezenfeksiyonu kursu düzenlendi. Ve katılım belgeleri düzenlendi. Apartman içmesuyu depoları temizliği ve dezenfeksiyonu yapmaya yetkili firma belgesi düzenlenmiştir.

SONUÇ VE KANAAT

Kaski Genel Müdürlüğünün 2017 yılı için yapılan olağan denetimi sonucunda yukarıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.

Büyükşehir Belediyesi sınırlarının artması sonucu 16 ilçe kapsamında yeteri kadar hizmet sunulmuş olup faaliyet alanı hizmetlerin artmasıyla genişlemiştir. Merkezi yönetim yanında merkezden uzak ilçelere hizmet sunumunda daha aktif olunması gerektiği ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kayseri merkez ve ilçelerinde kullanılan suyun güncel analizlerinin yaptırılmak suretiyle kamuoyunun Kayseri suyu hakkında bilgilendirmesinin yaptırılması gerekir. Bununla ilgili kamu spotu dahil görsel ve işitsel sunumlardan istifade edilmelidir.

Öncelikle gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlık ve refahı için gayretlerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine Kaski yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyor, hizmetlerinin artarak devam etmesini temenni ediyoruz.

Kaski Genel Kurulunun bilgisine saygıyla arz olunur. 15.03.2017

DENETÇİ
Ragıp DOST

DENETÇİ
Ramazan BEDİR

B-PERFORMANS BİLGİLERİ
1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

KASKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği'nin çalışmaları, 1 Hukuk Müşaviri 2 avukat ve 1 kalem personeli olmak üzere toplam dört eleman eliyle yürütülmüştür.

2017 yılı sonuna kadar açılan 58 adet dava dosyası ve önceki yıllardan devreden 39 dava dosyası ile birlikte toplam 97 dava dosyası hakkında işlem yapan Hukuk Müşavirliği, söz konusu dosyalardan 45 adedini geçtiğimiz yıl içerisinde sonuçlandırdı. Kalan 52 adet dosya ise 2018 yılına devredildi. Yönetim Kurulu Kararları, Makam Oluru ve temyiz sonucu kesinleşen dosyalarla ilgili ilam gereği işlemler yapıldı.

2017 yılı itibarıyla çek, ve senede, tutanağa veya ilama bağlı olup da ödenmeyen İdare alacaklarının tahsili amacıyla borçluları aleyhine 8 adet icra takibi başlatılmış, önceki yıllardan devreden 51 adet icra takibi ile birlikte 59 adet icra takibine devam edilmiş ve bunlardan 13 adedi infaz olunmuş, kalan 46 adet icra dosyası hakkındaki takip sürdürülmektedir.

2017 yılı çalışma döneminde, Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanlıklarının hukuki sorunları ile ilgili olarak çok sayıda şifahi mütalaanın yanı sıra 6 adet yazılı mütalaa verildi. Bunun yanı sıra şifahi sorular da yasal dayanaklarıyla cevaplandırıldı. 2017 yılı için Hukuk Müşavirliği'ne 427 adet evrak geldi, 253 adet evrak ilgili birimlere gönderildi.

Hukuk Müşavirliğimiz, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da yer aldığı çeşitli komisyon vb. toplantılara iştirak ederek, hukuki konularda çalışmalar yaptı.

2017 YILINDA AÇILAN DAVALARIN ÇEŞİTLERİ

A) İdare Adına Açılan Dava Sayısı ve Çeşitleri : 24

1- İtirazın İptali 3
2- Karşılıksız Yararlanma 1
3- Veraset 1
4- Şikayet (İcra Hukuk Mah.) 3
5- Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) 1
6- Rücuen Tazminat 1
7- Delil Tespiti 1
8- Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil 10
9- Tüketici Hakem Kurulu Kararına İtirazı 1
10- Görevi Kötüye Kullanma 1
11-Hırsızlık 1

2017 YILINDA GÖRÜLEN DAVALARIN SAYISAL GÖRÜNÜMÜ

Önceki Yıllardan Devreden Dava Sayısı	:	39
2017 Yılında Açılan Dava Sayısı	:	58
2017 Yılında Görülen Dava Sayısı	:	97
2017 Yılında Biten Dava Sayısı	:	45
2018 Yılına Devreden Dava Sayısı	:	52


B) Aleyhimize Açılan Dava Sayısı ve Çeşitleri: 34


İdare ve Vergi Mahkemesi (12);


1-	İdari İşlemin İptali	6
2-	Tam Yargı	5
3-	İdari İşlemin İptali ve Tam Yargı	1

Genel Mahkemeler (22);


1-	Tazminat (Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle)	3
2-	Maddi Tazminat	1
3-	Muarazanın Meni	1
4-	Menfi Tespit	2
5-	Tüketici Hakem Kuruluna İtiraz	1
6-	Delil Tespiti	1
7-	Alacak (İşçi-İşveren Huk. Kaynaklanan	9
8-	Tazminat (Özel Sigorta Söz. Kaynaklanan)	1
9-	Alacak (Rücuen Tazminat)	3

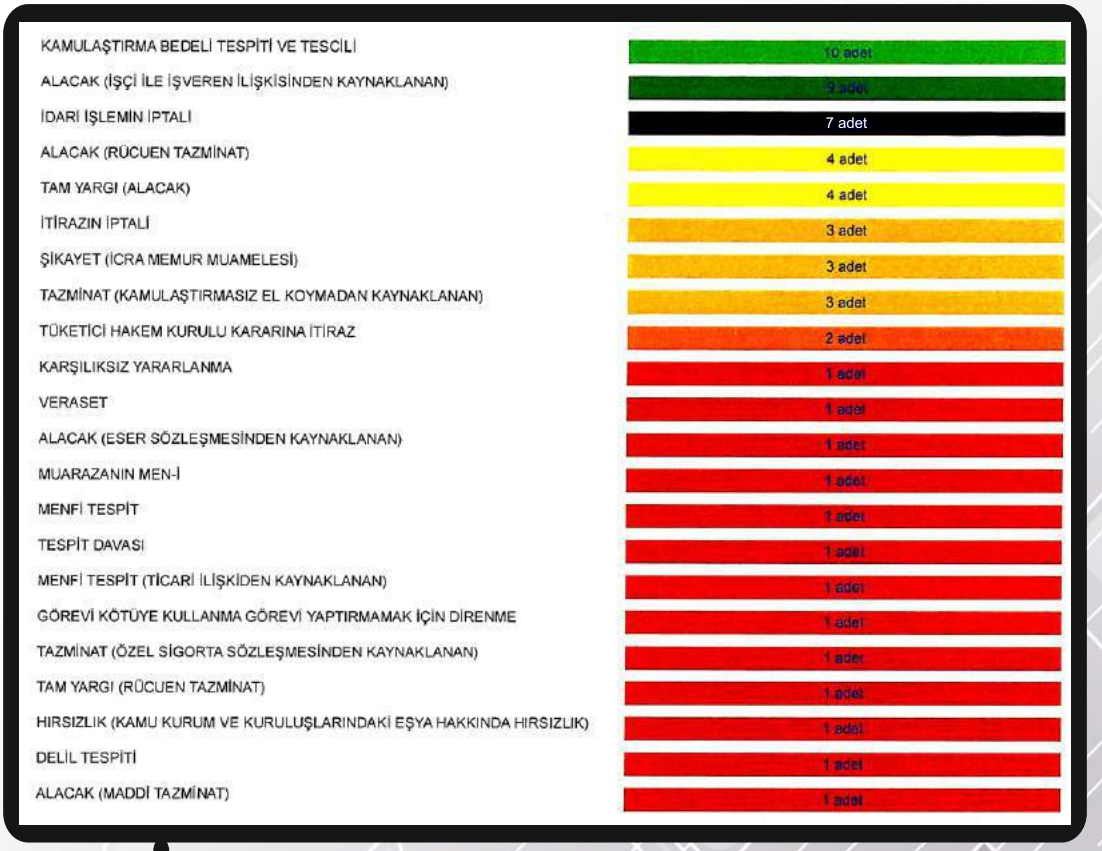

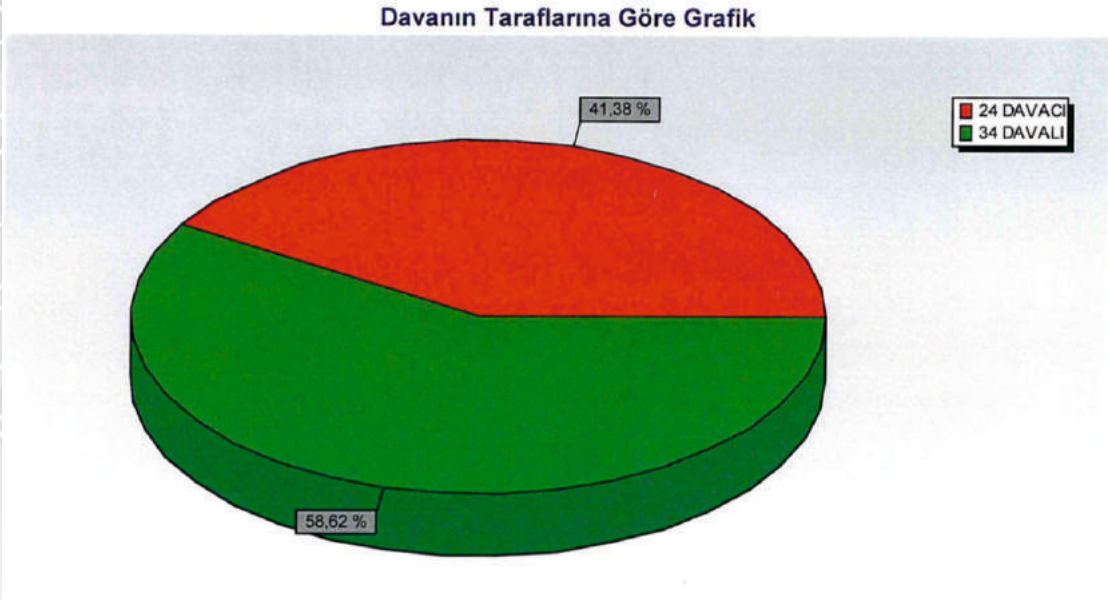

Davanın Taraflarına Göre Grafik
41,38 %
58,62 %
24 DAVACI
34 DAVALI

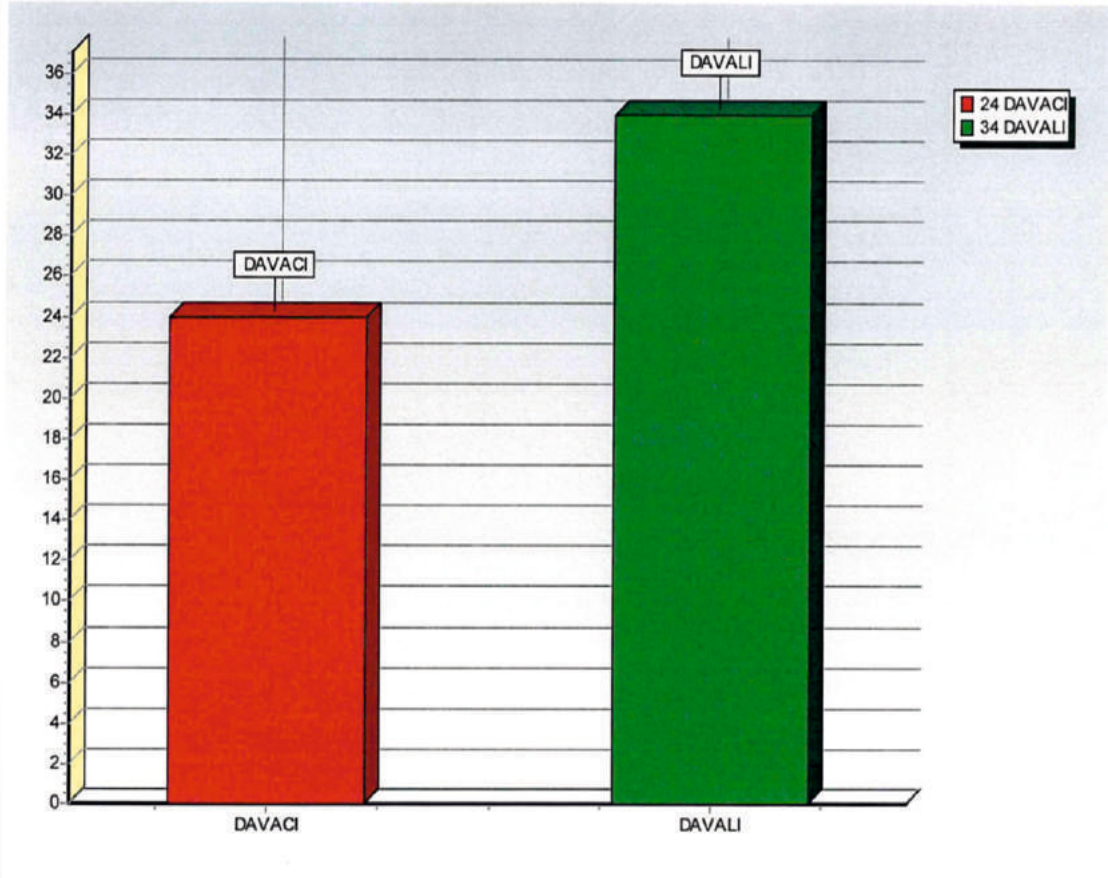
DAVACI
DAVALI
24 DAVACI
34 DAVALI
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
DAVACI
DAVALI


Dosyaların Mahkeme Türüne Göre Dağılımı

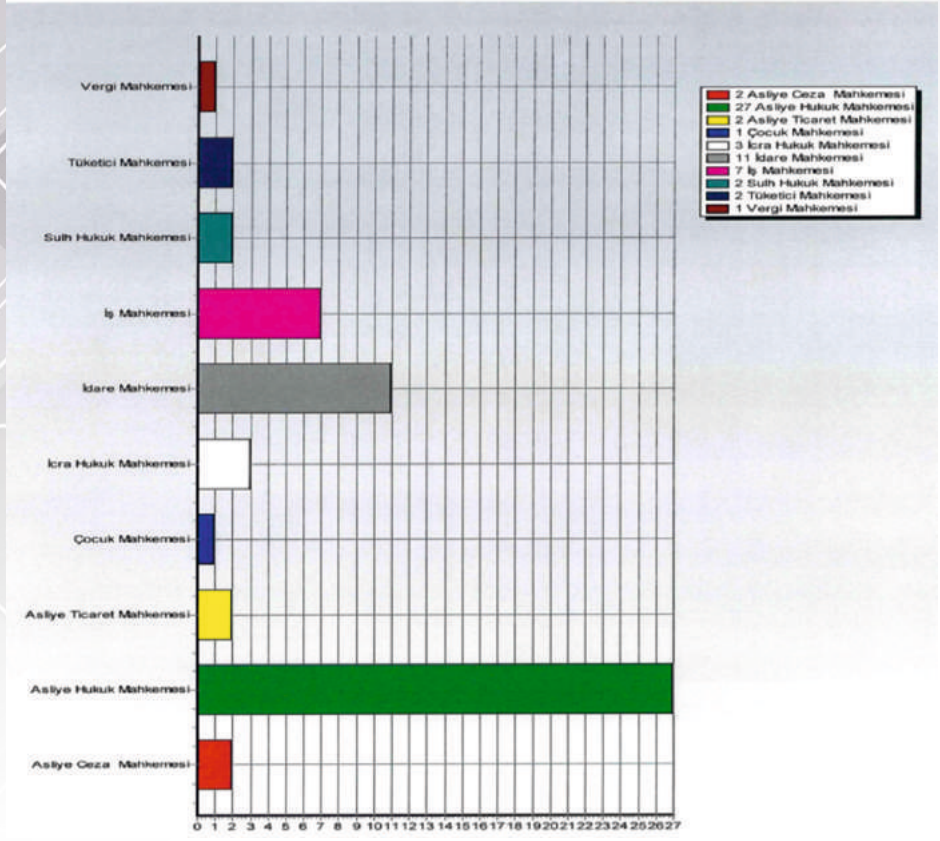


Dosyaların Dava Türüne Göre Dağılımı




Adli Davaların Alt Türüne Göre Dağılımı

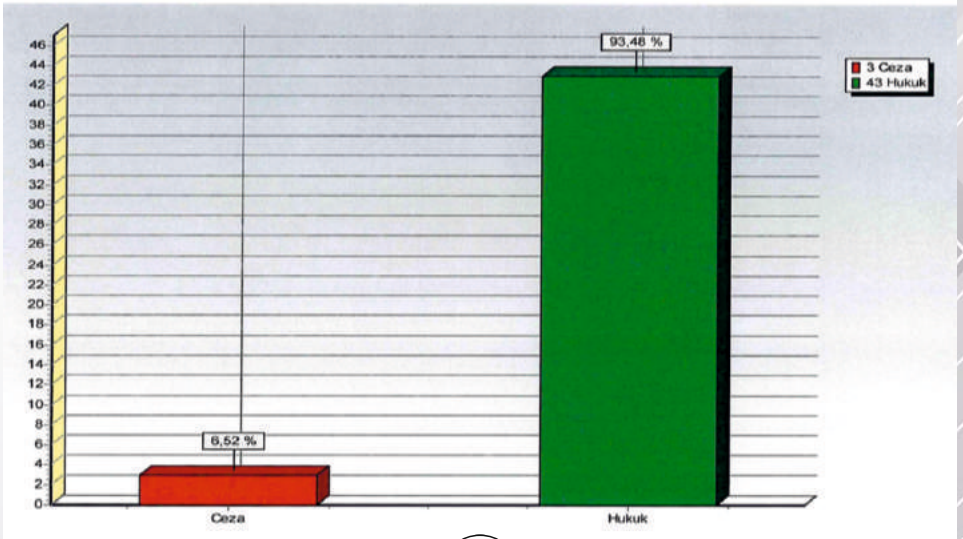


Davaların Durumuna Göre Dağılımı

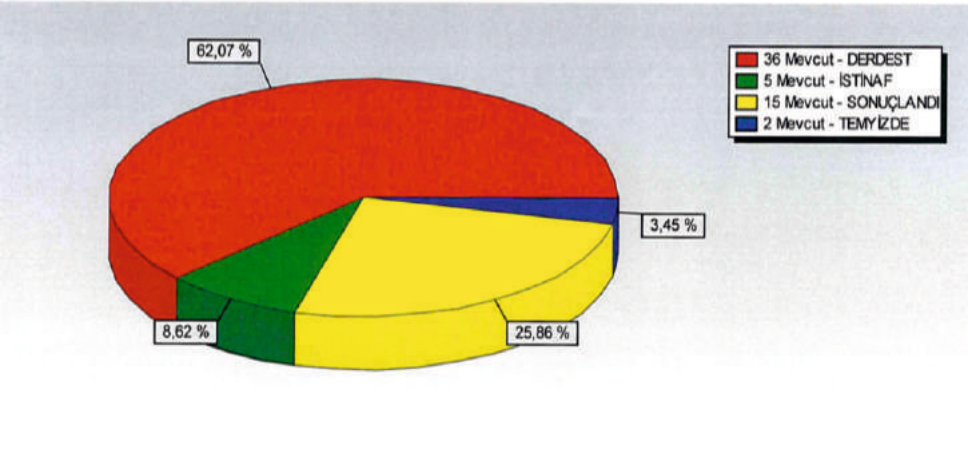


Dava Türüne Göre Devam Eden Dosyalar




Dava Türüne Göre Sonuçlanan Dosyalar




Adli Davaların Türüne Göre Devam Edenler




Adli Davaların Türüne Göre Sonuçlananlar




Dava Aşamalarına Göre Grafik

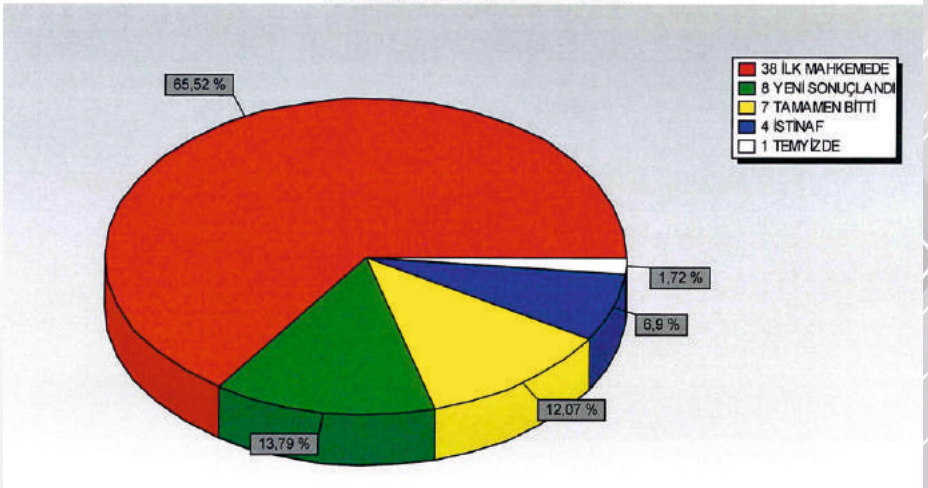

Davaların Konumlarına Göre Sonuçlanma Şekilleri

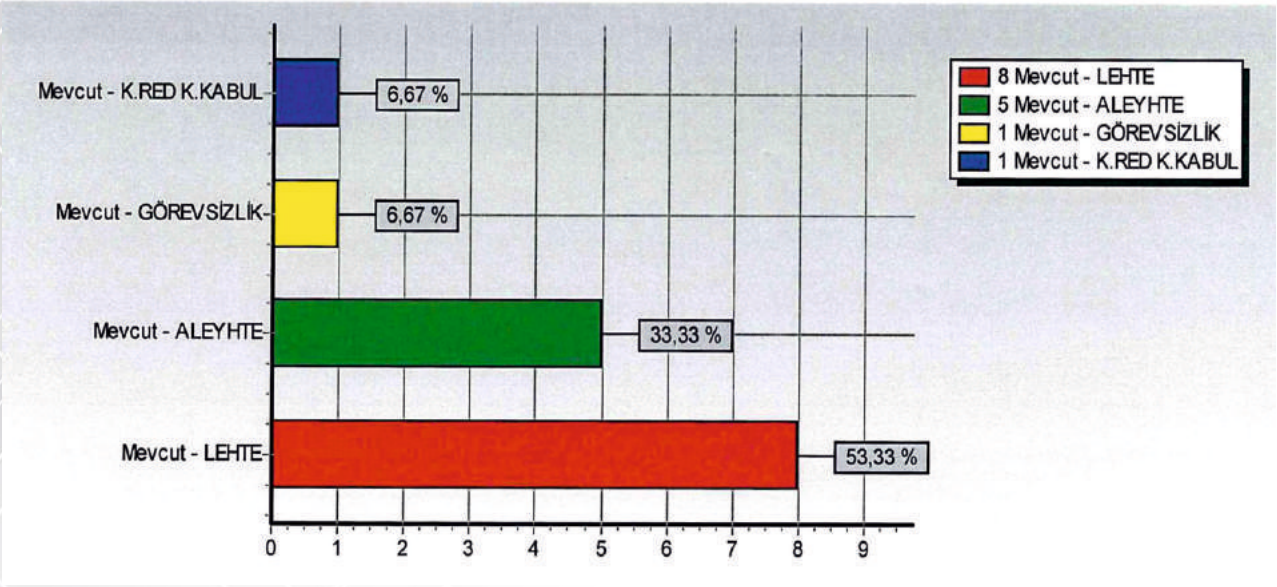

Konum ve Dava Türlerine Göre Sonuçların Dağılımı

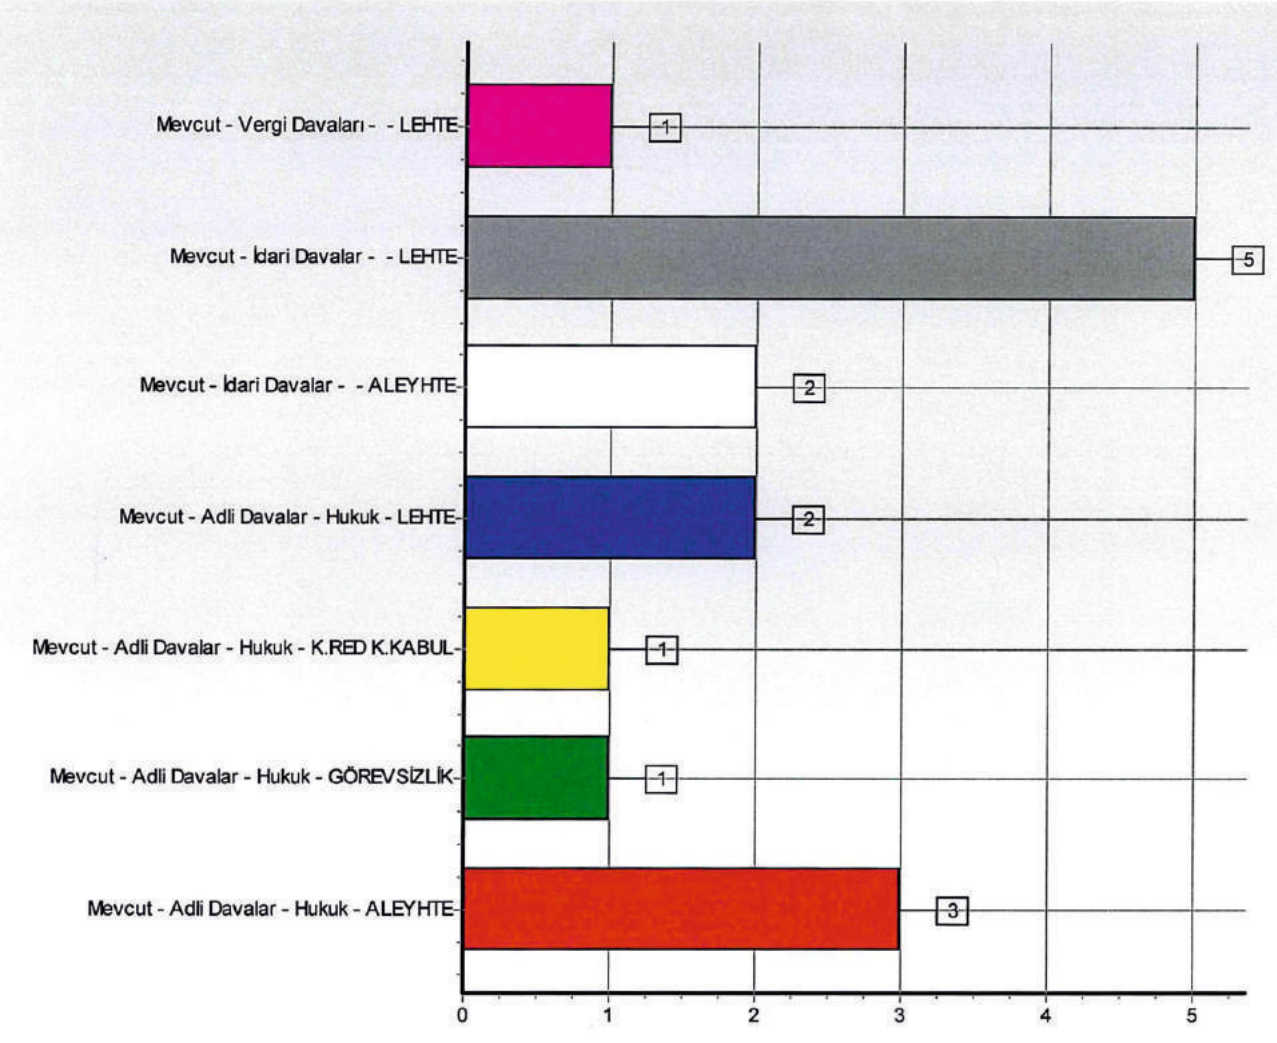

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İÇMESUYU ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube müdürlüğümüzün görevleri, üretilerek şebekemize verilen suyun şehrimizdeki abonelere paylaştırılması şebeke dağılımını, halkımıza kesintisiz su verilmesini ve şebeke arızalarının giderilmesini sağlamak. Şebeke üzerinde su dağıtımı için gerekli çalışmaları, testleri debi ve basınç ölçümlerini yapmak ve kontrollü şekilde devamlığı sağlamak.Yangın halinde gerekli suyun mevcut şebeke imkânları ile yangın bölgesine sevk etmek. Bütün şebekelerde ve sorumluluğu aboneye ait olan şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması, bulunması ve kaçakların KASKİ'ye ait şebekelerde önlenmesi şube yolunda işçilik olarak aboneye yardımcı olmaktır. Ayrıca Kayseri içmesuyu şebekesi alt bölge projelerini hazırlamak, bunlara ait abone ve şebeke borularının yenilenmesi inşaatında ilgili birimlerle koordineli çalışmak, gerekli durumlarda içmesuyu ihalelerinde kontrollük yapmak. Alt bölge ölçümleri için bölge ön izolesinin yapılması, yapılan ölçüm değerlerinin faturalandırma ile kıyaslanması ve şebeke çalışmaları tamamlandıktan sonra nihai ölçümlerini yapmak şube müdürlüğümüzün görevleri arasındadır.

6360 Sayılı yasa ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları tüm ili kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve görev ve sorumluk alanına 11 ilçe daha eklenerek toplam 16 ilçede 384 personel, 33 adet 4x4 pikap, 13 adet 4x2 pikap, 2 adet panelvan,11 kamyon,16 kamyonet, 42 kepçe ve Erciyes dağında bulunan 1 adet jetski ile KASKİ İçmesu Şube Müdürlüğü olarak hizmet vermekteyiz.

Ekiplerimiz tarafından bakım onarım çalışmalarının yanı sıra ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hatları yenilenmekte ve ihtiyaç olan yerlerde de şebeke döşeme çalışmalarına devam edilmektedir. Yeni bağlanan 11 ilçede İçmesuyu alt yapıları incelenerek sayısal ölçüm çalışmaları başlamıştır. İçmesuyu ihtiyacı olan ve mevcut şebekeleri yetersiz kalan mahallelerde Proje-Etüd ekibimiz tarafından yeni projeler hazırlanmaktadır. Bu kapsamda İçmesuyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bakım onarım ekipleri de hizmet sahası dahilinde 20 ekip evine ayrılarak vatandaşın en insani hakkı olan içme suyunu mümkün mertebede kesintisiz olarak sunmaya çalışmaktadır. Ekiplerin bölgelere göre hizmet sahaları aşağıda belirtilmiştir.

1-)Kocasinan (Karpuzatan) Ekibi: Oruçreis Mahallesi Karpuzatan mevkiinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Kocasinan Bulvarının kuzey kısmındaki Argıncık sınırına kadar olan tüm Mahalleler ile Yeni sanayi, Erkilet, Himmetdede, Düver, Kaşköy, Eskiömerler, Yuvalı, Yemliha, Amarat, Saracık, Boyacı, Taşhan, Çevril, Kuşcu, Emmiler, Kemer, Dadağı, Ebiç, Mahzemin, Elagöz, Yazır, Hasanarpa, Akin Mahallelerin içerisinde bulunduğu çok geniş bir alana hizmet vermektedir.

2-)Melikgazi Ekibi: Konaklar Mahallesi Kaski Germiraltı tesislerinin içerisinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Şehir Mezarlığı-Cumhuriyet meydanı-Sivas caddesi-Mimarsinan Köprülü kavşağı güzergâhının güneyinden Erciyes Dağına kadar ki bütün Mahalleler ile Hava İkmal, Esenyurt, Nurihas, Battalgazi, Gece Kondu Önleme Bölgesi Mahalleleri ile Hisarcık ve Kıranardı Mahallelerine hizmet etmektedir.

3-) Mahrumlar Ekibi: Kazım Karabekir Mahallesi Kaski Mahrumlar tesisleri içerisinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Kocasinan Bulvarı güneyindeki bölgenin Boğazköprü-Düvenönü-Şehir Mezarlığı istikametindeki tüm Mahalleleri, Ağaç işleri, Oymaağaç, Molu, Demirciler sitesi, Anbar, Nakliyeciler Sitesi, Dökümcüler ve Hurdacılar Sitesi ile Eğribucak (Belbaşı sınırına kadar), Kükürt, Akkaya bağlık kesimleri ile Karpuzsekisi, Gelbula, Hanyeri Mahallelerine hizmet etmektedir.

4-)Argıncık Ekibi: Doğu sanayi bölgesinde yer almaktadır. Hizmet sahası; eski terminal kavşağından Osman Kavuncu Bulvarı-Cumhuriyet Meydanı-Sivas Caddesi-Mimarsinan Köprülü Kavşağı ile Kocasinan Bulvarı kadar olan tüm mahalleler ile Argıncık bölgesi ve Talatpaşa, Fevzioğlu, Cırgalan, Beyazşehir, Gömeç, Güneşli, Kızık, Akçatepe, Buğdaylı, Salur, Samırsaklı, Karahöyük, Çavuşağa, Höbek, Yüreğil Mahallelerine hizmet etmektedir.

5-)Talas Ekibi: Kaski Talas Depo Tesisleri içerisinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Talas, Endürlük, Reşadiye, Zincidere, Akçakaya, Cebir, Başakpınar, Kepez, Yazyurdu, Yazılı, Alagazi, Ardıç, Çevlik, Çömlekci, Kamber, Koçcağız, Ortakavak, Örencik, Sakaltutan, Süleymanlı, Yamaçlı Mahallelerine hizmet etmektedir.

6-)Mimarsinan Ekibi: Mimarsinan Kayapul Mahallesinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Mimarsinan, Gürpınar, Kuruköprü, Çatakdere, Tavlusun, Gesi, Turan, Büyükbürüngüz, Küçükbürüngüz, Ağırnas, Subaşı, Bağpınar, Yeşilyurt, Güzelköy, Kayabağ ve Çalkan mevkiine hizmet etmektedir.

7-)Hacılar Ekibi: Hacılar'da yer almaktadır. Hizmet sahası; Hacılar, Sakar Çiftliği, Beğendik Bağları, İnecik ve Eşmecik bölgelerine hizmet etmektedir.

8-)İncesu Ekibi: İncesu'da yer almaktadır. Hizmet sahası; İncesu, Kızılören, Süksün, Örenşehir, Küllü, Hamurcu, Subaşı, Şeyhşaban, Tahirinli, Üçkuyu, Garipçe merkez ve mesire alanlarına hizmet etmektedir.

9-)Akkışla Ekibi: Akkışla merkez ve mahallerinde hizmet etmektedir.

10-)Bünyan Ekibi: Bünyan merkez ve mahallerinde hizmet vermektedir.

11-)Develi Ekibi: Develi merkez ve mahallerinde hizmet vermektedir.

12-)Felahiye Ekibi: Felahiye merkez, Felahiye mahalleri, Hasancı Mahallesi, Höbek Mahallesi, Mollahacı Mahallesi ve Obruk Mahallesinde hizmet vermektedir.

13-)Sarıoğlan Ekibi: Sarıoğlan merkez ve mahallerinde hizmet vermektedir.

14-)Sarız Ekibi: Sarız merkez ve mahallerinde hizmet vermektedir.

15-)Özvatan Ekibi: Özvatan merkez ve mahallerinde hizmet vermektedir.

16-)Tomarza Ekibi: Tomarza merkez ve çevresindeki mahallerde hizmet vermektedir.
17-)Dadaloğlu Ekibi: Dadaloğlu ve yakınındaki mahallerde hizmet vermektedir.
18-)Pınarbaşı Ekibi: Pınarbaşı merkez ve mahallerinde hizmet vermektedir.
19-)Yahyalı Ekibi: Yahyalı merkez ve mahallerinde hizmet vermektedir.
20-)Yeşilhisar Ekibi: Yeşilhisar merkez ve mahallerinde hizmet vermektedir.

2017 YILINDA İÇMESUYU ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN ANA İŞ KALEMLERİNE AİT ÖRNEKLER

KOCASİNAN İLÇESİ

*Ahievran Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ve abone aktarma işi.
*Akin Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Alsancak Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan şebeke hattının yenilenmesi işi.
*Barsama Mahallesi belediyenin yapmış olduğu park alanına içmesuyu hattı çekilmesi işi.
*Beyazşehir Mahallesi taşkın kanalı yapılması çalışmasından dolayı şebeke deplase işi.
*Cırgalan Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ve abone aktarma işi.
*Cumhuriyet Mahallesi belediyenin yol çalışması nedeniyle içmesuyu şebeke hattı deplase edilmesi işi.
*Doruklu Mahallesi yeni açılan sondaj kuyusundan terfi hattı çekilerek depoya su verilmesi işi.
*Ebiç Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Erkilet 100.Yıl Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ve abone aktarma işi.
*Erkilet Dere Mahallesi imara yeni açılan yerleşim alanına içmesuyu şebeke hattı çekme işi.
*Erkilet Osmangazi Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan şebeke hattının yenilenmesi işi.
*Eskİsanayi ekonomik ömrünü tamamlamış olan şebeke hattının yenilenmesi işi.
*Fevzioğlu Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan şebeke hattının yenilenmesi işi.
*Gevher Nesibe Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan şebeke hattının yenilenmesi işi.
*Gömeç mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ve abone bağlanması işi.
*Güneşli Cumhuriyet Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Hacı Saki Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ve abone aktarma işi.
*Karahöyük Mahallesi yeni açılan sondaj kuyusundan terfi hattı çekilerek depoya su verilmesi işi.
*Kayabaşı Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ve abone aktarma işi.
*Kocasinan Mahallesi belediyenin yol çalışması nedeniyle içmesuyu şebeke hattı deplase edilmesi işi.
*Mimarsinan Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ve abone aktarma işi.
*Saraybosna Mahallesi imara yeni açılan yerleşim alanına içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Taşhan Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Turgut Reis Mahallesi belediyenin yol çalışması nedeniyle ekonomik ömrünü tamamlamış içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Yemliha Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Yuvalı Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ve abone aktarma işi.
*Yüreğil Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ve abone aktarma işi.
*Zümrüt Mahallesi imara yeni açılan yerleşim alanına içmesuyu şebeke hattı çekme işi.

MELİKGAZİ İLÇESİ

*19 Mayıs Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Becen Mahallesi Kızıltepe Caddesi üzerine basınç kırıcı montajı ve muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ve Ø250 Çelik isale hattı döşenmesi işi.
*Çorakçılar Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi işi.
*Erciyes Dağı Kayak Merkezi Koçdağı kaynaklarında dranej çalışması işi.
*Erenköy Mahallesi muhtelif sokaklarda ömrünü tamamlamış olan şebeke hattının yenilenmesi işi.
*Hisarcık Bahçelievler Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ve abone aktarma işi.
*Hürriyet Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi işi.
*Küçükali Mahallesi kentsel dönüşüm sebebiyle değişen imar planından dolayı içmesuyu hattı deplase çalışması işi.
*Küçükali Mahallesi kentsel dönüşüm yapılan alandaki içmesuyu hatları körlenmesi işi.
*Kazım Karabekir Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Kıranardı Cumhuriyet Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan isale hattının yenilenmesi işi.
*Kıranardı Fatih Mahallesi terfi hattından yeni depoya bağlantı ve içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Konaklar Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Köşk Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ve abone aktarma işi.
*Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.

*Mimarsinan Şirintepe Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi işi.
*Mimarsinan Şirintepe Mahallesi imara yeni açılan yollara içmesuyu hattı döşenmesi işi.
* Altınoluk Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.

İNCESU İLÇESİ

*Bahçelievler Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Garipce Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Hamurcu Mahallesi yeni açılan sondaj kuyusundan terfi hattı çekilerek depoya su verilmesi işi.
*Kara Mustafa Paşa Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan şebeke hattının yenilenmesi işi.
*Kızılören Aşağı Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Kızılören Tabaklı Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan şebeke hattının yenilenmesi işi.
*Örenşehir Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Saraycık Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Subaşı Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Süksün Cumhuriyet Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Süksün Zafer Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Vali İhsan Aras Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan şebeke hattının yenilenmesi işi.

AKKIŞLA İLÇESİ

*Alevkışla Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Girinci Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Kululu Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Ortaköy Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Yeni Mahalle ekonomik ömrünü tamamlamış İçmesuyu isale hattının yenileme işi.

BÜNYAN İLÇESİ

*Büyüktuzhisar Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış İçmesuyu isale hattının yenileme işi.
*Cumhuriyet Mahallesi imar planına uygun döşenmeyen hatların deplase işi.
*Emirören Mahallesi yeni açılan sondaj kuyusundan terfi hattı çekilerek depoya su verilmesi işi.
*Karahıdır Mahallesi yeni mezarlık yerine içmesuyu hattı çekilmesi işi.
*Köprübaşı Mahalesi dereden geçen içmesuyu şebeke hattının deplase edilmesi işi.
*Sultanhanı Mahallesi yeni açılan sondaj kuyusundan terfi hattı çekilerek depoya su verilmesi işi.

FELAHİYE İLÇESİ

*Acırlı Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Büyüktoraman Mahallesi depolar arası isale hattı döşenmesi işi.
*Cumhuriyet Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Darılı Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Karaköy Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan terfi hattının yenilenmesi işi.

ÖZVATAN İLÇESİ

*Amarat Mahallesi yeni yerleşim alanına içmesuyu hattı çekilmesi işi.
*Kermelik Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Taşlık Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.

SARIOĞLAN İLÇESİ

*Alamettin Mahallesi yeni açılan sondaj kuyusundan terfi hattı çekilerek depoya su verilmesi işi.
*İğdeli Mahallesi bulunan kaynaktan depoya yeni isale hattı döşenerek su artışının arttırılması işi.
*Keklikoğlu Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Sofumahmut Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.

DEVELİ İLÇESİ

*Alparslan Mahallesi yeni yerleşim alanına içmesuyu şebeke hattı çekilmesi işi.
*Bahçebaşı Mahallesinden Toki ye içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Cami Cedit Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Kozluca Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan terfi hattının yenilenmesi işi.
*Kulpak Mahallesi yeni açılan sondaj kuyusundan terfi hattı çekilerek depoya su verilmesi işi.
*M.Asım Köksal Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Sindelhöyük Mahallesi yeni yerleşim alanına içmesuyu şebeke hattı çekilmesi işi.
*Soysallı Mahallesi yeni açılan sondaj kuyusundan terfi hattı çekilerek depoya su verilmesi işi.
*Zile Mahallesi yol çalışması nedeniyle içmesuyu şebekesinin deplase ve yenileme işi.

PINARBAŞI İLÇESİ

*Bahçecik Mahallesi ekonomik ömrünü doldurmuş olan isale hattının yenilenmesi işi.
*Bahçecik Mahallesi ekonomik ömrünü doldurmuş olan isale hattının yenilenmesi işi.
*Gaziler Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış İçmesuyu isale hattının yenileme işi.
*Gebelek Mahallesi ekonomik ömrünü doldurmuş olan isale hattının yenilenmesi işi.
*Hasırcı Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Kılıçmehmet Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Metiye Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan mahalle çeşme şebekesinin yenilenmesi işi.
*Pınarbaşı Merkezde muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*UzunAhmet Mahallesi kaynağından deposuna yeni isale hattı çekilmesi işi.
*Yusuflar Mahallesi yeni açılan sondaj kuyusundan terfi hattı çekilerek depoya su verilmesi işi.

TOMARZA İLÇESİ

*Akdere Mahallesi yeni yerleşim alanına içmesuyu hattı çekilmesi işi.
*Avşarsöğütlü Mahallesi isale hattı çekilmesi işi.
*Cumhuriyet Mahallesi karayolları çalışması nedeniyle içmesuyu şebeke isale hattı döşenmesi işi.
*Cumhuriyet Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Çabakpınar isale hattı çapı debi ihtiyacını karşılamadığı için yeni şebeke hattı çekilmesi işi.
*Gültepe yeni açılan sondaj kuyusundan terfi hattı çekilerek depoya su verilmesi işi.
*Karacaören Mahallesi yeni yerleşim alanına içmesuyu hattı çekilmesi işi.
*Kurtuluş Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Küçükcanlı Mahallesi yeni yerleşim alanına içmesuyu hattı çekilmesi işi.

YAHYALI İLÇESİ

*Burhaniye Mahallesi yeni yerleşim alanına içmesuyu hattı çekilmesi işi.
*Büyükçakır Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Çiğilli Mahallesi yeni yerleşim alanına içmesuyu hattı çekilmesi işi.
*Derebağ Mahallesi yeni yerleşim alanına içmesuyu hattı çekilmesi işi.
*Gazibeyli Mahallesi yeni yerleşim alanına içmesuyu hattı çekilmesi işi.
*Karaköy Mahallesi yeni yerleşim alanına içmesuyu hattı çekilmesi işi.
*Mustafa Beyli Mahallesinden şebeke hattı döşenerek Fetullah Mahallesine su verilmesi işi.
*Taşhan Mahallesi depolar arsası terfi hattı çekilmesi işi.
*Yenice Mahallesi yeni yerleşim alanına içmesuyu hattı çekilmesi işi.

YEŞİLHİSAR İLÇESİ

*Derebentbaşı Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Gülbayır Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan şebeke hattının yenilenmesi işi.
*Kovalı Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*Yavuzselim Mahallesi ekonomik ömrünü tamamlamış olan şebeke hattının yenilenmesi işi.

SARIZ İLÇESİ

*Çağsak Mahallesi kaynağından içmesuyu hattı çekilerek Elmaçatı mezrasına su verilmesi işi.
*Değirmentaşı Mahallesi kaynağından depoya isale hattı çekilmesi işi.
*Günesen Mahallesi muhtelif sokaklara içmesuyu şebeke hattı döşenmesi işi.
*İmirza Mahallesi yeni yerleşim alanına içmesuyu şebeke hattı çekilmesi işi.
*İncemağra Mahallesi Bütevler mevki yeni yerleşim alanına içmesuyu şebeke hattı çekilmesi işi.
*K.Kabaktepe Mahallesi yerleşim alanına içmesuyu şebeke hattı çekilmesi işi.
*Karayurt Mahallesi kaynağından depoya isale hattı çekilmesi işi.
*Kırkısrak Mahallesi kaynağından içmesuyu isale hattı çekilerek Dilikler Mahallesine su verilmesi işi.
*Tavla Mahallesi yeni yerleşim alanına içmesuyu şebeke hattı çekilmesi işi.
*Tekneli Mahallesi kaynağından depoya isale hattı çekilmesi işi.

2015 YILI FAALİYET TABLOSU

FAALİYETİN ADI	TOPLAM
MERKEZ ARIZA ONARIM	8.447 adet
YENİ BAĞLANAN İLÇELER	8.535 adet
ŞEBEKE DÖŞEME	184.886 mt
ABONE AKTARIMI	2.100 adet
PROJELENDİRME	22 adet
KAYIP KAÇAK TESPİTİ	956 adet
DEBİ VE BASINÇ ÖLÇÜMLERİ	680 adet

2016 YILI FAALİYET TABLOSU

FAALİYETİN ADI	TOPLAM
MERKEZ ARIZA ONARIM	7.201 adet
YENİ BAĞLANAN İLÇELER	6.954 adet
ŞEBEKE DÖŞEME	204.835 mt
ABONE AKTARIMI	2.032 adet
PROJELENDİRME	27 adet
KAYIP KAÇAK TESPİTİ	1.071 adet
DEBİ VE BASINÇ ÖLÇÜMLERİ	1.006 adet

2017 YILI FAALİYET TABLOSU

FAALİYETİN ADI	TOPLAM
MERKEZ ARIZA ONARIM	15.775 adet
YENİ BAĞLANAN İLÇELER	7.855 adet
KAYSERİ ŞEBEKE DÖŞEME	224.387 mt
ABONE AKTARIMI	1.574 adet
PROJELENDİRME	22 adet
KAYIP KAÇAK TESPİTİ	1.074 adet
DEBİ VE BASINÇ ÖLÇÜMLERİ	759 adet

2017 YILI MERKEZ İLÇELERE GÖRE FAALİYET TABLOSU

ÇALIŞMA TÜRÜ	İLÇELER					GENEL TOPLAM
	MELİKGAZİ	KOCASİNAN	TALAS	HACILAR	İNCESU	
ARIZALAR (adet)	5.733	7.121	1.138	726	1.057	**15.775 adet**
DÖŞENEN ŞEBEKE (mt)	33.152	54.271	16.061	7.205	14.957	**125.646 mt.**
ABONE AKTARMA	570	380	157	133	303	**1.543 adet**
DÖŞENEN BORU CİNSİ	**TOPLAM MİKTAR (mt)**					
PVC	24.988 mt					
DI	43.540 mt					
PE	55.915 mt					
CELİK	1.203 mt					
TOPLAM (mt)	**125.646 mt**					

	2017 YILINDA MERKEZ İLÇELERDE DÖŞENEN İÇMESUYU BORUSU						TOPLAM mt
	PVC	DI	PE	ÇELİK	HİDRANT	ABONE BAĞLANTISI	
MELİKGAZİ	3.294	19.351	9.304	1.203	5	570	**33.152**
KOCASİNAN	15.244	10.277	28.750	*	4	380	**54.271**
TALAS	362	10.812	4.877	*	3	157	**16.061**
HACILAR	2.451	2.788	1.966	*	*	133	**7.205**
İNCESU	3.637	312	11.008	*	1	304	**14.957**
TOPLAM	**24.988 mt**	**43.540 mt**	**55.915 mt**	**1.203 mt**	**13**	**1.574 Adet**	**125.646 mt**

2017 YILI İLÇELERE GÖRE FAALİYET TABLOSU

İLÇELER	DÖŞENEN ŞEBEKE (m)	ARIZALAR (adet)	DEBİ BASINÇ ÖLÇÜM (adet)	KAYIP KAÇAK (adet)	HİDRANT (adet)
AKKIŞLA	5.178	452	57	17	*
BÜNYAN	3.096	1.015	12	58	13
DEVELİ	18.028	1.773	65	16	*
FELAHİYE	5.882	311	12	19	*
SARIOĞLAN	1.141	381	24	17	*
SARIZ	24.634	492	*	8	*
ÖZVATAN	2.530	191	5	15	*
TOMARZA	11.419	938	41	8	1
YAHYALI	12.981	795	*	4	*
YEŞİLHİSAR	5.612	571	7	12	*
PINARBAŞI	8.240	936	*	13	*
GENEL TOPLAM	**98.741**	**7.855**	**223**	**187**	**14 adet**

DÖŞENEN BORU CİNSİ	TOPLAM DÖŞENEN BORU MİKTARI
PVC	**12.143m**
DI	**4.836 m**
PE	**81.762 m**
TOPLAM	**98.741 m**

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2017 YILI DÖŞENEN ŞEBEKE

MELİKGAZİ İLÇESİ

	Mahalle İsmi	PVC								PE												DUCTIL								ÇELİK					HİDRANT	VANA	ABONE	TOPLAM m
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 350	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	ADET	ADET	ADET	
1	19 MAYIS MAHALLESİ											121											663	201													985 m
2	AĞIRNAS MAHALLESİ																						90		115													205 m
3	ALTINOLUK MAHALLESİ					620						101						316					211															1.248 m
4	ANBAR MAHALLESİ					277						18																										295 m
5	BECEN MAHALLESİ											271			257								639	1242						799								3.208 m
6	EĞRİBUCAK MAHALLESİ											170			415			790					509									285						2.169 m
7	ERENKÖY MAHALLESİ					742						333			279			467					1025	2		732												3.580 m
8	ESENTEPE MAHALLESİ											50			251								955		1872													3.128 m
9	ESENYURT MAHALLESİ											108											403															511 m
10	GESİ BAĞPINAR MAHALLESİ											90																										90 m
11	GESİ FATİH MAHALLESİ																								28													28 m
12	GESİ GÜNEY MAHALLESİ											27																										27 m
13	GESİ KAYABAĞ MAHALLESİ																										7											7 m
14	HİSARCIK BAHÇELİEVLER					1433						302			126																							1.861 m
15	HİSARCIK ERCİYES MAHALLESİ											19																										19 m
16	HİSARCIK İBRAHİM TENNURİ MAH.											6																										6 m
17	HÜRRİYET MAHALLESİ											418											554		177													1.149 m
18	İNECİK MAHALLESİ											144			182																							326 m
19	KARACAOĞLU MAHALLESİ										10	102		104									450															666 m
20	KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ											68											360		320													748 m
21	KIRANARDI FATİH MAH.					146						345			62								509															1.062 m
22	KOCATEPE MAHALLESİ											15																										15 m
23	KONAKLAR MAHALLESİ											112			10			15					288	745														1.170 m
24	KÖŞK MAHALLESİ											19	152																									171 m
25	KÜÇÜK ALİ MAHALLESİ											321											628	110											119				1.178 m
26	MİMARSİNAN B.EVLER MAHALLESİ											133			94								334	180														741 m
27	MİMARSİNAN DEMOKRASİ MAHALLESİ					71						84											75															230 m
28	MİMARSİNAN FATİH MAHALLESİ											12													159													171 m
29	MİMARSİNAN ŞİRİNTEPE											148											333	2152	318													2.951 m
30	NURİHAS MAHALLESİ											6																										6 m
31	SELÇUKLU MAHALLESİ											6																										6 m
32	KEYKUBAT MAHALLESİ											19											98															117 m
33	KIRANARDI CUMHURİYET MAHALLESİ								5			5		454	448		2							56														970 m
34	SEYİTGAZİ MAHALLESİ											239																										239 m
35	CAFERBEY MAHALLESİ											90																										90 m
36	YILDIRIM BEYAZIT											42																										42 m
37	ŞEHİT NAZIMBEY MAHALLESİ										75	76																										151 m
38	GÜLTEPE MAHALLESİ											140	3		27								152	5	1368													1.695 m
39	SARIMSAKLI MAHALLESİ											20																										20 m
40	ÇORAKÇILAR MAHALLESİ											322											941	344														1.607 m
41	DANİŞMENTGAZİ MAHALLESİ											5						258																				263 m
	ÇAP TOPLAM	0	0	0	0	3.289	0	0	5	0	85	4.507	155	558	2.151	0	2	1.846	0	0	0	0	9.217	5.038	4.357	732	7	0	0	799	0	285	0	119	0	0	0	33.152 m
	MELİKGAZİ TOPLAM	3.294								9.304												19.351								1.203					0	0	0	33.152 m

KOCASİNAN İLÇESİ

	Mahalle İsmi	PVC								PE												DUCTIL								CELİK					HİDRANT	VANA	ABONE	TOPLAM
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 400	Ø 350	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	ADET	ADET	ADET	m
1	HACI SAKİ MAHALLESİ											95											11	522														628 m
2	YAVUZLAR MAHALLESİ											17																										17 m
3	OYMAAĞAÇ MAHALLESİ			523																					10													533 m
5	YILDIZEVLER MAHALLESİ											69																										69 m
6	BAYRAMHACI MAHALLESİ											21			78																							99 m
7	AMARAT MAHALLESİ														2815																							2.815 m
8	AKİN MAHALLESİ														590																							590 m
9	MİTHATPAŞA MAHALLESİ					66																																66 m
12	ERKİLET DERE MAHALLESİ											232											711	977														1.920 m
13	DORUKLU MAHALLESİ																	102																				102 m
16	EMMİLER MAHALLESİ											9			56																							65 m
18	TURGUT REİS MAHALLESİ											80											290				328											698 m
19	HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ					76						5																										81 m
22	ERKİLET OSMANGAZİ MAHALLESİ														903																							903 m
25	ERCİYESEVLER MAHALLESİ											121																										121 m
26	GÜNEŞLİ CUMHURİYET MAHALLESİ														179			120																				299 m
27	TANPINAR MAHALESİ													9																								9 m
29	KUŞÇU MAHALLESİ																	124																				124 m
30	ÇAVUŞAĞA MAHALLESİ																																					0 m
31	BEYAZŞEHİR MAHALLESİ					159						312																										471 m
32	ŞEKER MAHALLESİ											19						6					7	30	1496													1.558 m
33	CIRGALAN MAHALLESİ											21						510																				531 m
34	YAKUT MAHALLESİ											17											175															192 m
36	SANAYİ MAHALLESİ																							74	25													99 m
38	MİMARSİNAN MAHALLESİ											59																										59 m
43	YUVALI MAHALLESİ																	2295																				2.295 m
44	KAYABAŞI MAHALLESİ											19			105																							124 m
45	HÖBEK MAHALLESİ		10	700	600	6200												200																				7.710 m
47	ALSANCAK MAHALLESİ					150						58																										208 m
48	BARSAMA MAHALLESİ											481	1347					1147						24														2.999 m
49	GÖMEÇ MAHALLESİ				31						16	61			272																							380 m
50	GEVHERNESİBE MAHALLESİ											126			3								6															135 m
51	BOZTEPE MAHALLESİ					19																																19 m
52	CUMHURİYET MAHALLESİ											45						90					405															540 m
53	EBİÇ KZILIRMAK														513																							513 m
54	ELAGÖZ MAHALLESİ											30	204		204																							438 m
55	ERKİLET 100. YIL MAHALLESİ																	854																				854 m
56	ERKİLET ÇEVRİL											108			901			266																				1.275 m
57	ERKİLET GENERAL EMİR MAHALLESİ											108						800					204															1.112 m
58	ERKİLET TAŞHAN MAHALLESİ											172																										172 m
59	ESKİÖMERLER MAHALLESİ											198			826																							1.024 m
60	HASANCI MAHALLESİ											20			3																							23 m
61	HIRKAKÖY MAHALLESİ				180																																	180 m
62	HÖBEK MAHALLESİ					6261																																6.261 m
63	KIZIK MAHALLESİ											12																										12 m
64	HİLAL MAHALESİ											4			175		254	1691																				2.124 m
65	KARAKİMSE MAHALLESİ											36			1045																							1.081 m
66	HASAN ARPA MAHALLESİ					194								3	14																							211 m
67	SARAY BOSNA MAHALLESİ			72								156											771		702													1.701 m
68	VATAN MAHALLESİ										6	182																										188 m
69	KOCASİNAN MAHALLESİ											54			116								545															715 m
70	YEMLİHA MAHALLESİ											113			1075																							1.188 m
71	FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ											13																										13 m
72	YEŞİL MAHALLESİ														101																							101 m
73	YÜREĞİL MAHALLESİ											10			421																							431 m
74	YENİPERVANE MAHALLESİ											175											1168															1.343 m
75	FEVZİOĞLU MAHALLESİ											21			2			94																				117 m
76	ZÜMRÜT MAHALLESİ											274						15					1461		333													2.083 m
77	KARAHÖYÜK MAHALLESİ																	4147																				4.147 m
78	KUŞCAĞIZ MAHALLESİ														500																							500 m
	ÇAP TOPLAM	0	10	1.295	811	13.128	0	0	0	0	22	3.553	1.551	12	10.897	0	254	12.461	0	0	0	0	5.756	1.627	2.566	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.271 m
	KOCASİNAN TOPLAM	15.244								28.750												10.277								0					0	0	0	54.271 m

TALAS İLÇESİ

	Mahalle İsmi	PVC								PE												DUCTİL								CELİK					HİDRANT	VANA	ABONE	TOPLAM m
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 400	Ø 350	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	ADET	ADET	ADET	
1	HAN MAHALLESİ											161											771		16													948 m
2	YUKARI MAHALLESİ											49											497															546 m
3	AKÇAKAYA MAHALLESİ											32												45														77 m
4	MEVLANA MAHALLESİ											99											304														403 m
5	BAŞAKPINAR MAHALLESİ			107								17																										124 m
6	HARMAN MAHALLESİ											20						62																				82 m
7	GÜLİSTANEVLER MAHALLESİ											233						335					581	1237														2.386 m
8	REŞADİYE MAHALLESİ											189						618					3329	1618														5.754 m
11	TABLAKAYA MAHALLESİ											154											472				118											744 m
12	ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ											18			198																							216 m
13	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ											63											15															78 m
14	ZİNCİDERE MAHALLESİ																						18	152														170 m
15	YAZYURDU MAHALLESİ			122								17																										139 m
16	YAMAÇLI MAHALLESİ											15			150			913																				1.078 m
17	YENİDOĞAN MAHALLESİ											132											393															525 m
18	SAKALTUTAN MAHALLESİ											25			577																							602 m
19	CEBİR MAHALLESİ			133								32																										165 m
20	SÜLEYMANLI MAHALLESİ											19						692																				711 m
21	KİÇİKÖY MAHALLESİ											67											174	500	164		408											1.313 m
	ÇAP TOPLAM	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	1.342	0	0	925	0	0	2.620	0	0	0	0	6.554	3.552	180	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.061 m
	TALAS TOPLAM	362								4.887												10.812								0					0	0	0	16.061 m

HACILAR İLÇESİ

	Mahalle İsmi	PVC								PE												DUCTİL								CELİK					HİDRANT	VANA	ABONE	TOPLAM m
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 400	Ø 350	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	ADET	ADET	ADET	
1	ERCİYES MAHALLESİ					327						106			216								1051															1.700 m
2	AKDAM MAHALLESİ			166		737						43																											946 m
3	YEDİ AĞAÇ MAHALLESİ											509											17	1172														1.698 m
5	YUKARI MAHALLESİ		893									260			280								300															1.733 m
6	BEĞENDİK MAHALLESİ			115	50																																	165 m
7	AKYAZI MAHALLESİ											59			339																								398 m
8	KUYUCAK MAHALLE																							16															16 m
9	AŞAĞI MAHALLE					163						154											27																344 m
10	YENİ MAHALLE																							205															205 m
	ÇAP TOPLAM	0	893	281	50	1.227	0	0	0	0	0	1.131	0	0	835	0	0	0	0	0	0	0	1.395	1.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.205 m
	HACILAR TOPLAM	2.451								1.966												2.788								0					0	0	0	7.205 m

İNCESU İLÇESİ

	Mahalle İsmi	PVC								PE												DUCTİL								CELİK					HİDRANT	VANA	ABONE	TOPLAM m
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 400	Ø 350	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	ADET	ADET	ADET	
1	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ				42	200					310	320		200	960																							2.032 m
2	ÖRENŞEHİR MAHALLESİ										100	40			1983																							2.123 m
3	KARAMUSTAFAPAŞA MAHALESİ											180																											180 m
4	İHSAN ARAS MAHALLESİ				20						310	480																											810 m
5	GARİPÇE MAHALLESİ											20			200																								220 m
6	KARAHÖYÜK MAHALLESİ											585																											585 m
7	KIZILÖREN MAHALLESİ		1050	300	15	980					325	55																											2.725 m
8	SÜKSÜN HAMAMPINARI MAHALLESİ,		180	84								80			1000																								1,344 m
9	SÜKSÜN ATATÜRK CADDESİ										70	30		20									312																432 m
10	SUBAŞI MAHALLESİ														400																								400 m
11	SÜKSÜN ZAFER MAHALLESİ					400						30			550																								980 m
12	HAMURCU MAHALLESİ														1040																								1.040 m
13	TAHRİNLİ MAHALLESİ				6										150																								156 m
14	SÜKSÜN CUMHURİYET MAHALLESİ					360					100				350	220																								1.030 m
15	SEMERKANT MAHALLESİ											20			880																								900 m
	ÇAP TOPLAM	0	1.230	384	83	1.940	0	0	0	0	1.215	1.840	0	220	7.513	220	0	0	0	0	0	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.957 m
	İNCESU TOPLAM	3.637								11.008												312								0					0	0	0	14.957 m

AKKIŞLA İLÇESİ

	Mahalle İsmi	PVC								PE											DUCTIL										ÇELİK					HİDRANT	VANA	ABONE	TOPLAM
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 400	Ø 350	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	ADET	ADET	ADET	m
1	KULULU MAHALLESİ		145																																			145 m
2	ALEVKIŞLA MAHALLESİ											21			200																								221 m
3	GİRİNCİ MAHALLESİ		412															2129																					2.541 m
4	GANİŞEYH MAHALLESİ		200									15			125	84																							424 m
5	ÇİFTLİK MAHALLESİ															75																							75 m
6	ORTAKÖY MAHALLESİ																1000																							1.000 m
7	GÜMÜŞSU MAHALLESİ											25			652																								677 m
8	MANAVUZ MAHALLESİ		95																																				95 m
	ÇAP TOPLAM	0	852	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	977	159	1.000	2.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.178 m
	AKKIŞLA TOPLAM	852								4.326												0								0					0	0	0	5.178 m

BÜNYAN İLÇESİ

	Mahalle İsmi	PVC								PE											DUCTIL										ÇELİK					HİDRANT	VANA	ABONE	TOPLAM
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 400	Ø 350	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	ADET	ADET	ADET	m
1	YAĞMURBEY MAHALLESİ																118																					118 m
2	BÜYÜKHUZHİSAR MAHALLESİ				430	60																																490 m
3	EMİRÖREN MAHALLESİ				250																																	250 m
4	CUMHURİYET MAHALLESİ					60						200											572																832 m
5	SULTANHANI MAHALLESİ														430																								430 m
6	BURHANİYE MAHALLESİ				288																																	288 m
7	KARAHIDIR MAHALLESİ		80												100																								180 m
8	KARDEŞLER MAHALLESİ														130																								130 m
9	KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ						66	90																															156 m
10	AKMESCİT MAHALLESİ							42																															42 m
11	KARAKAYA MAHALLESİ				180																																	180 m
	ÇAP TOPLAM	0	80	0	1.148	120	66	132	0	0	0	200	0	0	660	0	118	0	0	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.096 m
	BÜNYAN TOPLAM	1.546								978												572								0					0	0	0	3.096 m

DEVELİ

	Mahalle İsmi	PVC								PE											DUCTIL										ÇELİK					HİDRANT	VANA	ABONE	TOPLAM
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	ADET	ADET	ADET	m
1	AŞIK VEYSEL SEYRANİ MAHALLESİ																300																					300 m
2	AYVAZHACI MAHALLESİ												150																										150 m
3	ALPASLAN MAHALLESİ											150			1370	200		300						758															2.778 m
4	KOZLUCA MAHALLESİ													300																									300 m
5	ZİLE MAHALLESİ								60			100			600									566															1.326 m
6	BAHÇEBAŞI MAHALLESİ															50		500																					550 m
7	CAMİİ CEDİT MAHALLESİ															100																							100 m
8	KÖSELER MAHALLESİ											66																											66 m
9	M.ASIM KÖKSAL MAHALLESİ											115		350		100																							565 m
10	SİNDELHÖYÜK MAHALLESİ											100		100		1000																							1.200 m
11	M.AKİF ERSOY MAHALLESİ														421																								421 m
12	Ş. HASAN ŞAHAN MAHALLESİ			53																																			53 m
13	ZİLE MAHALLESİ								79			57				593								256															985 m
15	GÜNEY AŞAGI MAHALLESİ														372																								372 m
16	İZMİRLİ MAHALLESİ														100																								100 m
17	SOYSALLI MAHALLESİ																											874											874 m
18	HARMAN MAHALESİ													304	431	105	48																						888 m
19	TOMBAK MAHALLESİ													3280	187																								3.467 m
20	YÜZEVLER MAHALLESİ														11			392																					403 m
21	ÖKSÜT MAHALLESİ												500																										500 m
22	KULPAK MAHALLESİ								860							178	387	300																					1.725 m
23	HADİBEY CADDESİ																							760															760 m
24	ABDULBAKİ MAHALLLESİ															145																							145 m
	ÇAP TOPLAM	0	0	53	0	0	0	0	999	0	0	588	650	4.334	3.492	2.471	735	1.492	0	0	0	0	0	2.340	0	0	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.028 m
	DEVELİ TOPLAM	1.052								13.762												3.214								0					0	0	0	18.028 m

FELAHİYE

	Mahalle İsmi	PVC								PE											DUCTIL										ÇELİK					HİDRANT	VANA	ABONE	TOPLAM
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	ADET	ADET	ADET	m
1	ACIRLI MAHALLESİ		250	150																																		400 m
2	BÜYÜKTORAMAN MAHALLESİ																	700																					700 m
3	HASANCI MAHALLESİ			20	372										50	150		200																					792 m
4	DARILI MAHALLESİ		630																																				630 m
5	KARAŞEYH MAHALLESİ															100	1800																						1.900 m
6	CUMHURİYET MAHALLESİ					100	60		1300																														1.460 m
	ÇAP TOPLAM	0	880	170	372	100	60	0	1.300	0	0	0	0	0	50	250	1.800	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.882 m
	FELAHİYE TOPLAM	2.882								3.000												0								0					0	0	0	5.882 m

ÖZVATAN

	Mahalle İsmi	PVC								PE												DUCTİL								ÇELİK					HİDRANT	VANA	ABONE	TOPLAM
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	ADET	ADET	ADET	m
1	EYİM MAHALLESİ														40																							40 m
2	TAŞLIK MAHALLESİ												40																									40 m
3	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ											50																										50 m
4	AMARAT MAHALLESİ														2300																							2.300 m
5	KERMELİK MAHALLESİ										100																											100 m
	ÇAP TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	50	40	0	2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.530 m
	ÖZVATAN TOPLAM	0								2.530												0								0					0	0	0	2.530 m

SARIOĞLAN İLÇESİ

	Mahalle İsmi	PVC								PE												DUCTİL								ÇELİK					HİDRANT	VANA	ABONE	TOPLAM
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	ADET	ADET	ADET	m
1	İĞDELİ MAHALLESİ		54												150																							204 m
2	KEKLİKOĞLU MAHALLESİ														133																							133 m
5	SOFİMAHMUT MAHALLESİ														175																							175 m
6	MURATBEYLİ MAHALLESİ												150																									150 m
7	ALAMETTİN MAHALLESİ														107																							107 m
8	ÖMERHACILI MAHALLESİ											372																										372 m
	ÇAP TOPLAM	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	372	150	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.141 m
	SARIOĞLAN TOPLAM	54								1.087												0								0					0	0	0	1.141 m

SARIZ İLÇESİ

	Mahalle İsmi	PVC								PE												DUCTİL								ÇELİK					HİDRANT	VANA	ABONE	TOPLAM
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	ADET	ADET	ADET	m
1	GÜNESEN MAHALLESİ										29	600		406			800																					1.835 m
2	ÇÖREKDERE MAHALLESİ														300																							300 m
3	K.KABAKTEPE MAHALLESİ											250			500																							750 m
4	TAVLA MAHALLESİ		245								50				120																							415 m
5	MULLAHÜSEYİNLER MAHALLESİ										200																											200 m
6	KEMER MAHALLESİ											130																										130 m
7	DALLIKAVAK MAHALLESİ								200	94	81	100	400	412																								1.287 m
8	İMİRZAĞ MAHALLESİ											400																										400 m
9	KIRKISRAK MAHALLESİ										83	154		385	1902			1715		17																		4.256 m
10	TEKNELİ MAHALLESİ										510						1000																					1.510 m
11	CAVLAK MAHALLESİ										100																											100 m
12	ÇAĞŞAK MAHALLESİ												589	600		5200																						6.389 m
13	KIZILPINAR MAHALLESİ										28						800																						828 m
14	ÇAVDAR MAHALLESİ										100																											100 m
15	İNCE MAĞARA MAHALLESİ														397																							397 m
16	KARAYURT MAHALLESİ														400																							400 m
17	FETTAHDERE MAHALLESİ														50																							50 m
18	ÇATALPINAR MAHALLESİ											300																										300 m
19	SANCAKAĞIL MAHALLESİ										251				513																							764 m
20	DEĞİRMENTAŞ MAHALLESİ														4223																							4.223 m
	ÇAP TOPLAM	0	245	0	0	0	0	0	200	94	1432	1934	989	1803	8405	5200	2600	1715	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.634 m
	SARIZ TOPLAM	445								24.189												0								0					0	0	0	24.634 m

PINARBAŞI İLÇESİ

	Mahalle İsmi	PVC								PE												DUCTİL								ÇELİK					HİDRANT	VANA	ABONE	TOPLAM
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	ADET	ADET	ADET	m
1	MERKEZ														50			700																					750 m
2	UZUNAHMET MAHLLESİ	40													1300																								1.340 m
3	ASLANBEYLİ MAHALLESİ				70										600																								670 m
4	GÜMÜŞGÜN MAHALLESİ				60																																	60 m
5	GÜRLEĞEN MAHALLESİ														200																								200 m
6	GAZİLER MAHALLESİ													300																									300 m
7	YUSUFLAR MAHALLESİ														400																								400 m
9	KURBAĞALIK MAHALLESİ														400																								400 m
10	FAKIEKİNCİ MAHALLESİ															200																								200 m
11	BAHÇECİK MAHALLESİ															300																								300 m
12	GEBELEK MAHALLESİ															250																								250 m
13	METHİYE MAHALLESİ											200																												200 m
14	MELİKGAZİ MAHALLESİ															70																								70 m
15	KILIÇMEHMET MAHALLESİ																	2400																						2.400 m
16	OĞUZLAR MAHALLESİ													200																										200 m
17	HASIRCI MAHALLESİ												200		200																										400 m
18	HALİTBÖĞREN MAHALLESİ														100																										100 m
	ÇAP TOPLAM	40	0	0	130	0	0	0	0	0	0	200	200	500	3250	820	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.240 m
	PINARBAŞI TOPLAM	170								8.070												0								0					0	0	0	8.240 m

TOMARZA İLÇESİ

	Mahalle İsmi	PVC								PE												DUCTİL								ÇELİK					TOPLAM m
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	
1	GÜLTEPE MAHALLESİ				302																														302 m
2	CUMHURİYET MAHALLESİ		18		50							80											480		570										1.198 m
3	KURTULUŞ MAHALLESİ		90								75	120																							285 m
4	TURANLI MAHALLESİ		230								95																								325 m
5	AKDERE MAHALLESİ									5	130	200		1000	918	200																			2.453 m
6	AVŞARSÖĞÜTLÜ MAHALLESİ					1800																													1.800 m
7	DADALOĞLU MAHALLESİ			75								100																							175 m
8	TOKLAR MAHALLESİ														1200																				1.200 m
9	CÜCÜN MAHALLESİ											120																							120 m
10	GÖKTEPE MAHALLESİ										75																								75 m
11	ŞİRAZ MAHALLESİ										55																								55 m
12	KAPUKAYA MAHALLESİ		30																																30 m
13	GÜZELSU MAHALLESİ											200			80																				280 m
14	SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ														50																				50 m
15	BOSTANLIK MAHALLESİ										65	200																							265 m
16	YAVUZ SELİM MAHALLESİ		81												170																				251 m
17	ÇANAKPINAR MAHALLESİ		245							15	7	136																							403 m
18	CULHA MAHALLESİ										55																								55 m
19	KARAMUHLU MAHALLESİ			15												200																			215 m
20	GÜLVEREN MAHALLESİ		50									20			700																				770 m
21	KARAÖREN MAHALLESİ		4							20	3				300																				327 m
22	ÇAYİNLİ MAHALLESİ											20																							20 m
23	SÜVEGEN MAHALLESİ											40			120																				160 m
24	ŞIHBARAK MAHALLESİ										60																								60 m
25	KÖMÜR MAHALLESİ										100																								100 m
26	KÜÇÜKCANLI									20					425																				445 m
	ÇAP TOPLAM	0	748	90	352	1800	0	0	0	60	720	1236	0	1000	3963	400	0	0	0	0	0	0	480	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	11.419 m
	TOMARZA TOPLAM	2.990								7.379												1.050								0					11.419 m

YAHYALI İLÇESİ

	Mahalle İsmi	PVC								PE												DUCTİL								ÇELİK					TOPLAM m
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	
1	İLYASLI MAHALLESİ											200																							200 m
2	AVLAĞA MAHALLESİ											200																							200 m
3	BURHANİYE MAHALLESİ														1000																				1.000 m
4	ÇİĞİLLİ MAHALLESİ											20	400	200	208		1800																	6	2.634 m
5	GAZİBEYLİ MAHALLESİ										40			100																					140 m
6	KARAKÖY MAHALLESİ													200	130																				330 m
7	ULUPINAR MAHALLESİ					100																													100 m
8	YENİCE KALE MAHALLESİ														600																				600 m
9	TAŞHAN MAHALLESİ																		950																950 m
10	YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ														240																				240 m
11	ARITMA TESİSİ										50				35																				85 m
12	ÇAVDARUŞAĞI MAHALLESİ											200																							200 m
13	KOCAHACILI MAHALLESİ														2200																				2.200 m
14	FETULLAH MAHALLESİ														350																				350 m
15	YENİCE MAHALLESİ														370																				370 m
16	MUSTAFABEYLİ MAHALLESİ																1800																		1.800 m
17	BÜYÜKÇAKIR MAHALLESİ													200																					200 m
18	DEREBAĞ MAHALLESİ														900																				900 m
20	FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ																																65		65 m
21	SENİRKÖY MAHALLESİ											5			250																				255 m
22	CAMİKEBİR MAHALLESİ																																	62	62 m
23	YEŞİLKÖY MAHALLESİ			50										50																					100 m
	ÇAP TOPLAM	0	0	50	0	100	0	0	0	0	90	625	400	750	6283	0	3600	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	68	12.981 m
	YAHYALI TOPLAM	150								12.698												0								133					12.981 m

YEŞİLHİSAR İLÇESİ

	Mahalle İsmi	PVC								PE												DUCTİL								ÇELİK					TOPLAM m
		Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	
1	ERDEMLİ MAHALLESİ										108				150																				258 m
2	DERBENTBAŞI MAHALLESİ		3									100			433																				536 m
3	KARACABEY MAHALLESİ			1168									159																						1.327 m
4	GÜLBAYIR MAHALLESİ		60	600												310	657																		1.627 m
5	YAVUZSELİM MAHALLESİ										18	31			440																				489 m
6	KAYADİBİ MAHALLESİ										190	12																							202 m
7	FATİH MAHALLESİ											21	143		186																				350 m
9	KOVALI MAHALLESİ				38						68	31			327	224	135																		823 m
	ÇAP TOPLAM	0	63	1768	0	0	0	0	0	0	384	195	302	0	1536	534	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.612 m
	YEŞİLHİSAR TOPLAM	1.869								3.743												0								0					5.612 m
	GENEL TOPLAM	36.998 m								137.677 m												48.376 m								1.336 m					224.387 m

GENEL İCMAL	PVC								PE													DUCTİL								ÇELİK					
	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 350	Ø 250	Ø 350	Ø 400	Ø 500	Ø 800	224.387 m
	40	5.055	4.453	2.946	21.704	126	132	2.504	154	4.048	17.834	4.437	9.177	53.842	10.054	10.901	26.263	950	17	0	0	24.286	13.950	7.673	732	861	874	0	799	0	285	65	187	

1999 – 2017 YILLARI ARASI İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN DÖŞEDİĞİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ

TOPLAM DÖŞENEN BORU	Döşenen İçmesuyu Şebekesi (mt) - Abone (adet)						TOPLAM mt
	AÇB	PVC	DI	PE	ÇE	ABONE	
1999	915	15.034	1.400	1.067			**18.416**
2000	1.984	9.869	25.986	16.000		402	**53.839**
2001		13.216	4.373	35.843		1.053	**53.432**
2002		17.031	3.256	13.314		412	**33.601**
2003	35	20.335	1.856	8.080		319	**30.306**
2004		10.676	320	8.447		352	**19.443**
2005		19.385	5.671	26.164		452	**51.220**
2006		26.495	5.194	24.062	4.890	689	**60.641**
2007		478	4.812	50.450	50	323	**55.790**
2008		12.386	6.782	40.930		317	**60.098**
2009		15.572	5.600	56.485		423	**77.657**
2010		25.628	23.451	31.986	72	577	**81.137**
2011		4.194	39.580	55.082	550	1.004	**99.406**
2012		4.908	43.462	54.156	1.102	2.036	**103.628**
2013		7.799	41.770	59.141	60	1.239	**108.770**
2014		10.126	36.554	87.450	806	1.394	**134.936**
2015		15.530	37.485	70.642	968	2.100	**124.625**
2016		12.540	39.539	152.390	366	2.032	**204.835**
2017		36.988	48.376	137.677	1.336	1.574	**224.387**
TOPLAM	**2.934**	**278.190**	**414.604**	**856.877**	**10.200**	**16.698**	**1.489.157**

1999 – 2017 YILLARI ARASI İPTAL EDİLEN İÇMESUYU BORUSU

TOPLAM İPTAL EDİLEN BORU	İptal Edilen İçmesuyu Borusu (metre)						TOPLAM mt
	AÇB	PVC-KANGAL	GALVANİZLİ	FONT	ÇELİK	PE	
1999			1.823	1.227			**3.050**
2000	4.000	220	500	5.470			**10.190**
2001	1.250		9.096	12.109			**22.455**
2002			1.750	4.559			**6.309**
2003		1.000	4.500	2.300			**7.800**
2004	4.687	1.310	26.659	6.384			**39.040**
2005	9.257	951	2.100	10.519			**22.827**
2006	24.864	9.433	20.803	15.214			**70.314**
2007	20.276	7.436	1.680	4.100			**33.492**
2008	15.800	10.200	32.100	20.300			**78.400**
2009	18.530	40.970	4.225	1.900			**65.625**
2010	23.179	17.041	14.511	20.800		3.212	**78.743**
2011	35.097	10.500	76.109	45.200	966	1.150	**169.022**
2012	57.887	35.650	48.500	52.523	1.000		**195.560**
2013	35.597	27.371	20.175	2.628			**85.771**
2014	13.790	28.590	11.560	7.270	135	3.770	**65.115**
2015	11.456	35.290	561	1.060	-	3.520	**51.887**
2016	22.140	4.410	41.500	-	-	1.115	**69.165**
2017	43.360	131.715	98.860	25.823	795	603	**301.156**
TOPLAM	**341.170**	**362.047**	**380.412**	**239.386**	**5.292**	**13.370**	**1.377.677**

2017 YILI KAYSERİ MERKEZ VE HİNTERLANDDA YAPILAN İÇMESUYU PROJE ÇALIŞMALARI	
SIRA NO	**PROJE ADI**
1	Akkışla Gömürgen İçmesuyu Temin Projesi
2	Alidağ 360 İçmesuyu Temin Projesi
3	Anneler Parkı Terfi Hattı Projesi
4	Bünyan Burhaniye-Kardeşler İçmesuyu Temin
5	Bünyan Köprübaşı Terfi Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
6	Bünyan Samağır İçmesuyu Projesi
7	Develi Muhtelif Mahalleler İçmesuyu Projesi
8	Erkilet İçmesuyu Şebeke Projesi
9	Eyim - Obruk Grup İçmesuyu Temin Projesi
10	Gesi Albay İsmail Kışlası Terfi Hattı Proje si
11	Hırka Terfi Hattı Projesi
12	Kızık Emniyet Poligon Terfi Hattı Projesi
13	Kocasinan Muhtelif Mahalleler İçmesuyu Projesi
14	Kuşcu - Boyacı İçmesuyu Temin Projesi
15	Melikgazi Muhtelif Mahalleler İçmesuyu Projesi
16	Pınarbaşı Uzunpınar İçmesuyu şebeke Projesi
17	Pınarbaşı Yeregeçen İçmesuyu şebeke Projesi
18	Sarız - Çağsak Grup İçmesuyu Temin Projesi
19	Yahyalı Grup İçmesuyu Temin Projesi
20	Yahyalı Yeşilköy İçmesuyu Temin Projesi
21	Yeniköy - Altınoluk İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi
22	Yıldırım Beyazıt İçmesuyu Temin Projesi


SU KAYIP KONTROL VE ÖLÇÜM SERVİSİ

Su kayıp kontrol ve ölçüm servisi tarafından Kayseri ilinde toplam 759 adet debi ve basınç ölçümü yapılmıştır.

AYLAR	ÖLÇÜLEN DEBİ VE BASINÇLAR (adet)
OCAK	42
ŞUBAT	35
MART	41
NİSAN	72
MAYIS	73
HAZİRAN	66
TEMMUZ	120
AĞUSTOS	85
EYLÜL	56
EKİM	63
KASIM	52
ARALIK	54
TOPLAM	**759**



Debi Ölçüm Çalışması

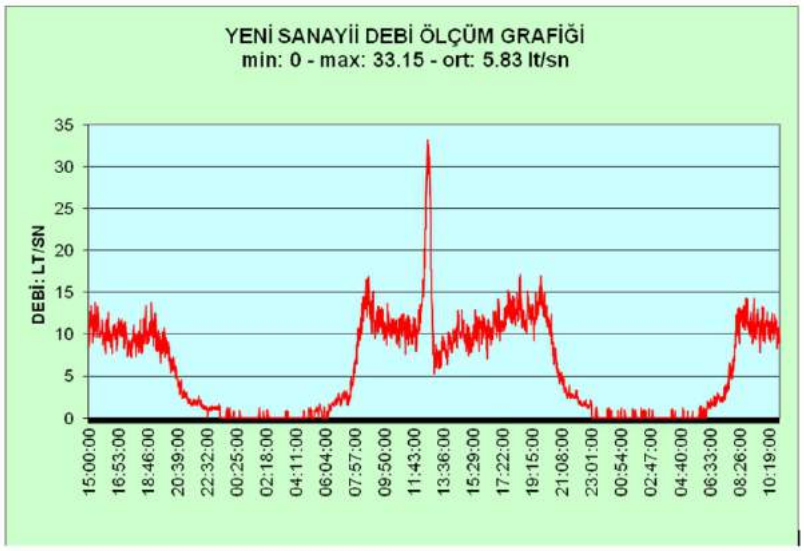

Yeni Sanayi 24 Saatlik Ölçüm Grafiği



Debi Ölçüm Çalışması

FİZİKİ KAYIPLAR SERVİSİ

Fiziki kayıplar servisi tarafından Kayseri ili genelinde 1.074 adet kayıp tespit edilmiş olup bu arızalar İçmesuyu Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte giderilerek fiziki kayıplara son verilmiştir.

2017 yılında fiziki kayıplar servisince yapılan alt bölge çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.

1- İldem Mahâllesi alt bölge taraması.
2- Argıncık Camikebir Mahallesi alt bölge taraması.
3- Argıncık Mehmet Akif Ersoy Mahâllesi alt bölge taraması.
4- Argıncık Cumhuriyet Mahâllesi alt bölge taraması.
5- Barsama Mahâllesi alt bölge taraması.
6- Mevlana Mahâllesi alt bölge taraması.
7- Sarız İlçesi İnce Mağara Mahâllesi i alt bölge taraması.
8- Battalgazi Mahâllesi alt bölge taraması.
9- Develi İlçesi Gazi Mahâllesi alt bölge taraması.
10- Develi İlçesi Şıhlı Mahâllesi alt bölge taraması.
11- Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi alt bölge taraması.
12- Özvatan İlçesi Kuşcağız alt bölge taraması.
13- Ağırnas Mahâllesi alt bölge taraması.
14- Güneşli Mahâllesi alt bölge taraması.
15- Kızık Mahâllesi alt bölge taraması.
16- Erenköy Mahâllesi alt bölge taraması.
17- Talas Ardıç Mahâllesi alt bölge taraması.
18- Subaşı Mahâllesi alt bölge taraması.
19- Seyrani Mahâllesi alt bölge taraması.
20- Yavuzlar Mahâllesi alt bölge taraması.
21- Elagöz Mahâllesi alt bölge taraması.
22- Gesi Bahçeli Mahâllesi alt bölge taraması.
23- Argıncık Kayabaşı Mahâllesi alt bölge taraması.
24- Caferbey Mahâllesi alt bölge taraması.
25- Bünyan İlçesi Karakaya Mahâllesi alt bölge taraması.
26- Tomarza İlçesi Çömlekçi Mahâllesi alt bölge taraması.
27- Tomarza İlçesi Dadaloğlu Mahâllesi alt bölge taraması.
28- Tomarza İlçesi Büyük Canlı Mahâllesi alt bölge taraması.

29- İncesu İlçesi Kızılören Mahâllesi alt bölge taraması.
30- İncesu İlçesi Örenşehir Mahâllesi alt bölge taraması.
31- Bünyan İlçesi alt bölge taraması.
32- Bünyan İlçesi Sultanhanı Mahâllesi alt bölge taraması.
33- Bünyan İlçesi Pirahmet Mahâllesi alt bölge taraması.
34- Bünyan İlçesi Tuzhisar Mahâllesi alt bölge taraması.
35- Bünyan İlçesi Elbaşı Mahâllesi alt bölge taraması.
36- Bünyan İlçesi Köprübaşı Mahâllesi alt bölge taraması.
37- Bünyan İlçesi Elbaşı Mahâllesi alt bölge taraması.
38- Felahiye İlçesi Mollahacı Mahâllesi alt bölge taraması.
39- Felahiye İlçesi Hasancı Mahâllesi alt bölge taraması.
40- Felahiye İlçesi Karaşeyh Mahâllesi alt bölge taraması.
41- Felahiye İlçesi Büyük Toraman Mahâllesi alt bölge taraması.
42- Sarıoğlan İlçesi Çiftlik Mahâllesi alt bölge taraması.
43- Sarıoğlan İlçesi Keklikoğlu Mahâllesi alt bölge taraması.
44- Sarıoğlan İlçesi Üzerlik Mahâllesi alt bölge taraması.
45- İncesu İlçesi Garipçe Mahâllesi alt bölge taraması.
46- İncesu İlçesi Süksün Mahâllesi alt bölge taraması.
47- Akkışla İlçesi alt bölge taraması.
48- Akkışla İlçesi Ortaköy Mahâllesi alt bölge taraması.
49- Akkışla İlçesi Akin Mahâllesi alt bölge taraması.
50- Akkışla İlçesi Gömürgen Mahâllesi alt bölge taraması.
51- Akkışla İlçesi Kululu Mahâllesi alt bölge taraması.
52- Akkışla İlçesi Ganişeyh Mahâllesi alt bölge taraması.
53- Saraycık Mahâllesi alt bölge taraması.
54- Yukarı Hasinli Mahâllesi alt bölge taraması.
55- Emmiler Mahâllesi alt bölge taraması.
56- Kazım Karabekir Mahâllesi alt bölge taraması.
57- Nurihas Mahâllesi alt bölge taraması.
58- Uğurevler Mahâllesi alt bölge taraması.
59- Talas Zincidere Mahâllesi alt bölge taraması.
60- Argıncık Cengiz Topel Mahâllesi alt bölge taraması.
61- Argıncık Alsancak Mahâllesi alt bölge taraması.
62- Yavuz Selim Mahâllesi alt bölge taraması.
63- Hırka Mahâllesi alt bölge taraması.
64- Büyük Bürüngüz Mahâllesi alt bölge taraması.
65- Tacettin Veli Mahâllesi alt bölge taraması.
66- Hacılar Karpuz Sekisi Mahâllesi alt bölge taraması.
67- Özvatan İlçesi alt bölge taraması.
68- Özvatan İlçesi Amarat Mahâllesi alt bölge taraması.
69- Sarız İlçesi Karayurt Mahâllesi alt bölge taraması.
70- Sarız İlçesi Büyük Söbeçimen Mahâllesi alt bölge taraması.
71- Pınarbaşı İlçesi Tokmak Mahâllesi alt bölge taraması.
72- Develi İlçesi Sindelhöyük Mahâllesi alt bölge taraması.
73- Develi İlçesi Millidere Mahâllesi alt bölge taraması.
74- Yahyalı İlçesi Kirazlı Mahâllesi alt bölge taraması.
75- Yahyalı İlçesi Derebağ Mahâllesi alt bölge taraması.
76- Yeşilhisar İlçesi alt bölge taraması.
77- İncesu İlçesi Hamurcu Mahâllesi alt bölge taraması.

FİZİKİ KAYIPLAR TESPİTİ

BÖLGELER	KAYIP TESPİT ADEDİ VE ÖLÇÜMLERİ (ADET)
MELİKGAZİ	390
KOCASİNAN	393
TALAS	68
HACILAR	24
İNCESU	22
AKKIŞLA	17
BÜNYAN	58
DEVELİ	16
SARIOĞLAN	17
SARIZ	8
ÖZVATAN	15
TOMARZA	8
YEŞİLHİSAR	12
YAHYALI	4
FELAHİYE	19
PINARBAŞI	3
TOPLAM	**1.074**



Kayıp ve Kaçaksu Ekiplerimizin Arazi Çalışması



Fiziki Kayıp Ekiplerimizin Tespit Ettiği Arıza



Fiziki Kayıp Ekiplerimizin Tespit Ettiği Arıza

2017 YILI 6360 SAYILI KANUNLA ÇALIŞMA ALANIMIZA GİREN İLÇELERDE YAPILAN KAYNAK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	
SIRA NO	**İLÇE-MAHALLE**
1	Akkışla - Gançeyh Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
2	Tomarza - Çukurağaç Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
3	Tomarza - Bostanlık Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
4	Tomarza - Avşarsöğütlü Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
5	Tomarza - Tatar Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
6	Sarıoğlan - Kızılpınar Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
7	Sarıoğlan - Ebulhayır Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
8	Sarıoğlan - İğdeli Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
9	Sarıoğlan - Gaziler Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
10	Sarıoğlan - Sofumahmut Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
11	Sarız - Kırkısrak Mahallesi Çamlar, Değirmendere, Gocalar, Dirikler, Armağan, Büyükköy mevkinde kaynakta iyileştirme yapıldı.
12	Sarız - Dallıkavak Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
13	Sarız - Çağsak Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
14	Sarız - Tekneli Mahallesi Çolaksu ve Kötüköy mevkinde kaynakta iyileştirme yapıldı.
15	Sarız - Çörekdere Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
16	Sarız - Fettahdere Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
17	Sarız - Değirmentaşı Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.
18	Sarız - Karayurt Mahallesi kaynakta iyileştirme yapıldı.

EVRAK SERVİSİ

2017 yılı içerisinde Daire Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunan resmi daire, özel teşebbüs ve vatandaşların müracaat ederek talep etmiş oldukları şehir içme suyu bağlantısı, su şebeke arızaları anında değerlendirilerek gereği yapılmış olup müracaat sahiplerinin isteği yerine getirilmiştir.

2017 yılı içerisinde servisimize 2.143 adet evrak gelmiş olup, evrak muhteviyatı incelenerek, ilgili Şube Müdürlüğünce (İçmesuyu Şebeke İşletme Şube Müdürlüğü, İçmesuyu Tesisler Şube Müdürlüğü ile Enerji ve Otomasyon Şube Müdürlüğü) gereği yerine getirilerek cevap gerektiren yazılara 1.229 adet servisimizden yazı yazılmıştır. Cevap gerektirmeyen yazışmalar ise talepleri yerine getirilerek mahallinde müracaat sahipleri sözlü olarak bilgilendirilmişlerdir.

2017 yılı içerisinde İçmesuyu Dairesi Başkanlığımız bünyesinde ihtiyaç duyulan her türlü malzeme alımları ve gale çıkarılan malzemelerle ilgili servislerimizin yazışmaları yapılarak, işlerimizin seri bir şekilde yürümesi sağlanmış ve hizmet akışı hızlandırılmıştır.

İÇMESUYU TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İçmesuyu Tesisler Şube Müdürlüğü, 6360 Sayılı Mücavir Alan yasasıyla bağlanan yerleşim yerleri de dahil Kayseri'nin tamamına İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kriterleri ölçü alınarak, standartlara uygun sağlıklı içmesuyu temin etmek amacıyla yeraltı sularının araştırılması,sonrasında bu suları yeryüzüne çıkarmak amaçlı sondaj kuyusu ve pompa istasyonu tesisleri yapılarak işletmeye alınması; bu tesislerin sürekli işletme, kontrol ve bakımının yapılarak şebekeye verilecek olan suların tesislerde ve şebekede kimyasal, bakteriyolojik tetkikleri yapılarak kontrollü şekilde halkımıza ulaşmasını sağlar.


6360 Sayılı Mücavir Alan yasasıyla bağlanan yerleşim yerlerindeki pompa, depo hacmi, debi gibi bilgileri tek tek tespit edilerek bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Bu yerlerde eksik ve hatalı olan uygulamaların giderilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Suyun yeraltından şebekeye verilinceye kadar geçen işlemler sırasında kullanılan araç, gereç temini, personel çalıştırılması, kontrollerin yapılması sağlanmaktadır. Suyun temin edildiği kaptaj alanları ve tesislerin arıza, bakım işleri yapılmaktadır. Sisteme verilen suyun hijyenik olabilmesi için bölgelerden belli aralıkta numune alınmakta ve klor kontrollü bir şekilde sisteme verilmektedir. Mevcut sistemin en iyi şekilde çalıştırılması için günümüz şartlarında kullanılan en son teknolojide pompa, mekanik ekipman ve cihazlardan faydalanılmaktadır.

6360 Sayılı Mücavir Alan yasasıyla bağlanan yerleşim yerlerindeki sondaj, depo, içmesuyu kaynakları rehabilite edilmesi ve insan faktörü olmadan işletilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Mevcut otomatik sıvı klorlama sistemi ile toplam 427 adet Merkez, Çevre beldeler ve 6360 Sayılı Mücavir Alan yasasıyla bağlanan yerleşim yerlerindeki depo ve sondajda (insan müdahalesi olmadan) otomatik klorlama yapılmaktadır. Ayrıca mevcut sistemin en iyi şekilde çalıştırılması için ekonomik ve yüksek performansta pompalar kullanılmaktadır.

2017 yılında İçmesuyu Tesisler Şube Müdürlüğü bünyesinde 4 mühendis, 2 tekniker, vardiya sistemiyle çalışan mekanik arıza ve bakım ekibinde 1 ustabaşı ve 13 işçi ile klor arıza ve bakım ekibinde çalışan 1 ustabaşı ve 4 işçi olmak üzere toplam 25 personel ile faaliyetlerini sürdürmüştür. Farklı noktalardaki 1.577 adet tesisimizin (Depo, Sondaj Binası, Terfi İstasyonu, Maslak, vb.) arıza, bakım ve kontrolü Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

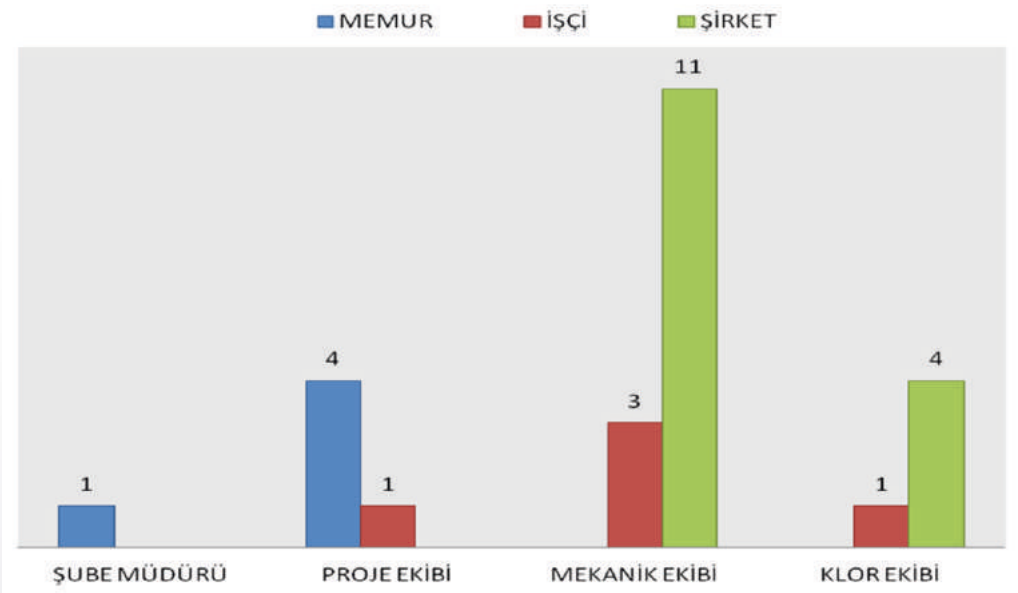

BİRİM	MEMUR	İŞÇİ	ŞİRKET
ŞUBE MÜDÜRÜ	1	-	-
PROJE EKİBİ	4	1	-
MEKANİK EKİBİ	-	3	11
KLOR EKİBİ	-	1	4

TESİSLER İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
MELİKGAZİ- KOCASİNAN - TALAS - HACILAR - İNCESU	
2017 YILI FAALİYET TABLOSU	
FAALİYETİN ADI	TOPLAM
MEKANİK ARIZA BAKIM EKİBİ FALİYETLERİ	
SANTRAFÜJ POMPA DEĞİŞİMİ	41
DALGIÇ POMPA MONTAJ VE DEMONTAJI	76
VANA, ÇEKVALF, DARBE VANASI, SALMASTRA ARIZA BAKIM İŞLERİ	147
TESİSLERİN KAPI, PENCERE KORKULUK KAYNAKLAR VE TAMİRATLARI	180
POMPA, MOTORLARIN YAĞLAMA, ARIZA VE BAKIM İŞLEMLERİ	321
KLOR ARIZA BAKIM EKİBİ FALİYETLERİ	
400 KGLIK GAZ KLOR TANKI DEĞİŞİMİ	64
40 KGLIK GAZ KLORLAMA TÜP DEĞİŞİMİ	83
GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ, AKÜMÜLATÖR, DOZAJ POMPASI, DEBİMETRE, KLOR ANALİZÖRÜ DEĞİŞİMİ, TAMİR VE BAKIMI	57
KLORLAMA SİSTEMİ: TESİSLERİN KONTROLÜ VE ARIZA BAKIMI	3.165
PROJE EKİBİ FALİYETLERİ	
TESİSLERİN GENEL KONTROLÜ VE TESPİT İŞLERİ	477
POMPA VE MOTORLARIN VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI	186
TESİSLER İLE İLGİLİ VERİLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI VE ÇİZİMLERİN GÜNCELLENMESİ	273
SONDAJ AÇILMASI İŞLEMLERİ VE RAPORLARIN TAKİBİNİN YAPILMASI	176

TESİSLER İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
6360 SAYILI Y ASA İLE BAĞLANAN MÜCAVİR ALAN İLÇE VE MAHALLELER	
2017 YILI FAALİYET TABLOSU	
FAALİYETİN ADI	**TOPLAM**
MEKANİK ARIZA BAKIM EKİBİ FALİYETLERİ	
SANTRAFÜJ POMPA DEĞİŞİMİ	7
DALGIÇ POMPA MONTAJ VE DEMONTAJI	163
VANA, ÇEKVALF, DARBE VANASI, SALMASTRA ARIZA BAKIM İŞLERİ	154
TESİSLERİN KAPI, PENCERE, KORKULUK KAYNAKLAR VE TAMİRATLARI	135
POMPA, MOTORLARIN YAĞLAMA, ARIZA VE BAKIM İŞLEMLERİ	91
KLOR ARIZA BAKIM EKİBİ FALİYETLERİ	
400 KGLIK GAZ KLOR TANKI DEĞİŞİMİ	4
40 KGLIK GAZ KLORLAMA TÜP DEĞİŞİMİ	100
GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ, AKÜMÜLATÖR, DOZAJ POMPASI, DEBİMETRE, KLOR ANALİZÖRÜ DEĞİŞİMİ, TAMİR VE BAKIMI	207
KLORLAMA SİSTEMİ: TESİSLERİN KONTROLÜ VE ARIZA BAKIMI	1.529
PROJE EKİBİ FALİYETLERİ	
TESİSLERİN GENEL KONTROLÜ VE TESPİT İŞLERİ	423
POMPA VE MOTORLARIN VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI	262
TESİSLER İLE İLGİLİ VERİLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI VE ÇİZİMLERİN GÜNCELLENMESİ	368
SONDAJ AÇILMASI İŞLEMLERİ VE RAPORLARIN TAKİBİNİN YAPILMASI	187

Şube Müdürlüğümüzce 2017 yılında Bünyan-Emiröreni, Bünyan-Karacaören, Bünyan-Kösehacılı, Bünyan-Sıvgın, Develi-Epçe, Develi-Kızık, Develi-Kulpak, Develi-Soysallı, Develi-Sindelhöyük, Develi-Toki, İncesu-Subaşı, Kocasinan-Akin, Kocasinan-Doruklu, Kocasinan-Kaş, Kocasinan-Güneşli, Kocasinan-Mahzemin (2), Kocasinan-Mollahacı, Melikgazi-A.Parkı(2), Melikgazi-B.Bürüngüz, Melikgazi-Eğribucak(2), Melikgazi- Gülmersu, Melikgazi-Mahrumlar(2), Pınarbaşı-Kaman, Sarıoğlan-Alamettin, Sarıoğlan-Çiftlik, Sarız, B.Söbeçimen, Talas-Kuruköprü, Tomarza-Merkez (2),Tomarza-İcadiye'de toplam 34 adet sondaj kuyusu açtırılmıştır. Bünyan-Emiröreni, Develi-Kulpak, Develi-Soysallı, Kocasinan-Doruklu, Sarıoğlan-Alamettin ve Mahrumlar sondaj kuyusu devreye alınmıştır. Ayrıca diğer sondaj kuyuları devreye alınabilecek durumda hazır vaziyettedir.

2017 YILINDA AÇILAN KUYULAR	
S.NO	**MEVKİ**
1	BÜNYAN-EMİRÖREN
2	BÜNYAN-KARACAÖREN
3	BÜNYAN-KÖSEHACILI
4	BÜNYAN-SIVGIN
5	DEVELİ-EPÇE
6	DEVELİ-KIZIK
7	DEVELİ-KULPAK
8	DEVELİ-SİNDELHÖYÜK
9	DEVELİ-SOYSALLI
10	DEVELİ-TOKİ
11	İNCESU-SUBAŞI
12	KOCASİNAN-AKİN
13	KOCASİNAN-DORUKLU
14	KOCASİNAN-GÜNEŞLİ
15	KOCASİNAN-KAŞ
16	KOCASİNAN-MAHZEMİN-1
17	KOCASİNAN-MAHZEMİN-2
18	KOCASİNAN-MOLLAHACI
19	MELİKGAZİ-A.PARKI (1.KUYU YANI)
20	MELİKGAZİ-A.PARKI (3.KUYU YANI)
21	MELİKGAZİ-B.BÜRÜNGÜZ DEPOYANI
22	MELİKGAZİ-EĞRİBUCAK DEPOALTI-1
23	MELİKGAZİ-EĞRİBUCAK DEPOALTI-2
24	MELİKGAZİ-GÜLMERSU
25	MELİKGAZİ-MAHRUMLAR (5. KUYU YANI)
26	MELİKGAZİ-MAHRUMLAR (7. KUYU YANI)
27	PINARBAŞI-KAMAN
28	SARIOĞLAN-ALAMETTİN
29	SARIOĞLAN-ÇİFTLİK
30	SARIZ-BÜYÜKSÖBEÇİMEN
31	TALAS-KURUKÖPRÜ
32	TOMARZA-İCADİYE
33	TOMARZA-MERKEZ-1
34	TOMARZA-MERKEZ-2





MEVCUT POMPALAR - 2017			
	MERKEZ	**HİNTERLAND**	**MÜCAVİR ALAN**
DALGIÇ POMPA	71	120	358
YATAYMİLLİ POMPA	38	7	9
DİKEYMİLLİ POMPA	18	107	47
GENEL TOPLAM	**127**	**234**	**414**

DEPO SAYISI - 2017	
MERKEZ	31
ÇEVRE BELDELER	130
MÜCAVİR ALAN	524
TOPLAM	**685**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016	2017
Kurulan klor sistemi. (adet)	64	217
Alınan gaz klor miktarı. (lt)	34.200	26.800
Alınan sıvı klor miktarı. (ton)	70	130
Ekonomik ömrünü doldurmuş pompa değişimi. (adet)	238	239
Değişen kolon borusu sayısı. (adet)	683	723
Açılan sondaj kuyusu. (adet)	36	34

PERFORMANS GÖSTERGELERİ -2017 EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ POMPA DEĞİŞİMİ (adet)	
Akkışla	1
Bünyan	15
Develi	24
Felahiye	6
Hacılar	10
İncesu	12
Kocasinan	42
Melikgazi	43
Özvatan	1
Pınarbaşı	21
Sarıoğlan	13
Sarız	8
Talas	14
Tomarza	12
Yahyalı	6
Yeşilhisar	11
TOPLAM	**239**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 2017 AÇILAN SONDAJ KUYUSU (adet)	
Akkışla	-
Bünyan	4
Develi	6
Felahiye	-
Hacılar	-
İncesu	1
Kocasinan	7
Melikgazi	8
Özvatan	-
Pınarbaşı	1
Sarıoğlan	2
Sarız	1
Talas	1
Tomarza	3
Yahyalı	-
Yeşilhisar	-
TOPLAM	**34**

ENERJİ OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Enerji ve Otomasyon Şube Müdürlüğü idarenin su üretim yerleri, motor evleri, su depoları, tüm bina tesis ve hizmet yerlerinin elektrik tesisatı, enerji nakil hatları, trafoları, sürücü panoları, otomasyon cihazları, elektrik motorları, SCADA kumanda sistemleri ve GPRS kumanda sistemlerini, kesintisiz işletmekle yükümlüdür.

Sistemlerin çalıştırılabilmesi için gerekli elektrik enerjisi temin edilmesi, yeni sistemlerin kurulması, çalıştırılması ve otomasyona ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli araştırma geliştirme projelendirme ve uygulama çalışmalarının yapılması, bakımı ve onarımının yapılması veya hizmet alım yolu ile yaptırılması işlerini yürütür. Elektrik şebekesinin devamlılığını ve arızaların giderilmesini sağlamak ve Motopomp, enerji hatları, Trafo, Dizel Jeneratör Grupları, SCADA, GPRS ile diğer elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımını ve onarımını yaptırmak Enerji ve Otomasyon Şube Müdürlüğü faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır.

Elektrik bakım ekibinin sevk ve idaresi ile su üretim sistemlerinin kesintisiz çalışması, SCADA sisteminin çalıştırılması, periyodik bakımlarının yaptırılması ile üretilen suyun izlenmesi, yönlendirilmesi, personelin sevk ve idaresi, oluşacak arızalara müdahale edilmesi ve onarım işlerinin yapılması, WEB tabanlı GPRS sistemi ile ilgili arızalara müdahale edilmesi, tesislerde üretilen ve depolardan şebekeye verilen su miktarı ile kuyuların anlık debi ölçümlerinin yaptırılarak tesislerin verimliliği sürekli kontrol altında tutulması, tasarruf elde edilmesi amacıyla depo ve terfi merkezlerinde enerji tüketiminin takip edilmesi Enerji ve Otomasyon Şube Müdürlüğü görev ve yetkisi dâhilindedir.

Çift terimli tarifenin disiplinli uygulanması ile, elektrik birim fiyatının yüksek olduğu saatlerde (17.00 - 22.00) motorlar beklemeye alınarak yüksek oranda parasal tasarruf elde edilmiştir. İçmesuyu tesislerinde, 2017 yılında tek terimli tarife ile 0,4180 ₺/kwh olan enerji birim maliyeti, çift terimli tarife ile ortalaması 0,2161 ₺ /kwh'e kadar düşürülerek 7 aylık süreç'te 39.117.909,60 kwh olan merkeze bağlı bölgelerin toplam tüketiminde ₺ 1.538.751,02 tasarruf sağlanmıştır. Bu miktar % 10.59'ya tekabül etmektedir.

Enerji verimliliğinin öneminin yeni anlaşılmaya başladığı günümüzde, Kurumuzda yaklaşık 20 yıl önce bu bilinçle Enerji Otomasyon Şube Müdürlüğü kurularak yüksek verimli EFF1 motorlarının kullanımı, AC motor sürücü, yumuşak yol verici (Softstarter) kullanımı, güneş paneli ile elektrik üretimi, motor ömrünün uzatılması, enerji tüketimlerinin WEB internet üzerinden anlık takip edilmesi gibi etkin önlemlerle enerji yönetimi verimli hale getirilerek üretilen suyun enerji birim maliyetinde son 10 yılda önemli miktarda düşüş sağlanmıştır. Teknolojik uygulamaları ile büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere birçok belediyenin ilgi odağı olmuştur.

Tesislerin elektrik tesisat projelerinin hazırlanması, enerji getirme ve trafo postası yapım işi ile elektrik aboneliklerinin yapılması ve tesislerde GSM baz istasyonları kurulması için teknik gereksinimlerin hesaplanması ve sözleşme hazırlanması faaliyetleri de müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir.

Elektrik tüketiminin en aza indirilmesi için tüketimi yüksek olan noktalarda gerekli iyileştirme ve proje çalışmalarının yapılması ve Elektrik sarfiyatının kontrol altına alınarak elektrik tüketimi istatistiğinin düzenlenmesi çalışmalarını yaparak elektrik faturalarının kontrolü, ödenmesi, WEB üzerinden elektrik sayaç bilgilerinin online izlenerek reaktif ve kapasitif güç tüketimlerinin limitler içinde tutulması, elektrik, scada bakım ekibinin sevk ve idaresi, su üretim sistemlerinin kesintisiz çalışması ile elektrik projelerinin ve aboneliklerinin yapılması müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır.

ELEKTRİK BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ

Elektrik Bakım Onarım Şefliği, Kaski Genel Müdürlüğüne ait su üretim yerleri, motor evleri, su depoları, tüm bina tesis ve hizmet yerlerinin elektrik tesisatı, enerji nakil hatları, trafoları, sürücü panoları, otomasyon cihazları, elektrik motorları, SCADA kumanda sistemleri ve GPRS kumanda sistemlerinin, kesintisiz işletilebilmesi için gerekli elektrik enerjisi temin edilmesini sağlamaktadır.

Yüksek verimli EFF1 motorlarının kullanımı, AC motor, sürücü, yumuşak yol verici (Softstarter) kullanımı, Güneş Paneli ile elektrik üretimi, motor ömrünün uzatılması (çoklu koruma), elektrik şebekesi devamlılığını ve arızaların giderilmesini sağlamak, Motopomp, Enerji Hatları, Trafo ile diğer elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımını ve onarımını yapmak da Elektrik Bakım Onarım şefliğinin faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır.

İçmesuyu tesislerinde bulunan 12 adet acil durum jeneratörünün aylık periyodik bakımlarının yapılarak, elektrik kesintilerinde sistemlerin ihtiyaç duyacağı enerjinin kesintisiz temin edilmesi, idarenin ihtiyaç duyduğu yerlerde Enerji Nakil Hattı tesisi için Elektrik Şirketi ile birlikte çalışılarak enerji getirilmesi ve direk üstü trafo postası işlerinin yapılması, orta gerilim sigortası arızalarında yetki belgesi almış personellerle elektrik arızalarına hızlı ve etkin müdahale edilerek içme su temininin kesintisiz sağlanması işi de elektrik bakım onarım ekibi tarafından yürütülmektedir. 250KVA mobil jeneratör ile de gerekli olan noktalarda kesintisiz enerji sağlanmaktadır.

Elektrik Bakım Ekibi Personel Dağılımı

Tekniker	Elektrik Arıza Ve Bakım Elemanı
4 Memur	9 İşçi

Elektrik Bakım Onarım Şefliği bünyesinde; 3 elektrik teknikeri, 2 vardiya şeklinde çalışan 9 elektrik arıza bakım onarım elemanı toplam 12 personel elektrik arızları, bakım ve onarımları ile sistemlerin işletilmesinde görev almaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; Elektrik arızaları, MCC Panoların bakım ve onarımları, trafo ve orta gerilim sigorta arızaları gibi 2017 yılı içerisinde elektrik ve bakım onarım ekibi tarafından yapılan işler;


FAALİYETİN ADI	TOPLAM (adet)
ELEKTRİK ARIZA VE BAKIM ONARIM EKİBİ	
TERMİK ELEKTRİK ARIZASI	746
HABERLEŞME ARIZASI	426
AKIŞ SWİTCHİ KONTROLÜ VE AYARI	60
TRAFO-PANO BAKIMI	277
ORTA GERİLİM ARIZ ASI	114
PANO ELEKTRİK ARIZA	586
KOMPANZASYON YAPILMASI	134
KABLO TAMİRATI	239
AYDINLATMA TESİSATI ÇEKİMİ VE ARIZASI	89
PANO İÇİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MALZEME DEĞİŞİMİ	609
DEPO VE MOTOREVLERİ ÖN ARIZA KONTROLLERİ	1.219
SÜRÜCÜ TAMİRATI VE DEĞİŞİM İ	122
VANA ELEKTRİK ARIZA VE AYARI	212
BASINÇ SAAT VE SEVİYE SENSÖR KONTROLÜ	223
MOTOR BAĞLANTISI	126
JENERATÖR BAKIMI	51
KLOR ELEKTRİK TESİSATI ÇEKİMİ	35
MEKANİK ARIZA TESPİTİ	98
TESİSLERİN ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ VE E.N.H. TESPİT ÇALIŞMASI	40
UMUMİ WC LERİN SU-ELEKTRİK TASARRUF SİSTEMİ KONTROLÜ	0


FAALİYETİN ADI	TOPLAM (adet)
ELEKTRİK ARIZA VE BAKIM EKİBİ (İLÇELER) 6360 SAYILI YASA İLE BAĞLANAN İLÇE VE BELDELER	
TERMİK ELEKTRİK ARIZASI	409
ZAMAN SAAT AYARI	256
TRAFO-PANO BAKIMI	314
ORTA GERİLİM ARIZASI	172
PANO ELEKTRİK ARIZA	431
SÜRÜCÜ TAMİRATI VE DEĞİŞİMİ	96
KOMPANZASYON YAPILMASI	102
AYDINLATMA TESİSATI ÇEKİMİ VE ARIZASI	62
PANO İÇİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MALZEME DEĞİŞİMİ	333
DEPO VE MOTOREVLERİ ÖN ARIZA KONTROLLERİ	822
VANA ELEKTRİK ARIZA VE AYARI	86
BASINÇ SAAT VE SEVİYE SENSÖR KONTROLÜ	167
MOTOR BAĞLANTISI	102
MEKANİK ARIZA TESPİTİ	103
HABERLEŞME ARIZASI	244
TESİSLERİN ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ VE E.N.H. TESPİT ÇALIŞMASI	62

6360 SAYILI KANUNLA KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARINA DAHİLOLAN İLÇELERDE 2017 YILI ELEKTRİK BAKIM ONARIM EKİBİ ARIZA DURUMU

BELEDİYE	BELDE-KÖY ADI	TERMİK ELEKTRİK ARIZA	ZAMAN SAAT AYARI	TRAFO-PANO BAKIMI	ORTA GERİLİM ARIZASI	PANO ELEKTRİK-SCADA ARIZA	SÜRÜCÜ TAMİRATI VE DEĞİŞİMİ	KOMPANZASYON YAPILMASI	AYDINLATMA TESİSAT ÇEKİMİ VE ARIZASI	PANO İÇİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MALZEME DEĞİŞİMİ	DEPO VE MOTOREVLERİ ÖN ARIZA KONTROLLERİ	VANA ELEKTRİK ARIZA VE AYARI	BASINÇ SAAT VE SEVİYE SENSÖR KONTROLÜ	MOTOR BAĞLANTISI	MEKANİK ARIZA TESPİTİ	LİNK-SCADA HABERLEŞME ARIZASI	ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ VE E.N.H. TESPİTİ	TOPLAM
AKKIŞLA	KÖYLER	7	4	5	2	8	2	0	1	3	21	5	3	2	1	6	3	73
BÜNYAN	KÖYLER	26	14	23	7	33	3	4	2	19	59	6	7	6	4	13	4	230
DEVELİ	MERKEZ	18	1	9	5	17	2	3	3	9	42	6	5	4	7	11	1	143
DEVELİ	KÖYLER	38	25	28	11	34	4	6	4	24	65	7	12	7	8	16	4	293
FELAHİYE	MERKEZ	13	2	2	3	6	2	1	2	4	15	3	3	2	1	3	1	63
FELAHİYE	KÖYLER	18	19	27	8	11	4	5	3	10	25	3	5	5	4	6	4	157
KOCASİNAN	KÖYLER	37	26	33	15	26	9	12	4	22	44	8	11	12	14	14	4	291
ÖZVATAN	MERKEZ	2	0	1	0	3	1	0	0	1	9	2	2	0	0	0	0	21
ÖZVATAN	KÖYLER	2	1	1	2	2	1	3	1	2	8	1	3	1	2	1	0	31
İNCESU	KÖYLER	12	16	19	12	21	6	7	4	15	46	5	13	7	9	17	6	215
MELİKGAZİ	KÖYLER	9	1	1	5	5	5	6	1	5	24	3	3	5	4	4	2	83
PINARBAŞI	MERKEZ	17	1	4	4	23	4	3	1	19	34	5	9	6	2	15	1	148
PINARBAŞI	KÖYLER	31	29	38	17	37	11	10	5	31	72	6	19	8	11	22	8	355
SARIOĞLAN	KÖYLER	28	24	24	15	25	8	7	3	25	45	2	13	4	8	14	5	250
SARIZ	MERKEZ	11	2	4	2	10	2	1	0	12	19	0	4	2	1	6	0	76
SARIZ	KÖYLER	23	23	22	12	24	5	3	3	26	32	2	6	2	4	14	3	204
TALAS	KÖYLER	27	22	25	14	31	7	11	6	29	48	4	10	7	8	18	6	273
TOMARZA	MERKEZ	15	1	5	4	25	1	2	2	13	32	1	8	3	2	9	1	124
TOMARZA	KÖYLER	25	24	15	13	28	6	9	5	28	63	5	12	6	5	18	3	265
YAHYALI	MERKEZ	5	0	2	2	8	1	1	1	3	21	1	3	3	1	4	0	56
YAHYALI	KÖYLER	18	11	10	7	21	4	3	3	11	35	4	6	2	3	11	2	151
YEŞİLHİSAR	MERKEZ	6	1	3	3	9	1	2	1	4	20	2	3	2	0	5	0	62
YEŞİLHİSAR	KÖYLER	17	9	13	9	21	7	3	3	16	43	5	7	6	4	17	3	183
İLÇELER	EKİP EVLERİ	4	0	0	0	3	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	14
TOPLAM		409	256	314	172	431	96	102	62	333	822	86	167	102	103	244	62	3.761

6360 SAYILI KANUNLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARINA DAHİLOLAN İLÇELERDE 2017 YILI ELEKTRİK BAKIM ONARIM EKİBİ ARIZA DURUMU

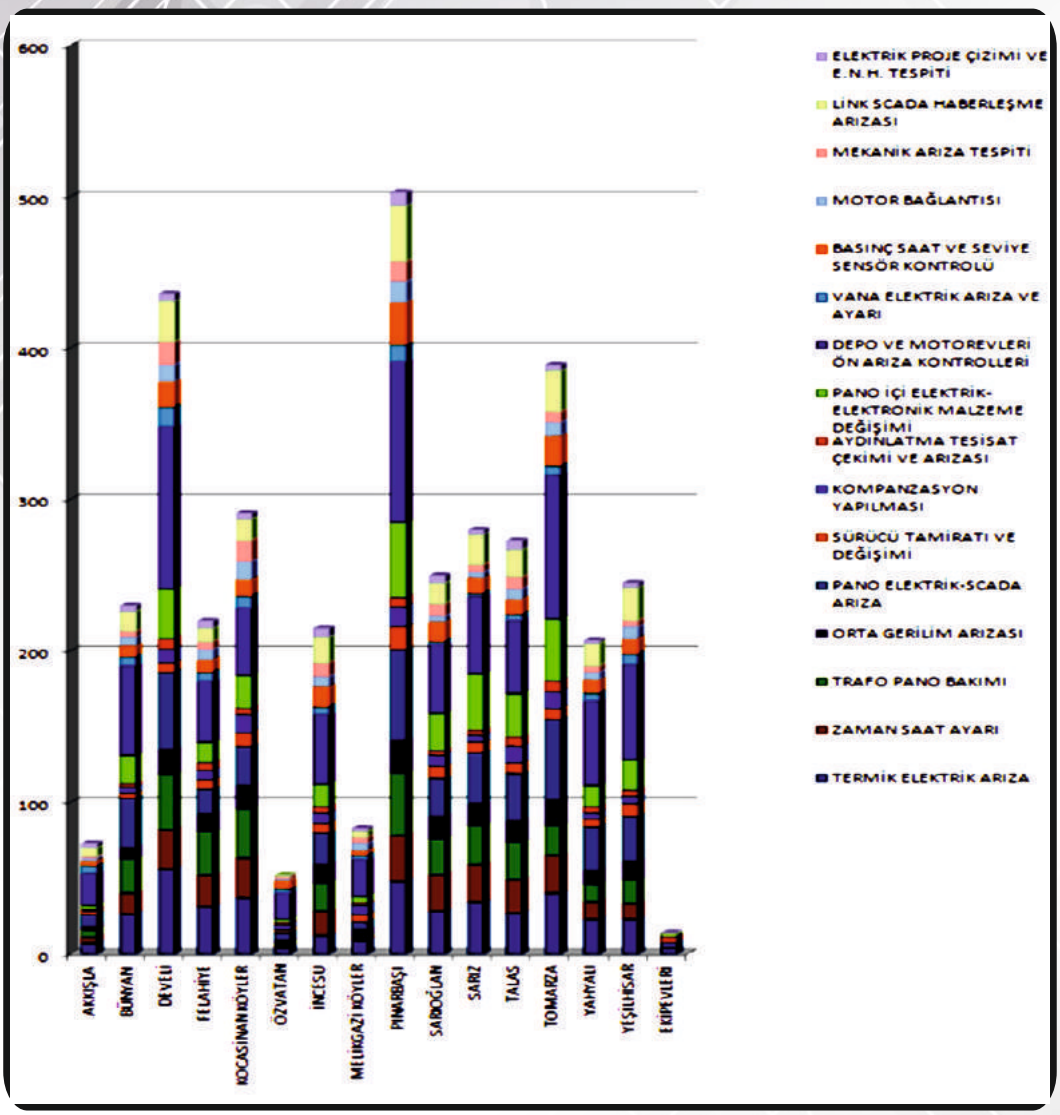

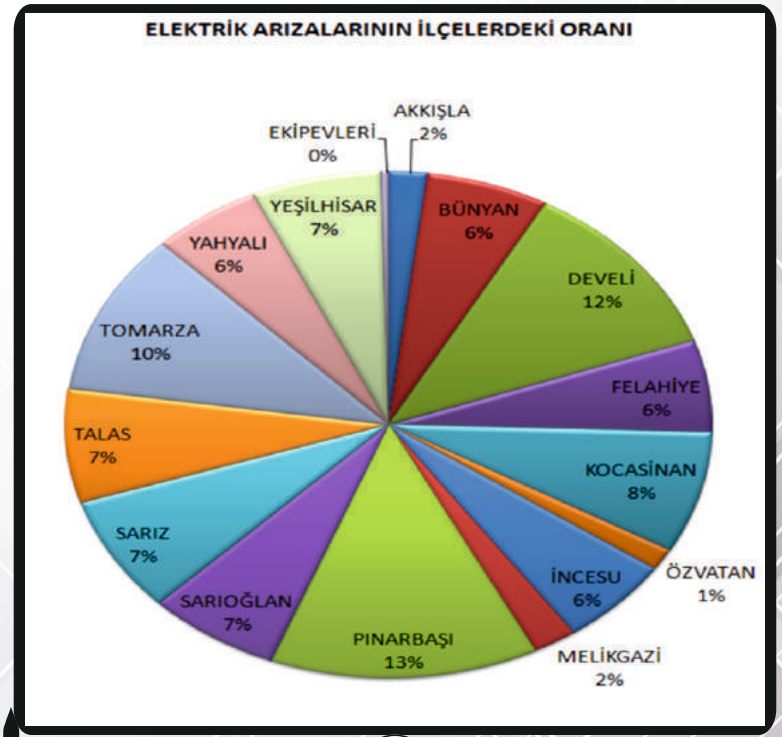

SCADA ŞEFLİĞİ

SCADA, (Supervisory Control And Data Acquisition) merkezi denetim ve bilgi toplama sistemi olup içmesuyu üretim ve dağıtımında etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve kumanda sağlamaktadır.

KASKİ SCADA Sisteminin temel görevi; Kayseri'ye yeterli ve düzenli şekilde içme suyunun dağıtımını yapmak ve su trafiğini devamlı kontrol altında tutmaktır. Bu yapı SCADA Merkezince dalgıçlar, pompa istasyonları ve depoların bilgisayarlar ve iletişim hatları vasıtasıyla gün boyu izlenip işletilmesi az elemanla çok verim alınması esasına dayanır.

Son yıllarda sık sık gündeme gelen enerji politikaları, içinde bulunduğumuz küresel iklim değişikliği, kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve sınırlı olması; gelecek adına su probleminin yaşanmaması için su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmıştır, Scada sistemiyle yapılan çalışmalar havzada bulunan su rezervinin etkin ve sağlıklı kullanımı gözetilerek bölgemizde bulunan diğer belediye uygulamalarına örnek teşkil etmiştir.

Scada Bakım Ekibi Personel Dağılımı

Tekniker	Bakım Elemanı	Scada Operatörü
1 Memur	4 İşçi	7 İşçi

2017 Yılı İtibarıyla Scada Şefliği bünyesinde; 1 elektrik teknikeri, 4 işci ve 24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışan 7 SCADA Operatörü ile toplam 12 Personel SCADA sisteminin işletilmesinde görev almaktadır. Scada sisteminin ve sisteme bağlı enstrümanların (scada panolarının, telsizlerin, antenlerin, debimetrelerin vb.) arızaları scada bakım ekibi tarafından giderilmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; Scada haberleşme arızaları, debimetre scada bağlantısı, link otomasyon sistem montajı gibi 2017 yılı içerisinde scada bakım onarım ekibi tarafından yapılan işler;


FAALİYETİN ADI	TOPLAM (adet)
SCADA ARIZA VE BAKIM ONARIM EKİBİ	
HABERLEŞME ARIZASI	678
PANO İÇİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MALZEME DEĞİŞİMİ	247
DEBİMETRE ARIZALARI VE KONTROLÜ	168
DEPO VE MOTOREVLERİ ÖN ARIZA KONTROLLERİ	459
SCADA PANO TAMİRATI	149
SEVİYE SENSÖR ARIZASI	161
DEBİMETRE BAKIMI VE SCADA BAĞLANTISI	145
LİNK SİSTEMİ OTOMASYON MONTAJI	0
SCADA SİSTEMİNE BAĞLANAN İSTASYON	84


FAALİYETİN ADI	TOPLAM (adet)
ELEKTRİK ARIZA VE BAKIM EKİBİ (İLÇELER) 6360 SAYILI YASA İLE BAĞLANAN İLÇE VE BELDELER	
HABERLEŞME ARIZASI	171
PANO İÇİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MALZEME DEĞİŞİMİ	84
DEBİMETRE ARIZALARI VE KONTROLÜ	68
DEPO VE MOTOREVLERİ ÖN ARIZA KONTROLLERİ	426
SCADA PANO TAMİRATI	86
SEVİYE SENSÖR ARIZASI	51
DEBİMETRE BAKIMI VE SCADA BAĞLANTISI	62
LİNK SİSTEMİ OTOMASYON MONTAJI	21
SCADA SİSTEMİNE BAĞLANAN İSTASYON	203

6360 SAYILI KANUNLA KAYSERİ BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ SINIRLARINA DAHİLOLAN İLÇELERDE 2017 YILI SCADA BAKIM ONARIM EKİBİ ARIZA DURUMU

BELEDİYE	BELDE-KÖY ADI	HABERLEŞME ARIZASI	PANO İÇİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MALZEME DEĞİŞİMİ	DEBİMETRE ARIZALARI VE KONTROLÜ	DEPO VE MOTOREVLERİ ÖN ARIZA KONTROLLERİ	SCADA PANO TAMİRATI	SEVİYE SENSÖR ARIZASI	DEBİMETRE BAKIMI VE SCADA BAĞLANTISI	LİNK SİSTEMİ OTOMASYON MONTAJI	SCADA SİSTEMİNE BAĞLANAN İSTASYON	TOPLAM
AKKIŞLA	MERKEZ	2	2	1	5	1	0	0	0	1	**12**
AKKIŞLA	KÖYLER	2	2	2	4	1	2	2	0	3	**18**
BÜNYAN	MERKEZ	21	7	4	10	6	3	4	0	6	**61**
BÜNYAN	KÖYLER	24	6	2	17	1	2	3	1	21	**77**
DEVELİ	MERKEZ	11	7	6	36	12	3	8	0	0	**83**
DEVELİ	KÖYLER	9	3	5	24	2	2	2	2	19	**68**
FELAHİYE	MERKEZ	6	5	4	18	4	1	2	0	0	**40**
FELAHİYE	KÖYLER	5	3	3	11	2	1	1	1	12	**39**
KOCASİNAN	KÖYLER	9	4	4	25	6	3	3	2	34	**90**
ÖZVATAN	MERKEZ	1	0	1	3	0	1	0	0	0	**6**
ÖZVATAN	KÖYLER	0	2	0	2	1	0	1	1	8	**15**
İNCESU	KÖYLER	8	6	3	19	5	3	3	2	9	**58**
MELİKGAZİ	KÖYLER	7	4	2	12	7	4	3	1	0	**40**
PINARBAŞI	MERKEZ	20	7	3	9	6	3	2	0	0	**50**
PINARBAŞI	KÖYLER	12	4	3	28	9	5	4	2	15	**82**
SARIOĞLAN	MERKEZ	1	1	1	5	0	2	1	0	0	**11**
SARIOĞLAN	KÖYLER	2	2	2	18	2	1	3	2	14	**46**
SARIZ	MERKEZ	3	1	0	13	2	1	1	0	0	**21**
SARIZ	KÖYLER	7	3	4	22	5	3	4	2	9	**59**
TALAS	KÖYLER	8	4	5	34	3	3	4	2	5	**68**
TOMARZA	MERKEZ	3	2	4	15	4	1	1	0	0	**30**
TOMARZA	KÖYLER	3	3	3	33	2	3	3	1	20	**71**
YAHYALI	MERKEZ	2	1	1	16	1	1	0	0	0	**22**
YAHYALI	KÖYLER	2	2	2	21	1	2	2	1	8	**41**
YEŞİLHİSAR	MERKEZ	3	1	2	9	1	0	1	0	0	**17**
YEŞİLHİSAR	KÖYLER	0	2	1	17	2	1	4	1	19	**47**
TOPLAM		**171**	**84**	**68**	**426**	**86**	**51**	**62**	**21**	**203**	**1.172**

6360 SAYILI KANUNLA BÜYÜKŞEHİR BELEİDYESİ SINIRLARINA DAHİLOLAN İLÇELERDE 2017 YILI SCADA BAKIM ONARIM EKİBİ ARIZA DURUMU

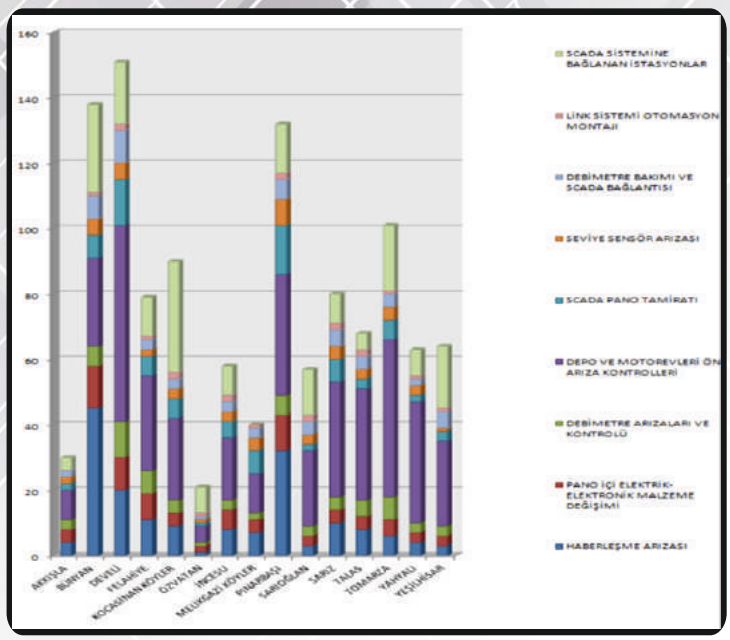


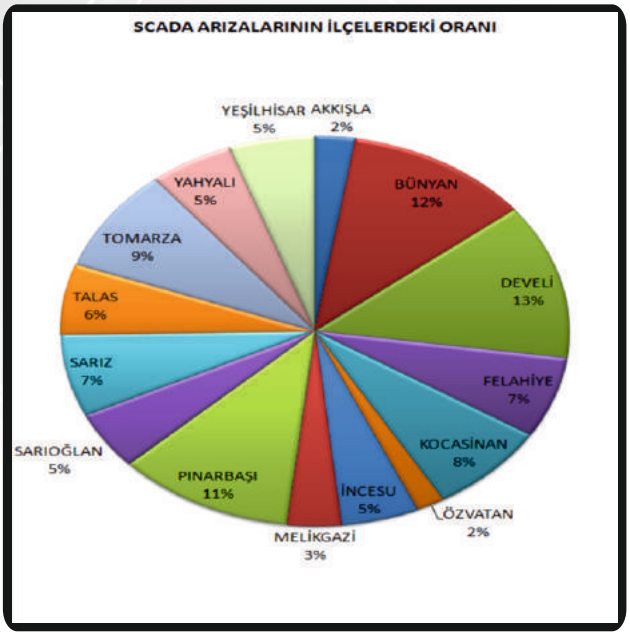

İçmesuyu tesisi kapsamında derin kuyular ile terfi merkezlerindeki motopomplara kablosuz otomasyon sistemi ile kumanda etmek ve depolarla birlikte tüm içmesuyu sisteminin tek bir merkezden kumanda edilmesini ve izlenmesini sağlamaktır. GPRS Panoları, Scada Panoları, Debimetre, Link Cihazları ile scada sisteminin sorunsuz işletilmesinde tüm elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımını ve onarımını yapmak da scada bakım onarım şefliğinin faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır.

Kaski scada'yla tanışmadan önce 1995 yılı; İşletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi) 12, depo ve terfi merkezlerinde (motorları ve dalgıç pompaları çalıştıran depo seviyelerini kontrol eden) personel sayısı 98 kişi

2017 yılı Scada sistemiyle; İşletilen tesis sayısı (Dalgıç, Terfi Merkezi ve Depo) 802, Scada'da çalışan toplam personel sayısı 7 kişi

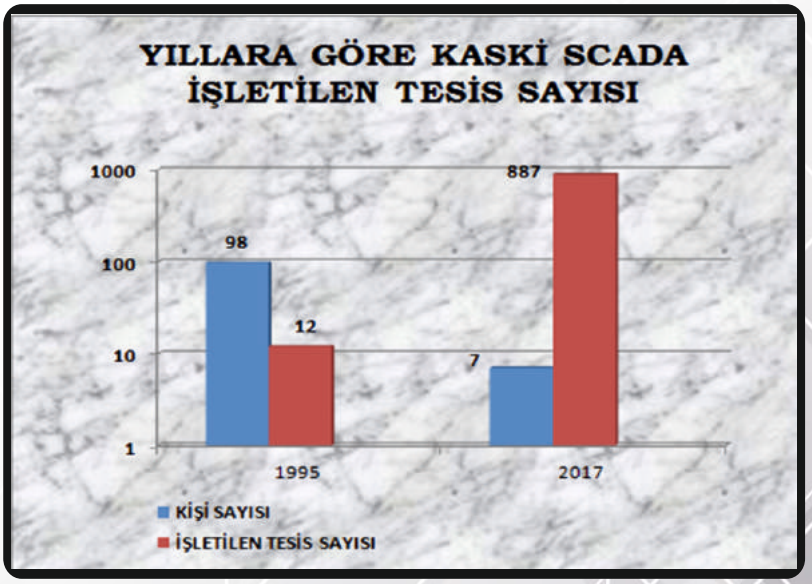

2017 yılı itibarıyla merkez, hinterland ve ilçeler kapsamındaki; 304 adet dalgıç ve dik milli pompa istasyonu, 266 adet depo istasyonu, 232 adet terfi pompa istasyonu, 57 adet master pano otomasyonu, izleme ve işletilmesi scada merkezinden yapılmaktadır.

YILLARA GÖRE SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİ				
YIL	DALGIÇ POMPA SAYISI	TERFİ MERKEZİ YATAY POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	İŞLETEN PERSONEL SAYISI
1995	42	31	18	98
2017	304	232	266	7


2017 yılında scada sistemine dahil edilen istasyonlar; 148 adet dalgıç ve dikmilli pompa istasyonu, 80 adet depo istasyonu, 65 adet yatay pompa istasyonu.

2017 YILINDA SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİNE DAHİL EDİLEN İSTASYONLAR				
YIL	DALGIÇ POMPA SAYISI	TERFİ MERKEZİ YATAY POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	İŞLETEN PERSONEL SAYISI
2017	148	65	80	7

Scada otomasyon sistemiyle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem sayesinde temel olarak içmesuyu tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır.

2017 yılı itibarıyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerindeki tesislerin scada sistemi tarafından kontrol edilebilmesinin sağlanması çalışmasına başlanmıştır. Böylece 6360 sayılı kanun gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki olan bütün yerleşim yerlerinin içmesuyu trafiği tek bir merkezden tüm Kayseri'ye su vermenin sorumluluk bilinciyle KASKİ SCADA birimi tarafından işletilecektir.


Yine 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğu il sınırına genişlediğinden dolayı yaklaşık 200 yerleşim bölgesinin de kontrolünün SCADA bünyesine alınması çalışmalarına devam edilecektir.

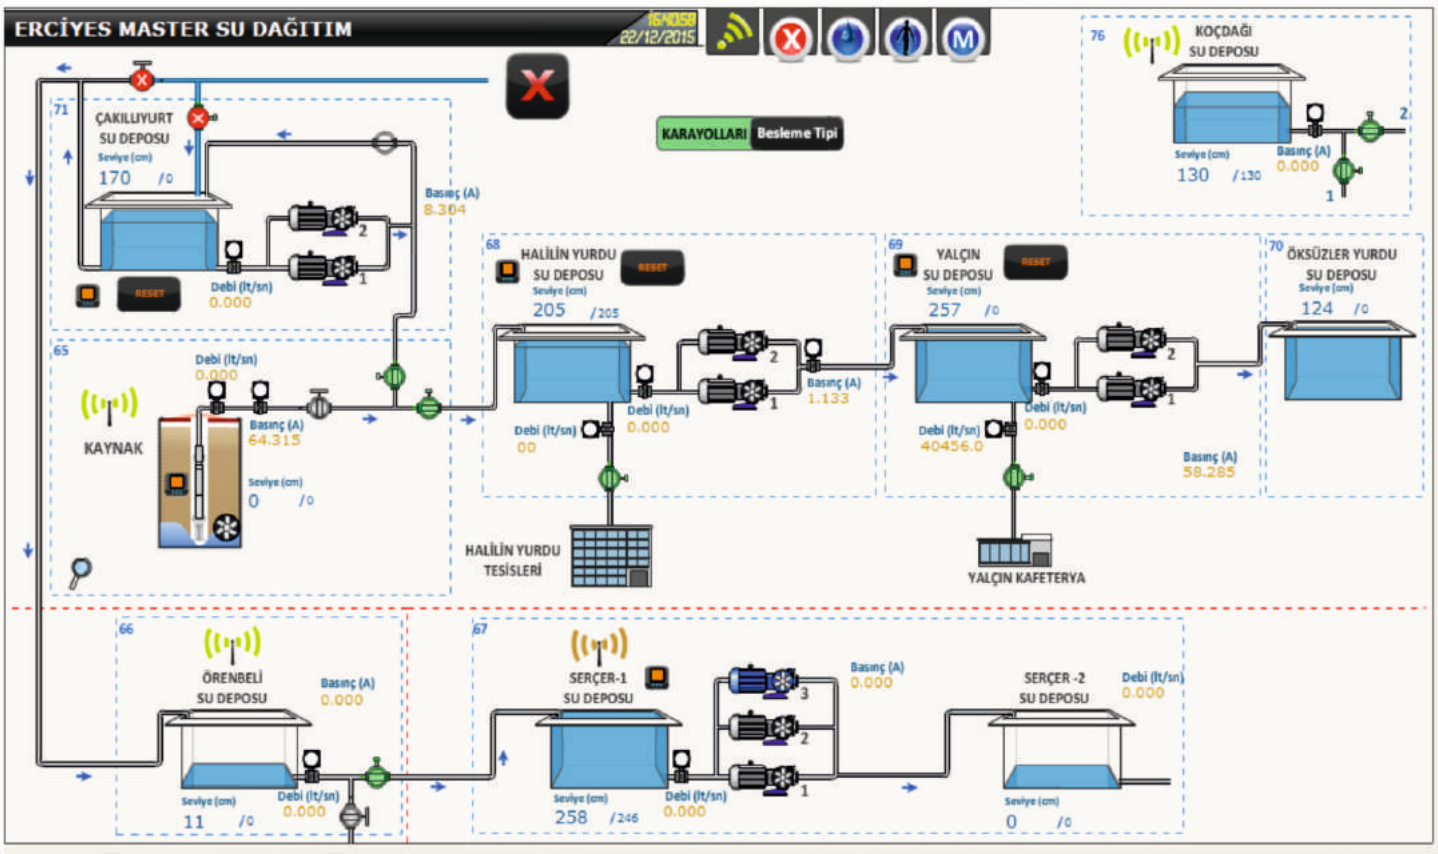


KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI AYLARA GÖRE SU ÜRETİM RAPORU


İSTASYONLAR	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM (m³)
ANAYURT	269.188	244.292	259.463	240.013	248.182	267.243	276.968	282.025	268.410	260.630	255.184	263.353	**3.134.951**
ANNELER PARKI	559.000	520.500	441.300	639.614	653.000	791.108	837.623	884.690	793.075	762.910	679.385	663.659	**8.225.864**
BEŞTEPELER	911.843	892.652	977.229	964.476	980.785	769.703	760.309	764.222	709.100	636.512	594.193	605.834	**9.566.858**
ÇAYBAĞLARI	323.388	287.352	278.460	301.392	310.752	391.248	573.768	516.672	493.272	408.564	358.020	372.528	**4.615.416**
EĞRİBUCAK	477.171	434.664	478.932	575.592	516.789	544.641	653.465	643.902	606.367	522.633	481.264	470.894	**6.406.314**
ERKİLET	16.800	15.480	13.980	14.760	18.420	25.500	38.040	34.380	31.140	21.780	15.660	14.400	**260.340**
GEDİRİS	237.300	218.295	234.045	233.730	285.810	258.930	262.080	282.870	259.350	220.710	334.653	214.402	**3.042.175**
GERMİRALTI	1.470.976	1.419.956	1.493.675	1.517.126	1.505.969	1.449.399	1.466.239	1.527.161	1.496.143	1.392.478	1.400.260	1.358.214	**17.497.596**
HACILAR	97.773	140.635	148.997	145.109	196.870	298.271	401.680	347.807	307.652	213.487	180.184	134.383	**2.612.848**
KARPUZATAN	950.240	869.090	920.070	922.400	876.770	972.020	1.424.630	1.290.720	1.155.880	1.180.150	1.159.590	1.189.850	**12.911.410**
KEYKUBAT	1.032.022	985.200	1.079.661	1.050.670	1.036.302	1.060.362	1.132.413	1.147.451	960.022	1.024.723	937.097	950.539	**12.396.462**
MAHRUMLAR	651.942	608.752	702.660	676.092	664.870	643.800	680.314	678.950	640.574	580.202	584.414	599.350	**7.711.920**
DOKUZPINARLAR	121.600	0	6.400	4.800	4.800	246.400	371.200	350.400	270.400	376.000	374.400	398.400	**2.524.800**
MİMARSİNAN	222.537	197.742	190.234	205.423	227.053	271.610	341.677	339.015	301.126	246.891	226.436	212.649	**2.982.393**
TOKİ	140.687	134.782	152.464	142.843	155.935	148.538	167.537	155.075	86.158	84.561	78.553	84.130	**1.531.263**
İNCESU	175.076	203.418	130.861	143.834	162.253	160.670	210.231	183.311	114.665	90.219	152.127	161.720	**1.888.385**
TOPLAM (m³)	**7.657.543**	**7.172.810**	**7.508.431**	**7.777.874**	**7.844.560**	**8.299.443**	**9.598.174**	**9.428.651**	**8.493.334**	**8.022.450**	**7.811.420**	**7.694.305**	**97.308.995**
ORTALAMA GÜNLÜK (m³)	**247.017,52**	**256.171,79**	**242.207,45**	**259.262,47**	**253.050,32**	**276.648,10**	**309.618,52**	**304.150,03**	**283.111,13**	**258.788,71**	**260.380,67**	**248.203,39**	

2003-2007 ARASI SU ÜRETİM DURUMU

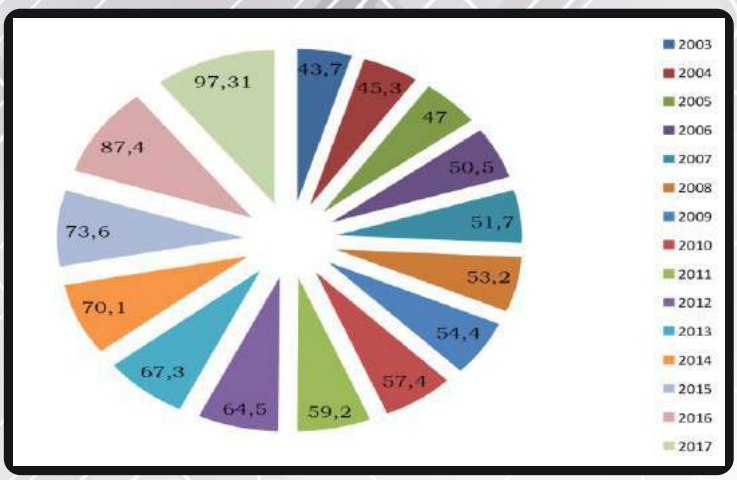


ENERJİ OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU

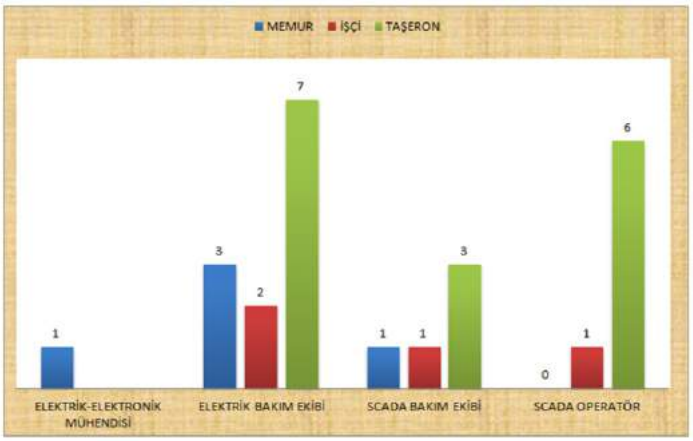

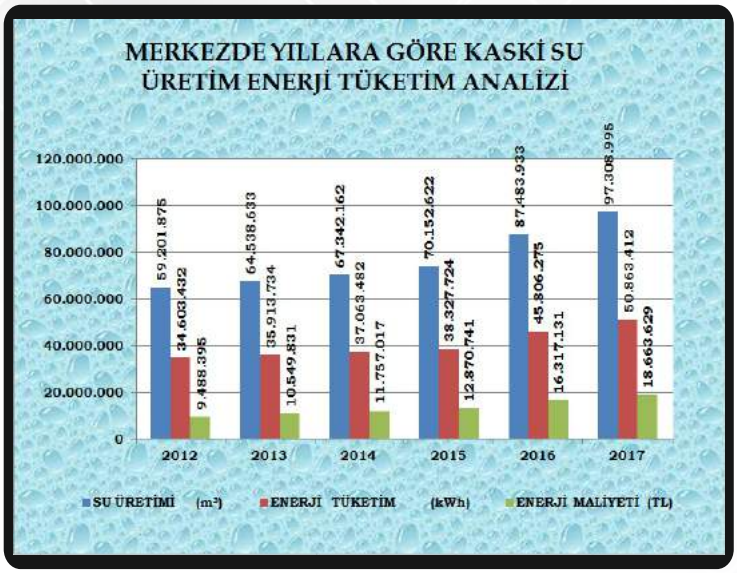

2017 yılı verilerine Mimarsinan - Toki ve İncesu verileri dahil edildiğinden bir miktar artış olmuştur.

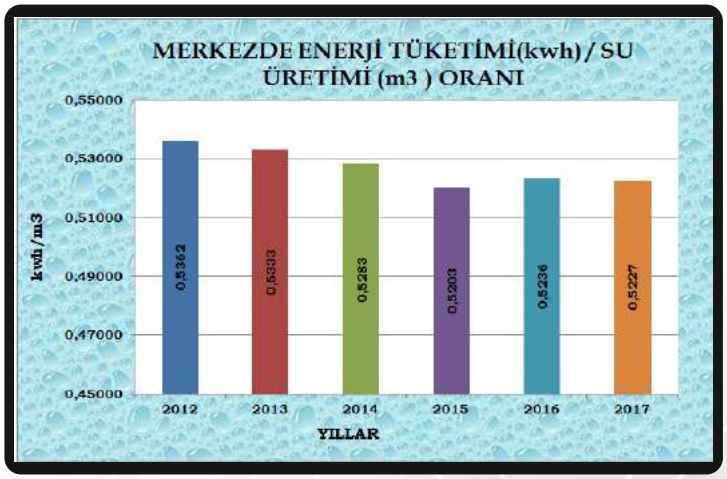

2017 yılında Scada Odası dizaynedilmiştir.





KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğümüzün faaliyetleri; evsel-endüstriyel atıksuların uzaklaştırılarak alıcı ortama verilmesine kadar olan Kanalizasyon şebekelerinin yapımı, bakımı, onarılması ve kanal görüntüleri alınarak arızaların giderilmesini kapsamaktadır. Bu faaliyetler; Kanal Arıza Servisi, Kanal Bağlantı Servisi, Yağmur Izgara Servisi ve İlçeler Servisi olarak dört servis ile gerçekleştirilmektedir. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımız düzenli olarak aşağıdaki çalışmaları yürütmektedir:

1. Atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.
2. Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi çalışmalarını yürütmek.
3. Şebekede oluşan arızaların insan ve çevre sağlığını etkilememesi için en kısa sürede giderilmesini sağlamak.
4. Kanalizasyon şebeke yapımı çalışmalarında işçiliğin ve kullanılan malzemelerin kalitesini yükselterek işletme ömrünü artırmak.
5. Personellerin kanalizasyon inşaatı ve işletme konusunda yeni teknikleri takip edebilmesi için malzeme kullanımı ve şebeke yapımı konusunda hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek.
6. İlimiz sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan bölgesel yerlere Kanalizasyon şebekesi ve abone bağlantıları yapmak.
7. Yeni açılan cadde ve sokaklarda yağmursuyu tahliyesi için yağmur ızgarası hatları ve yağmur ızgaraları yapmak.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 2017 yılında evrak servisine 3.600 adet evrak gelmiş ve kayıt altına alınmıştır. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı' nın 2017 yılı kalem servisinden de 951 adet evrak gönderilmiş ve kayıt altına alınmıştır.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü olmak üzere iki şube müdürlüğü ile faaliyetlerini yürütmektedir. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini 1 daire başkanı, 2 şube müdürü, 1 mühendis, 11 teknik personel, 1 sekreter, 1 evrak kalem memuru, 1 evrakçı, 6 ekip çavuşu, 106 kanal işçisi ile beraber; 2 adet otomobil, 3 adet panelvan, 4 adet 4x4 çift kabinli pikap, 7 adet 4x2 çift kabinli pikap, 10 adet büyük kombine kanal açma aracı, 11 adet faun kanal açma aracı, 2 adet vidanjör, 1 adet su tankeri, 2 adet lastik tekerlekli ekskavatör, 3 adet paletli ekskavatör, 17 adet beko-loder kepçe, 6 adet damperli 14 tonluk kamyon, 20 adet damperli 3 tonluk malzeme aracı ile birlikte yürütmektedir.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince 2017 yılı içerisinde toplam 135.970 mt kanalizasyon hattı yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaları bölge bazında ayıracak olursak; Merkez 5 ilçede Melikgazi ilçesinde 52.415 mt. kanalizasyon hattı, Kocasinan ilçesinde 56.727 mt. kanalizasyon hattı, Talas ilçesinde 7.065 mt. kanalizasyon hattı, İncesu ilçesinde 2.636 mt. kanalizasyon hattı, Hacılar ilçesinde 497 mt. kanalizasyon hattı ve diğer 11 ilçede de toplam olarak 26.630 mt. kanalizasyon hattı yapılmıştır.

2017 YILI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM FAALİYET										
İLÇELER	**Ø150-Ø200 (Pvc,Koriger ve Büz)**	**Ø300 (Koriger ve Büz)**	**Ø400 (Koriger ve Büz)**	**Ø500 (Koriger ve Büz)**	**Ø600 (Koriger ve Büz)**	**Ø700 (Koriger ve Büz)**	**Ø800 (Koriger ve Büz)**	**Ø900 (Koriger ve Büz)**	**Ø1000 (Koriger ve Büz)**	**TOPLAM**
MELİKGAZİ	24.497	21.134	2.602	677	2.342		1.163			**52.415**
KOCASİNAN	25.628	16.026	2.233	1.110	1.540				190	**46.727**
TALAS	3.496	3.160	187	85	103		34			**7.065**
HACILAR	235	261			1					**497**
İNCESU	1.416	1.203	7		10					**2.636**
AKKIŞLA	789	69	5	57						**920**
BÜNYAN	2.284	877	15	85	77					**3.338**
DEVELİ	4.965	200	208	31	3					**5.407**
FELAHİYE	1.018	1.633		6						**2.657**
ÖZVATAN	1.073									**1.073**
PINARBAŞI	1.495			2						**1.497**
SARIOĞLAN	187	12								**199**
SARIZ	4.012									**4.012**
TOMARZA	3.621	35	15	49	5					**3.725**
YAHYALI	2.572	213		60	5					**2.850**
YEŞİLHİSAR	818	87	6	40	1					**952**
TOPLAM	**78.106**	**44.910**	**5.278**	**2.202**	**4.087**		**1.197**		**190**	**135.970**
GENEL TOPLAM: 135.970 mt.										

KANALİZASYON İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kanal Bakım Onarım Şube Müdürlüğü kanal arıza ekiplerimiz tarafından ALO 185'e bildirilen veya dilekçe ile müracaatlarda yapılan incelemeler sonucu toplam 30.143 adet arıza başvurusunda bulunulmuş olup, aylık ortalama gelen arıza sayısı 2.512 adettir.



Bahsedilen bu arızaların Merkez İlçe Belediyeleri (Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu) sınırlarında olan kısmı 2017 yılı boyunca toplam 23.371 adet olup, aylık ortalama arıza sayısı 1.948 adettir.

Yeni eklenen ilçe sınırlarında olan kısmı ise 2017 yılında toplam 6.772 adet olup, aylık ortalama arıza sayısı 564 adettir. Ayrıca arıza bildirimi veya bilgi edinme için kanal arıza servisine 513 adet dilekçe ile başvurulmuş olup; bahsedilen dilekçelerin tamamı incelenmiştir.



Kanal arıza ekiplerinin görevleri arasında; kanal tıkanıklıklarına kanal açma aracı ile müdahale etmek, sağlıklı bilgi sistemine sahip olmak gerektiği için mevcut kanalizasyon hatlarının durumları ile ilgili veri tabanı oluşturmak, oluşturulan veri tabanında kanalizasyon sisteminde meydana gelen arızaların bilgisayar ortamında detaylı olarak kayıt altına alınması, bölgelere ve mahallelere göre sık arıza gelen kanalizasyon hatlarının temizliğinin

yapılarak kanal görüntüleme robotları ile kanal görüntülerinin alınması ve gerekli görülen kanalizasyon hatlarının tamiratının yapılması yer almaktadır.

Kanal arıza ekiplerince Merkez İlçelerde kepçe yardımı ile giderilen kanal arızası tamiratları için 2017 yılında kullanılan malzemeler şunlardır: 1.058 mt. Ø150 mm. boru, 1.013 mt. Ø200 mm. boru, 1.072 mt. Ø300 mm. boru, 66 mt. Ø400 mm. boru, 110 mt. Ø500 mm. Boru, 93 mt. Ø600 mm. boru, toplamda 3.412 mt. Boru ve 1.545 adet pik kapak kullanılmıştır.

KANALİZASYON BAĞLANTI VE YAĞMURSUYU UZAKLAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü kanal bağlantı ekiplerince kanalizasyon hattı yapımı ve atıksu abonesi kanalizasyon bağlantıları yapılmaktadır. 2017 yılında Melikgazi İlçesinde 370 adet, Kocasinan İlçesinde 280 adet, Talas İlçesinde 88 adet, İncesu İlçesinde 15 adet ve Hacılar İlçesinde 10 adet olmak üzere toplam 763 adet bina bağlantısı yapılmıştır.

Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü kanal bağlantı ekiplerince 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yeni bina bağlantısı ve muhtelif yerlerde kanalizasyon hattı bulunmayan sokak ve caddelere kanalizasyon hattı yapılmıştır. 2017 yılı Melikgazi ilçesinde 52.415 mt. abone bağlantısı ve hat yapımı, Kocasinan ilçesinde 46.727 mt. abone bağlantısı ve hat yapımı, Talas ilçesinde 7.065 mt. abone bağlantısı ve hat yapımı, İncesu ilçesinde 2.636 mt. abone bağlantısı ve hat yapımı, Hacılar ilçesinde 497 mt. abone bağlantısı ve kanalizasyon hattı yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan kanalizasyon hattı ve abone bağlantısı uzunluğu 2017 yılı içerisinde toplam 109.340 mt.'yi bulmuştur.



Aşağıda verilen tabloda kanalizasyon bağlantı ekiplerince kullanılan boru miktarları çaplarına göre verilmiştir. Toplamda abone bağlantısı ve şebeke olmak üzere yapılan hat uzunluğu 66.552 m.dir.

2017 YILI KANALİZASYON BAĞLANTI EKİBİ AYLIK FAALİYET TABLOSU										
AYLAR	**Ø150-Ø200 (Pvc, Koriger ve Büz)**	**Ø300 (Koriger ve Büz)**	**Ø400 (Koriger ve Büz)**	**Ø500 (Koriger ve Büz)**	**Ø600 (Koriger ve Büz)**	**Ø700 (Koriger ve Büz)**	**Ø800 (Koriger ve Büz)**	**Ø900 (Koriger ve Büz)**	**Ø1000 (Koriger ve Büz)**	**TOPLAM**
OCAK	200	48		1						**249**
ŞUBAT	354	1.371	97	4	9					**1.835**
MART	1.726	3.456	260	6	19		34			**5.501**
NİSAN	2.651	2.859	806	26	85		88			**6.515**
MAYIS	2.279	3.067	698	26	24		463			**6.557**
HAZİRAN	2.565	2.432	13	1	14					**5.025**
TEMMUZ	3.378	3.433	6	13	20				6	**6.856**
AĞUSTOS	3.498	3.539	11	63	14		84			**7.209**
EYLÜL	2.102	5.187	9		58		126		96	**7.578**
EKİM	2.921	3.373	652	7	19		402		88	**7.462**
KASIM	2.437	2.832	234	5	2.246					**7.754**
ARALIK	781	2.313	306	1	610					**4.011**
TOPLAM	**24.892**	**33.910**	**3.092**	**153**	**3.118**		**1.197**		**190**	**66.552**
GENEL TOPLAM: 66.552 mt.										

YAĞMUR IZGARA SERVİSİ

Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü Yağmur Izgara Ekibi; Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan cadde, sokak ve bulvarlarda ızgara yapımı görevini gerçekleştirmektedir.





Aşağıda verilen tabloda yağmur ızgara ekiplerince yapılan yağmursuyu hatları uzunlukları verilmiştir. Yağmur ızgara ekiplerince yağmur ızgara hattı yapımı çalışmalarında 2017 yılı içerisinde toplam 39.376 mt. yağmur ızgara hattı yapılmıştır.

2017 YILI YAĞMUR IZGARA EKİBİ AYLIK FAALİYET TABLOSU

AYLAR	Ø150-Ø200 Pvc, Koriger Büz	Ø300 Koriger Büz	Ø400 Koriger Büz	Ø500 Koriger Büz	Ø600 Koriger Büz	Ø700 Koriger ve Büz	Ø800 Koriger ve Büz	Ø900 (Koriger ve Büz)	Ø1000 (Koriger ve Büz)	TOPLAM
OCAK	388	37		3						**428**
ŞUBAT	117	233		15	4					**369**
MART	1.626	150	976	114	1					**2.867**
NİSAN	2.227	973	555	116	1					**3.872**
MAYIS	1.743	265		177	2					**2.187**
HAZİRAN	1.942	793	1	159	4					**2.899**
TEMMUZ	2.679	892	8	49	1					**3.629**
AĞUSTOS	3.762	559	6	150	10					**4.487**
EYLÜL	3.577	390		224	212					**4.403**
EKİM	4.387	920	195	318	543					**6.363**
KASIM	3.756	750	4	240	3					**4.753**
ARALIK	2.105	840	126	44	4					**3.119**
TOPLAM	**28.309**	**6.802**	**1.871**	**1.609**	**785**					**39.376**

GENEL TOPLAM: 39.376 mt.



Ayrıca şehrin muhtelif yerlerinde çalınan ızgara kapaklarının değişimi işini de yağmur ızgara ekipleri gerçekleştirmektedir.

YENİ YAPILAN – ÇALINAN IZGARA		
AYLAR	**YENİ YAPILAN IZGARA**	**ÇALINAN IZGARALARIN YERİNE YENİSİNİN KONULMASI**
OCAK	43	0
ŞUBAT	35	7
MART	150	1
NİSAN	166	8
MAYIS	232	4
HAZİRAN	208	1
TEMMUZ	266	0
AĞUSTOS	412	4
EYLÜL	380	3
EKİM	390	1
KASIM	319	0
ARALIK	192	0
TOPLAM	**2.793 adet**	**29 adet**

Tablodan da anlaşılacağı üzere 2017 yılında yağmur ızgara ekipleri tarafından toplam yapılan yağmur ızgarası 2.793 adet olup, yapılan bu ızgaraların 1.017 adedi Melikgazi bölgesinde, 1.662 adedi Kocasinan bölgesinde, 74 adedi Talas bölgesinde, 1 adedi İncesu bölgesinde, 6 adedi Akkışla bölgesinde, 33 adedi Bünyan bölgesinde yapılmıştır. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerinde hırsızlık maksadı ile çalınan 29 adet yağmur ızgara kapağı yenisi ile değiştirilmiştir.

İLÇELER SERVİSİ

6360 sayılı kanunla hizmet alanımıza giren ilçelerde İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ile ortak kullanılan ekiplerce 30 Mart 2014 tarihi itibarı ile işletme, bakım ve boru yenileme faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Yeni eklenen ilçe sınırlarında olan kısmında 2017 yılında toplam 6.379 adet arıza olup; aylık ortalama arıza sayısı 532 adettir. Ayrıca arıza bildirimi veya bilgi edinme için kanal arıza servisine 409 adet dilekçe ile başvurulmuş olup, bahsedilen dilekçelerin tamamına işlem yapılmıştır.

İLÇELER		Ø150-Ø200 (Pvc,Koriger ve Büz)	Ø300 (Koriger ve Büz)	Ø400 (Koriger ve Büz)	Ø500 (Koriger ve Büz)	Ø600 (Koriger ve Büz)	TOPLAM	Faunla Açılan Kanal Arızası
AKKIŞLA	Merkez	272	69	0	52	0		95
	Köyler	517	0	5	5	0		
		789 mt.	**69 mt.**	**5 mt.**	**57 mt.**	**0 mt.**	**920 mt.**	**95**
BÜNYAN	Merkez	1.898	853	15	82	77		794
	Köyler	386	24	15	3	0		
		2.284 mt.	**877 mt.**	**15 mt.**	**85 mt.**	**77 mt.**	**3.338 mt.**	**794**
DEVELİ	Merkez	4.118	136	158	31	0	4.443	2.052
	Köyler	847	64	50	0	0	964	
		4.965 mt.	**200 mt.**	**208 mt.**	**31 mt.**	**3 mt.**	**5.407 mt.**	**2.052**
FELÂHİYE	Merkez	145	130	0	2	0	277	150
	Köyler	873	1.503	0	4	0	2.380	
		1.018 mt.	**1.633 mt.**	**0 mt.**	**6 mt.**	**0 mt.**	**2.657 mt.**	**140**
ÖZVATAN	Merkez	363	0	0	0	0	363	63
	Köyler	710	0	0	0	0	710	
		1.073 mt.	**0 mt.**	**0 mt.**	**0 mt.**	**0 mt.**	**1.073 mt.**	**63**
PINARBAŞI	Merkez	855	0	0	2	0	855	563
	Köyler	640	0	0	0	0	640	
		1.495 mt.	**0 mt.**	**0 mt.**	**2 mt.**	**0 mt.**	**1.497 mt.**	**563**
SARIOĞLAN	Merkez	38	0	0	0	0	38	295
	Köyler	149	12	0	0	0	161	
		187 mt.	**12 mt.**	**0 mt.**	**0 mt.**	**0 mt.**	**199 mt.**	**295**
SARIZ	Merkez	1.263	0	0	0	0	1.263	362
	Köyler	2.749	0	0	0	0	2.749	
		4.012 mt.	**0 mt.**	**0 mt.**	**0 mt.**	**0 mt.**	**4.012 mt.**	**362**
TOMARZA	Merkez	1.314	24	15	22	0	1.375	972
	Köyler	2.307	11	0	27	5	2.350	
		3.621 mt.	**35 mt.**	**15 mt.**	**49 mt.**	**5 mt.**	**3.725 mt.**	**972**
YAHYALI	Merkez	1.944	210	0	51	3	2.208	1.101
	Köyler	628	3	0	9	2	642	
		2.572 mt.	**213 mt.**	**0 mt.**	**60 mt.**	**5 mt.**	**2.850 mt.**	**1.101**
YEŞİLHİSAR	Merkez	437	49	0	32	1	519	335
	Köyler	381	38	6	8	0	433	
		818 mt.	**87 mt.**	**6 mt.**	**40 mt.**	**1 mt.**	**952 mt.**	**335 ad.**
GENEL TOPLAM		**22.834 mt.**	**3.126 mt.**	**249 mt.**	**330 mt.**	**91 mt.**	**26.630 mt.**	**6.379 ad.**

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2017 YILINDA İLÇELERDE YAPILAN İŞLER		
İLÇELER	DÖŞENEN HAT	GİDERİLEN ARIZA
MELİKGAZİ	52.415	10.500
KOCASİNAN	46.727	10.167
TALAS	7.065	1.923
HACILAR	497	206
İNCESU	2.636	575
AKKIŞLA	920	95
BÜNYAN	3.338	794
DEVELİ	5.407	2.052
FELAHİYE	2.657	140
ÖZVATAN	1.073	63
PINARBAŞI	1.497	563
SARIOĞLAN	199	295
SARIZ	4.012	362
TOMARZA	3.725	972
YAHYALI	2.850	1.101
YEŞİLHİSAR	952	335
GENEL TOPLAM	135.970	30.143

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İL VE İLÇELERDE YAPILAN İŞLER										
İLÇELER	2014		2015		2016		2017		TOPLAM	
	YAPILAN KANAL	FAUNLUK ARIZA	YAPILAN KANAL	FAUNLUK ARIZA	YAPILAN KANAL	FAUNLUK ARIZA	YAPILAN KANAL	FAUNLUK ARIZA	YAPILAN KANAL	FAUNLUK ARIZA
MELİKGAZİ	30.287	7.305	39.630	9.702	39.972	10.454	52.415	10.500	162.304	37.961
KOCASİNAN	26.104	5.819	40.400	9.229	43.793	10.106	46.727	10.167	157.024	35.321
TALAS	8.112	1.254	6.988	1.859	7.251	1.955	7.065	1.923	29.416	6.991
HACILAR	1.413	133	688	173	602	223	497	206	3.200	735
İNCESU	3.483	311	1.532	345	1.469	335	2.636	575	9.120	1.566
AKKIŞLA	361	37	1.335	61	1.042	106	920	95	3.658	299
BÜNYAN	3.006	432	6.163	561	8.718	746	3.338	794	21.225	2.533
DEVELİ	1.364	449	3.751	1.326	3.107	2.153	5.407	2.052	13.629	5.980
FELAHİYE	330	44	1.331	79	1.558	97	2.657	140	5.876	360
ÖZVATAN	819	54	1.361	61	983	59	1.073	63	4.236	237
PINARBAŞI	592	104	1.643	221	2.220	436	1.497	563	5.952	1.324
SARIOĞLAN	1.252	109	320	153	324	244	199	295	2.095	801
SARIZ	675	101	1.671	218	1.805	303	4.012	362	8.163	984
TOMARZA	2.572	653	2.919	864	2.860	912	3.725	972	12.076	3.401
YAHYALI	1.833	427	4.506	714	3.136	1.033	2.850	1.101	12.325	3.275
YEŞİLHİSAR	3.401	104	973	309	1.927	290	952	335	7.253	1.038
TOPLAM	85.604	17.336	115.211	25.875	120.767	29.452	135.970	30.143	457.552	102.806

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğü, Kayseri mücavir alanı içerisinde oluşan ve kanalizasyon hatları ile Atıksu Arıtma Tesislerine ulaştırılan atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak, Atıksu Arıtma Tesislerini işletmek, tesislerden çıkan arıtma çamurlarının ve ızgara atıklarının herhangi bir çevre problemi oluşturmadan güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlamakta ve ayrıca Kayseri mücavir alanı içerisine yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesislerinin proje kontrolü, yapılmakta olan tesislerin yapım kontrolü ve yapılmış tesislerin işletme kontrollüğünü yapmakla görevlerini yerine getirmektedir.

2017 YILI FAALİYETLERİ ÖZETİ

Daire başkanlığımızca ilimiz sınırları mücavir alanı içerisinde Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Yeşilhisar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Yahyalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Pınarbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Sarıoğlan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Başakpınar Atıksu Arıtma Tesisi, Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi, Süksün Atıksu Arıtma Tesisi, Ebiç Atıksu Arıtma Tesisi, Gaziler Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Çiflik Biyolojik Atıksu Arıtma tesislerinin işletilmesi.

İlimiz mücavir alanı içerisindeki Develi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Tomarza Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin işletme kontrollüğünün yapılması.

İlimiz mücavir alanı içerisinde olan Sarız, Bünyan, Akkışla ve Özvatan İlçelerine yapılması planlanan Atıksu Arıtma Tesisleri projesi işinin kontrolörlüğünün yapılması.

İlimiz mücavir alanı içerisinde olan Bünyan, İncesu, Kocasinan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerine bağlı muhtelif mahallelere yapılacak olan 19 adet atıksu arıtma tesisi ihale sürecinin takibinin yapılması.

İlimiz Şehir merkezinde 11 adet, İlçelerde ise Pınarbaşı 3 adet, Bünyan 1 adet, Yeşilhisar 3 adet ve Develi 1 adet ile toplamda 19 adet yağmur ve atıksu terfi istasyonlarının arıza ve bakımlarının yapılması.

KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

Kayseri ve civarında oluşan atıksuların tamamına yakını KASKİ ana kolektöründe toplanmaktadır. 31.12.2004 tarihli 25.687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne göre yapılması yasal bir zorunluluk olan arıtma tesisi, 07.08.2003 tarihinden itibaren Kayseri ve civarındaki yerleşim birimlerinin atıksularını kabul etmeye başlamış olup çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde bertaraf ederek Kızılırmak'a bağlanan Karasu'ya deşarj etmektedir. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin inşaat işleri ve tüm proses ünitelerinin tam anlamıyla çalışması 20 Şubat 2004 tarihinde tamamlanmıştır. Bu tarihten itibaren başlayan bir yıllık işletme ve bakımı "VaTech Wabag - Tekser" konsorsiyumu tarafından yapılmış ve 20 Şubat 2005 tarihinden itibaren KASKİ kendi personeliyle işletmeye devam etmektedir.

Arıtma Tesisi çıkış suyu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nin ön gördüğü alıcı ortama deşarj standartları sağladığı gibi sorumluluğu olmadığı halde karbon gideriminin yanı sıra azot ve fosfor giderimi de yaparak AB standartlarında bir çıkış suyu kalitesini sağlamaktadır.

Atıksuların işlendiği arıtma tesisinde, ham çamur stabilize edilerek ekolojik yönden kullanıma uygun hale getirilirken biogaz, getirildikten sonra arıtma çamuru elde edilmektedir. Üretilen gaz (biogaz) ile elektrik üretilmekte ve tesisin elektrik ihtiyacının bir kısmı buradan karşılanmaktadır. Elektrik üretilirken elde edilen ısı enerjisinden kış aylarında tesisteki binaların ısıtılması sağlanmakta ve tesiste sürekli sıcak su kullanılmaktadır.

İşlenmiş arıtma çamurları (Biyokatılar), bünyelerinde dirençli organik bileşikleri ve bitki gelişimi için gerekli makro ve mikro besin elementlerini bulundurmaktadırlar. Azot ve fosfor içerikleri biyokatıların gübre değerini ortaya koymakta, organik madde içerikleri de bu materyalin toprak ıslah etme özelliği açısından ayrı bir önem taşıdığını göstermektedir. Biyokatıların arazide, tarım alanlarında, ıslah amaçlı, yeşil alanlarda ve ağaçlandırma alanlarında kullanılması mümkündür. Arıtma tesisinden günlük 350 ton arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 18 ton kum ve 7 ton ızgara atığı (kaba, ince ve strein pres) çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisi öncesine nazaran günlük 375 ton arıtma malzemesi Kızılırmağı besleyen Karasu'ya verilmemektedir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir.

KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İŞLEYİŞİ

Atıksu Yolu: Ana kolektör hattıyla tesise ulaşan atıksu ilk önce 9 cm aralıklı giriş ızgarasından geçerek ileriki ünitelerde atıksuyun cazibeyle akması için yaklaşık 12 m yükseltilir. Yükseltilen atıksu önce 3 cm aralıklı kaba ızgaradan, sonra 3 mm aralıklı ince ızgaradan geçirilerek mekanik aksamlara zarar verecek maddeler atıksudan ayrılır. Izgara ünitesinden çıkan atıksu iki bölmeli kum-yağ tutucuya girerek inorganik madde olan kumlar havuz dibine hava yardımıyla çökertilerek, yüzer maddelerde havuz yüzeyinde biriktirilerek atıksudan ayrılır. Atıksu sonra ön çöktürme havuzlarına girer ve debiye bağlı olarak burada dinlendirildikten sonra savaklanan atıksu selektör/bio-fosfor tankına girer. Tank girişinde ham atıksu ile geri devirden gelen çamur karıştırılır. Bu tankta mikroorganizmalar oksijensiz bir ortama tabi tutularak bünyelerindeki orto-fosfatları atıksuya vermeleri sağlanır. Tank çıkışında atıksu havalandırma havuzlarına iletilerek nitrifikasyon-denitrifikasyon olaylarının gerçekleşmesi sağlanarak atıksudaki azot, fosfor ve diğer kirleticilerin giderilmesi sağlanır. Havalandırma çıkış suyu son çöktürme ünitesine iletilir. Son ünite olan son çöktürmede debiye bağlı olarak atıksu dinlendirilerek savaklanan atıksu Karasu Deresine, çöken çamurda havuz dibinden alınarak cazibeyle geri devir pompa istasyonuna akar.

Çamur Yolu: Atıksu, ön çöktürme havuzunda dinlendirildikten sonra havuz dibine çökelen çamur cazibeyle ön çamur pompa istasyonuna akar. Çamur ilk önce, çamur ızgara-presi makinelerine girerek hem çamur yoğunlaştırma ve çürütme tankında meydana gelen katılaşma hemde susuzlaştırma ünitesindeki problemlere sebep olan kıl, tekstil lifi gibi malzemelerin çamur bünyesinden ayrılması sağlanır. Sonra ön çamurun katı madde muhtevasının artması için ön yoğunlaştırmaya basılarak dinlendirilir. Dinlendirilen çamur havuz dibinden emilerek çürütme tankına basılır. İlk ham çamur çürütme tankına basılırken çürümüş çamurla karıştırılır ve ısı eşanjöründe 37 dereceye ısıtılır. Ham çamurun çürütme tankı içerisinde homojen bir şekilde dağıtılması için tank içerisinde bulunan mikser yardımıyla 24 saat karıştırılır. 20 gün sonunda taşkan çamur son yoğunlaştırmaya, tank üstünde biriken metan gazı da gaz tankına iletilir. Son yoğunlaştırma tankı, susuzlaştırma ile çürütme tankı arasında bir nevi depo görevi görür. Susuzlaştırma ünitesine gerek son yoğunlaştırmadan, gerekse de geri devir pompa istasyonundan gelen çamur karıştırılarak belt-preslere basılır. Beltpreslere basılmadan hemen önce susuzlaştırmaya yardımcı eleman olarak seyreltilmiş polimer dozlanır ve çamur %18-20 katı madde muhtevasında çamur depolama sahasında depolanır. Gaz tankında depolanan metan gazıda ısı-güç ünitesindeki gaz jeneratörlerinde yakılarak elektrik enerjisi elde edilir. Ve bu enerji tesis içerisinde kullanılır.

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2017 Yılı Aylık Debiler		
Aylar	**Ort. Debi (m^3/gün)**	**Giren Atıksu (m^3/ay)**
Ocak	160.540	4.976.746
Şubat	160.943	4.506.401
Mart	169.938	5.264.986
Nisan	164.872	4.946.152
Mayıs	144.300	4.473.308
Haziran	155.036	4.651.073
Temmuz	175.866	5.100.113
Ağustos	164.049	5.085.504
Eylül	155.348	4.660.431
Ekim	156.270	4.844.385
Kasım	142.890	3.858.017
Aralık	154.374	4.785.590
TOPLAM		**57.152.706**

Atıksu Arıtma Tesisleri Çıkış Suyu Standart Değerleri		
Parametre	**AB Çıkış Standartları**	**Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 21.4**
		Kompozit Numune 24 Saatlik (mg/l)
$BOİ_5$	25 mg/l veya %70-90 verim	35
KOİ	125 mg/l veya %75 verim	90
TN	10 mg/l veya %70-80 verim	-
TP	1 mg/l veya %80 verim	-
pH	6-9	6-9
AKM	35 mg/l veya %90 verim	25

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2017 Yılı Ortalama Giriş Ve Çıkış Atıksu Parametre Değerleri			
Parametre	**Giriş Değerleri (mg/l)**	**Çıkış Değerleri (mg/l)**	**Verim (%)**
AKM	573	18	96,9
BOİ	491	9	98,2
KOİ	1.063	53	95,0
Toplam N	73	7	90,4
Toplam P	10	0,8	92,0

Pınarbaşı Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 1.622 m³/gün
- Proses: İleri Biyolojik
- İşletmeye Alma Tarihi: 03/03/2015



PINARBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ 2017 YILI ORTALAMA VERİLERİ				
Parametre	**AAT Giriş**	**AAT Çıkış**	**SKKY Tablo 21-3 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune**	**Verim (%)**
AKM	83	15	45	81,9
KOİ	189	30	140	84,1
BOİ5	117	6	50	94,9
2017 Yılı Toplam Arıtlan Atıksu Miktarı 780.000 m³				

Yahyalı Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 3.921 m³/gün
- Proses: İleri Biyolojik
- İşletmeye Alma Tarihi: 15/06/2012



YAHYALI ATIKSU ARITMA TESİSİ 2017 YILI ORTALAMA VERİLERİ				
Parametre	**AAT Giriş**	**AAT Çıkış**	**SKKY Tablo 21-3 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune**	**Verim (%)**
AKM	157	23	45	85,4
KOİ	406	38	140	90,6
BOİ5	203	10	50	95,1
2017 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı 1.684.358 m³				

Talas Başakpınar Atıksu Artıma Tesisi

- Kapasite: 500 m³/gün
- Proses: Biyolojik Ardışık Kesikli Reaktör
- İşletmeye Alma Tarihi: 19/11/2013



BAŞAKPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2017 YILI ORTALAMA VERİLERİ				
Parametre	**AAT Giriş**	**AAT Çıkış**	**SKKY Tablo 21-2 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune**	**Verim (%)**
AKM	285	40	60	86,0
KOİ	823	58	160	93,0
BOİ5	382	12	50	96,9
2017 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı 187.189 m³				

Melikgazi Gürpınar Atıksu Artıma Tesisi

- Kapasite: 1.100 m³/gün
- Proses: Biyolojik Ardışık Kesikli Reaktör
- İşletmeye Alma Tarihi: 19/12/2013



GÜRPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2017 YILI VERİLERİ				
Parametre	**AAT Giriş**	**AAT Çıkış**	**SKKY Tablo 21-3 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune**	**Verim (%)**
AKM	168	11	45	93,5
KOİ	485	30	140	93,8
BOİ5	172	8	50	95,3
2017 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı 404.781 m³				

İncesu Süksün Atıksu Artıma Tesisi

- Kapasite: 300 m³/gün
- Proses: Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi: 19/03/2014



SÜKSÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ 2017 YILI VERİLERİ				
Parametre	**AAT Giriş**	**AAT Çıkış**	**SKKY Tablo 21-2 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune**	**Verim (%)**
AKM	177	25	60	85,9
KOİ	275	40	160	85,5
BOİ5	121	8	50	93,4
2017 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı 117.682 m³				

Kocasinan Ebiç Atıksu Artıma Tesisi

- Kapasite: 500 m³/gün
- Proses: Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi: 19/03/2014



EBİÇ ATIKSU ARITMA TESİSİ 2017 YILI ORTALAMA VERİLERİ				
Parametre	**AAT Giriş**	**AAT Çıkış**	**SKKY Tablo 21-2 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune**	**Verim (%)**
AKM	81	15	60	81,5
KOİ	232	27	160	88,4
BOİ5	105	6	50	94,3
2017 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı 96.811 m³				

Yeşilhisar Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 1.680 m³/gün
- Proses: Biyolojik (Aktif Çamur + P)
- İşletmeye Alma Tarihi: 25/09/2014



YEŞİLHİSAR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2017 YILI ORTALAMA VERİLERİ				
Parametre	**AAT Giriş**	**AAT Çıkış**	**SKKY Tablo 21-3 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune**	**Verim (%)**
AKM	644	24	45	96,3
KOİ	847	41	140	95,2
BOİ5	349	8	50	97,7
2017 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı 626.698 m³				

Sarıoğlan Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 500 m³//gün
- Proses: Biyolojik (Aktif Çamur)
- İşletmeye Alma Tarihi: 24/12/2014



SARIOĞLAN ATIKSU ARITMA TESİSİ 2017 YILI ORTALAMA VERİLERİ				
Parametre	**AAT Giriş**	**AAT Çıkış**	**SKKY Tablo 21-2 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune**	**Verim (%)**
AKM	159	35	60	78,0
KOİ	284	50	160	82,4
BOİ5	91	16	50	82,4
2017 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı 115.000 m³				

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

İdarenin görev alanı içerisindeki yerlerde, mevcut ve geleceğine yönelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapısının kurulması, sağlıklı çalışmasıyla ilgili olarak arıtma tesisi, kuyu binaları, terfii binaları, içmesuyu depoları, vantuz odaları, debimetre odaları, basınç kırıcı odaları, su koçu darbe önleme odaları ile personel ekip evleri gibi her türlü inşaat, mekanik, tesisat, elektrik ve otomasyon gibi işleri dahil olmak üzere gerekli tüm imalatı, tamir ve tadilatını yapmak veya yaptırmak, ihale ve teminini gerçekleştirmek.

Tamir tadilat işlerine ait uygulama projeleri ile diğer birimlerce yapılacak yapım işlerine ait uygulama projelerinin keşif, teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmalarını tamamlamak ve ilgili mevzuata göre ihalesini ve teminini yapmak, bu işlerin yapım sürecini kontrol ve takip etmek, kısmi proje revizelerini yaptırmak ve işleri sonuçlandırmak. Bu doğrultuda 2017 yılı içerisinde birimimiz elemanlarınca gerçekleştirilen projeler ve kapsamları;

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NCA 2017 YILI İNŞAAT SEZONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIM PROJELERİ

A- İÇMESUYU YATIRIMLARI	
A1 - İHALE YOLUYLA YAPILAN İÇMESUYU İŞLERİ	
S.NO	**İŞİN ADI**
1	2016 YILI GESİ KISMİ İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞAATI (2016 % 50 - 2017 % 50 SÂRİ)
2	2017 YILI 1. GRUP 15 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2017 - 2018 SARÎ)
3	2017 YILI 2. GRUP 23 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2017 - 2018 SARÎ)
4	AKKIŞLA, BÜNYAN, FELÂHİYE, HACILAR, İNCESU, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, ÖZVATAN, SARIOĞLAN, TALAS İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SARÎ)
5	AKKIŞLA İLÇESİ GÖMÜRGEN MAHALLESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
6	ALİ DAĞI İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI
7	ANNELER PARKI TERFİ MERKEZİ ENERJİ TEMİNİ
8	BÜNYAN İLÇESİ BURHANİYE VE KARDEŞLER MAHALLELERİ İÇMESUYU TEMİNİ VE İSALE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
9	BÜNYAN İLÇESİ KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ İÇMESUYU TERFİİ VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
10	BÜNYAN İLÇESİ PINARBAŞI İÇMESUYU KAYNAĞI KAPTAJ BİNASI YAPIMI (2016 - 2017 SARÎ)
11	BÜNYAN İLÇESİ SAMAĞIR MAHALLESİ İÇMESUYU HATTI İNŞAATI
12	DEVELİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI

13	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SARÎ)
14	DEVELİ, YAHYALI, PINARBAŞI, FELÂHİYE, TOMARZA, YEŞİLHİSAR İLÇELERİNDE KUYU BİNALARI YAPILMASI
15	ERCİYES KOÇDAĞI İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI
16	ERCİYES TURİZM BÖLGESİNE İÇMESUYU ARAŞTIRMA SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
17	FELÂHİYE İLÇESİ KAYAPINAR MAHALLESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
18	GERMİRALTI - ANAYURT DEPO TERFİİ VE İSALE HATTI VE ANNELER PARKI KUYU BAĞLANTISI YAPILMASI
19	HİSARCIK GÜLMERSU BÖLGESİ İÇMESUYU TERFİ VE İSHALE HATLARI İLE TESİSLERİ İNŞAATI (2015 - 2017 SARÎ)
20	HİSARCIK - KIRANARDI BÖLGELERİNDE İÇMESUYU TEMİNİ, İSALE HATTI VE TESİSLERİ YAPILMASI
21	İLDEM BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
22	İNCESU İLÇESİ KIZILÖREN YAYLA KÜMEEVLER İÇMESUYU HATTI İNŞAATI
23	İNCESU VE BAĞLI BÖLGELERİNE İÇMESUYU TEMİNİ İÇİN GEREKLİ TESİSLER İLE İÇMESUYU HATLARININ YAPILMASI (2014 - 2016 SARÎ)
24	KOCASİNAN İLÇESİ MEVLANA MAHALLESİ İÇMESUYU DAĞITIM HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
25	KOCASİNAN İLÇESİ HIRKA MAHALLESİ İÇMESUYU TERFİİ HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
26	KOCASİNAN İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
27	KOCASİNAN, MELİKGAZİ, TALAS, HACILAR, İNCESU İLÇELERİNDE KUYU BİNALARI YAPILMASI
28	KUŞÇU BOYACI TERFİ VE İSALE HATLARI İLE TESİSLERİ İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
29	MELİKGAZİ İLÇESİ ALTINOLUK VE YENİKÖY MAHALLELERİ KISMİ İÇMESUYU DAĞITIM HATTI İNŞAATI
30	MELİKGAZİ İLÇESİ GESİ ALBAY İSMAİL SEYDİŞEHİR KIŞLASI İÇMESUYU TERFİİ HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
31	MELİKGAZİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
32	MUHTELİF BÖLGELERDE TRAFO POSTASI VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPILMASI
33	MUHTELİF İÇMESUYU TESİSLERİNDE ENERJİ NAKİL HATTI VE GÜÇ ARTIRIMI YAPILMASI
34	MÜCAVİR ALANDA MUHTELİF YERLERE 19 ADET SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2016 - 2017 SARÎ)
35	PINARBAŞI İLÇESİ PAZARÖREN MAHALLESİ İÇMESUYU İSALE HATTI İNŞAATI
36	PINARBAŞI, SARIZ İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SARÎ)
37	TALAS İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE 8 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI (2016 - 2017 SARÎ)
38	TALAS KISMİ İÇMESUYU İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)

39	TOMARZA İLÇESİ KEVENAĞIL MAHALLESİ İÇMESUYU İNŞAATI
40	YAHYALI İLÇESİ ÇUBUK HARMANI İÇMESUYU İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
41	YEŞİLHİSAR İLÇESİ GÜLBAYIR MAHALLESİ İÇMESUYU İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
A2 - DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN İÇMESUYU İŞLERİ	
42	AKKIŞLA İLÇESİ GANİŞEYH MAHALLESİ DEPO İLE MASLAK ARASI İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ
43	AKKIŞLA İLÇESİ GANİŞEYH MAHALLESİ KAYNAK İLE MASLAK ARASI İÇMESUYU HATTI İNŞAATI
44	AKKIŞLA İLÇESİ YEŞİL MAHALLE İÇMESUYU ABONE BAĞLANTILARININ YAPILMASI
45	AKKIŞLA İLÇESİ YUKARI VE ŞEN MAHALLELERİ İÇMESUYU ABONE BAĞLANTILARININ YAPILMASI
46	ARGINCIK VE BUĞDAYLI MAHALLELERİ İÇMESUYU İSALE HATLARI İNŞAATI
47	BÜNYAN CEZAEVİ SU TEMİN PROJESİ 100 KVA TRAFO POSTASI VE ENERJİ NAKİL HATTI
48	BÜNYAN İLÇESİ DERVİŞAĞA, BAYRAMLI, YENİCE VE İBRAHİMBEY MAHALLELERİ İÇMESUYU HATLARININ ABONE SAYACINA KADAR UZATILMASI
49	ÇAYBAĞLARI İLE KARPUZATAN TESİSLERİNDEKİ TERFİ BİNALARININ TAMİR TADİLATLARI VE KARPUZATAN TESİSİNDE DEBİMETRE ODASI YAPILMASI
50	FELÂHİYE İLÇESİ KARAŞEYH MAHALLESİ ESKİ YERLEŞİM BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
51	FELÂHİYE İLÇESİ KARAŞEYH MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
52	GESİ MAHALLESİ ALBAY İSMAİL SEYDİŞEHİRLİ KIŞLASI İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
53	İNCESU HAMURCU MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
54	KOCASİNAN İLÇESİ BAYRAMHACI MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU ENERJİ TEMİNİ
55	KOCASİNAN İLÇESİ CIRGALAN MAHALLESİ (SUKAYPARK) İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
56	KOCASİNAN MAHZEMİN MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
57	ÖRNEKEVLER MAHALLESİ ÇİÇEK VE AY SOKAKLARINA İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPILMASI
58	SARIOĞLAN ÇİFTLİK MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
59	TALAS İLÇESİ MEVLANA MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
60	YAHYALI İLÇESİ YEŞİLKÖY MAHALLESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI
61	YEŞİLHİSAR İLÇESİ KAYADİBİ MAHALLESİ İÇMESUYU ELEKTRİK ABONESİNİN GÜCÜNÜN 100 KVA'YA ARTTIRILMASI

B - KANALİZASYON YATIRIMLARI	
B1 - İHALE YOLUYLA YAPILAN KANALİZASYON İŞLERİ	
S.NO	**İŞİN ADI**
1	2016 YILI GESİ KISMİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
2	2016 YILI KOCASİNAN - İNCESU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
3	2016 YILI MELİKGAZİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
4	2016 - 2017 YILI TALAS - HACILAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
5	2017 YILI KOCASİNAN, TALAS, HACILAR, İNCESU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
6	2017 YILI MELİKGAZİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
7	AKİN, ELAGÖZ, HASANARPA, YAZIR KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
8	AKKIŞLA, BÜNYAN, SARIOĞLAN, FELÂHİYE, ÖZVATAN, PINARBAŞI VE SARIZ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
9	BÜNYAN İLÇESİ KAHVECİ VE TOPSÖĞÜT MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
10	BÜNYAN İLÇESİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2017 % 20 - 2018 % 80 SARÎ)
11	BÜNYAN İLÇESİ KARATAY MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
12	BÜNYAN İLÇESİ KÖPRÜBAŞI, SAMAĞIR MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
13	DEVELİ İLÇESİ ÇAYIRÖZÜ, KULPAK, SOYSALLI MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
14	DEVELİ İLÇESİ GÜMÜŞÖREN MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
15	DEVELİ İLÇESİ KARACAÖREN VE SARICA MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
16	DEVELİ İLÇESİ SARAYCIK, SARIKAYA VE YAYLACIK MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
17	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI, YEŞİLHİSAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
18	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI VE YEŞİLHİSAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)

19	İLDEM BÖLGESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
20	İNCESU İLÇESİ TAHİRİNİ MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
21	KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ BİYOLOJİK GAZ TANKI YAPIMI (2016 - 2017 SARÎ)
22	KOCASİNAN BULVARI – 30 AĞUSTOS KAVŞAĞI KISMİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI
23	KOCASİNAN İLÇESİ EMMİLER MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
24	KOCASİNAN İLÇESİ HÖBEK VE FELÂHİYE ACIRLI MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
25	KOCASİNAN İLÇESİ KAŞKÖY MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
26	KOCASİNAN İLÇESİ MOLU MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPIMI (2017 - 2018 SARÎ)
27	MUHTELİF KANALİZASYON TERFİLERİ İÇİN TRAFO POSTASI VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPILMASI (2017 - 2018 SARÎ)
28	MUHTELİF MAHALLELERDE FOSEPTİK YAPIMI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
29	MUHTELİF YERLERE KANALİZASYON PROJESİ HAZIRLANMASI
30	MUHTELİF YERLERE KANALİZASYON PROJESİ HAZIRLANMASI (2017 - 2018 SARÎ)
31	ÖZVATAN İLÇESİ KÜPELİ MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
32	PINARBAŞI İLÇESİ GÜLTEPE, KAYABAŞI VE KURTTEPE MAHALLELERİNE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPIMI (2017 - 2018 SARÎ)
33	PINARBAŞI İLÇESİ KAYAALTI VE KARAKUYU MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
34	SARIOĞLAN İLÇESİ EBULHAYIR VE TATILI MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
35	SARIZ İLÇESİ AYRANLIK VE ÇÖREKDERE MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
36	SARIZ İLÇESİ GERDEKMAĞRA VE TEKNELİ MAHALLELERİNE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPIMI (2017 - 2018 SARÎ)
37	SARIZ İLÇESİ KIRKISRAK MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
38	TALAS KISMİ KANALİZASYON İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
39	TOMARZA İLÇESİ BÜYÜKCANLI VE ÇULHA MAHALLELERİNE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)

40	TOMARZA İLÇESİ PUSATLI MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
41	TOMARZA İLÇESİ ŞIHBARAK MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
42	YAHYALI AVLAĞI MAHALLESİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI
43	YAHYALI İLÇESİ İLYASLI VE SENİRKÖY MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
44	YAHYALI İLÇESİ KAPUZBAŞI, ÇUBUKHARMANI, BALCIÇAKIRI VE YEŞİLKÖY MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
45	YAHYALI İLÇESİ KOPÇU, KOCAHACILI VE YERKÖY MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
46	YEŞİLHİSAR İLÇESİ MUSAHACILI, OVAÇİFTLİK VE YEŞİLOVA MAHALLELERİ KANALİZASYON İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)
47	YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ - BAĞDAT CADDESİ GÜZERGÂHI KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2018 - 2019 SARÎ)
B2 - DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN KANALİZASYON İŞLERİ	
48	ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARSİNAN YERLEŞKESİ KANALİZASYON DEŞARJ HATLARI İÇİN KILIF BORUSU YERLEŞTİRİLMESİ
49	BÜNYAN İLÇESİ ELBAŞI MAHALLELERİNDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPIMI
50	FELÂHİYE İLÇESİ KARAŞEYH MAHALLESİ FOSSEPTİK KANALİZASYON BAĞLANTISI HATTI İNŞAATI
51	GÖMEÇ MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI YATAY GEÇİŞİ YAPILMASI
52	İNCESU İLÇESİ TAHİRİNİ MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI YATAY GEÇİŞİ YAPILMASI
53	TALAS TABLAKAYA ERGUVAN CAFE RESTAURANT Ø160 PE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI
54	TOMARZA İLÇESİ ŞIHBARAK MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI DERE GEÇİŞİ YAPILMASI

C- ATIKSU ARITMA TESİSİ YATIRIMLARI	
C1 - İHALE YOLUYLA YAPILAN ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLERİ	
S.NO	**İŞİN ADI**
1	AKKIŞLA / GÖMÜRGEN İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
2	BÜNYAN / AKMESCİT İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3	BÜNYAN / ELBAŞI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
4	BÜNYAN / KARAKAYA İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)

5	BÜNYAN / KOYUNABDAL İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
6	BÜNYAN / YENİ SÜKSÜN - HAZERŞAH İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
7	DEVELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI (2014 - 2019 SÂRİ)
8	İNCESU / TAHİRİNLİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
9	KOCASİNAN HİMMETDEDE KALKANCIK KARAKİMSE İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
10	KOCASİNAN YEMLİHA İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SÂRİ)
11	PINARBAŞI PAZARÖREN İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TES İSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
12	SARIOĞLAN / KARAÖZÜ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
13	SARIOĞLAN PALAS İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SÂRİ)
14	TOMARZA AKDERE İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
15	TOMARZA AVŞAROBASI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
16	TOMARZA DADALOĞLU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
17	YAHYALI / ÇUBUKLU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SÂRİ)
18	YAHYALI BÜYÜKÇAKIR İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
19	YEŞİLHİSAR / İÇMECE - KAYADİBİ - KOVALI - KUŞÇU - OVAÇİFTLİK ORTAK İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SÂRİ)
20	YEŞİLHİSAR / MUSAHACILI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SÂRİ)
21	AKKIŞLA BÜNYAN ÖZVATAN VE SARIZ İLÇELERİ A.A.T PROJELERİ YAPTIRILMASI (2015 - 2017 SÂRİ)
22	MUHTELİF ARITMA TESİSLERİ TRAFO POSTASI VE ENERJİ NA KİL HATTI YAPIMI (2017 - 2018 SÂRİ)
C2 - DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLERİ	
23	DEVELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ BORU VE VANA İZOLASYONU

D- YAĞMURSUYU YATIRIMLARI	
D1 - İHALE YOLUYLA YAPILAN YAĞMURSUYU İŞLERİ	
S.NO	**İŞİN ADI**
1	2016 YILI MELİKGAZİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE YAĞMURSUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARİ)
D2 - DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN YAĞMURSUYU İŞLERİ	
2	BÜNYAN CEZAEVİ YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI

E- MUHTELİF YATIRIMLAR	
E1 - İHALE YOLUYLA YAPILAN MUHTELİF İŞLER	
S.NO	**İŞİN ADI**
1	KASKİ İDARİ BİNASI ÇATI VE DIŞ CEPHE MANTOLAMA YAPILMASI
2	KIRMATAŞ MALZEME TEMİNİ MAL ALIMI
3	SARIZ EKİPEVİ İNŞAATI
4	SARIOĞLAN EKİPEVİ İNŞAATI
5	TEKNİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI (2017 - 2019 SARÎ)
E2 - DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN MUHTELİF İŞLER	
6	BÜNYAN İÇMESUYU TEMİNİ GEÇİCİ KAPTAJ ALANI YAPILMASI VE AHŞAP OTURTMALI ÇATI İLE ÜZERİNİN KAPATILMASI
7	GERMİRALTI İDARE BİNASINA ARŞİV TADİLATI YAPILMASI
8	GESİ MAHALLESİ KISMİ TAŞ DUVAR YAPILMASI (GESİ GÜNEY MAHALLESİ ÜÇ HAVUZLAR SOKAK)
9	KASKİ ANA HİZMET BİNASI KATLARA SICAKSU TEMİNİ
10	KASKİ ÇAY OCAĞININ KISMİ SERAMİK TADİLATININ YAPILMASI
11	KASKİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI ÖN CEPHE KAPLAMASI YAPIMI
12	YAHYALI VE TOMARZA İLÇELERİ BÖLGE HİZMET BİNALARI PROJE YAPIMI
13	HARİTA EMLAK KAMULAŞTIRMA FAALİYET DURUMU

A- İÇMESUYU YATIRIMLARI

1- PROJE NUMARASI : İÇMESUYU 1
2- İŞİN ADI : 2016 YILI GESİ KISMİ İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞAATI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE : MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 12.04.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA : GAM İNŞAAT MAD. TEKS. GIDA NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ₺ 1.701.206,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ₺ 9.094,03 (2017 YILI ÖDENEN)

SONUÇ: İçmesuyu şebekesi önceki yıllarda yapılan ancak gerek nüfus yoğunluğunun artması ve gerekse ekonomik ömrünü tamamlamış, sık sık arıza verip su kayıplarına neden olan ve ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalan cadde ve sokakların şebekesi yenilenecektir. Bölgeye kesintisiz ve daha kaliteli su temini sağlanmıştır. Bu iş kapsamında Ø 110 mm PE boru ile 430m içmesuyu hattı yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- **PROJE NUMARASI**	:	İÇMESUYU 2
2- **İŞİN ADI**	:	2017 YILI 1. GRUP 15 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2017 - 2018 SARİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE**	:	DEVELİ, İNCESU, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, TALAS
4- **SÖZLEŞME TARİHİ**	:	06.06.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA**	:	TEMİZ MÜH. SONDAJ - MUSTAFA TEMİZ
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ**	:	₺ 1.705.934,26 x % 20 = ₺ 2.047.121,11
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN**	:	₺ 1.297.282,56 (2017 YILI ÖDENEN)

SONUÇ: DEVELİ (Kulpak, Soysallı, Toki), **İNCESU** (Subaşı), **KOCASİNAN** Akin, Doruklu, Eğim 1-2, Mahzemin), **MELİKGAZİ** Anneler Parkı 1-2, Büyükbürüngüz, Eğribucak Depo Altı 1-2, Gülmersu, Mahrumlar 1-2) olmak üzere toplam 16 adet içmesuyu sondaj kuyusu açılmıştır. Proje kapsamında daha kaliteli ve sağlıklı içmesuyu kaynağına ulaşılmıştır.



1- **PROJE NUMARASI**	:	İÇMESUYU 3
2- **İŞİN ADI**	:	2017 YILI 2. GRUP 23 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2017 - 2018 SARİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE**	:	AKKIŞLA, BÜNYAN, DEVELİ, FELÂHİYE, KOCASİNAN, PINARBAŞI, SARIOĞLAN, SARIZ, TALAS, TOMARZA
4- **SÖZLEŞME TARİHİ**	:	08.06.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA**	:	DERYA MÜHENDİSLİK VE SONDAJ İŞLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSİ MUHİTTİN HASİLİK
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ**	:	₺ 1.228.670,28
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2016 YILI**	:	₺ 0,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında 23 adet sondaj kuyusu açılarak daha kaliteli ve temiz su elde etmek amaçlanmıştır. AKKIŞLA (Girinci), BÜNYAN (Emirören, Karacaören, Kösehacılı, Şıvgın), DEVELİ (Sindelhöyük), FELÂHİYE (Menteşe), KOCASİNAN (Düver Kaş, Yüreğil), PINARBAŞI (Büyükkömarmut, Demircili, Akpınar, Kaman, Kuşçular, Kızılören, Mezgitli), SARIOĞLAN(Alamettin, Üzerlik), SARIZ (Büyüksöbeçimen), TALAS (Ortakavak), TOMARZA (Kapukaya, Merkez 1-2, Üçkonak) olmak üzere toplam 23 adet içmesuyu sondaj kuyusu açılması planlanmıştır.

1- **PROJE NUMARASI**	:	İÇMESUYU 4
2- **İŞİN ADI**	:	AKKIŞLA, BÜNYAN, FELÂHİYE, HACILAR, İNCESU, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, ÖZVATAN, SARIOĞLAN, TALAS İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE**	:	AKKIŞLA, BÜNYAN, FELÂHİYE, HACILAR, İNCESU, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, ÖZVATAN, SARIOĞLAN, TALAS
4- **SÖZLEŞME TARİHİ**	:	06.03.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA**	:	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYZAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ**	:	₺ 4.460.400,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN**	:	₺ 2.655.958,21

SONUÇ: 01.04.2014 tarihinde uygulamaya giren 6360 sayılı kanun kapsamında İl Özel İdaresinin kapanması, yetki ve sorumluluklarının idaremize devredilmesinden sonra ilçe merkezlerinde ve köylerindeki içmesuyu tesislerinde yapılan incelemelerde gözlemlenen halk sağlığını olumsuz etkileyecek faktörlerin bertaraf edilmesi, tesislerindeki eksikliklerin giderilmesi ve tesislerin mevcut skada sistemine entegre edilmesi için gerekli tüm çalışmalar yapılarak vatandaşlarımıza içilebilir su temin edilecektir. Akkışla, Bünyan, Felâhiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Sarıoğlan, Talas içmesuyu depolarının tamir tadilat ve yalıtımları yapılarak su kaçakları önlenmiş, Terfi Merkezi ile kuyu binaları yenilenerek kaliteli içmesuyu temini sağlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde 26 adet içmesuyu depo ve terfi merkezlerinin tamir ve tadilatları yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 5
2- İŞİN ADI	:	AKKIŞLA İLÇESİ GÖMÜRGEN MAHALLESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	AKKIŞLA
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	11.12.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	OSMAN ALTUNTEPE
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.106.391,60
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 0,00

SONUÇ: Akkışla ilçesine bağlı Gömürgen Mahallesindeki su kaynaklarının bölge halkının ihtiyaçlarına yetersiz kalması nedeniyle, Akkışla ilçesinde bulunan mevcut içmesuyu hatlarından Gömürgen Mahallesine içmesuyu temini sağlanarak bölge halkının su ihtiyacı sıkıntıları giderilmesi amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2018 yılı içerisinde Ø 110 mm O-PVC - Ø 160 mm O-PVC borularla 14.100m içmesuyu hattı, 100 m³ su deposu, abone bağlantısı, vantuz, yangın hidrantı bağlantıları gerçekleştirilecektir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 6
2- İŞİN ADI	:	ALİ DAĞI İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	TALAS
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	06.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	YILDIRIM İNŞAAT – MEHMET YILDIRIM
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 695.610,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN TOPLAM	:	₺ 631.998,57

SONUÇ: Ülkemizdeki yamaç paraşütü müsabakalarının yapıldığı merkezlerden biri olan Ali Dağı mevkiinde ilçe belediyemizin burada spor yapmaya gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına yapmayı planladığı ve projelendirdiği tesislerin, aynı zamanda bu mevkide yeni oluşan yerleşim bölgelerinin içmesuyu ihtiyaçlarını karşılamak adına Ø 110 mm - Ø 160 mm çap aralığında toplam 8.335 m içmesuyu hattı yapılarak hizmete sunulmuştur.



1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 7
2- İŞİN ADI	:	ANNELER PARKI TERFİ MERKEZİ ENERJİ TEMİNİ
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	07.12.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	BÜYÜKSARI ELEK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 690.300,00 x % 10 = ₺ 759.330,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 708.039,01

SONUÇ: Terfi merkezinin zemin seviyesinin altında olmasından dolayı, koç darbesi ile oluşan su kaçaklarının terfi istasyonuna dolması sonucu elektrik ve otomasyan sistemlerinin zarar görmesi, hizmetin kesintiye uğraması nedeni ile elektrik ve trafo sistemlerinin zemin seviyesine taşınması ve yenilenmesi gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 8
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN İLÇESİ BURHANİYE VE KARDEŞLER MAHALLELERİ İÇMESUYU TEMİNİ VE İSALE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	05.09.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	YURTER MÜHENDİSLİK & YURTER AKSOY
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 306.210,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2016 YILI	:	₺ 282.050,63

SONUÇ: Önceki yıllarda yapılan içmesuyu şebekesi nüfus yoğunluğunun artması ile ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığından dolayı isale hattı yenilenmiştir. Bu iş kapsamında Ø 110 mm - Ø 160 mm O-PVC çapları arasında 5.778 m isale hattı yapılmıştır. Bu proje kapsamında bölgeye kesintisiz ve daha kaliteli su temini sağlanmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 9
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN İLÇESİ KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ İÇMESUYU TERFİ VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	05.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	MOTİF İNŞAAT ELK. ELKTRO. SAN. TİC. TUR. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 733.759,40 x % 20 = ₺ 880.511,28
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 807.580,98

SONUÇ: Mahalle içerisinde kullanılmakta olan çürümüş, yıpranmış, paslanmış ve fiziki kayıplara sebebiyet veren eski içmesuyu hattı iptal edilmiş yerine daha sağlıklı ve uzun ömürlü O-PVC su boruları ile içmesuyu hattı yapılmıştır. Bu iş kapsamında Ø 63 - Ø 160 O-PVC borularla toplam: 15.177m içmesuyu hattı ve 3 adet yangın hidrandı yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 10
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN İLÇESİ PINARBAŞI İÇMESUYU KAYNAĞI KAPTAJ BİNASI YAPIMI (2016 - 2017 SARÎ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	04.04.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ALTERNATİF İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.106.840,00 x % 10 = ₺ 1.217.524,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 1.213.847,39

SONUÇ: Bünyan ilçe merkezi ile Tuzhisar, Sultanhanı, Palas kasabaları ve Sarıoğlan ilçe merkezine daha kaliteli içmesuyu temin edilebilmesi maksadıyla eski kaptaj (su alma yapısı) yıkılmış yerine modern estetik ve uzun yıllar bölge halkına hizmet edecek bir kaptaj binası yapılmıştır.



1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 11
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN İLÇESİ SAMAĞIR MAHALLESİ İÇMESUYU HATTI İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	05.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	MOTİF İNŞAAT ELK. ELKTRO. SAN. TİC. TUR. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 478.039,24 x % 20 = ₺ 573.647,09
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 491.910,81

SONUÇ: Mahalle içerisinde kullanılmakta olan çürümüş, yıpranmış, paslanmış ve fiziki kayıplara sebebiyet veren eski içmesuyu hattı iptal edilmiş yerine daha sağlıklı ve uzun ömürlü Polietilen ve O-PVC su boruları ile toplam 9.126m içmesuyu hattı yapılmıştır. Ayrıca mahalle halkının daha temiz ve sağlıklı içmesuyu kullanabilmeleri için mevcut 100m³ su deposunun tamir ve tadilatı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 12
2- İŞİN ADI	:	DEVELİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	DEVELİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	14.09.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	AHMET EROL
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 447.692,00 x % 20 = ₺ 537.230,40
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 312.922,03

SONUÇ: Yeni kurulan mahallelerdeki altyapı ihtiyaçlarını gidermek ve vatandaşlarımızın şahsen müracaatları dikkate alınarak alt yapısı olmayan veya mevcutta var olup ekonomik ömrünü doldurmuş, halkın ihtiyaçlarına cevap veremeyen altyapıların yenilenmesi adına yapılmış bir projedir. Bu iş kapsamında Ø200 - Ø400 DI borularla toplam 3.666m içmesuyu hattı yapılmıştır.



1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 13
2- İŞİN ADI	:	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	06.03.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	BENSEL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 3.138.800,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 1.449.879,38

SONUÇ: 01.04.2014 tarihinde uygulamaya giren 6360 sayılı kanun kapsamında İl Özel İdaresinin kapanması, yetki ve sorumluluklarının idaremize devredilmesinden sonra ilçe merkezlerinde ve köylerindeki içmesuyu tesislerinde yapılan incelemelerde gözlemlenen halk sağlığını olumsuz etkileyecek faktörlerin bertaraf edilmesi, tesislerindeki eksikliklerin giderilmesi ve tesislerin mevcut skada sistemine entegre edilmesi için gerekli tüm çalışmalar yapılarak vatandaşlarımıza içilebilir içmesuyu temin edilecektir. Develi, Tomarza ve Yahyalı İlçeleri Merkez ve köylerdeki 23 adet içmesuyu depolarının tamir tadilat ve yalıtımları yapılarak su kaçakları önlenmiş, Terfi Merkezi ile kuyu binaları yenilenerek kaliteli içmesuyu temini sağlanmıştır.



1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 14
2- İŞİN ADI	:	DEVELİ, YAHYALI, PINARBAŞI, FELÂHİYE, TOMARZA, YEŞİLHİSAR İLÇELERİNDE KUYU BİNALARI YAPILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	DEVELİ, YAHYALI, PINARBAŞI, FELÂHİYE, TOMARZA, YEŞİLHİSAR
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	27.02.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ÜLKER TAAHHÜT PROJE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 697.380,00 x % 10 = ₺ 767.118,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 763.286,92

SONUÇ: Develi, Yahyalı, Pınarbaşı, Felâhiye, Tomarza, Yeşilhisar İlçelerinde önceki yıllarda açtırılan içmesuyu sondaj kuyularının devreye alınması için Bünyan (Elbaşı ve Emirören), Develi (Kulpak, Merkez 1, Soysallı), Felâhiye (Alpaslan, Büyüktoraman, İsabey, Kayapınar), Kocasinan (Akin, Doruklu, Güneşli), Melikgazi (Konaklar), Pınarbaşı (Aslanbeyli, Gültepe, Oruçoğlu, Yusuflar), Sarıoğlan (Alaamettin), Talas (Anayurt), Yahyalı (Kuzuoluk) olmak üzere toplam 20 adet kuyu binası yapılarak devreye alınmıştır.



1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 15
2- İŞİN ADI	:	ERCİYES KOÇDAĞI İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	05.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ÜLKER TAAHHÜT PROJE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.229.845,56
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 1.027.242,60

SONUÇ: Ülkemizdeki kış sporlarının sayılı merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı Turizm bölgesindeki mevcut Otel ve Tesislerin, ayrıca her geçen gün yapımı artarak devam eden yeni otel inşaatlarının turizm sezonunda kesintisiz sağlıklı içmesuyu ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik ömrünü doldurmuş içmesuyu hatlarını yenilemek amacı ile Ø110 PE - Ø300 PE mm çap aralığında 6.377m, Ø300 DI 47m, Ø200 drenaj borusu 431m olmak üzere toplam 6.855m içmesuyu hattı ile 2 adet 20m³, 2 adet 30m³ yeni maslak ve 1 adet vantuz ve odası inşaatı tamamlanarak hizmete sunulmuştur.



1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 16
2- İŞİN ADI	:	ERCİYES TURİZM BÖLGESİNE İÇMESUYU ARAŞTIRMA SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	14.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	BULUTLAR GIDA MAD. PETR. ÜRN. NAK. SER. TAR. ÜRN. YET. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 5.169.945,80 x % 20 = ₺ 6.203.934,96
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 5.456.790,35

SONUÇ: 2010 yılında yapımına başlanılan Erciyes Dağı mastır planı kapsamında, bölge kış turizmi açısından hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi haline gelmiş ve artan taleplerin karşılanabilmesi amacı ile gerek kamu tarafından gerekse özel müteşebbisler tarafından yaptırılan konaklama tesisleri ve sosyal tesislerin içmesuyu ihtiyaçlarını karşılamak için sondaj kuyusu açtırılmıştır.



1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 17
2- İŞİN ADI	:	FELÂHİYE İLÇESİ KAYAPINAR MAHALLESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	FELÂHİYE
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	11.07.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GAM İNŞ. MAD. TEKST. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 6.284.420,40
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 4.823.453,44

SONUÇ: 6360 Sayılı yasa ile Genel Müdürlüğümüz hizmet alanına katılan Felâhiye İlçesi ilçe merkezi ile Kayapınar mahallesinde yeni içmesuyu kaynaklarıyla bölgenin su temini çözümlemiş ve bölgedeki ekonomik ömrünü tamamlamış, insan sağlığı açısından risk oluşturan mevcut AÇB boruların iptal edilerek yerine ductil ve polietilen borularla yenilenerek kayıp kaçak oranları minimuma indirilmiş olup bölge halkının kesintisiz ve sağlıklı su tüketimi hedeflenmiştir. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø150 mm - Ø 300 mm DI borularla 3.764m, Ø32 - Ø280 mm PE borularla 45.263m olmak üzere toplam 49.027m içmesuyu hattı, 200 ve 300 m^3 su depoları, 5 gruplu terfi merkezi, 2 adet vantuz ve odası, 5 adet yangın hidrantı ve 781 adet abone bağlantısı yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- **PROJE NUMARASI** : İÇMESUYU 18
2- **İŞİN ADI** : GERMİRALTI - ANAYURT DEPO TERFİİ VE İSALE HATTI VE ANNELER PARKI KUYU BAĞLANTISI YAPILMASI
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : TALAS
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 16.05.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : TEKSEN MÜH. MÜŞ. TES. ELK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 2.402.782,13
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN** : ₺ 1.206.103,83

SONUÇ: Anneler parkı içerisindeki eski depolar tamir edilerek hem kaçak kayıpları önlenmiş, hem daha sağlıklı ve temiz içmesuyuna ulaşım amaçlanmıştır. Bu kapsamda 1 adet 500 m³'lük olmak üzere Anneler Parkındaki içmesuyu kaynakları terfi hattı ile toplanarak depoya aktırılmıştır. Germiraltı - Anayurt depo arasında terfi ve isale hatları yenilerek bu kapsamda Ø 500 ÇB 520m, Ø400 ÇB 856m, Ø 350 ÇB 856m, Ø 300 ÇB 132m, olmak üzere toplam 2.367m içmesuyu hattı ve 1 adet debimetre odası yapılmıştır.

1- **PROJE NUMARASI** : İÇMESUYU 19
2- **İŞİN ADI** : HİSARCIK GÜLMERSU BÖLGESİ İÇMESUYU TERFİ VE İSHALE HATLARI İLE TESİSLERİ İNŞAATI (2015 - 2017 SÂRİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : MELİKGAZİ
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 06.04.2015
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : METE ÖZLÜ - TEKSEN MÜH. MÜŞ. TES. ELK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 7.890.471,91
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN (2017 YILI)** : ₺ 232.732,06

SONUÇ: Gülmersu su kooperatifince içmesuyu temin edilen bölgenin KASKİ'nin sorumluluğuna geçmesi sonrasında Melikgazi Belediyesi sınırları içindeki İbrahim Tennuri, Bahçelievler ve Erenköy Mahallelerindeki mevcut içmesuyu şebeke hattının ekonomik ömrünü tamamlamış olması, çok sık arıza veriyor olması, en önemlisi de insan hayatı için son derece risk oluşturan mevcut AÇB ve PVC içme suyu şebekesinin ductil, çelik ve polietilen borularla yenilenerek vatandaşlarımızın kesintisiz sağlıklı içmesuyuna kavuşması sağlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde 500m³ su deposu yapımı, 7 gruplu terfi merkezi, 6 adet kuyu binası ile 2 adet vantuz odası eksiklikleri tamamlanarak devreye alınmıştır.

1- **PROJE NUMARASI** : İÇMESUYU 20
2- **İŞİN ADI** : HİSARCIK - KIRANARDI BÖLGELERİNDE İÇMESUYU TEMİNİ, İSALE HATTI VE TESİSLERİ YAPILMASI
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : MELİKGAZİ
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 25.04.2016
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYSAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 2.779.903,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN** : ₺ 334.329,35

SONUÇ: Bu iş kapsamında Ø200 - Ø250 ÇB mm çaplar arası 64m, Ø150 - Ø200 DI mm çaplar arası 230m, Ø110 mm PE 173m olmak üzere toplam 467 m içmesuyu hattı ve 2 adet vantuz odası eksiklikleri yapılarak devreye alınmıştır.

1- **PROJE NUMARASI** : İÇMESUYU 21
2- **İŞİN ADI** : İLDEM BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : MELİKGAZİ
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 21.07.2016
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYSAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 1.086.308,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN** : ₺ 785.456,03

SONUÇ: Söz konusu iş; bölgede artış gösteren nüfus yoğunluğu ile birlikte Melikgazi İlçesi sınırları içinde kurulan İldem D Konutlarının içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzere planlanmıştır. Bu iş kapsamında Ø100 mm DI - Ø400 mm DI borularla toplam 8.997m içmesuyu hattı, 111 adet abone bağlantısı, 4 adet basınç kırıcı ve odası, 1 adet yangın hidrandı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 22
2- İŞİN ADI	:	İNCESU İLÇESİ KIZILÖREN YAYLA KÜMEEVLER İÇMESUYU HATTI İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	İNCESU
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	05.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ALTUNTEPE İNŞAAT - OSMAN ALTUNTEPE
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 579.279,70 x % 20 = ₺ 695.135,64
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 353.026,15

SONUÇ: İncesu İlçesi Kızılören Kümeevler mevkiindeki vatandaşlarımızın su sıkıntısını gidermek için mevcut su kaynağından başlayarak Kızılören kümeevler mevkiine kadar içmesuyu ana hattı, mahalle içerisinde ise şebeke hattı yapılarak vatandaşımızın kullanımına sunulacaktır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 63 - Ø 110 PE borularla 7.523m içmesuyu hattı yapılmıştır. 100m³ su deposu, maslak, vantuz ve odası, basınç kırıcı ve odası yapımına devam edilmekte olup 2018 yılı içerinde tamamlanacaktır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 23
2- İŞİN ADI	:	İNCESU VE BAĞLI BÖLGELERİNE İÇMESUYU TEMİNİ İÇİN GEREKLİ TESİSLER İLE İÇMESUYU HATLARININ YAPILMASI (2014 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	İNCESU
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	21.07.2014
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	MAZ İNŞAAT TAAH. PET. NAK. TUR. İŞL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 16.409.013,92
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN (2017 YILI)	:	₺ 1.856.398,95

SONUÇ: İncesu merkez ve mahallerinde daha temiz ve sağlıklı içme suyu kullanılabilmesi amacıyla Sarıkürklü bölgesinde açılan 4 adet sondaj kuyusundan çıkarılan içmesuyu Saraycık, Bedir Bağları, Örenşehir, Kumbağları, Garipçe, Toki bölgesi ve İncesu merkezine 9 adet muhtelif hacimlerde depo, 5 adet terfii merkezi ve 1.325m çelik, 3.365m duktil ve polietilen borularla içmesuyu hattı yapımı gerçekleştirilmiştir.



1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 24
2- İŞİN ADI	:	KOCASİNAN İLÇESİ MEVLANA MAHALLESİ İÇMESUYU DAĞITIM HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	27.06.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ASB İNŞAAT TAAH. PET. ELEKT. ELEKTRONİK NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 3.530.666,20 x % 20 = ₺ 4.236.799,44
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 2.530.872,13

SONUÇ: Mevlana ve Yeni Mahalle genelinde yapımına devam edilen içmesuyu şebeke hattı inşaatı işi kapsamında; mevcutta yer alan ekonomik ömrünü tamamlamış AÇB ve Pik malzemeden yapılmış içmesuyu dağıtım ve şebeke hatları yenilenmektedir. Bu iş kapsamında, 2017 yılı içerisinde Ø500 mm - Ø600 mm çelik boru 1.062m, Ø100 mm DI - Ø250 DI boru ile 24.342m, Ø63 mm - Ø110 mm PE boru 905m olmak üzere toplam 26.309m içmesuyu hattı ve 1.876 adet abone bağlantısı yapımı gerçekleştirilmiştir.



1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 25
2- İŞİN ADI	:	KOCASİNAN İLÇESİ HIRKA MAHALLESİ İÇMESUYU TERFİİ HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	04.10.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	YILDIRIM İNŞAAT – MEHMET YILDIRIM
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 623.364,50
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 0,00

SONUÇ: İlimiz merkez ilçesi olan Kocasinan ilçesine bağlı Hırka mahallesinde su kaynaklarının bölge halkının ihtiyacına yetersiz kalması hasebiyle Eski Ömerler mahallesindeki sondaj kuyusundan Ø160 mm PE boru ile 6.600m, Ø160 PVC boru ile 7.100m olmak üzere toplam 13.700m içmesuyu terfi hattı yapılması planlanmış olup 2018 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 26
2- İŞİN ADI	:	KOCASİNAN İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	14.09.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	MOTİF İNŞAAT ELK. ELEKT. SAN. TİC. TUR. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.546.591,49 x % 20 = ₺ 1.855.909,78
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 642.617,29

SONUÇ: Kocasinan İlçesi Muhtelif Mahallelerinde önceki yıllarda döşenen AÇB borular ekonomik ömrünü tamamlamış ve ayrıca sık sık arıza yaparak hem zaman hem de su kaybına neden olmaktaydı. Eski su şebekesinin yenilenmesi ve bu mahallelerde sarfiyatın yoğun olduğu yaz aylarında su sıkıntısı çekilmesi ve de ilçe belediyemizin bu kısımlarda yapacağı asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarının da göz önünde bulundurularak acilen bu işin yapılıp ikinci bir masrafa meydan vermemek amacıyla mahallelerin içmesuyu şebeke hatları yenilenmiştir. Bu iş kapsamında Ø100 mm - Ø350 mm ductil borularla 9.609m içmesuyu hattı ve 30 adet abone bağlantısı aktarımı yapılmış olup 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır.



1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 27
2- İŞİN ADI	:	KOCASİNAN, MELİKGAZİ, TALAS, HACILAR, İNCESU İLÇELERİNDE KUYU BİNALARI YAPILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN, MELİKGAZİ, TALAS, HACILAR, İNCESU
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	23.02.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	AÇILIM TEKNİK MÜŞ. TAAH. VE İNŞ. MÜH. TUR. TAŞ. İTH. İHR. PAZ. MAK. VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 853.140,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 853.140,00

SONUÇ: Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, İncesu İlçelerinde önceki yıllarda açtırılan içmesuyu sondaj kuyularının devreye alınması için Hacılar (Kuyucak), İncesu (Hamurcu), Kocasinan (Amarat, Barsama, Boyacı, Erkilet Gümüşlük, Keykubat), Melikgazi (Ağırnas 1-2, Anneler Parkı, Esenyurt, Germiraltı 1-2-3, Gülmersu, İldem, Kıranardı 1-2, Mahrumlar), Talas (15.000m³ Depo, Akçakaya, Ardıç, Çaybağları) olmak üzere toplam 24 adet kuyu binası yapılarak devreye alınmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 28
2- İŞİN ADI	:	KUŞÇU BOYACI TERFİ VE İSALE HATLARI İLE TESİSLERİ İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	05.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	A.S.B İNŞAAT TAAH. PETR. ELK. ELKTR. NAK. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 3.655.452,38 x % 20 = ₺ 4.386.542,86
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 2.527.907,18

SONUÇ: Eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış, sık sık arıza veren borular önemli su kayıplarına neden olmaktadır. Dolayısı ile hem sürekli su temini kesintiye uğramakta, hem de bakım onarım maliyetleri artmaktadır. Bölge halkına kesintisiz ve kaliteli su temin etmek ve su kayıplarının önüne geçmek amacı ile bu projemiz hayata geçirilmiştir. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø63 mm - Ø160 mm O-PVC borularla 30.696 m içmesuyu hattı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 29
2- İŞİN ADI	:	MELİKGAZİ İLÇESİ ALTINOLUK VE YENİKÖY MAHALLELERİ KISMİ İÇMESUYU DAĞITIM HATTI İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	05.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ALTUNTEPE İNŞAAT - OSMAN ALTUNTEPE
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 553.797,60 x % 20 = ₺ 664.557,12
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN TOPLAM	:	₺ 657.702,94

SONUÇ: Bu proje ile ekonomik ömrünü tamamlamış olan muhtelif çaplardaki asbest boruların ductil borularla yenilenip abone bağlantılarının da Ø32 PE borularla yeni yapılan hatlara aktarılması, yaşanabilecek şebeke arızalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında Ø100 mm - Ø200 Ductil borularla 10.751m içmesuyu hattı ve 127 adet abone bağlantısı ve 3 adet yangın hidrantı montajı yapılmıştır.



1- **PROJE NUMARASI** : İÇMESUYU 30
2- **İŞİN ADI** : MELİKGAZİ İLÇESİ GESİ ALBAY İSMAİL SEYDİŞEHİR KIŞLASI İÇMESUYU TERFİİ HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : MELİKGAZİ
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 07.11.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : MOTİF İNŞAAT ELK. ELKTRO. SAN. TİC. TUR. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 203.129,92
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN** : ₺ 0,00

SONUÇ: Askeri alan içerisinde herhangi bir yangın olasılığına karşı 1 adet sondaj kuyusu açılmış olup, mevcut depoya su temin edilerek askeri bölge içerisinde yangın hidrandı ve müştemilatı konulması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 1 adet kuyu binası, Ø110 mm O-PVC boru ile 370m içmesuyu terfi hattı, 4 adet yangın hidrandı yapımı gerçekleştirilecektir.

1- **PROJE NUMARASI** : İÇMESUYU 31
2- **İŞİN ADI** : MELİKGAZİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : MELİKGAZİ
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 05.09.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : MOTİF İNŞAAT ELK. ELKTRO. SAN. TİC. TUR. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 420.717,20
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN** : ₺ 0,00

SONUÇ: Melikgazi ilçesi muhtelif mahallelerinde önceki yıllarda döşenen AÇB borular ekonomik ömrünü tamamlamış ve ayrıca sık sık arıza yaparak hem zaman hem de su kaybına neden olmaktaydı. Eski su şebekesinin yenilenmesi ve bu mahallelerde sarfiyatın yoğun olduğu yaz aylarında su sıkıntısı çekilmesi ve de ilçe belediyemizin bu kısımlarda yapacağı asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarının da göz önünde bulundurularak acilen bu işin yapılıp ikinci bir masrafa meydan vermemek amacıyla mahallelerin içmesuyu şebeke hatları yenilenmiştir. Bu iş kapsamında Ø100 mm - Ø250 mm Duktil borularla 6.700m içmesuyu hattı ve 250 adet abone bağlantısı ve 3 adet yangın hidrandı yapılması planlanmıştır.



1- **PROJE NUMARASI** : İÇMESUYU 32
2- **İŞİN ADI** : MUHTELİF BÖLGELERDE TRAFO POSTASI VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPILMASI
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : AKKIŞLA, DEVELİ, FELÂHİYE, İNCESU, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, PINARBAŞI, TALAS, TOMARZA, YAHYALI
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 20.03.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : SE-TA ELEKTRİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 2.170.020,00 x % 10 = ₺ 2.387.022,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN** : ₺ 1.879.511,75

SONUÇ: Muhtelif bölgelerde trafo postası ve enerji nakil hattı yapılması işi kapsamında; Akkışla (Merkez, Girinci), Develi (Millidere, Gümüşova, Soysallı), Felâhiye (İsabey, Toraman), İncesu (Hamurcu, Kızılören), Kocasinan (Amarat, Barsama, Boyacı, Bölge Hastanesi, Erkilet Gümüşlük, Mahzemin), Melikgazi (Ağırnas, Anneler Parkı, Eğribucak, Esenyurt, Germiraltı, Gülmersu, İldem, Kıranardı), Pınarbaşı (Aslanbeyli, Mezitli, Yusuflar), Talas (Akçakaya, Anayurt, Ardıç, Kamber), Tomarza (Kapukaya), Yahyalı (sazak) olmak üzere toplam 31 adet trafo postası ve enerji nakil hattı yapımı gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında çalışmalarımız devam edecektir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 33
2- İŞİN ADI	:	MUHTELİF İÇMESUYU TESİSLERİNDE ENERJİ NAKİL HATTI VE GÜÇ ARTIRIMI YAPILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	AKKIŞLA, KOCASİNAN, TALAS
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	04.10.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	BÜYÜKSARI ELEK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 230.808,00 x 1,10 = ₺ 253.888,80
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 248.212,36

SONUÇ: İçmesuyunun nihai tüketiciye ulaştırılmaya kadar geçen süreçte üretim, terfi ve depolama istasyonlarına enerji temini için **Bünyan** (Emirören), **Kocasinan** (Akin), **Talas** (4.000m³ terfi binası) olmak üzere toplam 3 adet enerji nakil hattı ve güç artırımı yapılması işi gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 34
2- İŞİN ADI	:	MÜCAVİR ALANDA MUHTELİF YERLERE 19 ADET SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	DEVELİ, FELÂHİYE, İNCESU, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, PINARBAŞI, TOMARZA, YAHYALI, YEŞİLHİSAR
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	09.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	DERYA MÜHENDİSLİK - M. MUHİTTİN HASİLİK
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 840.561,67 x % 20 = ₺ 1.008.674,01
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 257.872,72

SONUÇ: Genel Müdürlüğümüze bağlı farklı sorumluluk sahalarında ihtiyaç duyulan içmesuları için 2016 yılında 19 adet sondaj açılması işi ihale edilmiş olup, 2016 yılında 17 yerleşim yerine sondaj kuyusu açılmıştır. 2017 yılı içerisinde ise 9 adet yerleşim yerine sondaj kuyusu açılmış olup toplamda 26 adet sondaj kuyusu açtırılarak devreye alınmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 35
2- İŞİN ADI	:	PINARBAŞI İLÇESİ PAZARÖREN MAHALLESİ İÇMESUYU İSALE HATTI İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	PINARBAŞI
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	05.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	MOTİF İNŞAAT ELK. ELKTRO. SAN. TİC. TUR. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 863.515,74
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2016 YILI	:	₺ 778.301,32

SONUÇ: Pazarören Mahallesinin daha temiz ve düzenli bir içmesuyuna sahip olabilmeleri için içmesuyu kaynağına yeni bir su alma yapısı ile 50 m³'lük yeni bir maslak inşaa edilmiştir. Ayrıca isale hattı üzerinde bulunan iki adet 50 m³'lük maslak ve 1000m³'lük su deposunun tamir ve tadilat işleri devam etmektedir. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø110 mm - Ø225 mm polietilen borularla 4.211m, içmesuyu hattı yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 36
2- İŞİN ADI	:	PINARBAŞI, SARIZ İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	PINARBAŞI, SARIZ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	09.03.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GAM İNŞAAT MAD. TEKST. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.743.500,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 1.151.408,60

SONUÇ: 01.04.2014 tarihinde uygulamaya giren 6360 sayılı kanun kapsamında İl Özel İdaresinin kapanması, yetki ve sorumluluklarının idaremize devredilmesinden sonra ilçe merkezlerinde ve köylerindeki içmesuyu tesislerinde yapılan incelemelerde gözlemlenen halk sağlığını olumsuz etkileyecek faktörlerin bertaraf edilmesi, tesislerdeki eksikliklerin giderilmesi ve tesislerin mevcut scada sistemine entegre edilmesi için gerekli tüm çalışmalar yapılarak vatandaşlarımıza içilebilir su temin edilecektir. Pınarbaşı, Sarız İlçelerinde içmesuyu depolarının tamir tadilat ve yalıtımları yapılarak su kaçakları önlenmiş, terfi merkezi ile kuyu binaları yenilenerek kaliteli içmesuyu temini sağlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde 18 adet içmesuyu depo ve terfi merkezlerinin tamir ve tadilatları yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 37
2- İŞİN ADI	:	TALAS İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE 8 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	TALAS
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	21.07.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	TEMİZ MÜHENDİSLİK SONDAJ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.146.464,40 x % 20 = ₺ 1.375.757,28
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 360.820,15

SONUÇ: DEVELİ (Sindelhöyük 1.224m 47lt/sn, Sindelhöyük2 252m 30lt/sn), **HACILAR** (Kuyucak 300m'de devam ediyor), **MELİKGAZİ** (Çaybağları 113m 35lt/sn, Esenyurt 85m 40lt/sn, Hisarcık Gülmersu 114m 50lt/sn, Kıranardı Deresi 250m 18lt/sn), **TALAS** (15.000 m³ Depo 285m 24lt/sn, Akçakaya 298m 16lt/sn, Ardıç 298m 9lt/sn, Kamber 210m 15lt/sn) toplam 11 adet sondaj kuyusu açılması gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 38
2- İŞİN ADI	:	TALAS KISMİ İÇMESUYU İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	TALAS
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	06.05.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GELİŞİM İNŞAAT - H. İBRAHİM UYAN
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 942.897,88 x % 20 = ₺ 1.131.477,46
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 231.474,57

SONUÇ: Eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış, sık sık arıza veren borular önemli su kayıplarına neden olmaktadır. Dolayısı ile hem sürekli su temini kesintiye uğramakta, hem de bakım onarım maliyetleri artmaktadır. Bölge halkına kesintisiz ve kaliteli su temin etmek ve su kayıplarının önüne geçmek amacı ile bu projemiz hayata geçirilmiştir. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø100 mm - Ø350 mm DI borularla 3.288m, Ø 32 mm PE boru ile 184m, olmak üzere toplam 3.472m içmesuyu hattı ve 60 adet abone bağlantısı ve 2 adet yangın hidrantı montajı yapılmıştır.



1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 39
2- İŞİN ADI	:	TOMARZA İLÇESİ KEVENAĞIL MAHALLESİ İÇMESUYU İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	TOMARZA
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	20.03.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	AHMET EROL
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 245.440,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 244.261,23

SONUÇ: Bu iş kapsamında Ø63 mm PE boru ile 2.250m içmesuyu hattı ve 50 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 40
2- İŞİN ADI	:	YAHYALI İLÇESİ ÇUBUK HARMANI İÇMESUYU İNŞAATI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	YAHYALI
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	26.08.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KİRAZOĞLU İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺489.316,50 x % 20 = ₺587.179,80
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺51.937,52

SONUÇ: Çubuk Harmanı mahallesindeki mevcut içmesuyu kaynakları mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılayamayacak seviyede olmasından dolayı içmesuyu hatları yeniden projelendirilerek vatandaşların daha sağlıklı ve düzenli içmesuyuna kavuşmaları amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø63 mm PE-Ø110 mm PE boru çapları arasında 24m, içmesuyu hattı yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 41
2- İŞİN ADI	:	YEŞİLHİSAR İLÇESİ GÜLBAYIR MAHALLESİ İÇMESUYU İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	YEŞİLHİSAR
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	07.11.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	YILDIRIM İNŞAAT – MEHMET YILDIRIM
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺681.538,50
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺680.125,10

SONUÇ: Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø100 DI boruyla 3.278m, Ø110 mm PE boruyla 1.509m olmak üzere toplam 4.787m içmesuyu hattı ve 1 adet vantuz odası, 1 adet 100m³ su deposu yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 42 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	AKKIŞLA İLÇESİ GANİŞEYH MAHALLESİ DEPO İLE MASLAK ARASI İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	AKKIŞLA
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	28.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	AHMET EROL MÜH. İNŞ. VE TAAH.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺61.360,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺61.360,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında Ø160 O-PVC boruyla 2.000m içmesuyu hattı yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 43 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	AKKIŞLA İLÇESİ GANİŞEYH MAHALLESİ KAYNAK İLE MASLAK ARASI İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	AKKIŞLA
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	09.08.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ALPAY MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺40.710,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺40.710,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında Ø110 PE boruyla 1.400m içmesuyu hattı yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 44 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	AKKIŞLA İLÇESİ YEŞİL MAHALLE İÇMESUYU ABONE BAĞLANTILARININ YAPILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	AKKIŞLA
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	17.04.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	OSMAN ALTUNTEPE
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺65.844,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺65.844,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında 310 adet abone bağlantısı yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 45 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	AKKIŞLA İLÇESİ YUKARI VE ŞEN MAHALLELERİ İÇMESUYU ABONE BAĞLANTILARININ YAPILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	AKKIŞLA
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	23.10.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ÜÇEL TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 66.268,80
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 66.268,80

SONUÇ: Bu iş kapsamında 312 adet abone bağlantısı yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 46 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	ARGINCIK VE BUĞDAYLI MAHALLELERİ İÇMESUYU İSALE HATLARI İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	05.12.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	MOTİF İNŞAAT ELK. ELEKTRO. SAN. TİC. TUR. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 24.846,08
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 24.846,08

SONUÇ: Bu iş kapsamında Ø250 ductil boru ile 80m içmesuyu hattı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 47 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN CEZAEVİ SU TEMİN PROJESİ 100 KVA TRAFO POSTASI VE ENERJİ NAKİL HATTI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	20.02.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	BÜYÜKSARI ELEK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 55.856,48
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 55.856,48

SONUÇ: İçmesuyu temini için açılmış olan sondaj kuyusuna enerji sağlamak amacıyla yapılmıştır.
Bu iş kapsamında 100 KVA trafo postası ve enerji nakil hattı yapımı işi gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 48 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN İLÇESİ DERVİŞAĞA, BAYRAMLI, YENİCE VE İBRAHİMBEY MAHALLELERİ İÇMESUYU HATLARININ ABONE SAYACINA KADAR UZATILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	14.11.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	TÜREM İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 59.000,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 59.000,00

SONUÇ: Bünyan İlçesi Dervişağa, Bayramlı, Yenice ve İbrahim Bey Mahallelerine 200 adet içmesuyu hatlarının abone sayacına kadar uzatılması işi gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 49 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	ÇAYBAĞLARI İLE KARPUZATAN TESİSLERİNDEKİ TERFİ BİNALARININ TAMİR TADİLATLARI VE KARPUZATAN TESİSİNDE DEBİMETRE ODASI YAPILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	TALAS, KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	07.08.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	TUNAY İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 53.100,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 53.100,00

SONUÇ: Çaybağları İle Karpuzatan Tesislerindeki terfi binalarının tamir tadilatları ve Karpuzatan Tesisinde debimetre odası yapılması işi gerçekleştirilmiştir.

1- **PROJE NUMARASI** : İÇMESUYU 50 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- **İŞİN ADI** : FELÂHİYE İLÇESİ KARAŞEYH MAHALLESİ ESKİ YERLEŞİM BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : FELÂHİYE
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 22.05.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : NETSER DOĞALGAZ İNŞAAT TAAH. MAD. TELEKOM. BİLG. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 38.232,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN** : ₺ 34.749,82

SONUÇ: Felâhiye İlçesi Karaşeyh Mahallesinde mevcut içmesuyu borularının ekonomik ömrünü tamamlaması, fiziki kayıp ve kaçakların fazla olması ve insan sağlığı açısından risk oluşturması hasebiyle bu projenin yapımı gerçekleştirilmiştir. Bu iş kapsamında Ø63 mm PE 400m içme suyu hattı, 75 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- **PROJE NUMARASI** : İÇMESUYU 51 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- **İŞİN ADI** : FELÂHİYE İLÇESİ KARAŞEYH MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : FELÂHİYE
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 20.01.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : DOĞAN YAPI
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 61.360,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN** : ₺ 61.360,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında Ø63mm PE 1.800m içmesuyu hattı ve 58 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- **PROJE NUMARASI** : İÇMESUYU 52 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- **İŞİN ADI** : GESİ MAHALLESİ ALBAY İSMAİL SEYDİŞEHİRLİ KIŞLASI İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : MELİKGAZİ
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 10.07.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : DERYA MÜHENDİSLİK VE SONDAJ
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 40.120,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN** : ₺ 30.143,10

SONUÇ: Bu iş kapsamında 114m içmesuyu sondaj kuyusu açılmış olup, 6 lt/sn. su çıkarılmıştır.

1- **PROJE NUMARASI** : İÇMESUYU 53 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- **İŞİN ADI** : İNCESU HAMURCU MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : İNCESU
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 10.04.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : ATOL MÜH. MÜŞ. İNŞ. TAAH. MAD. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 49.560,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN** : ₺ 49.560,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında 162m içmesuyu sondaj kuyusu açılmış olup, 20 lt/sn. su çıkarılmıştır.

1- **PROJE NUMARASI** : İÇMESUYU 54 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- **İŞİN ADI** : KOCASİNAN İLÇESİ BAYRAMHACI MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU ENERJİ TEMİNİ
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : KOCASİNAN
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 26.09.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : BÜYÜKSARI ELEK. İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 60.180,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN** : ₺ 60.180,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında 25KVA trafo postası ve enerji nakil hattı inşaatı yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 55 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	KOCASİNAN İLÇESİ CIRGALAN MAHALLESİ (SUKAYPARK) İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	10.04.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	DERYA MÜHENDİSLİK VE SONDAJ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺46.610,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺46.610,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında 130m içmesuyu sondaj kuyusu açılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 56 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	KOCASİNAN MAHZEMİN MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	21.03.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KORUSU SONDAJ MÜH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺64.900,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺64.900,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında Beydeğirmeni Mahallesine 201m içmesuyu sondaj kuyusu açılmış olup, 45 lt/sn. su çıkarılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 57 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	ÖRNEKEVLER MAHALLESİ ÇİÇEK VE AY SOKAKLARINA İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	03.01.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	BEDİR MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺48.378,82
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺48.368,20

SONUÇ: Bu iş kapsamında Ø100 ductil boru ile 440m içmesuyu hattı ve 60 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 58 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	SARIOĞLAN ÇİFTLİK MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	SARIOĞLAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	12.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	TEMİZ MÜHENDİSLİK SONDAJ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺64.900,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺62.540,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında Çiftlik Mahallesine 227m içmesuyu sondaj kuyusu açılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 59 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	TALAS İLÇESİ MEVLANA MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	TALAS
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	25.04.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	HEDEF ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET - MAHMUT YANAR
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺53.100,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺34.054,80

SONUÇ: Bu iş kapsamında Mevlana Mahallesine 206m içmesuyu sondaj kuyusu açılmış olup, 7 lt/sn. su çıkarılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 60 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	YAHYALI İLÇESİ YEŞİLKÖY MAHALLESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	YAHYALI
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	04.04.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ALTUNTEPE İNŞAAT - OSMAN ALTUNTEPE
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 64.900,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 64.900,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında Yahyalı İlçesi Yeşilköy Mahallesine Ø300 çelik boru ile 100m içmesuyu hattı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	İÇMESUYU 61 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	YEŞİLHİSAR İLÇESİ KAYADİBİ MAHALLESİ İÇMESUYU ELEKTRİK ABONESİNİN GÜCÜNÜN 100 KVA'YA ARTTIRILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	YEŞİLHİSAR
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	10.08.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	BÜYÜKSARI ELK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 26.374,18
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 26.374,18

SONUÇ: Yeşilhisar İlçesi Kayadibi Mahallesi içmesuyu elektrik abonesinin gücünün 100 KVA 'ya arttırılması işi gerçekleştirilmiştir.





B- KANALİZASYON YATIRIMLARI

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 1
2- İŞİN ADI	:	2016 YILI GESİ KISMİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	12.04.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GAM İNŞAAT MAD. TEKS. GIDA NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺652.451,50
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN TOPLAM	:	₺ 67.700,00

SONUÇ: Gesi Bahçeli ve Kuzey Mahallelerindeki kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara Ø150 mm - Ø300 mm çaplar arasında HDPE korige borularla toplam 605m kanalizasyon hattı yapılmıştır. Böylece atıksuların atıksu arıtma tesisine deşarjı sağlanarak çevre ve toplum sağlığı korunmuştur.



1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 2
2- İŞİN ADI	:	2016 YILI KOCASİNAN - İNCESU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN – İNCESU
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	28.04.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	TEKSEN MÜH. MÜŞ. TES. ELK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺5.057.480,00 x % 20 = ₺6.068.976,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺3.715.471,98

SONUÇ: İncesu ve Kocasinan İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara Ø150 mm - Ø300 mm çaplar arasında HDPE korige borularla toplam 38.919m kanalizasyon hattı ve 560 adet abone bağlantısı yapılmıştır. Böylece atıksuların atıksu arıtma tesisine deşarjı sağlanarak çevre ve toplum sağlığı korunmuştur.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 3
2- İŞİN ADI	:	2016 YILI MELİKGAZİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	20.05.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GÖKER GÖZÜTOK MÜH. İNŞAAT PRJ. TAAH.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺4.128.338,56
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 924.539,86

SONUÇ: Melikgazi İlçesi muhtelif mahallelerindeki kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara Ø 150 mm - Ø 600 mm çaplar arasında HDPE korige borularla toplam 9.121m kanalizasyon hattı, 155 adet abone bağlantısı yapılmıştır. Böylece atıksuların atıksu arıtma tesisine deşarjı sağlanarak çevre ve toplum sağlığı korunmuştur.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 4
2- İŞİN ADI	:	2016 - 2017 YILI TALAS - HACILAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	TALAS - HACILAR
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	16.05.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ÜLKER TAAHHÜT PROJE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.111.946,30
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 1.435.310,94

SONUÇ: Talas ve Hacılar İlçeleri Muhtelif Mahallelerindeki kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara Ø 150 mm - Ø 300 mm çaplar arasında HDPE korige borularla toplam 16.812m kanalizasyon hattı, 102 adet abone bağlantısı yapılmıştır. Böylece atıksuların atıksu arıtma tesisine deşarjı sağlanarak çevre ve toplum sağlığı korunmuştur.



1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 5
2- İŞİN ADI	:	2017 YILI KOCASİNAN, TALAS, HACILAR, İNCESU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN - TALAS - HACILAR - İNCESU
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	05.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GELİŞİM İNŞAAT - HALİL İBRAHİM UYAN
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.316.458,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2016 YILI	:	₺ 1.523.271,49

SONUÇ: Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu İlçeleri muhtelif mahallelerindeki kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara Ø 150 mm - Ø 300 mm çaplar arasında HDPE korige borularla toplam 16.149m kanalizasyon hattı, 246 adet abone bağlantısı yapılmıştır. Böylece atıksuların atıksu arıtma tesisine deşarjı sağlanarak çevre ve toplum sağlığı korunmuştur.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 6
2- İŞİN ADI	:	2017 YILI MELİKGAZİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	18.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYZAJ TEM. HİZ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 980.703,90
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 876.246,87

SONUÇ: Melikgazi İlçesi muhtelif mahallelerindeki kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara Ø 150 mm - Ø 400 mm çaplar arasında HDPE korige borularla toplam 8.485m kanalizasyon hattı, 132 adet abone bağlantısı yapılmıştır. Böylece atıksuların atıksu arıtma tesisine deşarjı sağlanarak çevre ve toplum sağlığı korunmuştur.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 7
2- İŞİN ADI	:	AKİN, ELAGÖZ, HASANARPA, YAZIR KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	12.07.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	H. İBRAHİM UYAN & KİRAZOĞLU İNŞAAT ORT. GRŞ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 5.860.942,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 784.976,86

SONUÇ: Akin, Elagöz, Hasanarpa, Yazır kanalizasyon kollektör ve şebeke hattı inşaatı işi kapsamında Ø 150 mm - Ø 500 mm çaplar arasında HDPE korige borularla toplam 6.122m kanalizasyon hattı, 49 adet abone bağlantısı yapılmıştır.



1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 8
2- İŞİN ADI	:	AKKIŞLA, BÜNYAN, SARIOĞLAN, FELÂHİYE, ÖZVATAN, PINARBAŞI VE SARIZ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	AKKIŞLA, BÜNYAN, SARIOĞLAN, FELÂHİYE, ÖZVATAN, PINARBAŞI, SARIZ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	12.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KİRAZOĞLU İNŞAAT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.645.560,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN TOPLAM	:	₺ 1.844.496,59

SONUÇ: Akkışla, Bünyan, Sarıoğlan, Felâhiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız İlçeleri muhtelif mahallelerindeki kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara Ø 150 mm - Ø 300 mm çaplar arasında HDPE korige borularla toplam 15.642m kanalizasyon hattı, 223 adet abone bağlantısı yapılmıştır. Böylece atıksuların atıksu arıtma tesisine deşarjı sağlanarak çevre ve toplum sağlığı korunmuştur.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 9
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN İLÇESİ KAHVECİ VE TOPSÖĞÜT MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	07.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	AKAR İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.803.748,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 894.518,08

SONUÇ: Bünyan İlçesi Kahveci ve Topsöğüt Mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız evsel atıklarını fosseptikle çözmeye çalışmışlardır. Ancak fosseptikler yeraltı sularını kirletmekte ve fosseptiklerin dolmasıyla da cadde ve sokaklara taşarak insan sağlığına olumsuz etkilemekteydi. Bu proje yapılarak bölgedeki halkın daha sağlıklı ortamda yaşaması sağlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 mm - Ø 200 mm çaplar arasında HDPE korige borularla toplam 7.772 m kanalizasyon hattı, 57 adet abone bağlantısı yapılmıştır. Böylece atıksuların atıksu arıtma tesisine deşarjı sağlanarak çevre ve toplum sağlığı korunmuştur.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 10
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN İLÇESİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	21.09.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYSAJ TEM. HİZ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 3.120.131,22
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 0,00

SONUÇ: Bünyan ilçe merkezinde bulunan ve arıtılmadan derelere deşarj edilen kanalizasyon hatlarının tek bir noktada toplanması ve ilçe merkezinde uzaklaştırılarak yapılması planlanan atıksu arıtma tesisine ulaştırılabilmesi için kollektör hattı projesi yapılmıştır. Bu iş kapsamında 2018 yılı içerisinde Ø 150 mm - Ø 600 mm Korige Borularla 18.925m, Ø 225 mm - Ø 355 PE borularla 810m olmak üzere toplam 19.735m kanalizasyon kolektör hattı yapılacaktır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 11
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN İLÇESİ KARATAY MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	14.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	YURTER MÜHENDİSLİK - YERGİNLER HARFİYAT İNŞ. TAAH TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.756.872,50
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 260.830,62

SONUÇ: Bünyan Karatay Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımız evsel atıklarını fosseptikle çözmeye çalışmışlardır. Ancak fosseptikler yeraltı sularını kirletmekte ve fosseptiklerin dolmasıyla da cadde ve sokaklara taşarak insan sağlığına olumsuz etkilemekteydi. Bu proje yapılarak o bölgedeki halkın daha sağlıklı ortamda yaşaması sağlanmıştır. Bu iş kapsamında 2016 yılı içerisinde Ø 150 mm - Ø 200 mm çaplar arasında korige borularla 1.594m, Ø 90 PE - Ø 225 PE borularla 3.614m olmak üzere toplam 5.208m kanalizasyon hattı yapılmıştır.



1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 12
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN İLÇESİ KÖPRÜBAŞI, SAMAĞIR MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	10.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	MOTİF İNŞAAT ELK. ELEKTRO. SAN. TİC. TUR. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.862.385,00 x % 20 = ₺ 3.434.862,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN TOPLAM	:	₺ 2.145.506,57

SONUÇ: Proje kapsamında Bünyan İlçesi Samağır ve Köprübaşı Mahalleleri ile Pınarbaşı İlçesi Kılıç Mehmet Mahallesine evsel atıksuların mahalle içlerindeki çevre ve toplum sağlına zarar vermeden tek bir hat üzerinde toplanması, uzaklaştırılması ve çürütmeli fosseptiklerden çökeltildikten sonra dere yataklarına deşarj edilebilmesi için kanalizasyon hatları yapılmıştır. Kılıç Mehmet mahallesinin fosseptiği bitirilmiş Samağır ve Köprübaşı mahallelerinin fosseptikleri ise devam etmektedir. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 mm - Ø 200 mm çaplar arasında korige borularla 19.911m kanalizasyon hattı, 337 adet abone bağlantısı yapılmış olup, 1 adet 100 kişilik fosseptik inşaatı devam etmektedir.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 13
2- İŞİN ADI	:	DEVELİ İLÇESİ ÇAYIRÖZÜ, KULPAK, SOYSALLI MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	DEVELİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	03.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ÇAĞAN İNŞ. MİM. MÜH. PLN. PRJ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 5.604.673,14
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN TOPLAM	:	₺ 834.477,96

SONUÇ: Develi İlçesi Çayırözü, Kulpak, Soysallı Mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız evsel atıklarını fosseptikle çözmeye çalışmışlardır. Ancak fosseptikler yeraltı sularını kirletmekte ve fosseptiklerin dolmasıyla, cadde ve sokaklara taşarak insan sağlığına olumsuz etkilemekteydi. Bu proje yapılarak o bölgedeki halkın daha sağlıklı ortamda yaşaması sağlanmıştır. Bu iş kapsamında Ø 150 mm - Ø 300 mm çaplar arasında korige borularla 6.348m, Ø 63 mm - Ø 225 mm çaplar arasında polietilen borularla 3.156m olmak üzere toplam 9.504m kanalizasyon şebeke hattı ve 142 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 14
2- İŞİN ADI	:	DEVELİ İLÇESİ GÜMÜŞÖREN MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	DEVELİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	04.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYZAJ TEM. HİZ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.210.293,40
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 282.785,93

SONUÇ: Vatandaşlardan gelen istekler içerisinden Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının değerlendirmeleri sonucunda kendi bünyesinde yapamadığı ancak kanalizasyon ihtiyaçlarının giderilmesini gerekli gördüğü mahallelerdeki ihtiyaçların giderilmesi için yapmış olduğu talepler neticesinde ihale edilerek söz konusu bölgedeki kanalizasyon hatları yapılarak hizmete alınması planlanmıştır. Bu kapsamda Ø 150 mm - Ø 300 mm çaplarında HDPE korige boru ile 2.269 m kanalizasyon hattı ve 8 adet abone bağlantısı yapılmıştır.



1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 15
2- İŞİN ADI	:	DEVELİ İLÇESİ KARACAÖREN VE SARICA MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	DEVELİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	08.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KÖSELER İNŞAAT - MURAT KÖSE
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.525.200,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 1.121.304,32

SONUÇ: Vatandaşlardan gelen istekler içerisinden Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının değerlendirmeleri sonucunda kendi bünyesinde yapamadığı ancak kanalizasyon ihtiyaçlarının giderilmesini gerekli gördüğü mahallelerdeki ihtiyaçların giderilmesi için yapmış olduğu talepler neticesinde ihale edilerek söz konusu bölgedeki kanalizasyon hatları yapılarak hizmete alınması planlanmıştır. Bu kapsamda Ø150 mm - Ø200 mm çaplarında HDPE korige boru ile 11.839 m kanalizasyon hattı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 16
2- İŞİN ADI	:	DEVELİ İLÇESİ SARAYCIK, SARIKAYA VE YAYLACIK MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	DEVELİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	16.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ÇAĞAN İNŞ. MİM. MÜH. PLN. PRJ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.533.342,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 1.969.068,32

SONUÇ: Vatandaşlardan gelen istekler içerisinden Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının değerlendirmeleri sonucunda kendi bünyesinde yapamadığı ancak kanalizasyon ihtiyaçlarının giderilmesini gerekli gördüğü mahallelerdeki ihtiyaçların giderilmesi için yapmış olduğu talepler neticesinde ihale edilerek söz konusu bölgedeki kanalizasyon hatları yapılarak hizmete alınması planlanmıştır. Bu kapsamda Ø 150 mm - Ø 200 mm çaplarında HDPE korige boru ile 17.270 m kanalizasyon hattı ve 301 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 17
2- İŞİN ADI	:	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI, YEŞİLHİSAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI, YEŞİLHİSAR
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	28.04.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	BENSEL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.076.916,82 x % 20 = ₺ 2.492.300,18
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 551.919,29

SONUÇ: Vatandaşlardan gelen istekler neticesinde Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının yapılmasını gerekli gördüğü mahallelerdeki kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yapmış olduğu talep neticesinde ihale edilerek söz konusu bölgedeki kanalizasyon sorunları giderilmiştir. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 mm - Ø 300 mm çaplar arasında korige borularla 7.071m, Ø 225 PE boru ile 102m olmak üzere toplam 7.173m kanalizasyon hattı, 52 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 18
2- İŞİN ADI	:	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI VE YEŞİLHİSAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI, YEŞİLHİSAR
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	17.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	BENSEL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 3.039.497,10
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2016 YILI	:	₺ 943.935,43

SONUÇ: Vatandaşlardan gelen istekler içerisinden Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının değerlendirmeleri sonucunda kendi bünyesinde yapamadığı ancak kanalizasyon ihtiyaçlarının giderilmesini gerekli gördüğü mahallelerdeki sorunların giderilmesi için yapmış olduğu talep neticesinde ihale edilerek söz konusu bölgedeki kanalizasyon hatları yapılarak hizmete sunulacaktır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 200 mm - Ø 400 mm çaplarında korige boru ile 9.632 m kanalizasyon hattı ve 57 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 19
2- İŞİN ADI	:	İLDEM BÖLGESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	21.07.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYZAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.991.368,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 885.140,46

SONUÇ: Söz konusu iş; bölgede artış gösteren nüfus yoğunluğu ile birlikte Melikgazi İlçesi sınırları içinde kurulan İldem D Konutlarının kanalizasyon altyapı ihtiyacını karşılamak üzere planlanmıştır. Bu iş kapsamında Ø 150 mm - Ø 400 mm çaplar arasında korige borularla 7.510m kanalizasyon şebeke hattı ve 125 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 20
2- İŞİN ADI	:	İNCESU İLÇESİ TAHİRİNİ MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	İNCESU
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	18.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ÜLKER TAAHHÜT PROJE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.587.507,10
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN TOPLAM	:	₺ 1.194.365,27

SONUÇ: Kanalizasyon ihtiyaçlarının giderilmesini gerekli gördüğü mahallelerdeki ihtiyaçların giderilmesi için yapmış olduğu talepler neticesinde ihale edilerek söz konusu bölgedeki kanalizasyon hatları yapılarak hizmete alınması planlanmıştır. Bu kapsamda Ø 150 mm - Ø 200 mm çaplarında HDPE korige boru ile 13.376 m, Ø 63 mm - Ø 225 PE borularla 494m olmak üzere toplam 13.870m kanalizasyon hattı ve 183 adet abone bağlantısı yapılmıştır.





1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 21
2- İŞİN ADI	:	KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ BİYOLOJİK GAZ TANKI YAPIMI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	23.05.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	BİOTEK ENDÜSTRİ SAN. TES. DAN. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.282.660,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 792.009,20

SONUÇ: Mevcut gaz tankının ekonomik ömrünü tamamlaması ve kapasitesinin yetersiz kalmasından dolayı 2 adet 3.000m³ kapasiteli gaz tankı yapılarak tesiste üretilen biogazdan elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 22
2- İŞİN ADI	:	KOCASİNAN BULVARI - 30 AĞUSTOS KAVŞAĞI KISMİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	05.06.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	NETSER DOĞALGAZ İNŞAAT TAAH. MAD. TELEKOM. BİLG. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 426.640,80
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 393.348,41

SONUÇ: Yeni yapılan üstyapı çalışmalarından doğan kanalizasyon ihtiyaçlarının giderilmesinin gerekli görüldüğü hatlarda merkez kollektör hattını rahatlatmak için, talepler neticesinde yeni hatlar ihale edilerek Kocasinan Bulvarı alt geçit çalışmalarına denk gelen kısım deplase edilmiştir. Bu iş kapsamında Ø 1400 mm betonarme borularla 239m kolektör hattı, 4 adet baca imalatı yapılarak tamamlanmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 23
2- İŞİN ADI	:	KOCASİNAN İLÇESİ EMMİLER MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	18.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ÇAĞAN İNŞ. MİM. MÜH. PLN. PRJ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.260.646,36
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 418.215,60

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yeraltı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 12.522m kanalizasyon hattı ve 550 adet abone bağlantısı yapılmış olup, 1000 kişilik fosseptik yapım inşaatı devam etmektedir.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 24
2- İŞİN ADI	:	KOCASİNAN İLÇESİ HÖBEK VE FELÂHİYE ACIRLI MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	25.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GAM İNŞ. MAD. TEKST. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.359.988,20
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 565.320,25

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yeraltı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 5.773m kanalizasyon hattı ve 55 adet abone bağlantısı yapılmış olup, 250 ve 500 kişilik fosseptik yapım inşaatları devam etmektedir.



1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 25
2- İŞİN ADI	:	KOCASİNAN İLÇESİ KAŞKÖY MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	14.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	YURTER AKSOY-YERGİNLER HARF. İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORT.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.907.177,80
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 736.628,75

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yeraltı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 7.764m kanalizasyon hattı ve 15 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 26
2- İŞİN ADI	:	KOCASİNAN İLÇESİ MOLU MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPIMI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	14.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	YURTER AKSOY-YERGİNLER HARF. İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORT.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.507.205,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 240.795,85

SONUÇ: İlimiz merkez ilçesi olan Kocasinan İlçesine bağlı Molu Mahallesinin mevcuttaki evsel atıksuların uzaklaştırılması müstakil fosseptik çukurlarıyla veya bölgede bulunan dere yataklarına verilerek sağlanmaktaydı. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 2.786m kanalizasyon hattı yapılmış olup çevre ve insan sağlığının korunması sağlanmıştır.



1- **PROJE NUMARASI** : KANALİZASYON 27
2- **İŞİN ADI** : MUHTELİF KANALİZASYON TERFİLERİ İÇİN TRAFO POSTASI VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPILMASI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : BÜNYAN, DEVELİ, İNCESU, SARIZ, TOMARZA, YAHYALI, YEŞİLHİSAR
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 04.10.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : MEHMET ERTUĞRUL TÜRKMEN
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 392.940,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN** : ₺ 0,00

SONUÇ: Kanalizasyon terfi hatları enerji temini için **Bünyan** (Karacaören, Karatay 1-2, Samağır), **Develi** (Çayırözü 1-2, Köprübaşı, Sarıca, Soysallı 1-2), **İncesu** (Tahirini), **Sarız** (Ayranlık), **Tomarza** (Şıhbarak), **Yahyalı** (İlyaslı 1-2, Kapuzbaşı, Kocahacılı 1-2, Kopçu 1-2, Senirköy 1-2, Yerköy), **Yeşilhisar** (Musahacılı, Ovaçiftlik 1-2, Yeşilova) olmak üzere toplam 27 adet enerji nakil hattı ve trafo postası yapılması işi gerçekleştirilecektir.

1- **PROJE NUMARASI** : KANALİZASYON 28
2- **İŞİN ADI** : MUHTELİF MAHALLELERDE FOSEPTİK YAPIMI İNŞAATI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : BÜNYAN, FELÂHİYE, SARIZ, TALAS
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 01.11.2016
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : RAFET ALTAY - İNŞAAT MÜHENDİSİ
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 311.520,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN** : ₺ 311.520,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Bünyan İlçesi, Karacaören Mahallesine 500m³/Gün, Felâhiye İlçesi, Karaşeyh Mahallesine 500m³/Gün, Sarız İlçesi, İnce Mağara Mahallesine 250m³/Gün, Talas İlçesi, Çömlekçi Mahallesine 250m³/Gün foseptik yapımı inşaatları gerçekleştirilmiştir.



1- **PROJE NUMARASI** : KANALİZASYON 29
2- **İŞİN ADI** : MUHTELİF YERLERE KANALİZASYON PROJESİ HAZIRLANMASI
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : BÜNYAN, DEVELİ, İNCESU, KOCASİNAN, PINARBAŞI, SARIOĞLAN, SARIZ, TOMARZA, YAHYALI
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 30.05.2016
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : AYDEĞER MÜHENDİSLİK
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 566.789,40
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN** : ₺ 566.789,40

SONUÇ: 01.04.2014 tarihinde uygulamaya giren 6360 sayılı kanun kapsamında İl Özel İdaresinin kapanması, yetki ve sorumluluklarının idaremize devredilmesinden sonra ilçe merkezlerinde ve köylerinde çevre, toplum ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olan atıksuların uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi amacıyla mevcutta olmayan kanalizasyon hatlarının yapılabilmesi için projeleri yaptırılmıştır. **BÜNYAN** (Burhaniye 15,53km, Şıvgın 3,34km), **DEVELİ** (Deresimli 3,27km, Eşelik 3,48km, Hüseyinli 9,56km, Millidere 6,36km, Satı 3,95km, Yeşilyurt 5,21km), **İNCESU** (Hamurcu 41,42km, Karahöyük 7,97km), **KOCASİNAN** (Hırka 19,25km, Koçcagız 5,59km), **PINARBAŞI** (Alagazili 6,11km, Büyükkömarmut 2,31km, Çerkezkaraboğaz 4,04km, Dilciler 6,07km, Eskiyassıpınar 4,26km, Gölcük 1,97km, Kadılı 2,64km, Kılıçmehmet 3,39, Kızılhan 2,75km, Küçükkömarmut 2km, Malaköy 10,20km, Serinyurt 4,47km), **SARIOĞLAN** (İğdeli 6,09km, Muratbeyli 6,06km, Ömer Hacılı 11,10km), **SARIZ** (Çavdar 4,78km, Dallıkavak 5,53km, Yedioluk 2,38km) , **TOMARZA** (Akmezar 3,20km, Avşarsöğütlü 9,47km, Dadaloğlu 31,32km, Hacıpaşa 6,05km, Karacaören 3,58km, Kesir 8,07km, Kızılören 8,35km, Küçükcanlı 9,74km), **YAHYALI** (Ağcaşar 9,31km, Çavdaruşağı 3,39km) **toplam 303,52km** kanalizasyon proje yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 30
2- İŞİN ADI	:	MUHTELİF YERLERE KANALİZASYON PROJESİ HAZIRLANMASI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	DEVELİ, KOCASİNAN, PINARBAŞI, SARIOĞLAN, TOMARZA, YAHYALI
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	19.10.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ÇÖZÜM ALTYAPI MÜHENDİSLİK
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 229.846,30
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 0,00

SONUÇ: 01.04.2014 tarihinde uygulamaya giren 6360 sayılı kanun kapsamında İl Özel İdaresinin kapanması, yetki ve sorumluluklarının idaremize devredilmesinden sonra ilçe merkezlerinde ve köylerinde çevre, toplum ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olan atıksuların uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi amacıyla mevcutta olmayan kanalizasyon hatlarının yapılabilmesi için projeleri yaptırılmıştır. **DEVELİ** (DereBAŞI 6,00km, Havadan 8,00km) **KOCASİNAN** (Bayramhacı 19,00km, Hasancı 19,00km), **PINARBAŞI** (Beserek 8,00km, Cabe + Çaybaşı 7,00km, Kavak 4,00km, Kılıçkışla 4,00km, Methiye 7,00km), **SARIOĞLAN** (Sofu Mahmut 5,00km), **TOMARZA** (Bostanlık 6,00km, Böke 4,00km, Kömür 10,00km, Köprübaşı 7,00km, Süvegenler 4,00km, Tatar 8,00km), **YAHYALI** (Dikme 7,00km, Sazak 7,00km) **toplam 140,00km** kanalizasyon proje yapımı gerçekleştirilecektir.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 31
2- İŞİN ADI	:	ÖZVATAN İLÇESİ KÜPELİ MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	ÖZVATAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	03.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GAM İNŞ. MAD. TEKST. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.475.152,66
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 510.660,01

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yeraltı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 300 mm korige borularla 4.963m kanalizasyon hattı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 32
2- İŞİN ADI	:	PINARBAŞI İLÇESİ GÜLTEPE, KAYABAŞI VE KURTTEPE MAHALLELERİNE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPIMI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	PINARBAŞI
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	07.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	AKAR İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.596.507,95
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 923.163,90

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yeraltı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 10.205m kanalizasyon hattı ve 114 adet abone bağlantısı yapılmıştır.



1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 33
2- İŞİN ADI	:	PINARBAŞI İLÇESİ KAYAALTI VE KARAKUYU MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	PINARBAŞI
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	03.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	AKAR İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.700.863,80
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 1.447.871,88

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yeraltı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 14.651m kanalizasyon hattı ve 155 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 34
2- İŞİN ADI	:	SARIOĞLAN İLÇESİ EBULHAYIR VE TATILI MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	SARIOĞLAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	07.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ÜLKER TAAHHÜT PROJE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 3.876.636,30
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 474.686,92

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yeraltı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 6.091m kanalizasyon hattı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 35
2- İŞİN ADI	:	SARIZ İLÇESİ AYRANLIK VE ÇÖREKDERE MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	SARIZ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	15.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	TUĞRA İNŞ. MÜH. VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME-ŞENOL KORKMAZ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺2.448.934,24
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 417.619,72

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yeraltı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 5.031m kanalizasyon hattı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 36
2- İŞİN ADI	:	SARIZ İLÇESİ GERDEKMAĞRA VE TEKNELİ MAHALLELERİNE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPIMI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	SARIZ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	15.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	TUĞRA İNŞ. MÜH. VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME-ŞENOL KORKMAZ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺2.665.148,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺1.198.268,51

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yeraltı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 12.847m kanalizasyon hattı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 37
2- İŞİN ADI	:	SARIZ İLÇESİ KIRKISRAK MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	SARIZ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	06.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	TEBERNÜŞ ÖZYURT - İNŞAAT MÜHENDİSİ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺2.212.128,30
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 469.156,38

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yer altı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 5.633m kanalizasyon hattı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 38
2- İŞİN ADI	:	TALAS KISMİ KANALİZASYON İNŞAATI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	TALAS
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	06.05.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GELİŞİM İNŞAAT - HALİL İBRAHİM UYAN
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺125.493,00 x % 20 = ₺150.591,60
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺19.081,71

SONUÇ: Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 263m kanalizasyon hattı ve 2 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 39
2- İŞİN ADI	:	TOMARZA İLÇESİ BÜYÜKCANLI VE ÇULHA MAHALLELERİNE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	TOMARZA
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	05.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ALTERNATİF İNŞ. TAAH. - MURAT ÇAVUŞ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.827.713,65
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 664.389,74

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yeraltı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 6.762m kanalizasyon hattı ve 42 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 40
2- İŞİN ADI	:	TOMARZA İLÇESİ PUSATLI MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	TOMARZA
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	12.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	MOTİF İNŞAAT ELK. ELKTRO. SAN. TİC. TUR. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.755.372,72
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 0,00

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yeraltı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atık uların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2018 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 17.170m kanalizasyon hattı, 1000 kişilik fosseptik ve 180 adet abone bağlantısı yapılacaktır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 41
2- İŞİN ADI	:	TOMARZA İLÇESİ ŞIHBARAK MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	TOMARZA
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	06.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GÖKER GÖZÜTOK MÜH. İNŞAAT PRJ. TAAH.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 2.538.180,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 709.721,61

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yer altı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 9.258m kanalizasyon hattı ve 104 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 42
2- İŞİN ADI	:	YAHYALI AVLAĞI MAHALLESİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	YAHYALI
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	26.08.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KİRAZOĞLU İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 294.563,40
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 275.469,82

SONUÇ: Mevcut kanalizasyonun fosseptiğe deşarj olduğu bölgede, tarımsal faaliyet yapılmasının neticesinde mahalle sakinlerinin tularemi hastalığına yakalanmalarına sebep olmuş ve hazırlanan bu proje ile kanalizasyon hattı bölgeden uzaklaştırılmıştır. Bu iş kapsamında Ø 200 korige boruyla 397m kanalizasyon hattı ve 1 adet 500 kişilik fosseptik yapımı gerçekleştirilmiş ve daha sağlıklı ve temiz çevre şartları sağlanmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 43
2- İŞİN ADI	:	YAHYALI İLÇESİ İLYASLI VE SENİRKÖY MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	YAHYALI
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	17.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KERİMOĞLU ALTYAPI İNŞAAT NAK. TEM. GIDA VE HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 3.314.030,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 1.084.980,55

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yeraltı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 12.017m, Ø 75 mm - Ø 315 mm PE borularla 2.901m olmak üzere toplam 14.918m kanalizasyon hattı ve 128 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 44
2- İŞİN ADI	:	YAHYALI İLÇESİ KAPUZBAŞI, ÇUBUKHARMANI, BALCIÇAKIRI VE YEŞİLKÖY MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	YAHYALI
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	17.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KERİMOĞLU ALTYAPI İNŞAAT NAK. TEM. GIDA VE HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 4.054.462,30
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 1.634.998,69

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yeraltı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 12.179m kanalizasyon hattı ve 198 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 45
2- İŞİN ADI	:	YAHYALI İLÇESİ KOPÇU, KOCAHACILI VE YERKÖY MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	YAHYALI
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	15.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KÖSELER İNŞAAT – MURAT KÖSE
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 3.525.840,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 580.783,98

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yer altı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 5.663m kanalizasyon hattı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 46
2- İŞİN ADI	:	YEŞİLHİSAR İLÇESİ MUSAHACILI, OVAÇİFTLİK VE YEŞİLOVA MAHALLELERİ KANALİZASYON İNŞAATI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	YEŞİLHİSAR
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	03.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GAM İNŞ. MAD. TEKST. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 3.513.078,30
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 1.279.288,11

SONUÇ: Bölgedeki fosseptiklerden sızan atıksular yeraltı sularını kirletmekte ve zaman zaman taşarak çevre ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Kanalizasyon hattı olmayan cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılarak, atıksuların arıtma tesisine bertaraf edilmesi ile daha çağdaş yaşam standartları ve çevre toplum sağlığı korunması amaçlanmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı içerisinde Ø 150 - Ø 200 mm korige borularla 11.846m kanalizasyon hattı ve 124 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 47
2- İŞİN ADI	:	YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ - BAĞDAT CADDESİ GÜZERGÂHI KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2018 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	MELİKGAZİ - KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	30.11.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ALTINBAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 24.485.873,20
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 0,00

SONUÇ: Kayseri Merkez Kollektör Hattı ihale edilerek söz konusu bölgelerdeki kanalizasyon hatlarının rahatlatılması amacıyla planlanmıştır. 2018 yılında yapımına başlanılacak olan bu iş kapsamında Ø 600 mm - Ø 2000 mm betonarme borularla 10.180m, Ø 300 mm - Ø 800 mm HDPE korige borularla 580m olmak üzere toplam 10.760 m kanalizasyon kolektör hattı yapılması planlanmıştır.





1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 48 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARSİNAN YERLEŞKESİ KANALİZASYON DEŞARJ HATLARI İÇİN KILIF BORUSU YERLEŞTİRİLMESİ
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	27.09.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ÜLKER TAAHHÜT PROJE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺47.141,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺47.141,00

SONUÇ: Abdullah Gül Üniversitesi Mimarsinan Yerleşkesi kanalizasyon deşarj hatları için kılıf borusu yerleştirilmesi işi kapsamında Ø 800 çelik boru ile 232m kılıf boru döşenmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 49 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN İLÇESİ ELBAŞI MAHALLELERİNDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPIMI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	27.09.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	LİFOS MAK. MİM. MÜH. İNŞ. TAAH. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺49.607,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺49.607,00

SONUÇ: Bünyan İlçesi Elbaşı Mahallesine Ø 400 mm korige boru ile 1.150m kanalizasyon hattı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 50 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	FELÂHİYE İLÇESİ KARAŞEYH MAHALLESİ FOSSEPTİK KANALİZASYON BAĞLANTISI HATTI İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	FELÂHİYE
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	09.08.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	RAFET ALTAY – İNŞAAT MÜHENDİSİ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺5.900,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺5.900,00

SONUÇ: Felâhiye İlçesi Karaşeyh Mahallesi fosseptik kanalizasyon bağlantısı hattı inşaatı işi kapsamında Ø 200 mm korige boru ile 70m kanalizasyon hattı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 51 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	GÖMEÇ MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI YATAY GEÇİŞİ YAPILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	09.03.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GÖKER MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺15.281,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺15.281,00

SONUÇ: Gömeç Mahallesi kanalizasyon hattı yatay geçişi yapılması işi kapsamında Ø 355 mm polietilen boru ile 20m kanalizasyon hattı yatay geçişi yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 52 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	İNCESU İLÇESİ TAHİRİNİ MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI YATAY GEÇİŞİ YAPILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	İNCESU
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	07.07.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GÖKER MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 49.560,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 41.506,50

SONUÇ: İncesu İlçesi Tahirini Mahallesi kanalizasyon hattı yatay geçişi yapılması işi kapsamında Ø 800 mm çelik boru ile 40m kanalizasyon hattı yatay geçişi yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 53 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	TALAS TABLAKAYA ERGUVAN CAFE RESTAURANT Ø160 PE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	TALAS
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	17.08.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ÜÇEL TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 18.378,50
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 18.378,50

SONUÇ: Talas Tablakaya Erguvan Cafe Restaurant Ø160 PE boru ile kanalizasyon hattı inşaatı işi kapsamında Ø 160 mm polietilen boru ile 170m kanalizasyon hattı yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	KANALİZASYON 54 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	TOMARZA İLÇESİ ŞIHBARAK MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI DERE GEÇİŞİ YAPILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	TOMARZA
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	27.11.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GÖKER GÖZÜTOK MÜH. İNŞAAT PRJ. TAAH.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 17.782,15
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 17.782,15

SONUÇ: Tomarza İlçesi Şıhbarak Mahallesi kanalizasyon hattı dere geçişi yapılması işi kapsamında 50 m'lik Ø 300 mm çelik boru içerisinden Ø 225 polietilen boru geçirilerek kanalizasyon hattı dere geçişi yapılması işi gerçekleştirilmiştir.

C- ATIKSU ARITMA TESİSİ YATIRIMLARI

1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 1
2- İŞİN ADI	:	AKKIŞLA / GÖMÜRGEN İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	AKKIŞLA
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	16.08.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KENAN METİN / EL-SE İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.639.020,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 0,00

SONUÇ: Bu proje kapsamında daha önceden atıksu uzaklaştırma sistemi yapılmış mahallede, atıksuyun su kirliliği kontrol yönetmeliği kriterlerine göre deşarjının sağlanabilmesi için 150 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması planlanmıştır. İş tamamlandığında arıtma işlemi gerçekleştirilmiş atıksuyun doğaya, insan sağlığına, temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj edilmesi sağlanacaktır.

1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 2
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN / AKMESCİT İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	13.07.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYSAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.660.260,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 124.333,56

SONUÇ: Bu proje kapsamında daha önceden atıksu uzaklaştırma sistemi yapılmış mahallede, atıksuyun su kirliliği kontrol yönetmeliği kriterlerine göre deşarjının sağlanabilmesi için 200 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması planlanmıştır. İş tamamlandığında arıtma işlemi gerçekleştirilmiş atıksu doğaya, insan sağlığına, temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj edilecektir.

1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 3
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN / ELBAŞI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	16.08.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KENAN METİN / EL-SE İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.620.140,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 341.201,48

SONUÇ: Mahalledeki kanalizasyon hattı deşarjı dereye verildiğinden insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple insan sağlığını korumak amacıyla bu projenin yapılması gerekli bulunmuştur. Bu sayede o bölgede yaşayan halkın daha sağlıklı ortamda yaşaması amaçlanmıştır. Bu proje kapsamında 150 m³/gün kapasiteli biyolojik atıksu arıtma tesisi yapımı gerçekleştirilecektir.

1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 4
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN / KARAKAYA İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	13.07.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ADIGÜZEL İNŞAAT – AHMET ADIGÜZEL
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.694.480,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 112.582,95

SONUÇ: Kanalizasyon hatlarımızdaki atıksuyun fosseptiklerde çökeltildikten sonra direk olarak dere yataklarına deşarj edilmemesi için ileri biyolojik atıksu arıtma tesisimiz vasıtasıyla doğaya ve toplum yaşamına zarar vermeyecek hale getirildikten sonra dere yatağına deşarjı için 200m³/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi projelendirilmiş ve tesisin inşaatına başlanılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 5
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN / KOYUNABDAL İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	16.08.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KENAN METİN / EL-SE İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.589.460,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 0,00

SONUÇ: Mahalledeki kanalizasyon hattı deşarjı dereye verildiğinden insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple insan sağlığını korumak amacıyla bu projenin yapılması gerekli bulunmuştur. Bu sayede o bölgede yaşan halkın daha sağlıklı ortamda yaşaması amaçlanmıştır. Proje kapsamında 150 m³/gün kapasiteli biyolojik atıksu arıtma tesisi yapımı gerçekleştirilecektir.

1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 6
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN / YENİ SÜKSÜN - HAZERŞAH İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	13.07.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ADIGÜZEL İNŞAAT – AHMET ADIGÜZEL
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.729.880,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 114.934,96

SONUÇ: Kanalizasyon hatlarımızdaki atıksuyun fosseptiklerde çökeltildikten sonra direk olarak dere yataklarına deşarj edilmemesi ileri biyolojik atıksu arıtma tesisimiz vasıtasıyla doğaya ve toplum yaşamına zarar vermeyecek hale getirildikten sonra dere yatağına deşarjı için 200m³/gün atıksu arıtma tesisi projelendirilmiş ve tesisin inşaatına başlanılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 7
2- İŞİN ADI	:	DEVELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI (2014 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	DEVELİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	30.12.2014
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ARTAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER TAAH. TİC. A.Ş.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 12.798.162,00 x % 10 = ₺ 14.077.978,20
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 1.174.413,51

SONUÇ: Bu proje kapsamında daha önceden atıksu uzaklaştırma sistemi yapılmış mahallelerdeki, atıksuyun su kirliliği kontrol yönetmeliği kriterlerine göre deşarjının sağlanabilmesi için 9.030m³/gün 60.000 kişi kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılarak arıtma işlemi gerçekleştirilmiş atıksuyun doğaya, insan sağlığına, temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj edilmesi sağlanmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 8
2- İŞİN ADI	:	İNCESU / TAHİRİNLİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	İNCESU
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	19.07.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ALPAY MÜH. ELK. İNŞ. TAAH. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.673.240,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 0,00

SONUÇ: Bu proje kapsamında daha önceden atıksu uzaklaştırma sistemi yapılmış mahallede, atıksuyun su kirliliği kontrol yönetmeliği kriterlerine göre deşarjının sağlanabilmesi için 150 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması planlanmıştır. İş tamamlandığında arıtma işlemi gerçekleştirilmiş atıksu doğaya, insan sağlığına, temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj edilecektir.

1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 9
2- İŞİN ADI	:	KOCASİNAN HİMMETDEDE KALKANCIK KARAKİMSE İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	20.07.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	DETAY ARITMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.681.500,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 0,00

SONUÇ: Bu proje kapsamında daha önceden atıksu uzaklaştırma sistemi yapılmış mahallede, atıksuyun su kirliliği kontrol yönetmeliği kriterlerine göre deşarjının sağlanabilmesi için 200 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması planlanmıştır. İş tamamlandığında arıtma işlemi gerçekleştirilmiş atıksu doğaya, insan sağlığına, temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj edilecektir.

1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 10
2- İŞİN ADI	:	KOCASİNAN YEMLİHA İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	15.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	TEKSEN MÜH MÜŞ. TES. ELK. ELKTR. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 3.995.573,22
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 799.993,67

SONUÇ: Bu proje kapsamında daha önceden atıksu uzaklaştırma sistemi yapılmış mahallede, atıksuyun su kirliliği kontrol yönetmeliği kriterlerine göre deşarjının sağlanabilmesi için 700 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması planlanmıştır. İş tamamlandığında arıtma işlemi gerçekleştirilmiş atıksu doğaya, insan sağlığına, temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj edilecektir.



1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 11
2- İŞİN ADI	:	PINARBAŞI PAZARÖREN İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	PINARBAŞI
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	04.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYZAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.580.020,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 110.121,07

SONUÇ: Bu proje kapsamında daha önceden atıksu uzaklaştırma sistemi yapılmış mahallede, atıksuyun su kirliliği kontrol yönetmeliği kriterlerine göre deşarjının sağlanabilmesi için 150 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması planlanmıştır. İş tamamlandığında arıtma işlemi gerçekleştirilmiş atıksu doğaya, insan sağlığına, temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj edilecektir.

1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 12
2- İŞİN ADI	:	SARIOĞLAN / KARAÖZÜ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	SARIOĞLAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	20.07.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	DETAY ARITMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.657.900,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 0,00

SONUÇ: Mahalledeki kanalizasyon hattı deşarjı dereye verildiğinden insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple insan sağlığını korumak amacıyla bu projenin yapılması gerekli bulunmuştur. Bu sayede o bölgede yaşan halkın daha sağlıklı ortamda yaşaması amaçlanmıştır. Bu proje kapsamında 150 m³/gün kapasiteli biyolojik atıksu arıtma tesisi yapımı gerçekleştirilecektir.

1- **PROJE NUMARASI** : ATIKSU ARITMA TESİSİ 13
2- **İŞİN ADI** : SARIOĞLAN PALAS İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : SARIOĞLAN
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 15.06.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : ADIGÜZEL İNŞAAT - AHMET ADIGÜZEL
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 4.106.400,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI** : ₺ 0,00

SONUÇ: Kanalizasyon hatlarımızdaki atıksuyun fosseptiklerde çökeltildikten sonra direk olarak dere yataklarına deşarj edilmemesi ileri biyolojik atıksu arıtma tesisimiz vasıtasıyla doğaya ve toplum yaşamına zarar vermeyecek hale getirildikten sonra dere yatağına deşarjı için 700 m³/gün atıksu arıtma tesisi projelendirilmiş ve tesisin inşaatına başlanılmıştır.

1- **PROJE NUMARASI** : ATIKSU ARITMA TESİSİ 14
2- **İŞİN ADI** : TOMARZA AKDERE İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : TOMARZA
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 04.05.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYZAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 1.677.960,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI** : ₺ 111.480,53

SONUÇ: Bu proje kapsamında daha önceden atıksu uzaklaştırma sistemi yapılmış mahallede, atıksuyun su kirliliği kontrol yönetmeliği kriterlerine göre deşarjının sağlanabilmesi için 150 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması planlanmıştır. İş tamamlandığında arıtma işlemi gerçekleştirilmiş atıksu doğaya, insan sağlığına, temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj edilecektir.

1- **PROJE NUMARASI** : ATIKSU ARITMA TESİSİ 15
2- **İŞİN ADI** : TOMARZA AVŞAROBASI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : TOMARZA
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 04.05.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYZAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 1.634.300,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI** : ₺ 83.377,09

SONUÇ: Bu proje kapsamında daha önceden atıksu uzaklaştırma sistemi yapılmış mahallede, atıksuyun su kirliliği kontrol yönetmeliği kriterlerine göre deşarjının sağlanabilmesi için 150 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması planlanmıştır. İş tamamlandığında arıtma işlemi gerçekleştirilmiş atıksu doğaya, insan sağlığına, temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj edilecektir.

1- **PROJE NUMARASI** : ATIKSU ARITMA TESİSİ 16
2- **İŞİN ADI** : TOMARZA DADALOĞLU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : TOMARZA
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 04.05.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYZAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 1.819.560,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI** : ₺ 136.263,21

SONUÇ: Bu proje kapsamında daha önceden atıksu uzaklaştırma sistemi yapılmış mahallede, atıksuyun su kirliliği kontrol yönetmeliği kriterlerine göre deşarjının sağlanabilmesi için 200 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması planlanmıştır. İş tamamlandığında arıtma işlemi gerçekleştirilmiş atıksu doğaya, insan sağlığına, temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj edilecektir.



1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 17
2- İŞİN ADI	:	YAHYALI / ÇUBUKLU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	YAHYALI
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	19.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	AHMET ER - İNŞAAT MÜHENDİSİ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.515.120,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017	:	₺ 187.179,44

SONUÇ: Bu proje kapsamında daha önceden atıksu uzaklaştırılma sistemi yapılmış mahallede atıksuyun su kirliliği kontrol yönetmeliği kriterlerine göre deşarjının sağlanabilmesi için 150 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması planlanmıştır. İş tamamlandığında arıtma işlemi gerçekleştirilmiş atıksu doğaya, insan sağlığına, temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj edilecektir.

1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 18
2- İŞİN ADI	:	YAHYALI BÜYÜKÇAKIR İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	YAHYALI
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	04.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYZAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.817.200,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 0,00

SONUÇ: Bu proje kapsamında daha önceden atıksu uzaklaştırılma sistemi yapılmış mahallede atıksuyun su kirliliği kontrol yönetmeliği kriterlerine göre deşarjının sağlanabilmesi için 200 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması planlanmıştır. İş tamamlandığında arıtma işlemi gerçekleştirilmiş atıksu doğaya, insan sağlığına, temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj edilecektir.

1- PROJE NUMARASI	:	ATIKSU ARITMA TESİSİ 19
2- İŞİN ADI	:	YEŞİLHİSAR / İÇMECE - KAYADİBİ - KOVALI - KUŞÇU - OVAÇİFTLİK ORTAK İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	YEŞİLHİSAR
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	19.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	AHMET ER - İNŞAAT MÜHENDİSİ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.661.440,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 67.639,30

SONUÇ: Bu proje kapsamında daha önce atıksu uzaklaştırma sistemi yapılmış mahallede, atıksuyun su kirliliği kontrol yönetmeliği kriterlerine göre deşarjının sağlanabilmesi için 200 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması planlanmıştır. İş tamamlandığında arıtma işlemi gerçekleştirilmiş atıksu doğaya, insan sağlığına, temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj edilecektir.



1- **PROJE NUMARASI** : ATIKSU ARITMA TESİSİ 20
2- **İŞİN ADI** : YEŞİLHİSAR / MUSAHACILI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : YEŞİLHİSAR
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 19.06.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : AHMET ER – İNŞAAT MÜHENDİSİ
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 1.603.620,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI** : ₺ 183.519,88

SONUÇ: Bu proje kapsamında daha önce atıksu uzaklaştırma sistemi yapılmış mahallede atıksuyun su kirliliği kontrol yönetmeliği kriterlerine göre deşarjının sağlanabilmesi için 150 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması planlanmıştır. İş tamamlandığında arıtma işlemi gerçekleştirilmiş atıksu doğaya, insan sağlığına, temiz su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde deşarj edilecektir.

1- **PROJE NUMARASI** : ATIKSU ARITMA TESİSİ 21
2- **İŞİN ADI** : AKKIŞLA BÜNYAN ÖZVATAN VE SARIZ İLÇELERİ A.A.T PROJELERİ YAPTIRILMASI (2015 - 2017 SÂRİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : AKKIŞLA, BÜNYAN, ÖZVATAN, SARIZ
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 03.09.2015
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : NEFHA İNŞAAT TAAH. VE TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 417.720,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI** : ₺ 417.720,00

SONUÇ: **Akkışla**(700m³/GÜN), **Bünyan**(3500m³/GÜN), **Özvatan**(600m³/GÜN), **Sarız** (700m³/GÜN) atıksu arıtma tesisi proje yapım işleri gerçekleştirilmiştir.

1- **PROJE NUMARASI** : ATIKSU ARITMA TESİSİ 22
2- **İŞİN ADI** : MUHTELİF ARITMA TESİSLERİ TRAFO POSTASI VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPIMI (2017 - 2018 SÂRİ)
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : AKKIŞLA, BÜNYAN, İNCESU, KOCASİNAN, PINARBAŞI, SARIOĞLAN, TOMARZA, YAHYALI, YEŞİLHİSAR
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 23.06.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : MESUT AYTÜRK - MEBİT ELKT. BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEK. TİC. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 1.849.060,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI** : ₺ 911.586,58

SONUÇ: Bu proje kapsamında **Akkışla**(Gömürgen), **Bünyan**(Akmescit, Elbaşı, Karakaya, Koyunabdal, Yenisüksün), **İncesu** (Tahirini), **Kocasinan** (Himmetdede, Yemliha), **Pınarbaşı** (Pazarören), **Sarıoğlan** (Karaözü, Üzerlik), **Tomarza** (Akdere, Avşarobası, Dadaloğlu), **Yahyalı** (Büyükçakır, Çubuklu), **Yeşilhisar** (Musahacılı, Kayadibi Kuşçu İçmece) ilçelerindeki muhtelif arıtma tesislerine trafo postası ve enerji nakil hattı yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- **PROJE NUMARASI** : ATIKSU ARITMA TESİSİ 23 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- **İŞİN ADI** : DEVELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ BORU VE VANA İZOLASYONU
3- **BAĞLI OLDUĞU İLÇE** : DEVELİ
4- **SÖZLEŞME TARİHİ** : 16.01.2017
5- **YÜKLENİCİ FİRMA** : DRN TEKNİK YAPI TARIM İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- **YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ** : ₺ 26.550,00
7- **YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI** : ₺ 26.550,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında Develi Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan boru ve vanaların izolasyonu işlemi gerçekleştirilmiştir.

D- YAĞMURSUYU YATIRIMLARI

1- PROJE NUMARASI	:	YAĞMURSUYU 1
2- İŞİN ADI	:	2016 YILI MELİKGAZİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE YAĞMURSUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN, MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	20.05.2016
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	GÖKER GÖZÜTOK MÜH. İNŞAAT PRJ. TAAH.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 464.800,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN TOPLAM	:	₺ 464.800,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında Kocasinan İlçesi Erkilet Çocuk Hastanesi çevresi Ø 600 mm 1.410m, Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı Ø 150 mm 541m, Ø 400 mm 1.458m, Ø 500 mm 247m, İldem Bölgesi Ø 200 mm 404m, Ø 300 mm 588m, korige borularla toplam 4.648 m yağmursuyu şebeke ve kolektör hattı yapılmıştır.



1- PROJE NUMARASI	:	YAĞMURSUYU 2 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN CEZAEVİ YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	13.01.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KAYISI HAFRİYAT - YAVUZ GENCER KAYISI
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 35.400,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN 2017 YILI	:	₺ 35.400,00

SONUÇ: Bünyan Cezaevi yağmursuyu hattı inşaatı işi kapsamında Ø 500 korige boru ile 200m yağmursuyu hattı yapılmıştır.

E- MUHTELİF YATIRIMLAR

1- PROJE NUMARASI	:	MUHTELİF 1
2- İŞİN ADI	:	KASKİ İDARİ BİNASI ÇATI VE DIŞ CEPHE MANTOLAMA YAPILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	20.03.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	AYDINLAR İNŞ. VE İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.696.840,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN TOPLAM	:	₺ 1.649.880,99

SONUÇ: 1994 yılında hizmete açılan KASKİ idari binamızın dış cephe ve çatısında oluşan yıpranmalardan dolayı tamir ve tadilat yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu proje kapsamında dış cephe yalıtım ve çatı örtüsü yenileme işlemi yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	MUHTELİF 2
2- İŞİN ADI	:	KIRMATAŞ MALZEME TEMİNİ MAL ALIMI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN - MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	20.03.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	SOLMAZLAR NAK. İNŞ. VE İNŞAAT MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.255.225,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN TOPLAM	:	₺ 412.241,87

SONUÇ: İlimiz sınırları içerisinde hizmet veren KASKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerin ve ihale yolu ile idaremizden altyapı işi alan yüklenici firmaların kullanması için 185.000 ton nitelikli kırma taş dolgu malzemesi temini sağlanacaktır. 2017 yılı içerisinde 60.757,83 ton nitelikli kırma taş dolgu malzemesi temini yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	MUHTELİF 3
2- İŞİN ADI	:	SARIZ EKİPEVİ İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	SARIZ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	15.03.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	FATİH TÜRKÜM
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.050.023,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 1.049.796,94

SONUÇ: Sarız ilçemizde hizmet vermekte olan Kaski Genel Müdürlüğüne bağlı kanalizasyon ve içmesuyu ekipleri ile abonelik hizmetlerini gerçekleştiren genel müdürlük personellerimizin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmeleri için Sarıoğlan ilçe merkezine, bünyesinde araç hangarları, malzeme depoları ve kamu hizmet bölümü bulunan bir ekip evi projelendirilmiş ve inşaatı gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	MUHTELİF 4
2- İŞİN ADI	:	SARIOĞLAN EKİPEVİ İNŞAATI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	SARIOĞLAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	15.03.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	AÇILIM TEKNİK MÜŞAVİRLİK TAAHHÜT VE İNŞAAT MÜHENDİSLİK TURİZM
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 1.034.860,00 x %10 = ₺ 1.138.346,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN TOPLAM	:	₺ 1.117.870,35

SONUÇ: Sarıoğlan ilçemizde hizmet vermekte olan Kaski Genel Müdürlüğüne bağlı kanalizasyon ve içmesuyu ekipleri ile abonelik hizmetlerini gerçekleştiren genel müdürlük personellerimizin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmeleri için Sarıoğlan ilçe merkezine, bünyesinde araç hangarları, malzeme depoları ve kamu hizmet bölümü bulunan bir ekip evi projelendirilmiş ve inşaatı gerçekleştirilmiştir.



1- PROJE NUMARASI	:	MUHTELİF 5
2- İŞİN ADI	:	TEKNİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI (2017 - 2019 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	05.07.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	PINAR TESİSAT - ÜMÜT GÜNDÜZ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 4.026.469,51
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 663.273,96

SONUÇ: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanı içerisinde bulunan ilçe ve mahallelerde yapılacak olan yatırımlarımızın her geçen gün artmasından dolayı, hizmet alanı içerisindeki yapım işlerimizin yapı denetim (kontrollük) hizmetlerinin yoğunluk kazandığı bilinen bir gerçektir. Şu ana kadar bahse konu hizmetler 657 sayılı kanuna tabi memur personeller, sözleşmeli personeller ve işçi personeller tarafından karşılanmaya çalışılıyordu. Ancak mevcut teknik personellerin gerek birim içerisinde farklı görevlere, gerekse diğer birimlerde görevlendirilmelerinden dolayı, aktif kontrollük hizmetlerini yürüten personelin sayısının azalmasına yol açmıştır. Bahse konu işlerle alakalı, mühendis ve tekniker pozisyonunda personel çalıştırılmasının zorunlu hale gelmesinden dolayı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi yapılmasına gerek duyulmuştur.

1- PROJE NUMARASI	:	MUHTELİF 6 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	BÜNYAN İÇMESUYU TEMİNİ GEÇİCİ KAPTAJ ALANI YAPILMASI VE AHŞAP OTURTMALI ÇATI İLE ÜZERİNİN KAPATILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	BÜNYAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	31.01.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ERBU DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 47.200,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 47.200,00

SONUÇ: Bünyan içmesuyu temini geçici kaptaj alanı yapılması ve ahşap oturtmalı çatı ile üzerinin kapatılması işi gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	MUHTELİF 7 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	GERMİRALTI İDARE BİNASINA ARŞİV TADİLATI YAPILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	11.12.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	KÜRŞAT ŞAHİN MÜHENDİSLİK İNŞAAT-YAPI
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 63.738,37
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 63.738,37

SONUÇ: Germiraltı idare binasına arşiv tadilatı yapılması işi gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	MUHTELİF 8 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	GESİ MAHALLESİ KISMİ TAŞ DUVAR YAPILMASI (GESİ GÜNEY MAH. ÜÇ HAVUZLAR SOKAK)
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	MELİKGAZİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	23.05.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	ASB İNŞAAT TAAH. PET. ELEKT. ELEKTRONİK NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 21.830,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 21.830,00

SONUÇ: Gesi mahallesi kısmi taş duvar yapılması işi kapsamında Gesi Güney Mahallesi Üç Havuzlar Sokakta 40m³ taş duvar ve beton hatıl yapılması işi gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	MUHTELİF 9 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	KASKİ ANA HİZMET BİNASI KATLARA SICAKSU TEMİNİ
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	30.10.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	E.T. TÜRKMEN MÜHENDİSLİK
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 22.193,44
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 22.193,44

SONUÇ: KASKİ merkez ana hizmet binasında bulunan katlardaki lavabolara sıcak su temin edilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	MUHTELİF 10 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	KASKİ ÇAY OCAĞININ KISMİ SERAMİK TADİLATININ YAPILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	08.06.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	AHMET EROL MÜH. İNŞ. TAAH.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 4.720,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 4.720,00

SONUÇ: Bu iş kapsamında KASKİ çay ocağına 40m² seramik tadilatının yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	MUHTELİF 11 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	KASKİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI ÖN CEPHE KAPLAMASI YAPIMI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	KOCASİNAN
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	24.10.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	HİLAL ALÜMİNYUM
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 68.438,58
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 68.438,58

SONUÇ: KASKİ Genel Müdürlüğü ana binası ön cephe girişine 305m² cephe kaplaması yapılmıştır.

1- PROJE NUMARASI	:	MUHTELİF 12 (DOĞRUDAN TEMİN)
2- İŞİN ADI	:	YAHYALI VE TOMARZA İLÇELERİ BÖLGE HİZMET BİNALARI PROJE YAPIMI
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	YAHYALI - TOMARZA
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	27.03.2017
5- YÜKLENİCİ FİRMA	:	NCZ HARİTA
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	₺ 38.350,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 38.350,00

SONUÇ: Yahyalı ve Tomarza İlçeleri bölge hizmet binaları projeleri yapımı gerçekleştirilmiştir.

1- PROJE NUMARASI	:	MUHTELİF 13
2- İŞİN ADI	:	HARİTA EMLAK KAMULAŞTIRMA FAALİYET DURUMU
3- BAĞLI OLDUĞU İLÇE	:	MUHTELİF İLÇE BELDE VE MAHALLELER
4- SÖZLEŞME TARİHİ	:	2017
5- YAPILAN İŞİN MİKTARI	:	38.984,25 m² İSTİMLÂK, 290,34 m² İRTİFAK, 31,00 m² BEDELSİZ DEVİR, 26.580,00 m² TAHSİS
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ	:	---
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN	:	₺ 486.290,52

SONUÇ: Hinterland kapsamında, hizmet götürmekle yükümlü olduğumuz yeni beldelerin kanalizasyon ve içme suyu sorunlarına kesin çözüm bulmak amacıyla yeni hazırlanan projelere altlık teşkil edecek şekilde projenin amacına uygun olarak istimlâk işlemlerinin bir kısmı tamamlanmış bir kısmına ise devam edilmektedir. Bu projelerin uygulaması sırasında inşaat mahallinde bulunan muhtelif taşınmazların bahçe duvarlarına ve ekili, dikili bulunan ürünlere zarar verilmiş ve hasar tespit tutanakları hazırlanarak hak sahiplerine ödenmiştir.



HARİTA EMLAK KAMULAŞTIRMA İŞLERİNDEKİ 2016 YILI FAALİYETİ

Genel Müdürlüğümüzün hizmet götürmekle yükümlü olduğu bölgelerde, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince, Kamulaştırma ve Daimi İrtifak tesisi, Devir işlemleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, 2017 yılı içerisinde;

Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanan Yerler: Develi ilçesinde 3 adet taşınmazda 5.803,05 m²'lik alanın ₺26.664,75 bedelle, Yeşilhisar İlçesinde 2 adet taşınmazda 11.589,39 m²'lik alanın ₺ 105.427,84 bedelle, Tomarza İlçesinde 1 adet taşınmazda 8.800,00m²'lik alanın ₺ 26.400,00 bedelle, Sarıoğlan İlçesinde 1 adet taşınmazda 2.243,51 m²'lik alanın ₺ 12.002,77 bedelle, Melikgazi ilçesinde 1 adet taşınmazda 702,52 m²'lik alanın ₺ 232.006,60 bedelle, Sarız İlçesinde 1 adet taşınmazda 2.845,11 m²'lik alanın ₺ 2.845,11 bedelle, Pınarbaşı İlçesinde 1 adet taşınmazda 2.600,00 m²'lik alanın ₺ 10.400,00 bedelle, Melikgazi İlçesinde 1 adet taşınmazda 226,67 m²'lik alanın ₺7.933,45 bedelle, Kocasinan İlçesinde 1 adet taşınmazda 4.174,00 m²'lik alanın ₺ 62.610,00 bedel karşılığında olmak üzere toplam 38.984,25m²'lik alan ₺ 486.290,52 bedel ile istimlâk edilerek Genel Müdürlüğümüz adına tapuda tescili yapılmıştır.

İrtifak İşlemleri Tamamlanan Yerler: Kayseri Şeker Ana Kollektör üzerinde bulunan 4 adet taşınmazda 290,34 m²'lik kısımda Genel Müdürlüğümüz lehine daimi irtifak tesisi kurularak tapuda tescili yaptırılmıştır.

Devir İşlemleri Tamamlanan Yerler: Develi ilçesinde 1 adet taşınmazda 31 m²'lik alanın devri Genel Müdürlüğümüze geçti.

Tahsis İşlemleri Tamamlanan Yerler: Pınarbaşı ilçesinde 1 adet taşınmazda 26.580 m²'lik kısımda Genel Müdürlüğümüz lehine daimi irtifak tesisi kurularak tapuda tescili yaptırılmıştır

ARAZİ ÇALIŞMALARI

Kurumumuzun faaliyetlerini yerine getirmesinde yardımcı olan muhtelif tesis ve hizmetlere yönelik olarak, bu kapsamda ihtiyaç duyulan her türlü arazi ölçüm ve aplikasyon işleri yapılarak, bu ölçümler neticesinde elde edilen verilerin hesapları yapılıp, ileriki zamanlarda yapılması planlanan işler ve alınacak kararlar için uygun alt yapı bilgileri hazırlanmaktadır.

a) Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Nedeni ile;

* 51 adet kanalizasyon projesi yapım işi kapsamında Develi ilçesi Sarıca Mahallesi yapılması düşünülen terfi hattı ölçümü yapıldı.

* 51 adet kanalizasyon projesi yapım işi kapsamında Develi ilçesi Gümüşören Mahallesi yapılacak fosseptik yerinin aplikasyonu yapıldı.

* Bünyan İlçesi'nde Yapılacak olan Kanalizasyon ana kolektör hattı nedeni ile arazi ölçümü yapıldı. (10km)

*Yahyalı İlçesi Kapuzbaşı Mahallesinde yapılacak olan kanalizasyon projesi nedeni ile fosseptik yeri ölçümü yapıldı. (7km)

b) İçmesuyu Hattı Çalışmaları Nedeni ile;

* Melikgazi İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi Kulaklı mevkiinde bulunan su deposu yerinin ifraz işlemleri için Kadastro Kontrol Mühendisi ile arazi ölçümü ve kontrolü yapılmıştır.

c)Atıksu Arıtma Tesisi Çalışmaları Nedeni ile;

* 19 mahallede Atıksu Arıtma Tesisi projesi yapım işi kapsamında Pınarbaşı ilçesi Pazarören mahallesinde yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi yerinin aplikasyonu Kadastro kontrol mühendisi ile arazi kontrolü yapıldı.

* 19 mahallede Atıksu Arıtma Tesisi projesi yapım işi kapsamında Pınarbaşı ilçesi Pazarören mahallesinde ve Tomarza ilçesinin muhtelif mahallelerinde yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi yerinin aplikasyonu ile arazi kontrolü yapıldı.

* Himmetdede - Kalkancık - Karakimse AAT yeri tespiti amacıyla 8 km güzergâh ölçümü yapıldı.

* Tuzhisar - Palas - Sultanhanı - Üzerlik AAT yeri tespiti için 20 km güzergâh ölçümü yapıldı.

* Sindelhöyük - Öksüt - Gazi - Zile - Tombak - Soysallı Develi AAT yeri tespiti için 30 km güzergâh ölçümü yapıldı.

* Şeker - Anbar Ana kolektör hattı 11 km ölçümü yapıldı.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 YILI FAALİYET İCMALİ

İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER		
İÇMESUYU İŞLERİ TOPLAMI	211.438 m	₺ 39.826.466,43
KANALİZASYON İŞLERİ TOPLAMI	373.404 m	₺ 37.970.635,84
ATIKSU ARITMA TESİSİ	20 Ad.	₺ 4.976.347,22
YAĞMURSUYU İŞLERİ TOPLAMI	4.648 m	₺ 464.800,00
MUHTELİF İŞLER TOPLAMI		₺ 4.893.064,11
TOPLAM		**₺ 88.131.313,60**

DOĞRUDAN TEMİN		
İÇMESUYU İŞLERİ TOPLAMI	6.220 m	₺ 1.010.725,46
KANALİZASYON İŞLERİ TOPLAMI	1.782 m	₺ 195.596,35
ATIKSU ARITMA TESİSİ		₺ 26.550,00
YAĞMURSUYU İŞLERİ TOPLAMI	200 m	₺ 35.400,00
MUHTELİF İŞLER TOPLAMI		₺ 752.760,91
TOPLAM		**₺ 2.021.032,72**

İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER + DOĞRUDAN TEMİN DÂHİL		
İÇMESUYU İŞLERİ TOPLAMI	217.658 m	₺ 40.837.191,89
KANALİZASYON İŞLERİ TOPLAMI	375.186 m	₺ 38.166.232,19
ATIKSU ARITMA TESİSİ	20 Ad.	₺ 5.002.897,22
YAĞMURSUYU İŞLERİ TOPLAMI	4.848 m	₺ 500.200,00
MUHTELİF İŞLER TOPLAMI		₺ 5.645.825,02
TOPLAM		**₺ 90.152.346,32**

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2017 YILI FALİYET RAPORU

A - İÇMESUYU YATIRIMLARI

S.NO	İŞİN ADI	YAPILAN İŞ		2017 YILI MALİYETİ (KDV DÂHİL)
1	2016 YILI GESİ KISMİ İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 110 PE	430 m	₺ 59.094,03
		ABONE BAĞLANTISI	25 Ad.	
		DEPO TAMİR TADİLATI	1 Ad.	
		TOPLAM	**430 m**	
2	2017 YILI 1. GRUP 15 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2017 - 2018 SARÎ)	**DEVELİ** (KULPAK, SOYSALLI, TOKİ)	3 Ad.	₺ 1.297.282,56
		İNCESU (SUBAŞI)	1 Ad.	
		KOCASİNAN (AKİN, DORUKLU, EĞİM 1 - 2, MAHZEMİN)	5 Ad.	
		MELİKGAZİ (ANNELERPARKI 1 - 2, BÜYÜKBÜRÜNGÜZ, EĞRİBUCAK DEPO ALTI 1 - 2, GÜLMERSU, MAHRUMLAR 1 - 2)	6 Ad.	
		TALAS (KURUKÖPRÜ)	1 Ad.	
		TOPLAM	**16 Ad.**	
3	2017 YILI 2. GRUP 23 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2017 - 2018 SARÎ)	**AKKIŞLA** (GİRİNCİ)	Ad.	₺ 0,00
		BÜNYAN (EMİRÖREN, KARACAÖREN, KÖSEHACILI, ŞIVGIN)	4 Ad.	
		DEVELİ (SİNDELHÖYÜK)	1 Ad.	
		FELAHİYE (MENTEŞE)	Ad.	
		KOCASİNAN (DÜVER, **GÜNEŞLİ,** KAŞ, **YUVALI**, YÜREĞİL)	2 Ad.	
		PINARBAŞI (BÜYÜKKÖMARMUT, DEMİRCİLİ - AKPINAR, **KAMAN,** KUŞÇULAR, KIZILÖREN - MEZGİTLİ)	1 Ad.	
		SARIOĞLAN (**ALAMETTİN,** ÜZERLİK, **TATILI**)	2 Ad.	
		SARIZ (BÜYÜKSÖBEÇİMEN)	1 Ad.	
		TALAS (ORTAKAVAK)	Ad.	
		TOMARZA (KAPUKAYA, **MERKEZ 1 - 2,** ÜÇKONAK)	2 Ad.	
		TOPLAM	**13 Ad.**	
4	AKKIŞLA, BÜNYAN, FELÂHİYE, HACILAR, İNCESU, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, ÖZVATAN, SARIOĞLAN, TALAS İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SARÎ)	AKKIŞLA İLÇESİ AKİN MAHALLESİ 200 M³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI (KREYN KİRİŞSİZ) VE MEVCUT 75 M³ LÜK BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU YIKIMI	1 Ad.	₺ 2.655.958,21
		AKKIŞLA İLÇESİ İÇMESUYU TESİSLERİNİN MEKANİK İŞLERİNİN YAPILMASI	1 Ad.	
		AKKIŞLA	**2 Ad.**	

		BÜNYAN İLÇESİ AĞCALI MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		BÜNYAN İLÇESİ AĞCALI MAHALLESİ POMPA BİNASI TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		BÜNYAN İLÇESİ BURHANİYE MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		BÜNYAN İLÇESİ ELBAŞI MAHALLESİ 300 M³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU YAPIMI (KREYN KİRİŞSİZ) VE MEVCUT 250 M³ LÜK BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU YIKIMI	1 Ad.	
		BÜNYAN İLÇESİ KARAKAYA MAHALLESİ 150 M³ LÜK AŞAĞI DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		BÜNYAN İLÇESİ KARAKAYA MAHALLESİ 150 M³ LÜK YUKARI DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		BÜNYAN İLÇESİ KARDEŞLER MAHALLESİ 100 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		BÜNYAN İLÇESİ KARDEŞLER MAHALLESİ POMPA BİNASI TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		BÜNYAN İLÇESİ KÖSEHACLILI MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		BÜNYAN İLÇESİ İÇMESUYU TESİSLERİNİN MEKANİK İŞLERİNİN YAPILMASI	1 Ad.	
		BÜNYAN	**10 Ad.**	
		FELAHİYE İLÇESİ ACIRLI MAHALLESİ 25 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
	AKKIŞLA, BÜNYAN, FELAHİYE, HACILAR, İNCESU, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, ÖZVATAN, SARIOĞLAN, TALAS İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SARÎ)	FELAHİYE İLÇESİ ALPARSLAN MAHALLESİ ALADAYILI MEZRASI MASLAK YAPILMASI (BASINÇ KIRICI TİPİ)	1 Ad.	
		FELAHİYE İLÇESİ BÜYÜK TOROMAN MAHALLESİ 300 M³ LÜK 1 NOLU DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		FELAHİYE İLÇESİ BÜYÜK TOROMAN MAHALLESİ 400 M³ LÜK 2 NOLU DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		FELAHİYE İLÇESİ BÜYÜK TOROMAN MAHALLESİ 300 M³ LÜK 3 NOLU DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		FELAHİYE İLÇESİ İÇMESUYU TESİSLERİNİN MEKANİK İŞLERİNİN YAPILMASI	1 Ad.	
		FELÂHİYE	**6 Ad.**	
		HACILAR İLÇESİ AKSU DAĞEVİ ALTI MASLAK VE DRENAJ TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		HACILAR İLÇESİ İÇMESUYU TESİSLERİNİN MEKANİK İŞLERİNİN YAPILMASI	1 Ad.	
		HACILAR	**2 Ad.**	
		İNCESU İLÇESİ HAMURCU MAHALLESİ 150 M³ LÜK 1 NOLU DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		İNCESU İLÇESİ HAMURCU MAHALLESİ 150 M³ LÜK 2 NOLU DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		İNCESU İLÇESİ İÇMESUYU TESİSLERİNİN MEKANİK İŞLERİNİN YAPILMASI	1 Ad.	
		İNCESU	**3 Ad.**	
		KOCASİNAN İLÇESİ AMARAT MAHALLESİ 70 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		KOCASİNAN İLÇESİ EMMİLER MAHALLESİ 300 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		KOCASİNAN İLÇESİ EMMİLER MAHALLESİ KAYAPINAR MEVKİİ 50 M³ HACMİNDE BETONARME MASLAK YAPIMI	1 Ad.	
		KOCASİNAN İLÇESİ İÇMESUYU TESİSLERİNİN MEKANİK İŞLERİNİN YAPILMASI	1 Ad.	

	AKKIŞLA, BÜNYAN, FELAHİYE, HACILAR, İNCESU, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, ÖZVATAN, SARIOĞLAN, TALAS İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SARÎ)	**KOCASİNAN**	**4 Ad.**	
		MELİKGAZİ İLÇESİ ÇALKAN 1.000 M³ LÜK DEPO VE P1 TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		MELİKGAZİ İLÇESİ BAŞIRGAT KAVŞAĞI 30 M³ HACMİNDE BETONARME MASLAK YAPIMI	1 Ad.	
		MELİKGAZİ İLÇESİ EĞRİBUCAK MAHALLESİ BAHÇELİHAN 200m³ İÇMESUYU DEPOSU YAPIMI	1 Ad.	
		MELİKGAZİ İLÇESİ GESİ GÜZELKÖY MAHALLESİ 500m³ DEPO YAPILMASI	1 Ad.	
		MELİKGAZİ İLÇESİ MİMARSİNAN MAHALLESİ 1.500 M³ LÜK YARMA DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		MELİKGAZİ İLÇESİ İÇMESUYU TESİSLERİNİN MEKANİK İŞLERİNİN YAPILMASI	1 Ad.	
		MELİKGAZİ	**6 Ad.**	
		ÖZVATAN İLÇESİ SOĞUKPINAR 50 M³ HACMİNDE BETONARME MASLAK YAPIMI	1 Ad.	
		ÖZVATAN İLÇESİ İÇMESUYU TESİSLERİNİN MEKANİK İŞLERİNİN YAPILMASI	1 Ad.	
		ÖZVATAN	**2 Ad.**	
		SARIOĞLAN İLÇESİ ALAMETTİN MAHALLESİ 300 M³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU YAPIMI (KREYN KİRİŞSİZ) VE MEVCUT 150 M³ LÜK BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU YIKIMI	1 Ad.	
		SARIOĞLAN İLÇESİ MURATBEYLİ MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		SARIOĞLAN İLÇESİ MURATBEYLİ MAHALLESİ MASLAK VE MASLAK BİNASI TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		SARIOĞLAN İLÇESİ İÇMESUYU TESİSLERİNİN MEKANİK İŞLERİNİN YAPILMASI	1 Ad.	
		SARIOĞLAN	**4 Ad.**	
		TALAS İLÇESİ AKÇAKAYA MAHALLESİ KAYNAKLARINA TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		TALAS İLÇESİ AKÇAKAYA ZİNCİDERE MAHALLESİ 30m³ B.A. MASLAK YAPILMASI	1 Ad.	
		TALAS İLÇESİ SÜLEYMANLI MAHALLESİ 100 M³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI (KREYN KİRİŞSİZ)	1 Ad.	
		TALAS İLÇESİ BAŞPINAR MAHALLESİ MASLAKLARIN TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		TALAS İLÇESİ CEBİR MAHALLESİ 300 M³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU YAPIMI (KREYN KİRİŞSİZ) VE MEVCUT 80 M³ LÜK BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU YIKIMI	1 Ad.	
		TALAS İLÇESİ KEPEZ MAHALLESİ 20 M³ HACMİNDE BETONARME MASLAK YAPIMI	1 Ad.	
		TALAS İLÇESİ SÜLEYMANLI MAHALLESİ 100 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		TALAS İLÇESİ İÇMESUYU TESİSLERİNİN MEKANİK İŞLERİNİN YAPILMASI	1 Ad.	
		TALAS	**8 Ad.**	
		TOPLAM	**47 Ad.**	
5	AKKIŞLA İLÇESİ GÖMÜRGEN MAHALLESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 110 O-PVC	m	₺ 0,00
		Ø 160 O-PVC	m	
		100m³ GÖMME SU DEPOSU	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		VANTUZ ODASI	Ad.	
		YANGIN HİDRANTI	Ad.	
		TOPLAM	**m**	

6	ALİ DAĞI İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI	Ø 63 PE	361 m	₺ 631.998,57
		Ø 110 O-PVC	7.270 m	
		Ø 160 O-PVC	705 m	
		YANGIN HİDRANTI	7 Ad.	
		TOPLAM	**8.336 m**	
7	ANNELER PARKI TERFİ MERKEZİ ENERJİ TEMİNİ	TERFİ MERKEZİ ENERJİ TEMİNİ		₺ 708.039,01
8	BÜNYAN İLÇESİ BURHANİYE VE KARDEŞLER MAHALLELERİ İÇMESUYU TEMİNİ VE İSALE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 110 O-PVC	971 m	₺ 282.050,63
		Ø 160 O-PVC	4.807 m	
		TOPLAM	**5.778 m**	
9	BÜNYAN İLÇESİ KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ İÇMESUYU TERFİİ VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 63 PVC	8.640 m	₺ 807.580,98
		Ø 110 O-PVC	5.880 m	
		Ø 160 O-PVC	585 m	
		Ø 300 ÇB / Ø 160 PE YATAY GEÇİŞİ	72 m	
		30m³ MASLAK VE MOTOREVİ TADİLATI	Ad.	
		75m³ AYAKLI DEPO TADİLATI	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		YANGIN HİDRANTI	3 Ad.	
		TOPLAM	**15.177 m**	
10	BÜNYAN İLÇESİ PINARBAŞI İÇMESUYU KAYNAĞI KAPTAJ BİNASI YAPIMI (2016 - 2017 SARÎ)	KAPTAJ BİNASI YAPIMI		₺ 1.213.847,39
11	BÜNYAN İLÇESİ SAMAĞIR MAHALLESİ İÇMESUYU HATTI İNŞAATI	Ø 63 PVC	2.759 m	₺ 491.910,81
		Ø 110 PE	201 m	
		Ø 110 O-PVC	6.166 m	
		75m³ DEPO YIKIMI	1 Ad.	
		100m³ DEPO TADİLATI	1 Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		KUYU BİNASI TADİLATI	Ad.	
		YANGIN HİDRANTI	Ad.	
		TOPLAM	**9.126 m**	
12	DEVELİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI	Ø 200 DI	981 m	₺ 312.922,03
		Ø 250 DI	2.472 m	
		Ø 400 DI	213 m	
		Ø 200 ÇB	m	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		TOPLAM	**3.666 m**	
13	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SARÎ)	DEVELİ İLÇESİ AYVAZHACILI MAHALLESİ AFETEVLERİ MEVKİİ 75 M³'LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	₺ 1.449.879,38
		DEVELİ İLÇESİ GAZİKÖY MAHALLESİ 150 M³'LÜK İÇMESUYU 1.DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		DEVELİ İLÇESİ GAZİKÖY MAHALLESİ 150 M³'LÜK İÇMESUYU 2.DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		DEVELİ İLÇESİ AYVAZHACILI MAHALLESİ MİLLİDERE MEVKİİ 50 M³'LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		DEVELİ İLÇESİ ŞIHLI MAHALLESİ 150 M³'LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		DEVELİ İLÇESİ HAVADAN VE OLUK MAHALLELERİ 75 M³'LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		DEVELİ İLÇESİ HAVADAN VE CAMBAZ MAHALLELERİ 30 M³'LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	

		DEVELİ İLÇESİ KULPAK MAHALLELERİ 200 M³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU YAPIMI (KREYN KİRİŞSİZ) (YENİ DEPO) VE 75 M³'LÜK ESKİ DEPONUN YIKILMASI VE YIKIM ARTIĞI HAFRİYATIN KESİN DÖKÜM SAHASINA TAŞINMASI	1 Ad.	
		DEVELİ İLÇESİ ÇAYIRÖZÜ MAHALLESİ 200 M³'LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		DEVELİ İLÇESİ SİNDELHÖYÜK MAHALLESİ 300 M³'LÜK İÇMESUYU 1.DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		DEVELİ İLÇESİ ÇADIRYERİ MAHALLELERİ 100 M³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI (KREYN KİRİŞSİZ) (YENİ DEPO) VE 75 M³'LÜK ESKİ DEPONUN YIKILMASI VE YIKIM ARTIĞI HAFRİYATIN KESİN DÖKÜM SAHASINA TAŞINMASI	Ad.	
		DEVELİ İLÇESİ DEREBAŞI MAHALLESİ 75 M³'LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		DEVELİ İLÇESİ SİNDELHÖYÜK MAHALLESİ 300 M³'LÜK İÇMESUYU 2.DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		DEVELİ İLÇESİNDEKİ DEPOLARIN MEKANİK İŞLERİ	1 Ad.	
		DEVELİ	**11 Ad.**	
	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SARÎ)	TOMARZA İLÇESİ YEŞİLBAĞ MAHALLESİ 75 M³'LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ ŞİRAZ MAHALLESİ 100 M³'LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ GÜLVEREN MAHALLESİ 75 M³'LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ KAPUKAYA MAHALLESİ 100 M³'LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ KAPUKAYA MAHALLELERİ 30 M³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI (KREYN KİRİŞSİZ) (YENİ DEPO)	Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ BOSTANLIK MAHALLESİ 50 M³'LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ KALE MAHALLESİ 100 M³'LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ SÖĞÜT MAHALLESİ 100 M³'LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ ŞIHBARAK MAHALLESİ 300 M³'LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ CÜCÜN MAHALLESİ MOTOREVİ TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ CÜCÜN MAHALLESİ 150 M³'LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ DADALOĞLU AKİN MAHALLESİ AYAKLI DEPO TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ BÜYÜK CANLI MAHALLESİ 100 M³'LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ 50 M³'LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ DADALOĞLU MAHALLESİ MOTOREVİ YAPILMASI VE ESKİ MOTOREVİNİN YIKILMASI	Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ DADALOĞLU MAHALLESİ GÖKTEPE MASLAK YAPILMASI	Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ TATAR MAHALLESİ 75 M³'LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ MELİKÖREN MAHALLESİ MOTOREVİ YAPILMASI VE ESKİ MOTOREVİNİN YIKILMASI	Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ MELİKÖREN MAHALLESİ ELEKTRİK EVİ TAMİRATININ YAPILMASI	Ad.	
		TOMARZA İLÇESİ KÖMÜR MAHALLELERİ 100 M³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI (KREYN KİRİŞSİZ) (YENİ DEPO)	1 Ad.	

	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SARÎ)	TOMARZA İLÇESİ GÜZELCE MAHALLESİ 75'M³ LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		TOMARZA İLÇESİNDEKİ DEPOLARIN MEKANİK İŞLERİ	1 Ad.	
		TOMARZA	**8 Ad.**	
		YAHYALI İLÇESİ ULUPINAR MAHALLESİ KAYNAKLARINA MASLAK YAPILMASI	1 Ad.	
		YAHYALI İLÇESİ ULUPINAR MAHALLELERİ 100 M³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU YAPIMI (KREYN KİRİŞSİZ) (YENİ DEPO) VE 100 M³'LÜK ESKİ DEPONUN YIKILMASI VE YIKIM ARTIĞI HAFRİYATIN KESİN DÖKÜM SAHASINA TAŞINMASI	Ad.	
		YAHYALI İLÇESİ KUZUOLUK MAHALLESİ 75 M³'LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		YAHYALI İLÇESİ SAZAK MAHALLESİ 75 M³'LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		YAHYALI İLÇESİ MUSTAFABEYLİ MAHALLESİ 200'M³ LÜK DEPO TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		YAHYALI İLÇESİNDEKİ DEPOLARIN MEKANİK İŞLERİ	1 Ad.	
		YAHYALI	**4 Ad.**	
		TOPLAM	**23 Ad.**	
14	DEVELİ, YAHYALI, PINARBAŞI, FELÂHİYE, TOMARZA, YEŞİLHİSAR İLÇELERİNDE KUYU BİNALARI YAPILMASI	**BÜNYAN** ELBAŞI, EMİRÖREN KUYU BİNASI YAPILMASI (KAPLAMA TUĞLASIZ)	2 Ad.	₺ 763.286,92
		DEVELİ KULPAK, MERKEZ 1 (MİLLİDERE YOLUKUYU), MERKEZ SOYSALLI 1, KUYU BİNASI YAPILMASI (KAPLAMA TUĞLASIZ)	3 Ad.	
		FELAHİYE ALPARSLAN, BÜYÜK TOROMAN, İSABEY, KAYAPINAR KUYU BİNASI YAPILMASI (KAPLAMA TUĞLASIZ)	4 Ad.	
		KOCASİNAN AKİN, DORUKLU, GÜNEŞLİ KUYU BİNASI YAPILMASI (KAPLAMA TUĞLASIZ)	3 Ad.	
		MELİKGAZİ KONAKLAR KUYU BİNASI YAPILMASI (KAPLAMA TUĞLASIZ)	1 Ad.	
		PINARBAŞI ASLANBEYLİ, GÜLTEPE, ORUÇOĞLU, YUSUFLAR KUYU BİNASI YAPILMASI (KAPLAMA TUĞLASIZ)	4 Ad.	
		SARIOĞLAN ALAMETTİN KUYU BİNASI YAPILMASI (KAPLAMA TUĞLASIZ)	1 Ad.	
		TALAS ANAYURT KUYU BİNASI YAPILMASI (KAPLAMA TUĞLALI)	1 Ad.	
		YAHYALI KUZUOLUK KUYU BİNASI YAPILMASI (KAPLAMA TUĞLASIZ)	1 Ad.	
		TOPLAM	**20 Ad.**	
15	ERCİYES KOÇDAĞI İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI	Ø 300 DI	47 m	₺ 1.027.242,60
		Ø 200 DRENAJ BORUSU	431 m	
		Ø 110 PE	3.801 m	
		Ø 160 PE	641 m	
		Ø 225 PE	1.232 m	
		Ø 280 PE	703 m	
		20m³ MASLAK	2 Ad.	
		30m³ MASLAK	2 Ad.	
		VANTUZ ODASI	1 Ad.	
		TOPLAM	**6.855 m**	
16	ERCİYES TURİZM BÖLGESİNE İÇMESUYU ARAŞTIRMA SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	İÇMESUYU ARAŞTIRMA SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	1 Ad.	₺ 5.456.790,35
		TOPLAM	**1 Ad.**	

17	FELÂHİYE İLÇESİ KAYAPINAR MAHALLESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 150 DI	307 m	₺ 4.823.453,44
		Ø 200 DI	3.365 m	
		Ø 250 DI	69 m	
		Ø 300 DI	23 m	
		Ø 32 PE	12.125 m	
		Ø 63 PE	10.043 m	
		Ø 110 PE	13.184 m	
		Ø 160 PE	4.980 m	
		Ø 225 PE	4.089 m	
		Ø 280 PE	842 m	
		20m³ MASLAK (BAĞLAR, İKİARMUT, İTBURNU MEVKİLERİ)	1 Ad.	
		200m³ SU DEPOSU (KAYAPINAR)	1 Ad.	
		300m³ SU DEPOSU (KAYAPINAR)	2 Ad.	
		5 GRUPLU TM	1 Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	781 Ad.	
		VANTUZ ODASI	2 Ad.	
		YANGIN HİDRANTI	5 Ad.	
		TOPLAM	**49.027 m**	
18	GERMİRALTI - ANAYURT DEPO TERFİİ VE İSALE HATTI VE ANNELER PARKI KUYU BAĞLANTISI YAPILMASI	Ø 250 ÇB	m	₺ 1.206.103,83
		Ø 300 ÇB	132 m	
		Ø 350 ÇB	856 m	
		Ø 400 ÇB	856 m	
		Ø 500 ÇB	519 m	
		Ø 100 DI	m	
		Ø 150 DI	m	
		Ø 200 DI	4 m	
		ANNELER PARKI 500m³ DEPO TAMİR TADİLATI	Ad.	
		DEBİMETRE ODASI	1 Ad.	
		YANGIN HİDRANTI	Ad.	
		İÇMESUYU TOPLAM	**2.367 m**	
19	HİSARCIK GÜLMERSU BÖLGESİ İÇMESUYU TERFİ VE İSHALE HATLARI İLE TESİSLERİ İNŞAATI (2015 - 2017 SARÎ)	Ø 200 ÇB	13 m	₺ 232.732,06
		Ø 300 ÇB	4 m	
		TOPLAM	**17 m**	
20	HİSARCIK - KIRANARDI BÖLGELERİNDE İÇMESUYU TEMİNİ, İSALE HATTI VE TESİSLERİ YAPILMASI	Ø 200 ÇB	40 m	₺ 334.329,35
		Ø 250 ÇB	24 m	
		Ø 150 DI	175 m	
		Ø 200 DI	55 m	
		Ø 110 PE	173 m	
		VANTUZ ODASI	2 Ad.	
		TOPLAM	**467 m**	

21	İLDEM BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 100 DI	7.302 m	₺ 785.456,03
		Ø 150 DI	647 m	
		Ø 200 DI	133 m	
		Ø 250 DI	340 m	
		Ø 300 DI	215 m	
		Ø 400 DI	360 m	
		ABONE BAĞLANTISI	111 Ad.	
		BASINÇ KIRICI ODASI	4 Ad.	
		YANGIN HİDRANTI	1 Ad.	
		TOPLAM	**8.997 m**	
22	İNCESU İLÇESİ KIZILÖREN YAYLA KÜMEEVLER İÇMESUYU HATTI İNŞAATI	Ø 63 PE	1.371 m	₺ 353.026,15
		Ø 110 PE	6.152 m	
		100m³ SU DEPOSU	Ad.	
		BASINÇ KIRICI ODASI	Ad.	
		MASLAK	Ad.	
		VANTUZ ODASI	Ad.	
		TOPLAM	**7.523 m**	
23	İNCESU VE BAĞLI BÖLGELERİNE İÇMESUYU TEMİNİ İÇİN GEREKLİ TESİSLER İLE İÇMESUYU HATLARININ YAPILMASI (2014 - 2016 SARÎ)	Ø 200 ÇB	64 m	₺ 1.856.398,95
		Ø 250 ÇB	3 m	
		Ø 300 ÇB	44 m	
		Ø 100 DI	84 m	
		Ø 150 DI	148 m	
		Ø 200 DI	303 m	
		Ø 250 DI	370 m	
		Ø 110 PE	159 m	
		Ø 160 PE	131 m	
		Ø 225 PE	14 m	
		Ø 315 PE	243 m	
		300m³ SU DEPOSU	2 Ad.	
		DEBİ ÖLÇÜM VE VANA ODASI	9 Ad.	
		VANTUZ ODASI	7 Ad.	
		TOPLAM	**1.563 m**	
24	KOCASİNAN İLÇESİ MEVLANA MAHALLESİ İÇMESUYU DAĞITIM HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 450 ÇB	m	₺ 2.530.872,13
		Ø 500 ÇB	712 m	
		Ø 600 ÇB	350 m	
		Ø 100 DI	15.795 m	
		Ø 150 DI	2.037 m	
		Ø 200 DI	4.610 m	
		Ø 250 DI	1.900 m	
		Ø 300 DI	m	
		Ø 350 DI	m	
		Ø 63 PE	317 m	
		Ø 110 PE	588 m	
		ABONE BAĞLANTISI	1.876 Ad.	
		DEBİMETRE ODASI	Ad.	
		TOPLAM	**26.309 m**	

25	KOCASİNAN İLÇESİ HIRKA MAHALLESİ İÇMESUYU TERFİİ HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 160 PE	m	₺ 0,00
		Ø 160 PVC	m	
		DEPO TAMİR TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		KUYU BİNASI	Ad.	
		VANTUZ ODASI	Ad.	
		TOPLAM	**m**	
26	KOCASİNAN İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 100 DI	2.513 m	₺ 642.617,29
		Ø 150 DI	1.158 m	
		Ø 200 DI	3.938 m	
		Ø 250 DI	m	
		Ø 300 DI	275 m	
		Ø 350 DI	1.725 m	
		Ø 100 O-PVC	m	
		Ø 160 O-PVC	m	
		Ø 63 PE	m	
		ABONE BAĞLANTISI	30 Ad.	
		YANGIN HİDRANTI	Ad.	
		TOPLAM	**9.609 m**	
27	KOCASİNAN, MELİKGAZİ, TALAS, HACILAR, İNCESU İLÇELERİNDE KUYU BİNALARI YAPILMASI	**HACILAR** KUYUCAK KUYU BİNASI YAPILMASI	1 Ad.	₺ 853.140,00
		İNCESU HAMURCU KUYU BİNASI YAPILMASI	1 Ad.	
		KOCASİNAN AMARAT, BARSAMA, BOYACI, ERKİLET GÜMÜŞLÜK, KEYKUBAT, KARPUZATAN, KUYU BİNASI YAPILMASI	6 Ad.	
		MELİKGAZİ AĞIRNAS 1 - 2, ANNELER PARKI, ÇAYBAĞLARI, ESENYURT, GERMİRALTI 17 - 18 - RASAT, GÜLMERSU, İLDEM, KIRANARDI DERESİ 1- 2, MAHRUMLAR, KUYU BİNASI YAPILMASI	13 Ad.	
		TALAS 15.000m³, AKÇAKAYA, ARDIÇ, KUYU BİNASI YAPILMASI	3 Ad.	
		TOPLAM	**24 Ad.**	
28	KUŞÇU BOYACI TERFİ VE İSALE HATLARI İLE TESİSLERİ İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 ÇB	m	₺ 2.527.907,18
		Ø 200 ÇB	m	
		Ø 250 ÇB	m	
		Ø 350 ÇB	m	
		Ø 100 DI	m	
		Ø 32 PE	m	
		Ø 63 PVC	12.688 m	
		Ø 110 O-PVC	13.447 m	
		Ø 160 O-PVC	4.561 m	
		300m³ SU DEPOSU	1 Ad.	
		5 GRUPLU TERFİ MERKEZİ YAPIMI	1 Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		BASINÇ KIRICI ODASI	Ad.	
		BOYACI, KARAGEDİK, KUŞÇU, DEPOLARIN TAMİR TADİLATI	3 Ad.	
		DARBE ÖNLEME ODASI	Ad.	
		VANTUZ ODASI	Ad.	
		TOPLAM	**30.696 m**	

29	MELİKGAZİ İLÇESİ ALTINOLUK VE YENİKÖY MAHALLELERİ KISMİ İÇMESUYU DAĞITIM HATTI İNŞAATI	Ø 100 DI	5.043 m	₺ 657.702,94
		Ø 150 DI	5.226 m	
		Ø 200 DI	482 m	
		ABONE BAĞLANTISI	127 Ad.	
		DEBİMETRE ODASI	1 Ad.	
		YANGIN HİDRANTI	3 Ad.	
		TOPLAM	**10.751 m**	
30	MELİKGAZİ İLÇESİ GESİ ALBAY İSMAİL SEYDİŞEHİR KIŞLASI İÇMESUYU TERFİİ HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 110 O-PVC	m	₺ 0,00
		KUYU BİNASI	Ad.	
		YANGIN HİDRANTI	Ad.	
		TOPLAM	**m**	
31	MELİKGAZİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 100 DI	m	₺ 0,00
		Ø 150 DI	m	
		Ø 200 DI	m	
		Ø 250 DI	m	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		YANGIN HİDRANTI	Ad.	
		TOPLAM	**m**	
32	MUHTELİF BÖLGELERDE TRAFO POSTASI VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPILMASI	MERKEZ	1 Ad.	₺ 1.879.511,75
		GİRİNCİ	1 Ad.	
		AKKIŞLA	**2 Ad.**	
		MİLLİDERE	1 Ad.	
		GÜMÜŞOVA	1 Ad.	
		SOYSALLI	1 Ad.	
		DEVELİ	**3 Ad.**	
		İSABEY	Ad.	
		TORAMAN	1 Ad.	
		FELAHİYE	**1 Ad.**	
		HAMURCU	1 Ad.	
		KIZILÖREN	1 Ad.	
		İNCESU	**2 Ad.**	
		AMARAT	1 Ad.	
		BARSAMA	1 Ad.	
		BOYACI	1 Ad.	
		BÖLGE HASTANESİ	1 Ad.	
		ERKİLET GÜMÜŞLÜK	1 Ad.	
		MAHZEMİN	Ad.	
		KOCASİNAN	**5 Ad.**	
		AĞIRNAS	1 Ad.	
		ANNELER PARKI	1 Ad.	
		EĞRİBUCAK	1 Ad.	
		ESENYURT	1 Ad.	
		GERMİRALTI	1 Ad.	
		GÜLMERSU	Ad.	
		İLDEM	Ad.	
		KIRANARDI	1 Ad.	
		MELİKGAZİ	**6 Ad.**	
		ASLANBEYLİ	1 Ad.	
		MEZİTLİ	Ad.	

		YUSUFLAR	1 Ad.	
		PINARBAŞI	**2 Ad.**	
		AKÇAKAYA	1 Ad.	
		ANAYURT	1 Ad.	
		ARDIÇ	1 Ad.	
		KAMBER	1 Ad.	
		TALAS	**4 Ad.**	
		KAPUKAYA	Ad.	
		TOMARZA	**Ad.**	
		SAZAK	1 Ad.	
		YAHYALI	**1 Ad.**	
		TOPLAM	**26 Ad.**	
33	MUHTELİF İÇMESUYU TESİSLERİNDE ENERJİ NAKİL HATTI VE GÜÇ ARTIRIMI YAPILMASI	BÜNYAN EMİRÖREN SONDAJ	1 Ad.	₺ 248.212,36
		KOCASİNAN AKİN SONDAJ	1 Ad.	
		TALAS 4000'LİK TERFİ BİNASI	1 Ad.	
		TOPLAM	**3 Ad.**	
34	MÜCAVİR ALANDA MUHTELİF YERLERE 19 ADET SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2016 - 2017 SARÎ)	**DEVELİ** (EPÇE GÜMÜŞÖREN, KIZIK)	2 Ad.	₺ 257.872,72
		MELİKGAZİ (AĞIRNAS)	1 Ad.	
		TOMARZA (İCADİYE, KAPIKAYA, KUŞCAĞIZ,)	3 Ad.	
		YAHYALI (KUZUOLUK)	1 Ad.	
		YEŞİLHİSAR (BUGET, DOĞANLI)	2 Ad.	
		TOPLAM	**9 Ad.**	
35	PINARBAŞI İLÇESİ PAZARÖREN MAHALLESİ İÇMESUYU İSALE HATTI İNŞAATI	Ø 110 PE	1.139 m	₺ 778.301,32
		Ø 160 PE	2.231 m	
		Ø 225 PE	841 m	
		50m³ MASLAK	1 Ad.	
		50m³ DEPO TADİLATI (YARIMTEPE - YEREGEÇEN)	2 Ad.	
		75m³ DEPO TADİLATI (KÖTÜÖREN)	1 Ad.	
		500m³ DEPO TADİLATI (PAZARÖREN)	1 Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		SU ALMA YAPISI	1 Ad.	
		VANTUZ ODASI	4 Ad.	
		TOPLAM	**4.211 m**	
36	PINARBAŞI, SARIZ İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SARÎ)	PINARBAŞI İLÇESİ KAVLAKLAR MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	₺ 1.151.408,60
		PINARBAŞI İLÇESİ KARAMANLI MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ GÖLCÜK MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ KARAHACILI MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ ESKİ TEKKE MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ AŞAĞI BORANDERE MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ KUŞÇULAR MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ AYGÖRMEZ MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	

	PINARBAŞI, SARIZ İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SARÎ)	PINARBAŞI İLÇESİ DEVEDERESİ MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ HİLMİYE MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ AŞAĞI DİLCİLER MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ BÜYÜK POTUKLU MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ KABAKTEPE MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ TAHTA KÖPRÜ MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ ŞEREFİYE MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ KILIÇKIŞLA MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ KARAHALKA MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ KARABOĞAZ MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ KURTTEPE MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ CİN AHMET MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ KADILI KURUKAVAK MAHALLESİ 75 M³ LÜK AYAKLI DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ SERİNYURT MAHALLESİ 100 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ PAYASLI MAHALLESİ 100 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ ESKİYASSIPINAR MAHALLESİ 100 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ ARTMAK MAHALLESİ 40 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ MELİKGAZİ MAHALLESİ 30 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ GÖLCÜK UZUNAHMET MAHALLESİ 15 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ DİLCİLER MAHALLESİ 15 M³ MASLAK YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ CİNAHMET MAHALLESİ POMPA BİNASI TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ AŞAĞI BORANDERE MAHALLESİ POMPA BİNASI TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ KAYNAR MAHALLESİ 200 M³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI (KREYN KİRİŞSİZ)	1 Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ ELMALI MAHALLESİ 50 M³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI (KREYN KİRİŞSİZ)	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ YARIMTEPE MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ AVŞARPOTUKLU MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	

	PINARBAŞI, SARIZ İLÇELERİNDE İÇMESUYU TESİSLERİNİN TAMİR - TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2017 - 2018 SARÎ)	PINARBAŞI İLÇESİ KIZILHAN MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ YAHYABEYLİ MAHALLESİ 50 M³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI (KREYN KİRİŞSİZ)	Ad.	
		PINARBAŞI İLÇESİ MEKANİK SİSTEM	1 Ad.	
		PINARBAŞI	**9 Ad.**	
		SARIZ İLÇESİ KISKISRAK KALUZİLER VE ERDOĞANLAR MAHALLESİ 50 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		SARIZ İLÇESİ KURUDERE MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		SARIZ İLÇESİ BÜYÜK SÖBEÇİMEN MAHALLESİ 75 M³ LÜK DEPO TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		SARIZ İLÇESİ KURTİNİ MAHALLESİ MASLAK TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		SARIZ İLÇESİ KISKAÇLI MAHALLESİ MASLAK TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		SARIZ İLÇESİ KISKAÇLI KULAKSIZ MAHALLESİ MASLAK TAMİR-TADİLATININ YAPILMASI	1 Ad.	
		SARIZ İLÇESİ YEŞİLKENT KARAKOYUNLU MAHALLESİ 200 M3 HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI (KREYN KİRİŞSİZ)	1 Ad.	
		PINARBAŞI SARIZ İLÇELERİNDE 15 M3 MASLAK YAPILMASI	1 Ad.	
		SARIZ İLÇESİ MEKANİK SİSTEM	1 Ad.	
		50M³ LÜK İÇMESUYU DEPO YIKILMASI	Ad.	
		200M³ LÜK İÇMESUYU DEPO YIKILMASI	Ad.	
		SARIZ	**9 Ad.**	
		TOPLAM	**18 Ad.**	
37	TALAS İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE 8 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI (2016 - 2017 SARÎ)	DEVELİ (SİNDELHÖYÜK 1, 2)	Ad.	₺ 360.820,15
		HACILAR (KUYUCAK)	Ad.	
		MELİKGAZİ (ÇAYBAĞLARI, ESENYURT, HİSARCIK GÜLMERSU, KIRANARDI DERESİ)	Ad.	
		TALAS (15000 m³ DEPO, AKÇAKAYA, ARDIÇ, KAMBER)	1 Ad.	
		TOPLAM	**1 Ad.**	
38	TALAS KISMİ İÇMESUYU İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 100 DI	526 m	₺ 212.392,86
		Ø 150 DI	861 m	
		Ø 200 DI	1.096 m	
		Ø 250 DI	805 m	
		Ø 350 DI	m	
		Ø 32 PE	184 m	
		Ø 63 PE	m	
		Ø 110 PE	m	
		ABONE BAĞLANTISI	60 Ad.	
		YANGIN HİDRANTI	2 Ad.	
		TOPLAM	**3.472 m**	
39	TOMARZA İLÇESİ KEVENAĞIL MAHALLESİ İÇMESUYU İNŞAATI	Ø 63 PE	2.250 m	₺ 244.261,23
		150 m³ SU DEPOSUNUN TAMİR TADİLATI	1 Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	50 Ad.	
		TOPLAM	**2.250 m**	
40	YAHYALI İLÇESİ ÇUBUK HARMANI İÇMESUYU İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 63 PE	11 m	₺ 51.937,52
		Ø 110 PE	13 m	
		TOPLAM	**24 m**	

41	YEŞİLHİSAR İLÇESİ GÜLBAYIR MAHALLESİ İÇMESUYU İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 100 DI	3.278 m	₺ 680.125,10
		Ø 110 PE	1.509 m	
		100m³ SU DEPOSU	1 Ad.	
		VANTUZ ODASI	1 Ad.	
		TOPLAM	**4.787 m**	
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			**211.438 m**	**₺ 39.826.466,43**
42	AKKIŞLA İLÇESİ GANİŞEYH MAHALLESİ DEPO İLE MASLAK ARASI İÇMESUYU HATTI DÖŞENMESİ	Ø 160 O-PVC	2.000 m	₺ 61.360,00
		TOPLAM	**2.000 m**	
43	AKKIŞLA İLÇESİ GANİŞEYH MAHALLESİ KAYNAK İLE MASLAK ARASI İÇMESUYU HATTI İNŞAATI	Ø 110 PE	1.400 m	₺ 40.710,00
		TOPLAM	**1.400 m**	
44	AKKIŞLA İLÇESİ YEŞİL MAHALLE İÇMESUYU ABONE BAĞLANTILARININ YAPILMASI	YEŞİL MAHALLE	310 Ad.	₺ 65.844,00
		TOPLAM	**310 Ad.**	
45	AKKIŞLA İLÇESİ YUKARI VE ŞEN MAHALLELERİ İÇMESUYU ABONE BAĞLANTILARININ YAPILMASI	ŞEN MAHALLESİ	150 Ad.	₺ 66.268,80
		YUKARI MAHALLE	162 Ad.	
		TOPLAM	**312 Ad.**	
46	ARGINCIK VE BUĞDAYLI MAHALLELERİ İÇMESUYU İSALE HATLARI İNŞAATI	Ø 250 DI	80 m	₺ 24.846,08
		TOPLAM	**80 m**	
47	BÜNYAN CEZAEVİ SU TEMİN PROJESİ 100 KVA TRAFO POSTASI VE ENERJİ NAKİL HATTI	100 KVA TRAFO POSTASI VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPIMI		₺ 55.856,48
48	BÜNYAN İLÇESİ DERVİŞAĞA, BAYRAMLI, YENİCE VE İBRAHİMBEY MAHALLELERİ İÇMESUYU HATLARININ ABONE SAYACINA KADAR UZATILMASI	BAYRAMLI	50 Ad.	₺ 59.000,00
		DERVİŞAĞA	50 Ad.	
		İBRAHİMBEY	50 Ad.	
		YENİCE	50 Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	**200 Ad.**	
49	ÇAYBAĞLARI İLE KARPUZATAN TESİSLERİNDEKİ TERFİ BİNALARININ TAMİR TADİLATLARI VE KARPUZATAN TESİSİNDE DEBİMETRE ODASI YAPILMASI	ÇAYBAĞLARI TERFİ BİNASI TAMİR TADİLATI	1 Ad.	₺ 53.100,00
		KARPUZATAN TERFİ BİNASI TAMİR TADİLATI	1 Ad.	
		KARPUZATAN DEBİMETRE ODASI	1 Ad.	
		TOPLAM	**3 Ad.**	
50	FELÂHİYE İLÇESİ KARAŞEYH MAHALLESİ ESKİ YERLEŞİM BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI	Ø 63 PE	400 m	₺ 34.749,82
		ABONE BAĞLANTISI	75 Ad.	
		TOPLAM	**400 m**	
51	FELÂHİYE İLÇESİ KARAŞEYH MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI	Ø 63 PE	1.800 m	₺ 61.360,00
		Ø 50 VANA	2 Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	58 Ad.	
		TOPLAM	**1.800 m**	
52	GESİ MAHALLESİ ALBAY İSMAİL SEYDİŞEHİRLİ KIŞLASI İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	ALBAY İSMAİL SEYDİŞEHİRLİ KIŞLASI 114 m İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	1 Ad.	₺ 30.143,10
			1 Ad.	
53	İNCESU HAMURCU MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	HAMURCU MAHALLESİ 162 m İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	1 Ad.	₺ 49.560,00
			1 Ad.	
54	KOCASİNAN İLÇESİ BAYRAMHACI MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU ENERJİ TEMİNİ	25KVA TRAFO POSTASI VE ENERJİ NAKİL HATTI İNŞAATI		₺ 60.180,00
55	KOCASİNAN İLÇESİ CIRGALAN MAHALLESİ (SUKAYPARK) İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	MAZAKALAND SUKAYPARK 130 m İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	1 Ad.	₺ 46.610,00
			1 Ad.	
56	KOCASİNAN MAHZEMİN MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	BEYDEĞİRMENİ MAHALLESİ 201m İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	1 Ad.	₺ 64.900,00
			1 Ad.	
57	ÖRNEKEVLER MAHALLESİ ÇİÇEK VE AY SOKAKLARINA İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPILMASI	Ø 100 DI	440 m	₺ 48.368,20
		ABONE BAĞLANTISI	60 Ad.	
		TOPLAM	**440 m**	
58	SARIOĞLAN ÇİFTLİK MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	227 m İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	1 Ad.	₺ 62.540,00
			1 Ad.	

59	TALAS İLÇESİ MEVLANA MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	MEVLANA 206 m İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI	1 Ad.	₺ 34.054,80
			1 Ad.	
60	YAHYALI İLÇESİ YEŞİLKÖY MAHALLESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI	Ø 300 ÇB	100 m	₺ 64.900,00
		TOPLAM	**100 m**	
61	YEŞİLHİSAR İLÇESİ KAYADİBİ MAHALLESİ İÇMESUYU ELEKTRİK ABONESİNİN GÜCÜNÜN 100 KVA'YA ARTTIRILMASI	ELEKTRİK ABONESİNİN GÜCÜNÜN 10 KVA'YA ARTTIRILMASI		₺ 26.374,18
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			**6.220 m**	**₺ 1.010.725,46**
İÇMESUYU İŞLERİ TOPLAMI			**217.658 m**	**₺ 40.837.191,89**
ABONE BAĞLANTISI TOPLAMI			**4.237 Ad.**	
SONDAJ KUYUSU TOPLAMI			**40 Ad.**	
YANGIN HİDRANTI TOPLAMI			**21 Ad.**	

B - KANALİZASYON YATIRIMLARI

S.NO	İŞİN ADI	YAPILAN İŞ		2017 YILI MALİYETİ (KDV DÂHİL)
1	2016 YILI GESİ KISMİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	120 m	₺ 67.700,00
		Ø 200 KORİGE	300 m	
		Ø 300 KORİGE	185 m	
		ABONE BAĞLANTISI	10 Ad.	
		TOPLAM	**605 m**	
2	2016 YILI KOCASİNAN - İNCESU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	5.388 m	₺ 3.715.471,98
		Ø 200 KORİGE	22.913 m	
		Ø 300 KORİGE	10.618 m	
		C PARÇASI TEŞKİLİ	560 Ad.	
		TOPLAM	**38.719 m**	
3	2016 YILI MELİKGAZİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	548 m	₺ 924.539,86
		Ø 200 KORİGE	3.328 m	
		Ø 300 KORİGE	4.178 m	
		Ø 400 KORİGE	m	
		Ø 600 KORİGE	1.067 m	
		ABONE BAĞLANTISI	155 Ad.	
		YAĞMUR IZGARASI	Ad.	
		TOPLAM	**9.121 m**	
4	2016 - 2017 YILI TALAS - HACILAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	733 m	₺ 1.435.310,95
		Ø 200 KORİGE	9.845 m	
		Ø 300 KORİGE	6.234 m	
		ABONE BAĞLANTISI	102 Ad.	
		TOPLAM	**16.812 m**	
5	2017 YILI KOCASİNAN, TALAS, HACILAR, İNCESU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	1.408 m	₺ 1.523.271,49
		Ø 200 KORİGE	12.759 m	
		Ø 300 KORİGE	1.982 m	
		ABONE BAĞLANTISI	246 Ad.	
		TOPLAM	**16.149 m**	
6	2017 YILI MELİKGAZİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI	Ø 150 KORİGE	1.132 m	₺ 876.246,87
		Ø 200 KORİGE	1.965 m	
		Ø 300 KORİGE	5.388 m	
		Ø 400 KORİGE	m	
		ABONE BAĞLANTISI	132 Ad.	
		TOPLAM	**8.485 m**	
7	AKİN, ELAGÖZ, HASANARPA, YAZIR KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	43 m	₺ 784.976,86
		Ø 200 KORİGE	2.549 m	
		Ø 300 KORİGE	3.368 m	
		Ø 400 KORİGE	m	
		Ø 500 KORİGE	162 m	
		ABONE BAĞLANTISI	49 Ad.	
		KANALİZASYON TOPLAM	**6.122 m**	

8	AKKIŞLA, BÜNYAN, SARIOĞLAN, FELAHİYE, ÖZVATAN, PINARBAŞI VE SARIZ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	1.217 m	₺ 1.844.496,59
		Ø 200 KORİGE	7.704 m	
		Ø 300 KORİGE	6.721 m	
		Ø 225 PE	m	
		ABONE BAĞLANTISI	223 Ad.	
		TOPLAM	**15.642 m**	
9	BÜNYAN İLÇESİ KAHVECİ VE TOPSÖĞÜT MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	80 m	₺ 894.518,08
		Ø 200 KORİGE	7.668 m	
		Ø 225 PE	24 m	
		100 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	57 Ad.	
		TOPLAM	**7.772 m**	
10	BÜNYAN İLÇESİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2017 % 20 - 2018 % 80 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	m	₺ 0,00
		Ø 200 KORİGE	m	
		Ø 300 KORİGE	m	
		Ø 400 KORİGE	m	
		Ø 600 KORİGE	m	
		Ø 225 PE	m	
		Ø 315 PE	m	
		Ø 355 PE	m	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		TERFİ İSTASYONU VE AÇIK IZGARA BİNASI	Ad.	
		HAZIR KANALİZASYON TERFİ POMPA İSTASYONU	Ad.	
		TOPLAM	**m**	
11	BÜNYAN İLÇESİ KARATAY MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	151 m	₺ 260.830,62
		Ø 200 KORİGE	1.443 m	
		Ø 90 PE	3.614 m	
		Ø 225 PE	m	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		HAZIR KANALİZASYON TERFİ POMPA İSTASYONU	Ad.	
		TOPLAM	**5.208 m**	
12	BÜNYAN İLÇESİ KÖPRÜBAŞI, SAMAĞIR MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	1.952 m	₺ 2.145.506,57
		Ø 200 KORİGE	17.959 m	
		Ø 90 PE	m	
		Ø 225 PE	m	
		100 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	337 Ad.	
		HAZIR KANALİZASYON TERFİ POMPA İSTASYONU	Ad.	
		TOPLAM	**19.911 m**	

13	DEVELİ İLÇESİ ÇAYIRÖZÜ, KULPAK, SOYSALLI MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	865 m	₺ 834.477,96
		Ø 200 KORİGE	5.483 m	
		Ø 63 PE	m	
		Ø 75 PE	m	
		Ø 90 PE	3.156 m	
		Ø 225 PE	m	
		500 KİŞİLİK FOSSEPTİK	1 Ad.	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	142 Ad.	
		HAZIR KANALİZASYON TERFİ POMPA İSTASYONU	Ad.	
		TOPLAM	**9.504 m**	
14	DEVELİ İLÇESİ GÜMÜŞÖREN MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	65 m	₺ 282.785,93
		Ø 200 KORİGE	780 m	
		Ø 300 KORİGE	1.424 m	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	8 Ad.	
		TOPLAM	**2.269 m**	
15	DEVELİ İLÇESİ KARACAÖREN VE SARICA MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	m	₺ 1.121.304,32
		Ø 200 KORİGE	11.839 m	
		Ø 75 PE	m	
		Ø 225 PE	m	
		500 KİŞİLİK FOSSEPTİK	1 Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		HAZIR KANALİZASYON TERFİ POMPA İSTASYONU	Ad.	
		TOPLAM	**11.839 m**	
16	DEVELİ İLÇESİ SARAYCIK, SARIKAYA VE YAYLACIK MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	3.641 m	₺ 1.969.068,32
		Ø 200 KORİGE	13.629 m	
		500 KİŞİLİK FOSSEPTİK	1 Ad.	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	1 Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	301 Ad.	
		TOPLAM	**17.270 m**	
17	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI, YEŞİLHİSAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	1.006 m	₺ 551.919,29
		Ø 200 KORİGE	5.940 m	
		Ø 300 KORİGE	125 m	
		Ø 225 PE	102 m	
		ABONE BAĞLANTISI	52 Ad.	
		TOPLAM	**7.173 m**	

18	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI VE YEŞİLHİSAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	638 m	₺ 943.935,43
		Ø 200 KORİGE	5.626 m	
		Ø 300 KORİGE	1.460 m	
		Ø 400 KORİGE	1.908 m	
		Ø 225 PE	m	
		ABONE BAĞLANTISI	57 Ad.	
		TOPLAM	**9.632 m**	
19	İLDEM BÖLGESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	1.479 m	₺ 885.140,46
		Ø 300 KORİGE	5.990 m	
		Ø 400 KORİGE	41 m	
		ABONE BAĞLANTISI	125 Ad.	
		TOPLAM	**7.510 m**	
20	İNCESU İLÇESİ TAHİRİNİ MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	962 m	₺ 1.194.365,27
		Ø 200 KORİGE	12.414 m	
		Ø 63 PE	482 m	
		Ø 225 PE	12 m	
		ABONE BAĞLANTISI	134 Ad.	
		HAZIR KANALİZASYON TERFİ POMPA İSTASYONU	Ad.	
		TOPLAM	**13.870 m**	
21	KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ BİYOLOJİK GAZ TANKI YAPIMI (2016 - 2017 SARÎ)	ATIKSU ARITMA TESİSİ BİYOLOJİK GAZ TANKI YAPIMI		₺ 792.009,20
22	KOCASİNAN BULVARI - 30 AĞUSTOS KAVŞAĞI KISMİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI	Ø 1400 B.A.	239 m	₺ 393.348,41
		MUAYENE BACASI	4 Ad.	
		TOPLAM	**239 m**	
23	KOCASİNAN İLÇESİ EMMİLER MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	9.900 m	₺ 418.215,60
		Ø 200 KORİGE	2.622 m	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	1 Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	550 Ad.	
		TOPLAM	**12.522 m**	
24	KOCASİNAN İLÇESİ HÖBEK VE FELÂHİYE ACIRLI MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	384 m	₺ 565.320,25
		Ø 200 KORİGE	5.389 m	
		Ø 225 PE	m	
		250 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		500 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	55 Ad.	
		TOPLAM	**5.773 m**	
25	KOCASİNAN İLÇESİ KAŞKÖY MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	120 m	₺ 736.628,75
		Ø 200 KORİGE	7.644 m	
		ABONE BAĞLANTISI	15 Ad.	
		TOPLAM	**7.764 m**	
26	KOCASİNAN İLÇESİ MOLU MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPIMI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	m	₺ 240.795,85
		Ø 200 KORİGE	2.786 m	
		Ø 225 PE	m	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		TOPLAM	**2.786 m**	
27	MUHTELİF KANALİZASYON TERFİLERİ İÇİN TRAFO POSTASI VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPILMASI (2017 - 2018 SARÎ)	KARACAÖREN	Ad.	₺ 0,00
		KARATAY 1, 2	Ad.	
		SAMAĞIR	Ad.	
		BÜNYAN	**Ad.**	
		ÇAYIRÖZÜ 1, 2	Ad.	

		KÖPRÜBAŞI	Ad.	
		SARICA	Ad.	
		SOYSALLI 1, 2	Ad.	
		DEVELİ	**Ad.**	
		TAHİRİNLİ	Ad.	
		İNCESU	**Ad.**	
		AYRANLIK	Ad.	
		SARIZ	**Ad.**	
		ŞIHBARAK	Ad.	
		TOMARZA	**Ad.**	
		İLYASLI 1, 2	Ad.	
		KAPUZBAŞI	Ad.	
		KOCAHACILI 1, 2	Ad.	
		KOPÇU 1, 2	Ad.	
		SENİRKÖY 1, 2	Ad.	
		YERKÖY	Ad.	
		YAHYALI	**Ad.**	
		MUSAHACILI	Ad.	
		OVAÇİFTLİK 1, 2	Ad.	
		YEŞİLOVA	Ad.	
		YEŞİLHİSAR	**Ad.**	
		TRAFO POSTASI VE ENH TOPLAM	**Ad.**	
28	MUHTELİF MAHALELERDE FOSEPTİK YAPIMI İNŞAATI (2016 -2017 SARÎ)	BÜNYAN İLÇESİ, KARACAÖREN 500m³/GÜN	1 Ad.	₺ 311.520,00
		FELÂHİYE İLÇESİ, KARAŞEYH 500m³/GÜN	1 Ad.	
		SARIZ İLÇESİ, İNCE MAĞARA 250m³/GÜN	1 Ad.	
		TALAS İLÇESİ, ÇÖMLEKÇİ 250m³/GÜN	1 Ad.	
		TOPLAM	**4 Ad.**	
29	MUHTELİF YERLERE KANALİZASYON PROJESİ HAZIRLANMASI	**BÜNYAN** (BURHANİYE 15,53km, ŞIVGIN 3,34km)	18,87 km	₺ 566.789,40
		DEVELİ (DERESİMLİ 3,27km, EŞELİK 3,48km, HÜSEYİNLİ 9,56km, MİLLİDERE 6,36km, SATI 3,95km, YEŞİLYURT 5,21km)	31,84 km	
		İNCESU (HAMURCU 41,42km, KARAHÖYÜK 7,97km)	49,39 km	
		KOCASİNAN (HIRKA 19,25km, KOÇCAGIZ 5,59km)	24,83 km	
		PINARBAŞI (ALAGAZİLİ 6,11km, BÜYÜKKÖMARMUT 2,31km, ÇERKEZKARABOĞAZ 4,04km, DİLCİLER 6,07km, ESKİYASSIPINAR 4,26km, GÖLCÜK 1,97km, KADILI 2,64km, KILIÇMAHMET 3,39km, KIZILHAN 2,75km, KÖMARMUT 2km, MALAKÖY 10,20km, SERİNYURT 4,47km)	50,19 km	
		SARIOĞLAN (İĞDELİ 6,09km, MURATBEYLİ 6,06km, ÖMER HACILI 11,10km)	23,25 km	

		SARIZ (ÇAVDAR 4,78km, DALLIKAVAK 5,53km, YEDİOLUK 2,387km)	12,68 km	
		TOMARZA (AKMEZAR 3,20km, AVŞARSÖĞÜTLÜ 9,47km, DADALOĞLU 31,32km, HACIPAŞA 6,5km, KARAÖREN 3,58, KESİR 8,07km, KIZILÖREN 8,35km, KÜÇÜKCANLI 9,74km)	79,77 km	
		YAHYALI (AĞCAŞAR 9,31km, ÇAVDARUŞAĞI 3,39km)	12,70 km	
		TOPLAM	**303,52 km**	
30	MUHTELİF YERLERE KANALİZASYON PROJESİ HAZIRLANMASI(2017 - 2018 SARÎ)	**DEVELİ** (DEREBAŞI 6 km, HAVADAN 8 km)	14,00 km	₺ 0,00
		KOCASİNAN (BAYRAMHACI 19 km, HASANCI 19 km)	38,00 km	
		PINARBAŞI (BESEREK 8 km, CABE + ÇAYBAŞI 7 km, KAVAK 4 km, KILIÇKIŞLA 4 km, METHİYE 7 km)	30,00 km	
		SARIOĞLAN (SOFUMAHMUT 5 km)	5,00 km	
		TOMARZA (BOSTANLIK 6 km, BÖKE 4 km, KÖMÜR 10 km, KÖPRÜBAŞI 7 km, SÜVEGENLER 4 km, TATAR 8 km)	39,00 km	
		YAHYALI (DİKME 7 km, SAZAK 7 km)	14,00 km	
		TOPLAM	**140,00 km**	
31	ÖZVATAN İLÇESİ KÜPELİ MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	m	₺ 510.660,01
		Ø 200 KORİGE	4.375 m	
		Ø 300 KORİGE	588 m	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		TOPLAM	**4.963 m**	
32	PINARBAŞI İLÇESİ GÜLTEPE, KAYABAŞI VE KURTTEPE MAHALLELERİNE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPIMI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	1.508 m	₺ 923.163,90
		Ø 200 KORİGE	8.697 m	
		100 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		500 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	114 Ad.	
		TOPLAM	**10.205 m**	
33	PINARBAŞI İLÇESİ KAYAALTI VE KARAKUYU MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	1.900 m	₺ 1.447.871,88
		Ø 200 KORİGE	12.751 m	
		500 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	155 Ad.	
		TOPLAM	**14.651 m**	
34	SARIOĞLAN İLÇESİ EBULHAYIR VE TATILI MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	m	₺ 474.686,92
		Ø 200 KORİGE	6.091 m	
		Ø 225 PE	m	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		TOPLAM	**6.091 m**	

35	SARIZ İLÇESİ AYRANLIK VE ÇÖREKDERE MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	m	₺ 417.619,72
		Ø 200 KORİGE	5.031 m	
		Ø 225 PE	m	
		500 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		HAZIR KANALİZASYON TERFİ POMPA İSTASYONU	Ad.	
		TOPLAM	**5.031 m**	
36	SARIZ İLÇESİ GERDEKMAĞRA VE TEKNELİ MAHALLELERİNE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPIMI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	m	₺ 1.198.268,51
		Ø 200 KORİGE	12.847 m	
		50 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		100 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		TOPLAM	**12.847 m**	
37	SARIZ İLÇESİ KIRKISRAK MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	m	₺ 469.156,38
		Ø 200 KORİGE	5.633 m	
		Ø 225 PE	m	
		8 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		50 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		100 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		TOPLAM	**5.633 m**	
38	TALAS KISMİ KANALİZASYON İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	169 m	₺ 19.081,71
		Ø 200 KORİGE	94 m	
		ABONE BAĞLANTISI	2 Ad.	
		TOPLAM	**263 m**	
39	TOMARZA İLÇESİ BÜYÜKCANLI VE ÇULHA MAHALLELERİNE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	338 m	₺ 664.389,74
		Ø 200 KORİGE	6.424 m	
		500 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	42 Ad.	
		TOPLAM	**6.762 m**	
40	TOMARZA İLÇESİ PUSATLI MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	m	₺ 0,00
		Ø 200 KORİGE	m	
		Ø 225 PE	m	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		TOPLAM	**m**	

41	TOMARZA İLÇESİ ŞIHBARAK MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	1.386 m	₺ 709.721,61
		Ø 200 KORİGE	7.872 m	
		Ø 75 PE	m	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	104 Ad.	
		HAZIR KANALİZASYON TERFİ POMPA İSTASYONU	Ad.	
		TOPLAM	**9.258 m**	
42	YAHYALI AVLAĞI MAHALLESİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI	Ø 200 KORİGE	242 m	₺ 275.469,82
		Ø 200 KORİGE (Ø 350 ÇB KILIFLI)	155 m	
		500 KİŞİLİK FOSSEPTİK	1 Ad.	
		TOPLAM	**397 m**	
43	YAHYALI İLÇESİ İLYASLI VE SENİRKÖY MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	1.779 m	₺ 1.084.980,55
		Ø 200 KORİGE	10.238 m	
		Ø 75 PE	2.901 m	
		Ø 315 PE	m	
		HAZIR KANALİZASYON TERFİ POMPA İSTASYONU	Ad.	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	128 Ad.	
		TOPLAM	**14.918 m**	
44	YAHYALI İLÇESİ KAPUZBAŞI, ÇUBUKHARMANI, BALCIÇAKIRI VE YEŞİLKÖY MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI	Ø 150 KORİGE	2.213 m	₺ 1.634.998,69
		Ø 200 KORİGE	9.966 m	
		Ø 75 PE	m	
		100 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		1500 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	198 Ad.	
		KAPUZBAŞI TM	Ad.	
		TOPLAM	**12.179 m**	
45	YAHYALI İLÇESİ KOPÇU, KOCAHACILI VE YERKÖY MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	m	₺ 580.783,98
		Ø 200 KORİGE	5.663 m	
		Ø 75 PE	m	
		1000 KİŞİLİK FOSSEPTİK	Ad.	
		ABONE BAĞLANTISI	Ad.	
		HAZIR KANALİZASYON TERFİ POMPA İSTASYONU	Ad.	
		VANTUZ ODASI	Ad.	
		TOPLAM	**5.663 m**	

46	YEŞİLHİSAR İLÇESİ MUSAHACILI, OVAÇİFTLİK VE YEŞİLOVA MAHALLELERİ KANALİZASYON İNŞAATI (2017 - 2018 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	510 m	₺ 1.279.288,11
		Ø 200 KORİGE	11.336 m	
		Ø 75 PE	m	
		Ø 90 PE	m	
		ABONE BAĞLANTISI	124 Ad.	
		HAZIR KANALİZASYON TERFİ POMPA İSTASYONU	Ad.	
		TOPLAM	**11.846 m**	
47	YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ - BAĞDAT CADDESİ GÜZERGÂHI KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2018 - 2019 SARÎ)	Ø 600 BA	10 m	₺ 0,00
		Ø 800 BA	20 m	
		Ø 1000 BA	1.100 m	
		Ø 1200 BA	1.000 m	
		Ø 1400 BA	3.200 m	
		Ø 2000 BA	4.850 m	
		Ø 300 KORİGE	400 m	
		Ø 400 KORİGE	80 m	
		Ø 500 KORİGE	10 m	
		Ø 600 KORİGE	40 m	
		Ø 800 KORİGE	50 m	
		ABONE BAĞLANTISI	15 Ad.	
		TOPLAM	**10.760 m**	
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			**373.404 m**	**₺ 37.970.635,84**
48	ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARSİNAN YERLEŞKESİ KANALİZASYON DEŞARJ HATLARI İÇİN KILIF BORUSU YERLEŞTİRİLMESİ	Ø 800 ÇB	232 m	₺ 47.141,00
		KILIF BORU YERLEŞTİRİLMESİ	**232 m**	
49	BÜNYAN İLÇESİ ELBAŞI MAHALLELERİNDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPIMI	Ø 400 KORİGE	1.150 m	₺ 49.607,20
		TOPLAM	**1.150 m**	
50	FELAHİYE İLÇESİ KARAŞEYH MAHALLESİ FOSSEPTİK KANALİZASYON BAĞLANTISI HATTI İNŞAATI	Ø 200 KORİGE	70 m	₺ 5.900,00
		TOPLAM	**70 m**	
51	GÖMEÇ MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI YATAY GEÇİŞİ YAPILMASI	Ø 355 PE	20 m	₺ 15.281,00
		TOPLAM	**20 m**	
52	İNCESU İLÇESİ TAHİRİNİ MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI YATAY GEÇİŞİ YAPILMASI	Ø 800 ÇB	40 m	₺ 41.506,50
		TOPLAM	**40 m**	
53	TALAS TABLAKAYA ERGUVAN CAFE RESTAURANT Ø160 PE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI	Ø 160 PE	170 m	₺ 18.378,50
		TOPLAM	**170 m**	
54	TOMARZA İLÇESİ ŞIHBARAK MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI DERE GEÇİŞİ YAPILMASI	Ø 300 ÇB	50 m	₺ 17.782,15
		Ø 225 PE	50 m	
		TOPLAM	**100 m**	
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			**1.782 m**	**₺ 195.596,35**
KANALİZASYON İŞLERİ TOPLAMI			**375.186 m**	**₺ 38.166.232,19**
ABONE BAĞLANTISI TOPLAMI			**4.175 Ad.**	
FOSEPTİK TOPLAMI			**10 Ad.**	
HAZIR TERFİ İSTASYONU			**Ad.**	
YAĞMUR IZGARASI			**Ad.**	

C - ATIKSU ARITMA TESİSİ YATIRIMLARI				
S.NO	**İŞİN ADI**	**YAPILAN İŞ**		**2017 YILI MALİYETİ (KDV DÂHİL)**
1	AKKIŞLA / GÖMÜRGEN İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SARÎ)	150m³/GÜN	1 Ad.	₺ 0,00
2	BÜNYAN / AKMESCİT İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SARÎ)	200m³/GÜN	1 Ad.	₺ 124.333,56
3	BÜNYAN / ELBAŞI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SARÎ)	150m³/GÜN	1 Ad.	₺ 341.201,48
4	BÜNYAN / KARAKAYA İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SARÎ)	200m³/GÜN	1 Ad.	₺ 112.582,95
5	BÜNYAN / KOYUNABDAL İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SARÎ)	150m³/GÜN	1 Ad.	₺ 0,00
6	BÜNYAN / YENİ SÜKSÜN - HAZERŞAH İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SARÎ)	200m³/GÜN	1 Ad.	₺ 114.934,96
7	DEVELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI (2014 - 2019 SARÎ)	9.030m³/GÜN	1 Ad.	₺ 1.174.413,51
8	İNCESU / TAHİRİNLİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SARÎ)	150m³/GÜN	1 Ad.	₺ 0,00
9	KOCASİNAN HİMMETDEDE KALKANCIK KARAKİMSE İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SARÎ)	200m³/GÜN	1 Ad.	₺ 0,00
10	KOCASİNAN YEMLİHA İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SARÎ)	700m³/GÜN	1 Ad.	₺ 799.993,67
11	PINARBAŞI PAZARÖREN İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SARÎ)	150m³/GÜN	1 Ad.	₺ 110.121,07
12	SARIOĞLAN / KARAÖZÜ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SARÎ)	150m³/GÜN	1 Ad.	₺ 0,00
13	SARIOĞLAN PALAS İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SARÎ)	700m³/GÜN	1 Ad.	₺ 0,00
14	TOMARZA AKDERE İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SARÎ)	150m³/GÜN	1 Ad.	₺ 111.480,53
15	TOMARZA AVŞAROBASI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SARÎ)	150m³/GÜN	1 Ad.	₺ 83.377,09
16	TOMARZA DADALOĞLU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SARÎ)	200m³/GÜN	1 Ad.	₺ 136.263,21
17	YAHYALI / ÇUBUKLU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SARÎ)	150m³/GÜN	1 Ad.	₺ 187.179,44
18	YAHYALI BÜYÜKÇAKIR İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2019 SARÎ)	200m³/GÜN	1 Ad.	₺ 0,00
19	YEŞİLHİSAR / İÇMECE - KAYADİBİ - KOVALI - KUŞÇU - OVAÇİFTLİK ORTAK İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SARÎ)	200m³/GÜN	1 Ad.	₺ 167.639,30
20	YEŞİLHİSAR / MUSAHACILI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2019 SARÎ)	150m³/GÜN	1 Ad.	₺ 183.519,88
21	AKKIŞLA BÜNYAN ÖZVATAN VE SARIZ İLÇELERİ A.A.T PROJELERİ YAPTIRILMASI (2015 - 2017 SARÎ)	AKKIŞLA AAT (700m³/GÜN)	1 Ad.	₺ 417.720,00
		BÜNYAN AAT (3.500m³/GÜN)	1 Ad.	
		ÖZVATAN AAT (600m³/GÜN)	1 Ad.	
		SARIZ AAT (700m³/GÜN)	1 Ad.	
		TOPLAM	**4 Ad.**	

22	MUHTELİF ARITMA TESİSLERİ TRAFO POSTASI VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPIMI (2017 - 2018 SARÎ)	GÖMÜRGEN	Ad.	₺ 911.586,58
		AKKIŞLA	**Ad.**	
		AKMESCİT	1 Ad.	
		ELBAŞI	1 Ad.	
		KARAKAYA	Ad.	
		KOYUNABDAL	1 Ad.	
		YENİSÜKSÜN	1 Ad.	
		BÜNYAN	**4 Ad.**	
		TAHİRİNLİ	1 Ad.	
		İNCESU	**1 Ad.**	
		HİMMETDEDE	1 Ad.	
		YEMLİHA	1 Ad.	
		KOCASİNAN	**2 Ad.**	
		PAZARÖREN	1 Ad.	
		PINARBAŞI	**1 Ad.**	
		KARAÖZÜ	1 Ad.	
		ÜZERLİK	Ad.	
		SARIOĞLAN	**1 Ad.**	
		AKDERE	Ad.	
		AVŞAROBASI	1 Ad.	
		DADALOĞLU	1 Ad.	
		TOMARZA	**2 Ad.**	
		BÜYÜKÇAKIR	Ad.	
		ÇUBUKLU	Ad.	
		YAHYALI	**Ad.**	
		MUSAHACILI	Ad.	
		KAYADİBİ, KUŞÇU, İÇMECE	Ad.	
		YEŞİLHİSAR	**Ad.**	
		TOPLAM	**11 Ad.**	
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			**20 Ad.**	**₺ 4.976.347,22**
23	DEVELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ BORU VE VANA İZOLASYONU	AAT BORU VE VANA İZOLASYONU		₺ 26.550,00
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			**Ad.**	**₺ 26.550,00**
TOPLAM			**20 Ad.**	**₺ 5.002.897,22**

D - YAĞMURSUYU YATIRIMLARI				
S.NO	**İŞİN ADI**	**YAPILAN İŞ**		**2017 YILI MALİYETİ (KDV DÂHİL)**
1	2016 YILI MELİKGAZİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2016 - 2017 SARÎ)	Ø 150 KORİGE	541 m	₺ 224.600,00
		Ø 400 KORİGE	1.458 m	
		Ø 500 KORİGE	247 Ad.	
		ESENTEPE MAHALLESİ TAHA CARIM BULVARI TOPLAM	**2.246 m**	
		Ø 200 KORİGE	404 m	₺ 99.200,00
		Ø 300 KORİGE	588 m	
		İLDEM BÖLGESİ TOPLAM	**992 m**	
		Ø 600 KORİGE	1.410 m	₺ 141.000,00
		ERKİLET ÇOCUK HASTANESİ ÇEVRESİ TOPLAM	**1.410 m**	
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			**4.648 m**	**₺ 464.800,00**
2	BÜNYAN CEZAEVİ YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI	Ø 500 KORİGE	200 m	₺ 35.400,00
		TOPLAM	**200 m**	
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			**200 m**	**₺ 35.400,00**
YAĞMURSUYU İŞLERİ TOPLAMI			**4.848 m**	**₺ 500.200,00**

E - MUHTELİF YATIRIMLAR			
S.NO	**İŞİN ADI**	**YAPILAN İŞ**	**2017 YILI MALİYETİ (KDV DÂHİL)**
1	KASKİ İDARİ BİNASI ÇATI VE DIŞ CEPHE MANTOLAMA YAPILMASI	İDARİ BİNASI ÇATI VE DIŞ CEPHE MANTOLAMA YAPILMASI	₺ 1.649.880,99
2	KIRMATAŞ MALZEME TEMİNİ MAL ALIMI	60.757,83 TON MALZEME TEMİNİ YAPILDI.	₺ 412.241,87
3	SARIZ EKİPEVİ İNŞAATI	EKİPEVİ YAPIMI	₺ 1.049.796,94
4	SARIOĞLAN EKİPEVİ İNŞAATI	EKİPEVİ YAPIMI	₺ 1.117.870,35
5	TEKNİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI (2017 - 2019 SÂRİ)		₺ 663.273,96
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			**₺ 4.893.064,11**
6	BÜNYAN İÇMESUYU TEMİNİ GEÇİCİ KAPTAJ ALANI YAPILMASI VE AHŞAP OTURTMALI ÇATI İLE ÜZERİNİN KAPATILMASI	KAPTAJ ALANI YAPILMASI VE AHŞAP OTURTMALI ÇATI İLE ÜZERİNİN KAPATILMASI	₺ 47.200,00
7	GERMİRALTI İDARE BİNASINA ARŞİV TADİLATI YAPILMASI	ARŞİV TADİLATI YAPILMASI	₺ 63.738,37
8	GESİ MAHALLESİ KISMİ TAŞ DUVAR YAPILMASI (GESİ GÜNEY MAH. ÜÇ HAVUZLAR SOKAK)	40m³ TAŞ DUVAR VE BETON HATIL YAPILMASI	₺ 21.830,00
9	KASKİ ANA HİZMET BİNASI KATLARA SICAKSU TEMİNİ	ANA BİNA LAVABOLARA SICAKSU TEMİNİ	₺ 22.193,44
10	KASKİ ÇAY OCAĞININ KISMİ SERAMİK TADİLATININ YAPILMASI	40m² SERAMİK YAPILMASI	₺ 4.720,00
11	KASKİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI ÖN CEPHE KAPLAMASI YAPIMI	305m² CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI	₺ 68.438,58
12	YAHYALI VE TOMARZA İLÇELERİ BÖLGE HİZMET BİNALARI PROJE YAPIMI	HİZMET BİNALARI PROJE YAPIMI	₺ 38.350,00
13	HARİTA EMLAK KAMULAŞTIRMA FAALİYET DURUMU	38.984,25 m² İSTİMLÂK 290,34 m² İRTİFAK 31,00 m² BEDELSİZ DEVİR 26.580,00 m² TAHSİS	₺ 486.290,52
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI			**₺ 752.760,91**
MUHTELİF İŞLER TOPLAMI			**₺ 5.645.825,02**
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI (KDV DÂHİL)			**₺ 88.166.713,60**
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI (KDV DÂHİL)			**₺ 1.985.632,72**
GENEL TOPLAM (KDV DÂHİL)			**₺ 90.152.346,32**

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI



2017 yılı bütçesinde öngörülen kaynaklar, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandırılmış, görev ve yetki alanımız içerisinde, idari ve mali kararlara ilişkin işlemlerin yasal ve düzenliliği hususunda yeterli güvence sağlanmıştır.

Başkanlığımızca yapılan iş ve işlemler, şube müdürleri organizesinde memur ve işçiler tarafından yürütülmüş, daire başkanı yapılan iş ve işlemleri sürekli izlemiş ve denetlemiştir. Daire Başkanlığına bağlı 1 sekreter 3 şube müdürlüğü vardır.

MAKİNE VE ATÖLYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Şube Müdürlüğünde; 1 şube müdürü, 2 tekniker, 1 baş şoför, 1 atölye formeni, 5 kurum şoförü, 1 akaryakıt görevlisi ve 9 hizmet alımı personel olmak üzere toplam 20 personel görev yapmıştır.

Şube Müdürlüğümüz, kurumun tüm birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak, kuruma ait 76, hizmet alımı yolu ile kiralanan 39 araç olmak üzere toplam 115 adet araç ve iş makinesiyle, kurumun tüm alt yapı, üst yapı, şebeke su ve atıksu ile kanalizasyon bakım ve onarım çalışmalarına destek vermiştir. Kurumumuza ait araç ve iş makinelerinin zorunlu trafik sigortaları ve Tüvtürk fenni muayene işleri gününde ve düzenli olarak yaptırılmıştır.

Yıl içerisinde kuruma ait tüm araç ve iş makinelerine otomatik taşıt takip sistemi monte edilmiştir. Resmi ve kiralık, araç ve iş makinelerinin sevk ve idaresi online Taşıt Takip Sistemi ile titizlikle takip edilmiş, iş akışının aksamadan devamı sağlanmıştır.

Kuruma ait akaryakıt istasyonu sürekli faal olarak çalıştırılmıştır. 2016 yılında ihalesi yapılmış olan Akaryakıt Pompa ve Tank Otomasyon Sistemi 2017 yılı dönem başında aktif hale getirilmiştir. Kurumumuza ait araç ve iş makineleri ile ayrıca yakıtı idareye ait olarak kiralanan şirket araçları otomasyon sistemine dâhil edilmiştir. Tank otomasyonu ile yüklenici firmadan alınan yakıt alımları ile araçlara yapılan anlık yakıt çıkışları kesintisiz ve kontrollü şekilde çift kart sistemi ile sağlanmıştır. Seyyar Yakıt Tankeri de söz konusu otomasyon sistemine dahil edilmiş olup, 7/24 yapılan yakıt ikmalleri otomasyon sisteminden online takip edilecek konuma getirilmiş, çalışma yerlerinde araç ve iş makinelerine yakıt ikmali yapılarak iş aksaklığına meydan verilmemiştir. Ayrıca atıksu arıtma tesisinde bulunan yakıt istasyonunun da bu otomasyon sistemi ile koordinasyonlu çalıştırılması sağlanmış, her türlü yakıt ikmalleri tek merkezden online kontrol altına alınmıştır.

İhale yolu ile 2017 yılı içerisinde, ilçe ekiplerine OTTS ile Germiraltı akaryakıt istasyonuna tanker bazlı olmak üzere toplam 863.342,71 litre motorin, 10.570 litre benzin alınmıştır. Alınan akaryakıt ürünlerinin muayene ve kabul işlemleri yapılarak, aylık hakedişleri düzenlenmiş, düzenlenen hakedişlerle yüklenici firmaya ödenmek üzere KDV hariç toplam ₺ 3.132.731,06 tutarında ödeme evrakları ilgili birime gönderilmiştir. 2017 yılı içerisinde Germiraltı benzinlik ve seyyar tankerden 8.386 adet motorin pompa çıkışı yapılarak toplam 662.149,49 lt. motorin, 406 adet kurşunsuz benzin pompa çıkışı yapılarak toplam 9.332,26 lt kurşunsuz benzin sevkiyatı yapılmıştır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında, kurumumuz İSG uzman temsilcileri ile gerekli görüşmeler yapılmış, birimimize ait tesislerin eksiklikleri tespit edilmiş, gerekli düzenleme ve tedbirlerin sağlanması konusunda çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu İGS uygulamaları kapsamında Kurumumuza ait tüm araç ve iş makinelerinin fenni muayeneleri Makine Mühendisleri Odasına düzenli olarak yaptırılmıştır.

Kuruma ait 76 adet taşıt ve iş makinelerinin yıl içerisinde 862 adet bakım, tamir, onarım ve arızaları, imkân dâhilinde kurum atölyesinde giderilmiş, atölyede tamiri mümkün olmayan 277 adet bakım onarım ilgili servislerde yaptırılmış, bu işlemler için 2017 yılı içerisinde KDV hariç yaklaşık ₺ 1.144.645 tutarında mal ve hizmet alımı yapılarak iş akışı sağlanmıştır.

Hizmet alımı ihalesi ile kiralanan 39 adet araçlar için 12 adet hak ediş düzenlenmiş, KDV hariç toplam ₺2.583.400,15 hakediş bedelleri yüklenici firmalara ödeme yapılması için muhasebeye gönderilmiştir



2017 Yılı İçerisinde Kurum Demirbaş Envanterine Kayıtlı Hizmet Araçları Ve İş Makineleri

S.NO	TAŞITIN CİNSİ	KURUM
1	Binek Otomobil (Renault Kango)	1
2	4x2 Pic-up Kamyonet (şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	11
3	4x4 Pic-up Kamyonet (şoför dahil 3 veya 6 kişilik) büyük tip	3
4	Damperli Kamyon (14 ton kapasite)	3
5	Kayar Kasalı Kamyon	1
6	Su Tankeri	1
7	Damperli Kamyon (3 ton yakıt tankeri)	2
8	Kombine Kanal Açma Aracı	9
9	Kanal Kazıyıcı - Yükleyici Kepçe	15
10	Tır Dorsesi	1
11	Tır	1
12	Vidanjör	3
13	Greyder	1
14	Forklift	5
15	Kamyon Bakım Aracı (jeneratör)	1
16	Kamyon Vinç	3
17	Kamyon Faun (4 adedi minibüs faun)	8
18	Minibüs	5
19	Seyyar Vezne (minibüs)	2
TOPLAM		**76**


Hizmet Alımı İle (01.01.2017 – 31.12.2018) Tarihleri Arasında Kiralanan Taşıtlar

S.NO	TAŞITIN CİNSİ	KİRALIK TAŞIT SAYISI
1	Klimalı Binek Tip Otomobil	14
2	Yandan Camlı Panel Tipi Taşıt	16
3	4x2 Çift Kabinli Kamyonet (Pikap)	3
4	4x4 Çift Kabinli Kamyonet (Pikap)	6
TOPLAM		**39**

2017 Yılında Aylara Göre Germiraltı Benzinlik Ve Seyyar Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Sevkiyatları


AYLAR	MOTORİN		KURŞUNSUZ BENZİN		AYLIK TOPLAM	
	Sayısı	Miktarı	Sayısı	Miktarı	Sayısı	Miktarı
Ocak	548 Ad.	37.401,76 lt.	9 Ad.	152,67 lt.	557 Ad.	37.554,43 lt.
Şubat	549 Ad.	44.398,59 lt.	22 Ad.	538,39 lt.	571 Ad.	44.936,98 lt.
Mart	664 Ad.	55.277,55 lt.	28 Ad.	490,49 lt.	692 Ad.	55.768,04 lt.
Nisan	661 Ad.	48.488,98 lt.	34 Ad.	850,41 lt.	695 Ad.	49.339,39 lt.
Mayıs	726 Ad.	54.917,40 lt.	35 Ad.	737,56 lt.	761 Ad.	55.654,96 lt.
Haziran	695 Ad.	46.566,68 lt.	38 Ad.	1.071,32 lt.	733 Ad.	47.638,00 lt.
Temmuz	896 Ad.	78.284,94 lt.	54 Ad.	1.047,56 lt.	950 Ad.	79.332,50 lt.
Ağustos	771 Ad.	69.491,62 lt.	30 Ad.	937,94 lt.	801 Ad.	70.429,56 lt.
Eylül	724 Ad.	56.273,57 lt.	48 Ad.	1.039,26 lt.	772 Ad.	57.312,83 lt.
Ekim	780 Ad.	61.288,96 lt.	40 Ad.	1.058,66 lt.	820 Ad.	62.347,62 lt.
Kasım	723 Ad.	62.603,17 lt.	43 Ad.	782,17 lt.	766 Ad.	63.385,34 lt.
Aralık	649 Ad.	47.156,27 lt.	25 Ad.	625,83 lt.	674 Ad.	47.782,10 lt.
TOPLAM	**8.386 Ad.**	**662.149,49 lt.**	**406 Ad.**	**9.332,26 lt.**	**8.792 Ad.**	**671.481,75 lt.**

2017 Yılında Aylara Göre Germiraltı Benzinlik Ve Seyyar Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Sevkiyat Grafiği

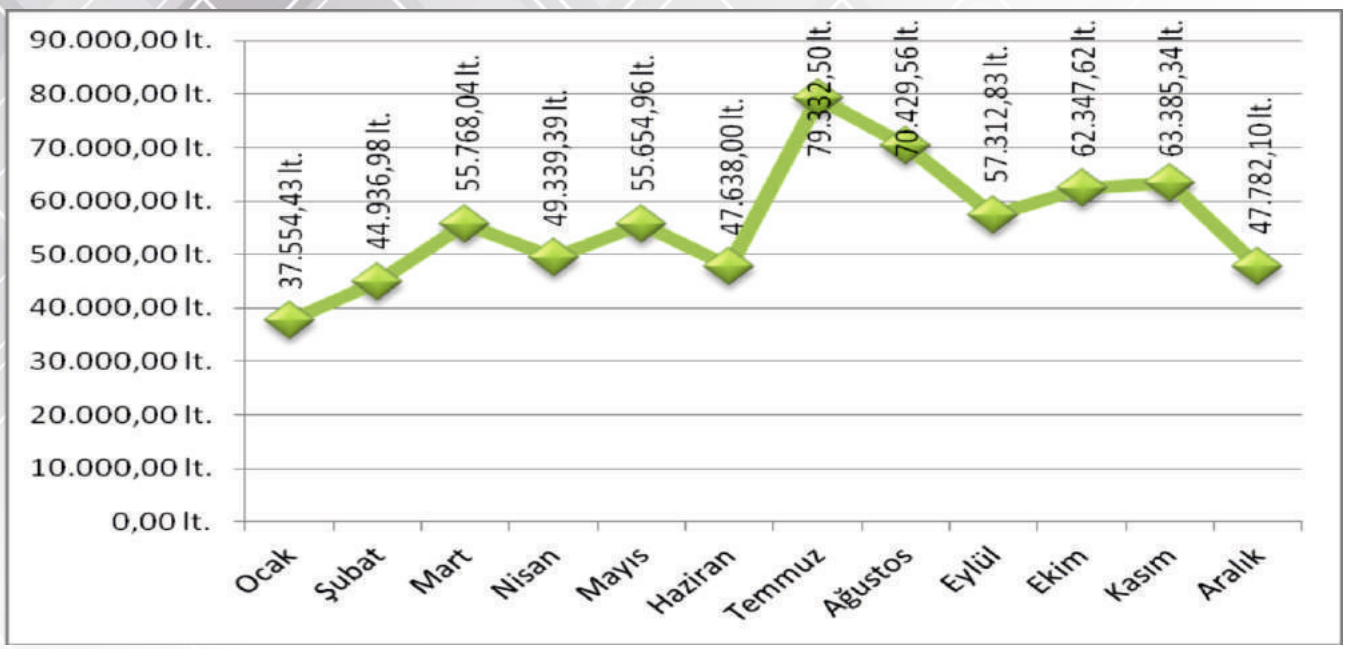

2017 Yılında Atölyede Arızalanan Araçlara Ait Bilgiler

AYLAR	Atölyede Arızası Giderilen Araç Sayısı	Atölye Dışında Servislerde Arızası Giderilen Araç Sayısı	Arızası Giderilen Toplam Araç Sayısı
Ocak	70 Ad.	20 Ad.	90 Ad.
Şubat	65 Ad.	25 Ad.	90 Ad.
Mart	75 Ad.	20 Ad.	95 Ad.
Nisan	65 Ad.	15 Ad.	80 Ad.
Mayıs	74 Ad.	17 Ad.	91 Ad.
Haziran	79 Ad.	19 Ad.	98 Ad.
Temmuz	82 Ad.	29 Ad.	111 Ad.
Ağustos	78 Ad.	32 Ad.	110 Ad.
Eylül	70 Ad.	29 Ad.	99 Ad.
Ekim	75 Ad.	33 Ad.	108 Ad.
Kasım	70 Ad.	20 Ad.	90 Ad.
Aralık	59 Ad.	18 Ad.	77 Ad.
TOPLAM	**862 Ad.**	**277 Ad.**	**1.139 Ad.**

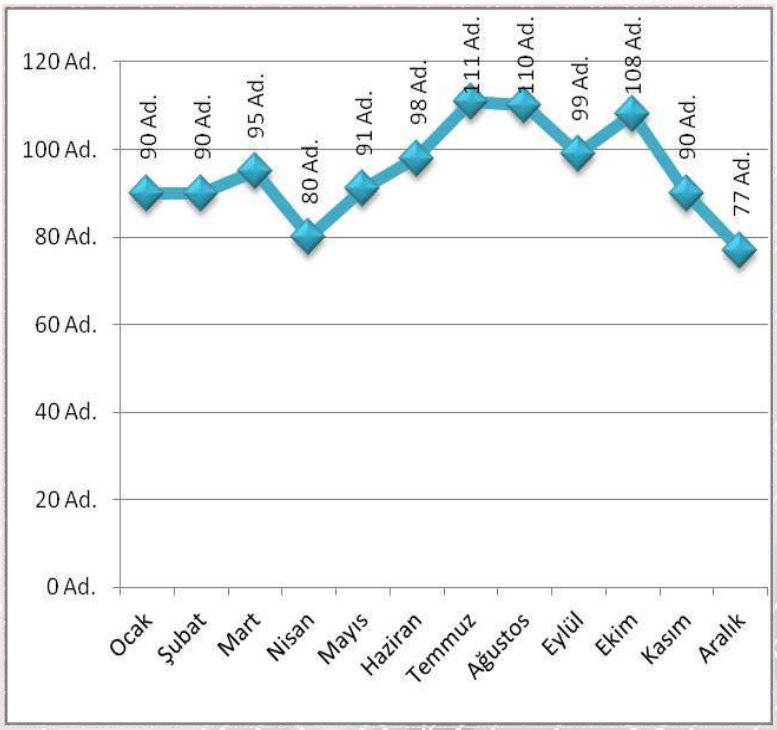


SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlüğünde; 1 şube müdürü, 3 memur, 4 satınalma görevlisi olmak üzere 8 personel görev yapmıştır. Harcama birimlerinin talep ettikleri, her türlü mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin usulü ile veya ihale yolu ile temini yapılmış, satılması talep edilen hurda ve demirbaşların satış işlemleri gerçekleştirilmiştir. Doğrudan temin alımlarında satın alma görevlisi personellerimizle birlikte malın en kalitelisinin, en düşük fiyattan alınmasına özen gösterilmiş, satın alınan malların teslim-tesellümü, denetim muayene ve kabulü yapılmış, fatura bedellerinin ödenmesi için gerekli her türlü yazışmalar yapılmıştır.

2017 yılında doğrudan teminle yapılan alımlar tablo halinde aşağıdaki gibidir:

AYLAR	HİZMET ALIMI		MAL ALIMI		GENEL TOPLAM	
	Evrak Sayısı (Adet)	Tutarı (₺)	Evrak Sayısı (Adet)	Tutarı (₺)	Evrak Sayısı (Adet)	Tutarı (₺)
OCAK	20	111.114,96	40	530.591,45	60	641.706,41
ŞUBAT	29	232.340,05	51	565.615,57	80	797.955,62
MART	20	76.495,07	47	424.413,39	67	500.908,46
NİSAN	16	220.131,43	31	359.750,24	47	579.881,67
MAYIS	21	272.051,13	49	471.325,67	70	743.376,80
HAZİRAN	27	193.654,29	42	420.137,67	69	613.791,96
TEMMUZ	14	126.443,72	35	381.560,14	49	508.003,86
AĞUSTOS	12	70.387,90	30	418.080,04	42	488.467,94
EYLÜL	22	266.954,27	31	312.383,03	53	579.337,30
EKİM	24	356.499,28	28	307.020,07	52	663.519,35
KASIM	22	159.667,40	61	579.337,92	83	739.005,32
ARALIK	24	261.506,17	41	763.205,44	65	1.024.711,61
TOPLAM	**251**	**2.347.245,67**	**486**	**5.533.420,63**	**737**	**7.880.666,30**

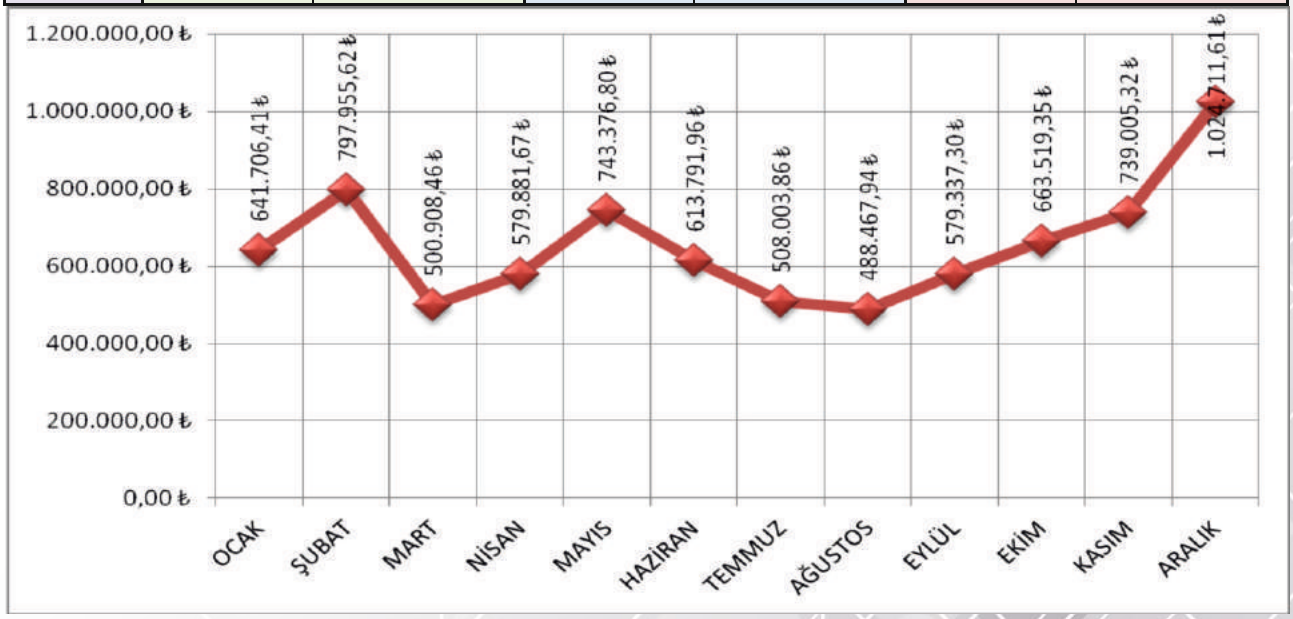

Doğrudan temin ve ihalelere ait tüm evraklar usulüne göre ayrı ayrı tanzim edilmiş, dosyalanmış ve arşivlenmiştir.

İhale yolu ile alımlarda, talep eden birim tarafından hazırlanan teknik şartname doğrultusunda piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyet hazırlanmış, idari şartname ve sözleşme taslağı hazırlanarak, ihale yetkilisinin onayından sonra, ihale ilanları usulüne uygun olarak yapılmış, ihale komisyonları kurulmuş, ihale işlem dosyaları hazırlanmış, isteklilere dosya satışı yapılmış, ihaleler ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılmıştır. Komisyon tarafından hazırlanan ihale komisyon raporları bir üst yazı ile Yönetim Kurulunun onayına sunulmuş, kesinleşen ihale kararları ihaleye katılan tüm iştirakçilere gönderilmiş, ihalesi üzerinde kalan yüklenicilerle ayrı ayrı sözleşme imzalanmış, mal tesliminden veya hizmet alımı tamamlandıktan sonra denetim, muayene kabul komisyonları kurulmuş, komisyonların hazırladıkları kabul tutanakları ihale yetkilisinin onayına sunulmuş, makamın onayına müteakiben, ilgili firmalara ödeme yapılması için her türlü yazışma gerçekleştirilmiş yazışmaların birer sureti fatura örnekleri, teminat iade yazıları ve ihale ile ilgili her türlü yazışmalar, ihale işlem dosyasına konmuş, dosyalar ayrı ayrı tanzim edilmiş ve muhafaza altına alınmıştır.

2017 yılı içerisinde aşağıdaki ihaleler yapılmıştır.

S.NO	İHALE USULÜ	TALEP EDEN BİRİM	İHALE KAYIT NO VE ADI	İHALE TARİH VE SAATİ	KATILIMCI FİRMA SAYISI	KISIM ADI	YÜKLENİCİ FİRMA ADI VE İHALE BEDELİ	
1	19. MADDE Açık İhale Usulü	İçmesuyu Dairesi Başk.' lığı	2017/19184 İçmesuyu Muhtelif Malzeme Alımı	27.02.2017 14:00	12 Firma	1.Kısım :89 Kalem Ductil Malzeme Alımı	Samsun Mak. San. A.Ş.	₺ 11.165.500
						2.Kısım :52 Kalem Polietilen Malzeme Alımı	Özhan Grup Alt Yapı	₺ 2.289.907
						3.Kısım :75 Kalem PVC Malzeme Alımı	Epaş Döküm	₺ 1.588.633
						4.Kısım :14 Kalem Sarı Pirinç Malzeme Alımı	Özhan Grup Alt Yapı	₺ 379.530
						5.Kısım :11 Kalem Vana Alımı	G.M.S. Genel Mak.	₺ 495.200
						6.Kısım :22 Kalem Hazır Tamir Malzeme Alımı	İptal	₺ 0,00
						7.Kısım :6 Kalem Çelik Malzeme Alımı	Vefa Boru	₺ 2.209.000
2	19. MADDE Açık İhale Usulü	Kanalizasyon Dairesi Başk.'lığı	2017/71692 Kanal-Korige, PVC Boru ve Ek Parçaları İle Betonarme Boru, Baca ve Yükseltme Elemanları Alımı	27.03.2017 14:00	11 Firma	1.Kısım :8 Kalem Korige Kanal Boru ve Ek Parçaları Alımı	Hidro Plastik	₺ 3.632.125
						2.Kısım :2 Kalem Sfero Döküm Yağmur Izgara ve Kanal Kapağı Alımı	Uğur PAYZA	₺ 658.200
						3.Kısım :3 Kalem PVC Atıksu ve Yağmursuyu Borusu Alımı	İpek Hırdavat	₺ 412.200
						4.Kısım :16 Kalem Baca Yükseltme Elemanları Alımı	SORGUNTAŞ	₺ 670.300
3	21. MADDE Pazarlık Usulü (21/b)	İçmesuyu Dairesi Başk.' lığı	2017/61474 İçmesuyu Araç ve Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı (21/b)	16.02.2017 14:00	1 Firma	İçmesuyu Araç ve Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı (21/b)	Ömer BALCİ	₺ 951.051,04

S.NO	İHALE USULÜ	TALEP EDEN BİRİM	İHALE KAYIT NO VE ADI	İHALE TARİH VE SAATİ	KATILIMCI FİRMA SAYISI	KISIM ADI	YÜKLENİCİ FİRMA ADI VE İHALE BEDELİ	
4	19. MADDE Açık İhale Usulü	İçmesuyu Dairesi Başk.'lığı	2017/121186 Elektrik Enerjisi Alımı	08.05.2017 14:00	2 Firma	Elektrik Enerjisi Alımı	İptal	₺ 0,00
5	19. MADDE Açık İhale Usulü	İçmesuyu Dairesi Başk.'lığı	2017/122080 Elektrik Malzemeleri ve İş Elbiseleri Alımı	02.05.2017 14:00	14 Firma	1.Kısım :55 Kalem Elektrik Malzeme Alımı	Agaranti Pompa Elektrik Elektronik Otom. İnş. Taah. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.	₺ 516.000
						2.Kısım :4 Kalem Trafo Alımı	FMB Hırdavat Mak. Elekt. İnş. Yed. Parça Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.	₺ 236.440
						3.Kısım :13 Kalem Sürücü Alımı	Koru-Su Sondaj. Müh. Müşv. Taş. İmalat İhr. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.	₺ 383.000
						4.Kısım :13 Kalem Debimetre Alımı	Koru-Su Sondaj. Müh. Müşv. Taş. İmalat İhr. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.	₺ 416.000
						5.Kısım :20 Kalem İş Elbisesi Alımı	Aydın Grup İnş. İş Elbiseleri Sosy. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.	₺ 96.875
6	19. MADDE Açık İhale Usulü	Atıksu Arıtma Dai. Başk.'lığı	2017/106545 Atıksu Arıtma Muhtelif Mekanik Malzeme ve Laboratuvar Malzemesi Alımı	10.04.2017 14:00	4 Firma	1.Kısım :86 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı	Açılım Teknik	₺ 266.000
						2.Kısım :16 Kalem Su Malzemesi Alımı	Sta Pompa Endüstri Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti.	₺ 310.690
						3.Kısım :60 Kalem Hırdavat Malzemesi Alımı	İptal	₺ 0,00
						4.Kısım :35 Kalem Laboratuvar Malzemeleri Alımı	Mine Serap YAŞAR	₺ 139.587
7	19. MADDE Açık İhale Usulü	İçmesuyu Dairesi Başk.'lığı	2017/162186 Scada Malzemeleri Alımı	22.05.2017 14:00	10 Firma	37 Kalem Scada Malzemeleri Alımı	Envest Enerji ve Su Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.	₺ 2.970.000
8	19. MADDE Açık İhale Usulü	İçmesuyu Dairesi Başk.'lığı	2017/124938 İçme Suyu Dairesi Dalgıç Tip Motopomp ve Dalgıç Tip Motor Alımı	24.04.2017 14:00	5 Firma	1.Kısım :28 Kalem Dalgıç Tip Motopomp Alımı	Üstünel Pompa ve Mak. San. Tic. A.Ş.	₺ 350.750
						2.Kısım :9 Kalem Dalgıç Tip Motor Alımı	Üstünel Pompa ve Mak. San. Tic. A.Ş.	₺ 102.250
9	19. MADDE Açık İhale Usulü	İçmesuyu Dairesi Başk.'lığı	2017/133885 İçmesuyu Personel ve Araç Çalıştırılması Hizmet Alımı	04.05.2017 14:00	4 Firma	İçmesuyu Personel ve Araç Çalıştırılması Hizmet Alımı	Ömer Balcı - Sarba Taş.Paz.Tic.Ltd.Şti. (İş Ortaklığı)	₺ 6.753.887,72
10	21. MADDE Pazarlık Usulü (21/f)	Kanalizasyon Dairesi Başk.'lığı	2017/150869 Kombine Kanal Temizleme ve Görüntüleme Aracı Kiralanması Alımı (21/F)	06.04.2017 14:00	2 Firma	Kombine Kanal Temizleme ve Görüntüleme Aracı Kiralanması Alımı (21/F)	Suzan Handan ATEŞ	₺ 176.000

S.NO	İHALE USULÜ	TALEP EDEN BİRİM	İHALE KAYIT NO VE ADI	İHALE TARİH VE SAATİ	KATILIMCI FİRMA SAYISI	KISIM ADI	YÜKLENİCİ FİRMA ADI VE İHALE BEDELİ	
11	19. MADDE Açık İhale Usulü	Atıksu Arıtma Dai. Başk.'lığı	2017/135683 Polielektrolit Alımı	15.05.2017 14:00	5 Firma	Polielektrolit Alımı	İptal	₺ 0,00
12	19. MADDE Açık İhale Usulü	İçmesuyu Dairesi Başk.' lığı	2017/187643 İçmesuyu Hazır Tamir Malzemesi Alımı	22.05.2017 14:00	1 Firma	İçmesuyu Hazır Tamir Malzemesi Alımı	Açılım Teknik Müş.Taah.Tic.Ltd.Şti.	₺ 330.000
13	21. MADDE Pazarlık Usulü (21/f)	Yatırım İnş. Dai. Başk.'lığı	2017/189520 Betonarme Boru Alımı (21/F)	21.04.2017 14:30	1 Firma	Betonarme Boru Alımı (21/F)	Rim Mühendislik	₺ 187.200
14	19. MADDE Açık İhale Usulü	İnsan Kaynakları Dai.Başk.'lığı	2017/208884 İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Hizmet Alımı	29.05.2017 14:00	5 Firma	İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Hizmet Alımı	İptal	₺ 0,00
15	19. MADDE Açık İhale Usulü	Abone İşleri Dai. Başk.'lığı	2017/227419 Su Sayaçları Endeks Okuma, Değiştirme, Kapama, Açma ve Belge Dağıtımı Hizmet Alımı	19.06.2017 14:00	6 Firma	Su Sayaçları Endeks Okuma, Değiştirme, Kapama, Açma ve Belge Dağıtımı Hizmet Alımı	İzer Temizlik Hizmetleri Yemek Peyzaj Bilgisayar İlaçlama Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.	₺ 7.685.880
16	19. MADDE Açık İhale Usulü	İnsan Kaynakları Dai.Başk.'lığı	2017/220742 Kaski Genel Müdürlüğü ve Ek Binalarının Temizlik Hizmeti ve Destek Personeli Hizmet Alımı	12.06.2017 14:00	15 Firma	Kaski Genel Müdürlüğü ve Ek Binalarının Temizlik Hizmeti ve Destek Personeli Hizmet Alımı	İzer Temizlik Hizmetleri Yemek Peyzaj Bilgisayar İlaçlama Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.	₺ 2.008.100,52
17	19. MADDE Açık İhale Usulü	Abone İşleri Dai. Başk.'lığı	2017/240739 Su Sayacı Alımı	19.06.2017 14:00	3 Firma	Su Sayacı Alımı	Yavuz Metal San. ve Tic. A.Ş.	₺ 1.380.000
18	19. MADDE Açık İhale Usulü	İçmesuyu Dairesi Başk.' lığı	2017/278261 İçmesuyu Muhtelif Klor Malzemesi Alımı	17.07.2017 14:00	4 Firma	İçmesuyu Muhtelif Klor Malzemesi Alımı	Akösan Akü San. ve Tic. A.Ş	₺ 586.936
19	21. MADDE Pazarlık Usulü (21/f)	Bilgi İşlem Dairesi Başk.'lığı	2017/261513 Coğrafi Bilgi Sistemi ve Abone Bilgi Yönetim Sistemi Entegrasyonu İşi Hizmeti Alımı (21/F)	07.06.2017 14:30	2 Firma	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Abone Bilgi Yönetim Sistemi Entegrasyonu İşi Hizmeti Alımı (21/F)	Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş.	₺ 140.000

S.NO	İHALE USULÜ	TALEP EDEN BİRİM	İHALE KAYIT NO VE ADI	İHALE TARİH VE SAATİ	KATILIMCI FİRMA SAYISI	KISIM ADI	YÜKLENİCİ FİRMA ADI VE İHALE BEDELİ	
20	19. MADDE Açık İhale Usulü	Atıksu Arıtma Dai. Başk.'lığı	2017/292622 Katyonik Esaslı Polielektrolit Alımı	24.07.2017 14:00	4 Firma	Katyonik Esaslı Polielektrolit Alımı	iptal	₺ 0,00
21	21. MADDE Pazarlık Usulü (21/f)	Bilgi İşlem Dairesi Başk.'lığı	2017/309759 Elektronik Belge Yönetimi ve Doküman Arşiv Sistemi Yazılım Hizmeti Alımı (21/F)	23.06.2017 10:00	1 Firma	Elektronik Belge Yönetimi ve Doküman Arşiv Sistemi Yazılım Hizmeti Alımı (21/F)	İş Yazılım Don.Elkt.San.Tic.Ltd.Şti.	₺ 160.000
22	19. MADDE Açık İhale Usulü	İçmesuyu Dairesi Başk.' lığı	2017/346427 Muhtelif Vana, Çelik Ek Parçaları, Enerji Kablosu, Hidrostatik Seviye Probu, Hırdavat Malzemeleri ve Conta Alımı	14.08.2017 14:00	8 Firma	1.Kısım :20 Kalem, Muhtelif Vana Alımı	iptal	₺ 0,00
						2.Kısım :31 Kalem, Çelik Malzeme Alımı	Serdal DOĞAN	₺ 167.131
						3.Kısım :7 Kalem, Enerji Kablosu Alımı	Emka Taah. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.	₺ 174.450
						4.Kısım :5 Kalem, Hidrostatik Seviye Probu Alımı	Envest Enerji ve Su Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.	₺ 116.000
						5.Kısım :23 Kalem, Hırdavat Malzeme Alımı	Açılım Teknik Müşv. Taah. Ve İnş. İth. İhr. Yed. Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.	₺ 72.000
						6.Kısım :5 Kalem, Conta Alımı	İpek Hırdavat Demir Çelik Elekt. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.	₺ 34.715
23	19. MADDE Açık İhale Usulü	İçmesuyu Dairesi Başk.' lığı	2017/392093 Duktil Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı	11.09.2017 14:00	2 Firma	1.Kısım :6 Kalem Duktil Boru Alımı	Samsun Mak. San. A.Ş.	₺ 7.388.000
						2.Kısım :68 Kalem Bağlantı Parçaları Alımı	Samsun Mak. San. A.Ş.	₺ 873.400
24	19. MADDE Açık İhale Usulü	Çev. Kor. ve Kont. Dai. Başk.'lığı	2017/422233 İyon Kromatografi Cihazı Alımı	25.09.2017 14:00	1 Firma	İyon Kromatografi Cihazı Alımı	Redoks kimyasal Biyolojik Mad. ve Lab. Cih. Paz.	₺ 307.800
25	19. MADDE Açık İhale Usulü	Atıksu Arıtma Dai. Başk.'lığı	2017/430702 Katyonik Esaslı Polielektrolit Alımı	09.10.2017 14:00	4 Firma	Katyonik Esaslı Polielektrolit Alımı	Flochem Kimya San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.	₺ 711.200
26	21. MADDE Pazarlık Usulü (21/f)	Bilgi İşlem Dairesi Başk.'lığı	2017/465525 Kompakt Arşiv Dolabı Alımı (21/F)	28.09.2017 14:00		Kompakt Arşiv Dolabı Alımı (21/F)	İptal	₺ 0,00

S.NO	İHALE USULÜ	TALEP EDEN BİRİM	İHALE KAYIT NO VE ADI	İHALE TARİH VE SAATİ	KATILIMCI FİRMA SAYISI	KISIM ADI	YÜKLENİCİ FİRMA ADI VE İHALE BEDELİ	
27	19. MADDE Açık İhale Usulü	Atıksu Arıtma Dai. Başk.'lığı	2017/476307 Atıksu Arıtma Dairesi Personel ve Araç Çalıştırılması Hizmeti Alımı	06.11.2017 14:00	5 Firma	Atıksu Arıtma Dairesi Personel ve Araç Çalıştırılması Hizmeti Alımı	Sheme Tem. ve Araç Kiralama Hiz. Tic A.Ş.	₺ 5.986.961
28	21. MADDE Pazarlık Usulü (21/f)	Bilgi İşlem Dairesi Başk.'lığı	2017/503889 Kompakt Arşiv Dolabı Alımı (21/F)	19.10.2017 14:00	4 Firma	Kompakt Arşiv Dolabı Alımı (21/F)	Kılıçaslan Metal Büro San. Ve Tic.Ltd.Şti.	₺ 68.760
29	21. MADDE Pazarlık Usulü (21/f)	İçmesuyu Dairesi Başk.' lığı	2017/570616 Sondaj Kuyuları İçin Dalgıç Tip Motopomp ve Ekipman Alımı (21/F)	16.11.2017 14:00	2 Firma	Sondaj Kuyuları İçin Dalgıç Tip Motopomp ve Ekipman Alımı (21/F)	Fatih LAZOĞLU - Ecesu Enerji	₺ 194.500
30	19. MADDE Açık İhale Usulü	Çev. Kor. ve Kont. Dai. Başk.'lığı	2017/560836 Muhtelif Laboratuar Malzemesi Alımı	11.12.2017 14:00	2 Firma	Muhtelif Laboratuar Malzemesi Alımı	Mine Serap YAŞAR	₺ 243.000
31	21. MADDE Pazarlık Usulü (21/f)	Kanalizasyon Dairesi Başk.'lığı	2017/588178 Kombine Kanal Temizleme ve Görüntüleme Aracı Kiralama Hizmeti Alımı (21/F)	23.11.2017 14:00	1 Firma	Kombine Kanal Temizleme ve Görüntüleme Aracı Kiralama Hizmeti Alımı (21/F)	Suzan Handan ATEŞ	₺ 189.975
32	21. MADDE Pazarlık Usulü (21/f)	Kanalizasyon Dairesi Başk.'lığı	2017/680610 Römorklu Tip Drenaj Pompası Alımı (21/F)	28.12.2017 14:00	1 Firma	Römorklu Tip Drenaj Pompası Alımı (21/F)	İptal	₺ 0,00
							2017 Yılı İhaleleri Genel Toplamı	**₺ 66.175.134,28**

S.NO	İHALE USULÜ	TALEP EDEN BİRİM	İHALE TARİH VE SAATİ	KATILIMCI SAYISI	İhale Adı	ALICI FİRMA ADI VE İHALE BEDELİ	
1	KASKİ Gelir Getirici işlere Ait İhale Yönetmeliği'nin 26/b maddesine göre Açık Teklif Usulü	Elk Mak. Ve Malz. İkml. Dai. Başkanlığı	03.05.2017	6	KAZ. YÜK. KEPÇE FERMEC 860 BECO LOADER SATIŞI	Salih KARAKAYA	₺ 29.000
2					KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE HİDROMEH BECO LOADER SATIŞI	Şahin Kardeşler Grup Metal Nak. Petrol İnş. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.	₺ 27.100
3					KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE HİDROMEH BECO LOADER SATIŞI	Şahin Kardeşler Grup Metal Nak. Petrol İnş. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.	₺ 30.600
4					KAMYON - BMC KAMYON SATIŞI	Şahin Kardeşler Grup Metal Nak. Petrol İnş. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.	₺ 7.600
5		Yatırım İnş. Ve İnş. Dairesi Başkanlığı	02.10.2017	2	Arsa Satışı	Güldenur YİĞİT	₺ 227.000

AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ambar Şube Müdürlüğünde 1 şube müdürü, 2 memur, 7 işçi ve 2 şirket işçisi ile hizmetler yürütülmüştür. Germiraltı Ambarı ve Kaski Merkez Ambar olmak üzere iki ambarda hizmet verilmiştir. Ambarlarda iş ve işlemler; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre, Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan ve 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 19/06/2010 tarih 27616 sayılı, 22/03/2012 tarih 28241 sayılı, 08/11/2012 tarih 28461 sayılı ve 22/04/2016 tarih 29692 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanan değişiklerle birlikte en son yürürlükte olan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yürütülmüştür.

Germiraltı Ambarı çevre düzenlemesi yapılmış olup, açık alanda malzemeler evsafına göre istif edilmiş, yeni malzeme stok alanları oluşturulmuş, 740 mt. uzunluğunda koruma çiti yaptırılarak ambar malzemelerinin iç ve dış etkenlerden tecridi sağlanmıştır. Kapalı alandaki malzemelerin malzeme tanıtım kartları raflar üzerine asılmış, giren ve çıkan malzemelerin kontrolü sağlanarak bu işlem aynı zamanda bilgisayar ortamından da takip edilmiştir.

Her sabah saat 08:00'dan itibaren ekip servislerine günlük ihtiyaçları olan su ve kanalizasyon malzemeleri ekip arabalarına yüklenmiş, malzeme sayımları yapılarak her bir ekip için ayrı ayrı eğreti defterine kaydedilmiş, teslim ve tesellümü yapan personellerin karşılıklı imzaları alınmış, Eğreti Defterine kaydedilen malzemeler aynı gün içinde bilgisayar kaydı yapılarak, stoklardan düşüm yapılmıştır. Ambar stokları sürekli takip edilmiş, malzemede azalma olduğunda ihtiyaçların karşılanabileceği sayıda yeniden alım yapılması için ilgili birimlere bilgi akışı sağlanmıştır. İhalesi, malzemeli yapılan yatırımlar için işin görevli kontrolörü nezaretinde kurum malı müteahhitlere verilmiş, kayıtları ayrı ayrı tutulmuş, çıkış işlemleri bilgisayar kayıtlarından yapılmıştır. Kaskide iş yapan taşeron firmalar ihtiyaç duydukları malzemeleri bedeli karşılığında komisyon kararı ve makam onayı ile satışları yapılmış, mal teslimine müteakip ambar kayıt çıkış işlemleri yapılmıştır. Satın alınan malzemelerin denetim muayene ve kabulüne müteakip ambar kayıtları yapılarak yüklenicilere ödeme yapılması için evraklar Muhasebe Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. 2017 yılında ihalesi yapılan mal ve akaryakıt ürünlerinin denetim muayene ve kabul komisyonu raporu doğrultusunda ambar giriş ve çıkış işlemleri gerçekleştirilmiştir. Buna göre:

1.473 adet taşınır işlem giriş fişi düzenlenerek mal malzemelerin ambar girişi yapılmış, kullanılmak üzere ilgili birimlere 1.662 adet taşınır işlem çıkış fişi tanzim edilerek mal ve malzeme çıkışı yapılmıştır. Harcama birimleri yetkilileri tarafından onaylı 40 adet kayıtan düşme teklif ve onay tutanaklarına istinaden hurdaya ayrılan malzemeler cinslerine göre ayrılmış, listelenmiş hurda olarak satış yapılmak üzere Satınalma Şube Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilmiştir.




Harcama Birimlerine Göre Ambarlardaki Malzeme Giriş – Çıkış – Kayıttan Düşmeyi Gösterir Tablo

SIRA NO	Harcama Birimleri Kodu İsmi Ambar Kodu İsmi			BİRİMİ	TOPLAM		
					GİRİŞ	ÇIKIŞ	K. DÜŞME
1	02	950	Özel Kalem Ambar	Adet	31	21	4
2	03	951	Sivil Savunma Şube Müdürlüğü	Adet	0	0	0
3	04	952	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Adet	17	14	3
4	05	953	İns. Kay. Ve Destek Hiz. Dai. Bşk.	Adet	256	66	2
5	10	954	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Adet	55	26	3
6	11	955	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Adet	230	137	4
7	23	956	APK Uzmanlığı	Adet	0	0	0
8	24	957	I.Hukuk Müşavirliği	Adet	4	2	0
9	25	958	Basın Yayın Şube Müdürlüğü	Adet	13	9	1
10	27	959	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Adet	0	0	0
11	31	960	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Adet	77	677	13
12	32	961	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Adet	241	536	5
13	33	962	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Adet	74	48	2
14	34	963	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Adet	17	13	1
15	35	964	Kurum Tabipliği	Adet	0	0	0
16	36	965	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	Adet	416	91	2
17	37	966	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Adet	27	16	0
18	38	967	Tesisler Dairesi Başkanlığı	Adet	15	6	0
TOPLAM TAŞINIR İŞLEM FİŞİ					**1.473**	**1.662**	**40**
GENEL TOPLAM					**3.175**		

AYLAR	Taşınır İşlem Giriş Fişi İle Ambar Girişi	Taşınır İşlem Çıkış Fişi İle Ambar Çıkışı	Kayıttan Düşme Ve Teklif Onay İşlemi	Yapılan İşlem Sayısı
Ocak	118	46		164
Şubat	144	102	11	257
Mart	148	134	2	284
Nisan	102	107	2	211
Mayıs	127	107		234
Haziran	116	105	5	226
Temmuz	111	190	5	306
Ağustos	101	155	2	258
Eylül	101	166	3	270
Ekim	119	189	3	311
Kasım	126	139	6	271
Aralık	160	222	1	383
TOPLAM	**1.473**	**1.662**	**40**	**3.175**

2017 Yılı Aylara Göre Ambar Giriş - Çıkış - Kayıttan Düşme İşlemleri Grafiği

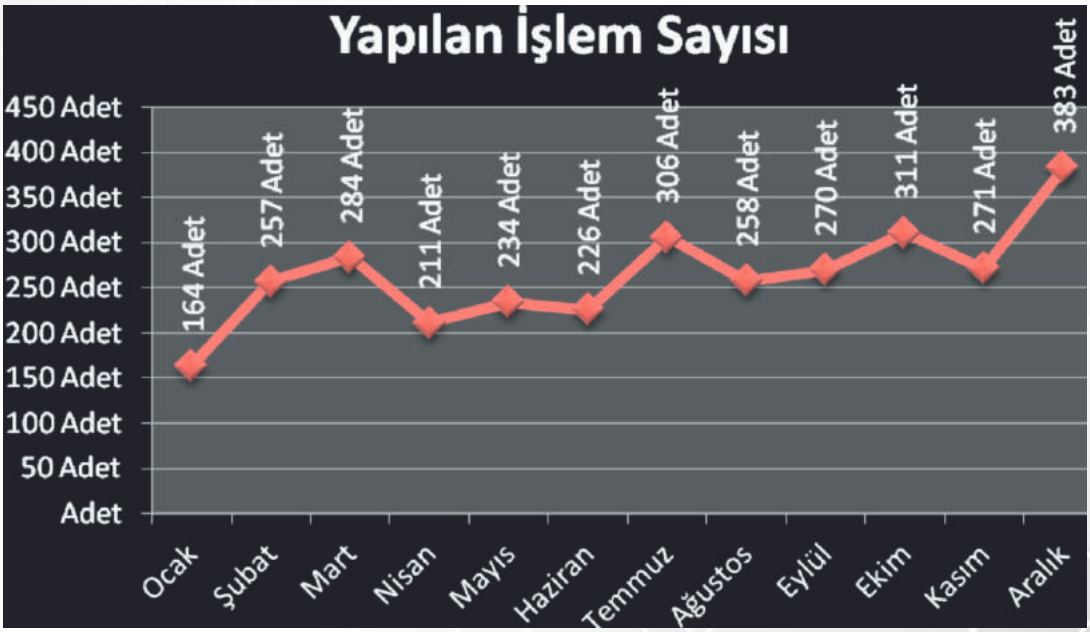

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımız artan ihtiyaç ve kullanıcı sayısına paralel olarak bilgi teknolojilerini en ileri ve yaygın şekilde kullanılabilirliğini sağlamak, gereken yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetlerini karşılayarak bunların devamlılığını uzmanlaşmış kadrolar ile gerçekleştirerek, uygulanma seviyesi açısından ön sıralarda yer almak çabasındadır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, su tahsilât ve tahakkuk bilgilerinin, muhasebe, personel, stok bilgilerinin, coğrafi sistem bilgilerinin depolamasını ve yönetimini, internet ve mail hizmetlerinin kontrolünü sağlamaktadır. Bu hizmetleri idaresinde, ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi), EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), DAYS (Doküman Arşiv Yönetim Sistemi), GIS, Logo Tiger Enterprise, Mail, Web, Su-Kanal-Sayaç Arıza Bakım Onarım, AntiVirüs, Sistem Update, Sorgulama, GPRS, AD, DHCP, FTP, File, İnsan Kaynakları, Kimlik Paylaşım, İp santral (3CX), Akaryakıt, MRTG, Scada ve Additional olmak üzere toplam 61 adet Server, 4 adet dağıtım merkezi ve sistem odasında bulunan aktif cihazlar (modemler, router, switchler) ile vermektedir. 420 kullanıcılı ağ ortamında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kurumda mevcut her türlü bilgisayar, donanım ve yazılımları hakkında kullanıcılara gereken bilgi ve desteği sağlamaktadır. Başkanlığa bağlı üç şube müdürlüğü bulunmakta ve aktif çalışmasına devam etmektedir. Toplam 420 bilgisayar ve 223 adet yazıcı hâlihazırda kullanılmaktadır.

VERİ ANALİZ İŞLETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ABYS otomasyonu için yıllık bakım destek anlaşması yapılmıştır. 7020 nolu yasa gereği su ve atıksu alacaklarından vadesi 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş alacaklar için yeni uygulama yaptırılarak alacaklar yapılandırılmıştır. Kullanıcıların talepleri doğrultusunda ABYS otomasyonunda ek geliştirmeler yapılmıştır. Enerji Bakanlığı ile istatistik amaçlı çalışma yapılmıştır. Resmi kurumların istediği istatiksel veriler karşılanmıştır.

Veritabanı yönetim sistemimiz Oracle Bakım Destek Anlaşması yenilenmiştir. 22 banka ile güvenli HTTPS tahsilâtı yapılmaya devam edilmiştir.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü ve CBS Servisi olarak faaliyet göstermektedir. 1 adet mühendis, 2 adet tekniker, 1 memur 4 kişi ile çalışmalarını sürdürmektedir.



Belediyelerin en önemli hizmetlerinden birisi olan kent alt yapısının oluşturulması ve takibinde, su ve kanalizasyon bilgilerinin takibi ve güncelleştirilmesi, içmesuyu şebekesi boru arızalarının noktasal olarak tespiti ve onarılması bunlara bağlı olan vana ve diğer bağlantı malzemelerinin grafik ortam üzerinde anında tespiti ve müdahalelerin sağlanması, bunların kapatılması ve arızası halinde etkilenecek olan ada, parsel ve binaların ortaya çıkarılması, seçilen paftalarda grafik ve sözel verilerin sorgulanması ve istenilen özel bilgilerin elde edilmesi Harita ve CBS Şube Müdürlüğü faaliyetleri arasındadır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan mevcut alt yapı (Su ve Kanalizasyon) bilgileri MapInfo 12.0 ve AutoCAD ortamında değerlendirilmektedir. Alt yapı bilgilerimizin işlenmesinde altlık olarak kullanılmakta olan uydu görüntüsü yenilenerek güncel haliyle kullanıma başlamıştır. Mevcut Şebeke ve İçme suyu bilgileri hazırlanan bu altlıklar üzerine koordinatlı olarak işlenmektedir. İşlenen bu bilgiler MapInfo programında açılarak değerlendirilmektedir. 2017 yılı içerisinde ihale ile yapımı tamamlanan içmesuyu ve kanalizasyon şebekeleri sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemi programı Başar Soft firmasına ihale edilerek MAP İnfo ortamında masa üstü web uygulaması olarak yazılarak KASKİ içerisindeki birimlerde kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca KASKİ ile Kçetas ve Büyükşehir Belediyesi arasında wms ortamında bilgi paylaşımı sağlanmıştır. 2017 yılında yapılan çalışmalarla, aşağıda açıklanan uygulamalar yapılıp devreye alınmıştır.

CBS - ABYS Entegrasyonu; Bu sayede abonelerin konum bilgileri tanımlanmıştır. CBS üzerinde İleriye dönük yapılacak uygulamaların altyapısı tamamlanmış oldu.

CBS - Büyükşehir CBS Entegrasyonu; Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yeni adres ve adres güncellemeleri Kaski CBS tarafından algılanıp güncelleme yapacaktır.

CBS - Scada Entegrasyonu; Bu zamana kadar ayrı ayrı çalışan bu iki programın entegrasyonu sayesinde tesis bilgileri CBS üzerinden (Programın ana özelliği sayesinde) kayıt yapılarak, istenilen verilere istatistiki olarak ulaşılabilecektir.

DONANIM YAZILIM VE WEB HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumda mevcut sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarının, yazıcıların, kullanılan ağ ve bunlara ait çevre birimlerinin işletilmesinden ve bilişim altyapısının yazılım ve donanım olarak geliştirilmesinden sorumlu olarak görev yapmaktadır. 114 adet el bilgisayarları ile okunarak toplanan 624.420 (2018 Şubat itibarıyla) abonemize ait su tüketim endeksleri daire başkanlığımız tarafından veri tabanına işlenmektedir. El terminallerinden online veri aktarımı da yapabilen tablet bilgisayarlara geçiş süreci başlatılmıştır.

420 bilgisayar kullanıcısı bulunan kurumumuzda kullanıcılar, yönetim birimleri, blok ve kat düzeninde sanal ağlar oluşturularak yönetilebilir kenar switchler ve omurga switchler üzerinde tanımlanmıştır. Mevcut data prizlerinden sadece tanımlanan kullanıcıların yararlanabileceği güvenli vlanlar oluşturulmuştur. Oluşturulan vlanlar AD ve firewall üzerinde konfigürasyonu yapılarak çalışmaya başlamıştır. Ekonomik ömürleri dolan kişisel bilgisayar ve yazıcılar yerine yenileri satın alınmıştır. 2017 Yılı Ekim başından itibaren Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçilerek; gerek kurum içi birimler arası yazışmaların gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmaların bilgisayar ortamında yapılması sağlanmıştır. Ayrıca; yazışmaların standartlaşması, yazışmaların sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılması, harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesi, yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi hedeflenmiştir.

EBYS ile birlikte, kağıt ortamındaki evrakları farklı tarama yöntemleri ile sayısallaştıran ve elektronik ortama alınan bu dokümanları yasal saklama sürelerince saklama, intranet veya internetten kurum personellerine veya yetkisi olan kullanıcılar için araştırmaya açma, sorgulama, görüntüleme, raporlama gibi faklı servis ve modüllerden oluşan Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) yazılımı da alınmıştır. Arşivlerin sayısallaştırılması kapsamında Germiraltı Tesislerimize fiziksel arşivin taşınabilmesi, kurumumuzun tüm arşivlik belgelerinin düzenli bir şekilde tek bir çatı altında toplanabilmesi için 55 adet kompakt arşiv dolabı alınmıştır.

Kurum içi arıza destek ve diğer taleplerin kayıt altına alınabilmesi, süreç bazlı takibi, hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi ve raporlanabilmesi için Bilgi İşlem Destek Modülü oluşturulmuştur. KASKİ olarak vatandaşlarımıza verilen hizmet kalitesini artırabilmek amacıyla kurum üst yönetimi ve yetkilendirilen çalışanların iş akışlarını izleyebileceği ve gereken noktada müdahale edebileceği, tüm yazılımların birbirine entegre olduğu, gerekli her türlü raporlamanın yapılabileceği, kurum içi bilgi bankası oluşturabileceği Yönetim Bilgi Sistemi yazılımının alınması çalışmalarına başlanmıştır.

Kullanıcılarımıza ait kişisel bilgisayarlardaki donanım arızaları tespit edilerek ilgili parçalar (disk, ram, ekran kartı, cd-rom, vb.) tamir edilmiş veya yenisi ile değiştirilmiştir. Talep edilen kişisel bilgisayarlara işletim sistemleri ve kurumumuzdaki uygulama yazılımları (ABYS, Logo Unity, Sudabis, Arıza Bakım Onarım, Taşınır Mal Yönetmeliği, Laboratuvar Programı, AutoCAD, NetCAD, Ofis Programları vb.) yüklenmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüzde, 2017 yılında 237 memur, 261 işçi ve 4 adet sözleşmeli olmak üzere toplam 502 personel görev yapmıştır. Kurumumuzda çalışan, memur, işçi ve sözleşmeli personelin tüm özlük hakları, atama, sicil ve tahakkuk işleri ile hizmet içi eğitim çalışmalarının takip edildiği şube müdürlüğümüzde, 1 şube müdürü, 1 uzman, 2 memur ve 3 işçi olmak üzere toplam 7 personel görev yapmakta olup, 5'i yükseköğrenim, 2 kişi lise mezunudur. Genel Müdürlüğümüzde çalışmakta olan memurların, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince yapılması gereken işlemleri için aylık emeklilik kesenek karşılıkları her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmiştir. Personelin mali hakları ile ilgili bütün işlemler yapılmış, yürürlükteki mevzuata göre aylıkların tespiti ve ödeme bordroları zamanında tanzim edilmiştir. Memurların yan ödeme ve özel hizmet tazminatı vize cetvellerinin hazırlanması, süresi içinde sağlanmıştır. Yurtiçi ve yurt dışı göreve giden personelin görev onayları titizlikle takip edilmiştir. Personelin, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş, tüm personelin aylık ücret, kesinti ve diğer istihkaklarının ve bordrolarının tanzimi yapılıp ödemesini yapacak olan Daire Başkanlığına bildirilmiştir. Personele ait kararlar ilgililere tebliğ edilmiştir. 2016-2017 eğitim yılı "Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği" çerçevesinde 35 adet meslek lisesi öğrencisinin staj yapması sağlanmıştır. 2016-2017 eğitim yılı yaz döneminde de 106 üniversite, 86 meslek yüksekokulu ve 17 lise öğrencisine staj imkânı sağlanmıştır. Memur ve işçi personelin atama, terfi, yer değiştirme, ayrılma, emeklilik, izin, disiplinle ilgili işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan HİTAP programına 657 sayılı yasaya tabii olarak

görev yapan personellerin bilgileri aktarılmıştır. 2017 yılında 20 işçi ve 6 memur emekli olmuş, 1 işçi ve 3 memur vefat etmiş, 1 işçi ve 3 memur kamudan ihraç edilmiş ve 3 memur nakil gitmiş olup, 1 sözleşmeli personel, eski hükümlü kadrosuyla 3 işçi ve diğer kurumlardan 15 memur nakil gelerek göreve başlamışlardır. Personelin işe giriş ve çıkışları, merkez bina ve arıtma tesisi, İncesu, Germiraltı, Argıncık, Mahrumlar, Karpuzatan, Beştepeler ve Talas tesislerimizde elektronik parmak izi okuyucu makinelerle bilgisayar ortamında internet ile takip edilmiştir.

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzde; 11 personel görev yapmakta olup, 4'ü yükseköğrenim, 5'i lise, 2'si de ortaokul mezunudur. Genel Evrak servisinde önceki yıllarda olduğu gibi kuruma gelen tüm evrakların girişi, ihale dosyalarının teslim alınması, ihale komisyonlarına havalesi ve evrakların ilgili servislere dağıtımı işiyle, kurum dışına gidecek evrakların kayıt edilerek Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile elden ya da posta ile gidecekleri yere ulaştırılması sağlanmıştır.

Yemekhanede ise; öğle yemeğinin hazırlanmasıyla ilgili erzak temini, satınalma ve sipariş hizmetleri, ambar giriş-çıkış işlemeleri ve tüm tabildot hizmetleri yürütülmüş ve günde ortalama 250-300 kişilik yemek mutfak bölümünde hazırlanıp öğle yemeği olarak servis edilmiştir. Kurumumuz dış ünitelerinden Atıksu Arıtma ve Germiraltı Tesisine de merkezden yemek taşınarak servis hizmeti yapılmıştır. Kurum personelinden yakınlarını kaybedenlere taziye ziyaretleri ile yemek ve tatlı ikramları yapılmıştır. Misafirhane olarak kullanılan bölümde misafirler konaklatılmış, misafirhane hizmeti verilmiştir. Isınma hizmeti olarak, merkez binası ve diğer ek binaların kaloriferle ısıtılması, yaz aylarında klimayla soğutulması, bu tesisatın bakımının rutin kontroller olarak yapılması, tüm binaların boya, badana, bakım ve onarımları yaptırılmıştır. Temizlik hizmeti olarak; Merkez binası tüm kat ve koridorlar, tuvalet ve lavabolar, odalar, pencere ve kapılarıyla birlikte bina çevresi caddeye kadar her zaman olduğu gibi temizlenmiştir. Dış üniteler; tahsilât şubeleri, ekip evleri ve sosyal tesislerin temizliği de temizlik personeliyle yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz genel santralinin kullanımı, bakım onarım, sabit ve cep telefonu faturalarının takibi, ödenmesi, birimlerdeki müstakil telefon santrallerinin bakımı gibi hizmetler, binaların bayramlarda ve özel günlerde poster ve bayraklarla donatılması hizmetleri yapılmıştır. Destek Hizmetleri olarak tüm bina ve tesislerimizde kullanım olarak aksayan herşeye müdahale edilmiş, vatandaşların ve çalışanların daha uygun bir ortamda bulunmaları için çaba sarf edilmiştir. İlçelerde oluşturulan hizmet binalarının ihtiyaçlarının giderilmesi, temizlik ve bakımları yapılmıştır.

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TESİS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Apartman içmesuyu proje tesisat onayı yapıldı. (312 adet). Kurumumuz tarafından yapılan altyapı çalışmaları sırasında ürünü zarar gören çiftçilerin ürün hasar bedeli hesaplandı. (34 adet). Yıllık izinleri 300 - 400 gün olan işçi personelimizin izinleri 100 günün altına düşürüldü. İşçi personelimizin yazlık ve kışlık kıyafetleri yönetmeliğine uygun olarak alınıp dağıtıldı. İşçi personelimizin mesaileri Kurumumuza ekonomik yük getirmeyecek şekilde ayarlanıp, az mesai ile çok iş yapıldı. Başbakanlığın 2016 yılında yayımladığı yönetmeliğe uygun yangın teknik şartnamesi yazıldı. İl ve ilçe merkezlerinde yangın tatbikatı yapıldı. İş sağlığı ve güvenliği eğitim semineri düzenlendi. Tesislerimizde çim ekili alanların periyodik bakımları yapıldı. (Çimlerin sulanması, biçilmesi, gübrelenmesi). Muhtelif tesislere ağaç dikildi ve mevcut dikili ağaçların bakımları yapıldı. (Budama, sulama, ilaçlama). Tesislerin inşaatsal ve tel örgü tamirleri yapıldı. KASKİ'ye ait içmesuyu depolarının temizliği yapıldı. (99 adet). KASKİ yetkili firmaları tarafından apartman içmesuyu depolarının temizliği yapıldı. (1.446 adet) Tesislerin otları traktör ile sürülerek temizlendi. İçmesuyu depoları temizliği ve dezenfeksiyonu kursu düzenlendi. İçmesuyu depoları temizliği ve dezenfeksiyonu kursa katılım belgeleri düzenlendi. Apartman içmesuyu depoları temizliği ve dezenfeksiyonu yapmaya yetkili firma belgesi düzenlendi.

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'na iş ve işlemler için gelen vatandaşlar başkanlığımız katındaki ilk girişte, halkla ilişkilerde görevli elemanlarca güler yüzle karşılanır. Müracaatı hakkında bilgi alınarak, istek ve konunun muhtevasına göre işlem yapılır. Servislerimizde müracaat dilekçeleri, kayıt işlemleri ve formlar personelimiz tarafından hazırlanarak, takip edilecek yol hakkında rehberlik hizmeti sunulur. Kurumumuza müracaat eden abonelerin yüzde doksanbeşinin uğrak yeri olan servislerimizde yapılacak işlem ve talepler en seri şekilde neticelendirilmektedir.

ABONE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü; 1 şube müdürü 1 abone hizmetleri şefi, 13 işçisi ve 9 memur personel ile yeni abone, tahakkuk, kanal tahakkuk, fen memurluğu, arşiv servisi, halkla ilişkiler ve Talas Abone Şubesi olarak 1 şube müdürü 4 işçi ve 1 memur ile hizmet vermektedir. (6360 sayılı yasa ile Daire Başkanlığına bağlı abone merkezlerimizde 14 memur 11 işçi ile hizmet verilmektedir.)

Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü; yeni abone kaydı, abone iptali, geçici kapama, yeniden açma ve kanal tahakkuk işlemlerinin yanı sıra fen memurluğunca yerinde yapılan tespitler çerçevesinde isim değişikliği, depozito iadesi, itirazlı fatura ve endeks düzeltme, arşiv düzenlemesi gibi işlemleri de yürütmektedir.

2017 yılı içerisinde 21.098 adet abone kaydı, 498 adet köylerden devredilen ve iptalden aktifleştirilen abone, 2.706 adet abone iptal işlemi yapılmıştır. Yılsonu itibarıyla abone sayısı 560.568 adede ulaşmıştır. Vatandaşların beyanına istinaden yeni abone, yeniden su açma, geçici kapama, isim değişikliği, kesin iptal, tek birime düşürme, iş yerinden meskene, meskenden iş yerine çevirme vb. gibi farklı işlemler için 36.082 adet evrak işlemi gerçekleştirilmiştir.



Halkla İlişkiler Servisince 2017 yılı içerisinde 12.421 adet abonenin isim değişikliği, 1.445 adet geçici kapama ve 2.856 adet yeniden su açma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Tahakkuk Servisince 430 adet tutanaklı fatura düzeltme işlemi yapılmış, Fen Memurluğunca da 24.775 adet kontrol yapılarak rapor tanzim edilmiştir.

Şubemiz rapor tanzimine bağlı işlemlerin yanı sıra birim arşivinde sağladığı düzen ile aboneye ait kesin iptal, isim değişikliği, açma-kapama evraklarını içeren abone dosyalarını isteğe bağlı olarak kullanıcısına sunmaktadır.



KANAL TAHAKKUK SERVİSİ

1-) 1.232 adet yeni inşaat ruhsatı başvurusu yapılmış, ₺ 6.498.837 kanal katılım payı tahakkuk ettirilmiştir.

2-) İmarsız yapılara ait atıksu çıkışlarının kanalizasyon şebekesine bağlanması sonucu toplam ₺ 176.177 kanal katılım payları abonelerin su tüketim bedeline ilave edilmiştir.

3-) Binaların tali kanallarında meydana gelen arızaların giderilmesi neticesinde ₺ 491.790 kanal açma ücreti tahakkuk ettirilmiştir.

4-) 21.098 adet yeni abone dilekçesinin ilişiği kesilmiştir.

5-) Kanalizasyon şebekesine bağlantıları yapılan yeni binaların tali kanallarından ₺ 151.556 ücret tahakkuku yapılmıştır.

6-) Ayrıca inşaatları tamamlanmış binaların (mesken ve işyeri) yapı kullanma izin belgesi ilişikleri, bozulan yol, asfalt ve kaldırım bedelleri 2. kanal bağlantısı yaptıranların bağlantı ücretleri tahakkuku, eski binalarda kanalizasyon şebekesine bağlantı yaptırmak isteyenlerin yerinde ölçüm ve tahakkuk işlemleri, müteahhitce bağlanan bölgelerdeki imarlı binaların ölçüm ve tahakkuk işlemleri yapılmıştır.



KAÇAKSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kaçaksu Şube Müdürlüğümüz, faaliyetlerini "borç takibi ve su açma-kapama" "kaçaksu takip ve kontrolleri" ve "ödenmeyen borçların icra yoluyla takip edilmesi" olmak üzere üç ayrı bölümde yürütmüştür.

Yıl boyunca yapılan bölgesel çalışma planları doğrultusunda, periyodik olarak tüm bölgelere borç takibi amacıyla ekiplerimiz tarafından gidilmiştir. Birikmiş su borcu bulunan abonelerimize borç miktarı ve ödenmemiş fatura adedi vb. bilgilerin yer aldığı "su kapama bildirimi" yazılı olarak adreslerine ulaştırılmıştır. Bu uyarıyı dikkate almayıp borcunu zamanında ödemeyen abonelerimizin suları kullanıma kapatılmıştır.

Bu uygulama neticesinde borcunu ödeyenler veya taksit yaptıranlar mevcut bilgisayar programıyla otomatik olarak takip edilip, ilgili personelimiz tarafından aynı gün içerisinde aksaklığa meydan verilmeden suları kullanıma açılmıştır.

Ayrıca kaçaksu servisine yazılı, sözlü, telefon veya elektronik posta yoluyla gelen tüm kaçaksu ihbarları değerlendirilerek gerekli işlemler titizlikle yapılmıştır. Yapılan bu ihbarların bilgisayar ortamında arşivlenmesi sağlanmış olup gerektiğinde bu bilgiler kullanılmıştır. Abone olmadan veya aboneli kaçaksu fiillerini işleyenlere tutanak tanzim edilip, tahakkuk eden cezanın tahsilâtının hızlandırılması ve aykırılığın ortadan kaldırılması için kurum adına tüm yaptırımlar eksiksiz ve zamanında uygulanmıştır.



KAÇAKSU TAKİP EKİPLERİNİN FAALİYETLERİ

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda, yapılan bölgesel tarama planlarına uygun organizeli çalışmalar sayesinde, usulsüz veya kaçak kullanılan suların tespiti, tutanak tutulması ve tahakkuk eden alacakların tahsili; dört araçla birlikte biri şef üçü merkez serviste olmak üzere toplam onaltı personel tarafından yürütülmüştür.

Kaçaksu servisine yazılı, sözlü, telefon veya elektronik posta yoluyla gelen 1.512 adet ihbar değerlendirilerek gerekli işlemler titizlikle yapılmıştır.

Yıl içerisinde muhtelif şekillerde usulsüz su kullanımı için 94.136 adet kaçaksu tutanağı tanzim edilerek toplam ₺ 14.595.216,93 tahakkuk ettirilmiştir. Tutanak bedellerinin ödenmesi de titizlikle takip edilmiştir. ₺12.173.711,77 tutarında tahsilât gerçekleştirilmiş olup, ₺ 311.259,02'lik miktarın ise taksit günü gelmediğinden; tahakkuk eden tutanak bedellerinin de tahsili için gerekli önlemler alınmış ve işlemleri devam etmektedir.

Abone olmadan sayaçlı su kullananların takibi dönemsel olarak düzenli bir şekilde takip edilmektedir. 2017 yılında el terminali ile 83.079 adet sayaçlı abonesiz tutanak okunmuştur.

Her türlü uyarılara rağmen ödenmeyen 56 adet kaçaksu tutanak bedeli olan ₺ 18.951,09'nin tahsili için İcra Servisine gönderilmiştir.

Ayrıca; önceki yıllarda da olduğu gibi, su hırsızlığı kapsamına giren kaçaksu tutanaklarından 478 adedi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmak üzere İcra Şefliği kanalı ile sözleşmeli kurum avukatlarına havalesi gerçekleştirilmiştir.

İCRA ŞEFLİĞİ

Kaçaksu Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren İcra Şefliği; tahsil edilemeyen abone borçları ile kaçaksu kullanıp, haklarında tutanak tanzim edilen ve ödenmeyen kurum alacaklarını icra yolu ile tahsil işlemlerini yürütmektedir.

İcra Servisinde 2017 yılı içerisinde 12 sözleşmeli avukatla, 1.765 adet dosya takibinden 687 adedi neticelendirilerek, ₺ 1.609.381,59 tahsilât yapılmış, kalan 1.078 adet dosyanın da takip işlemleri devam etmektedir.

SU KESME - AÇMA VE BORÇ TAKİBİ EKİPLERİNİN FAALİYETLERİ



Su açma-kapama ve borç takibi çalışmaları, 8 araçlı ekiple toplam 19 şirket personeli tarafından üçü merkezde açma-kapama servis görevlisi olarak iş ve işlemleri yürütmüştür.

2017 yılında, birikmiş borçlarını ödemeyen tüm abonelerin sularının kesileceği yazılı olarak bildirilmiştir. Zamanında borçlarını ödemeyen 145.961 abonenin adreslerine yazılı olarak "*Su Kapama Bildirimleri*" ilgili şirket personeli tarafından ulaştırılmıştır. Bu uyarıları dikkate almayan 18.531 adet abonenin suları da kullanıma kapatılmıştır.

Yıl boyunca 18.835 abonenin de borçlarını ödediklerinden dolayı suları kullanıma açılmıştır. Bu yolla tahakkuk eden alacakların tahsilinin yanında, abonelerden su kesme-açma ücreti olarak toplam ₺ 828.740 gelir elde edilmiştir. Bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilebilmesi ve kurum adına farklı faaliyet ve yaptırımların yerine getirilmesi amacıyla yıl içerisinde açma-kapama ekipleri tarafından 183.327 adrese gidilmiştir.

Ayrıca; 1.453 aboneye yönetmelikler çerçevesinde taksit yapılarak borçlarını ödemelerinde kolaylık gösterilerek alacaklarının tahsili bu yolla sağlanmıştır. Her türlü takip uyarı su kesme ve benzeri yaptırımlara rağmen borçlarını ödemeyen 12.748 abonenin alacaklarının yasal yollardan tahsili için İcra Servisine gönderilmiştir.

SAYAÇ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayaç Şube Müdürlüğü; sayaç okuma, sayaç değiştirme ve sayaç tamiratı üzerine faaliyetlerini yürütmektedir.

SAYAÇ ŞEFLİĞİ

Şeflik bünyesinde; sayaç değiştirme, tamirat, itirazları değerlendirme, sayaç değişim bilgilerinin kayıtlara geçirilmesi, 10 yılı dolduran sayaçların periyodik bakımlarının yapılması, hurda sayaçların değerlendirilmesi ve tamiri mümkün olanların atölyede tamirinin yapılarak yeniden ekonomiye kazandırılması, şikâyetli sayaçların incelenmesinin sağlanması işlemlerini yürütmektedir.

Ayrıca, sayaç taleplerinin karşılanması, sayaç bakımı ve korunması hususlarında abonelerin bilgilendirilmesi de Sayaç Şefliğinin görevleri arasında yer almaktadır.



Bozuk ve patlak sayaç müracaatı.	10.421
Toplam değişen sayaç.	37.071
Bozuk değişen sayaç.	8.247
Patlak değişen sayaç.	16.288
Evde bulunamayan abone.	1.072
Tesisatı çürük, sayaç yeri değişime uygun olmayan abone.	345
Yeni abonelere satılan sayaç.	689
Tamir ve montajı yapılan rekor.	1.003
Şikayetli sökülen sayaç.	456
Atölyede tamir edilen sayaç.	630
Garanti kapsamında tamir edilen sayaç.	6.120
Hurda olarak verilen sayaç.	30.024
Yönetim Kurulu Kararı ile değişen sayaç. (periyodik)	12.536
Yeri, tesisatı yapılan ve takılan sayaç.	70



TESPİT ŞEFLİĞİ

2017 yılında sayaç okuma, endeks kontrolü, arızalı sayaç kontrolü, muhtelif konularda duyuru, el ilanlarının abonelere ulaştırılması, itirazları değerlendirme işlemlerini yürütmekte olup, kaçak su kullanımı ihbarlarını da ilgili birime iletmektedir.

Yıl içerisinde 96 üniformalı tespit elemanı ile Kayseri ili sınırları ortalama 30 günlük dönemler halinde 12 kez, 6360 sayılı kanun dahilindeki tüm ilçe ve beldeler ise ortalama 60 günlük dönemler halinde 6 kez, köy ve yazlık bağ evleri ise yılda 3 kez olmak üzere su tüketim bildirimi hazırlanarak tüm abonelerimize ulaştırılmıştır. 361.542 adet sayaç yeri "kilitli", 8.340 adet sayaç için "bozuk", 342.958 adet sayaç için (kullanılmıyor, sayaç seri no okunmuyor, aparatlı) "raporlu okuma", 4.375.881 adet abone sayacı normal okunmuş olmak üzere toplam 5.088.721 adet su tüketim bildirimi işlemi yapılmıştır.

Ayrıca; müracaatlı itiraz sonucu toplam 1.612 aboneye ulaşarak, sorunları yerinde yapılan kontrol neticesi giderilmiştir.

YÖNETİM KURULU BÜROSU

KASKİ Genel Kurulu 2017 yılı içerisinde 2 adet toplantı yapmıştır. 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde 6 karar ve Kasım ayında iki oturumda 9 karar olmak üzere toplam 15 adet Genel Kurul kararı alınmıştır. KASKİ Yönetim Kurulunca; kurumun işleyiş ve uygulamaları ile ilgili olarak 2017 yılı içerisinde 52 toplantı yapılmış ve toplam 473 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların birimlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hukuk Müşavirliği	3
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	204
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	82
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	17
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	28
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	46
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	21
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	6
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	60
Tesisler Dairesi Başkanlığı	1
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	3
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1
Yönetim Kurulu Bürosu	1

Yönetim Kurulu Bürosu olarak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak; yazımı, imzası, çoğaltılması ve dağıtılması için azami dikkat ve itina gösterilerek en asgari sürede gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı,

- Su Kalitesi İzleme ve Havza Yönetimi Şube Müdürlüğü
- Laboratuvar Şube Müdürlüğü
- Atıksu Denetim ve Ruhsat Şube Müdürlüğü birimleri ile müstakil binasında hizmet vermektedir.

SU KALİTESİ İZLEME VE HAVZA YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlükte; 1 şube müdürü (kimya mühendisi), 2 numune alma personeli olmak üzere 3 personel görev yapmaktadır. KASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehir merkezi ve hinterlant kapsamında şebekeye verdiğimiz suyun üretim tesislerinden, depo çıkışlarından ve şebekenin muhtelif yerlerinden periyodik olarak su numuneleri alınarak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılması için Laboratuvar Şube Müdürlüğüne teslim edilmektedir.



Beştepeler Motorevi Kimyasal Numune Alma



Şebeke Mikrobiyolojik Numune Alma

Şehir merkezi ve hinterlant kapsamındaki Genel Müdürlüğümüze ait su üretim tesislerinde, depo çıkışlarında ve şebekenin muhtelif yerlerinde ve uç noktalarda serbest klor ölçümleri yapılmaktadır.



Serbest Klor Ölçümü

Şebeke suyunun toplu olarak tüketildiği okul, lokanta, fırın, pastane, camii gibi yerlerden sürekli numuneler alınarak analizleri yapılması için Laboratuvar Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Halkımızdan gelen istekler doğrultusunda evlerden, bina depolarından ve genel kullanım amaçlı mekânlardan numune alınarak incelenmiş problemli çıkan yerlere gerekli bilgi verilmiştir. Birimiz personelleri tarafından alınan numunelerin sonuçları "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe" göre değerlendirilmiş ve sonuçlar ilgili daire başkanlıkları ile paylaşılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yetki verilen firmalar tarafından temizliği yapılan bina depolarından firmalar tarafından alınan içmesuyu numunelerinin analiz sonuçları ilgili daire başkanlığı ile paylaşılmıştır. Analiz sonuçları "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe" göre uygun çıkmayan depoların kontrolleri tekrar yapılmıştır. İçme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel ve yer altı su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksu ile kirlenmesini önlemek için bu kaynaklar etrafında bulunan; mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında alınacak tedbirler için Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmakta, gerekli olan her türlü bilgi akışını sağlamaktadır.


Ülkemizde su kaynakları havza bazlı yönetilmeye başlanmış olup Şehrimiz Kızılırmak ve Seyhan Havzalarında yer almaktadır. Bu bağlamda Kayseri Kızılırmak Havzası ve Seyhan Havzasında kalan yerleşim yerlerinin su, atıksu ve arıtma bilgileri Genel Müdürlüğümüzün ilgili dairelerinden temin edilerek Havza Koruma Eylem Planı Takip Tablolarına periyodik olarak girilmektedir. Ayrıca bu konuyla ilgili düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır.

Ulusal Sulak Alan Komisyonunca 24.07.2012 tarih ve 21-2012/1 sayılı karar ile onaylanmış Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından " Hürmetçi Sazlığı Sulak Alan Revize Taslak Yönetim Planı" hazırlatılmış olup, bu kapsamda düzenlenen çalıştaylara katılım sağlanmış ve kurumumuzdan istenen bilgiler hazırlanıp gönderilmiştir. Çalıştaylarda alınan kararlar da Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleriyle paylaşılmıştır. 2017 yılı Müdürlüğümüzün aldığı numune sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

SU KALİTE İZLEME VE HAVZA YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI FAALİYETLERİ

NUMUNENİN CİNSİ		NUMUNE SAYISI
MERKEZ		2.457
HİNTERLAND		2.705
YENİ HİNTERLAND	AKKIŞLA	56
	BÜNYAN	93
	DEVELİ	102
	FELAHİYE	30
	İNCESU	8
	KOCASİNAN	34
	MELİKGAZİ	4
	PINARBAŞI	283
	ÖZVATAN	44
	SARIOĞLAN	36
	SARIZ	127
	TALAS	4
	TOMARZA	134
	YAHYALI	46
	YEŞİLHİSAR	30
ŞİKAYET		1.107
MOTOREVİ		1.372
SONDAJ		152
TOPLAM		**8.824**

TOPLAM SERBEST KLOR ÖLÇÜMÜ	**3.746**

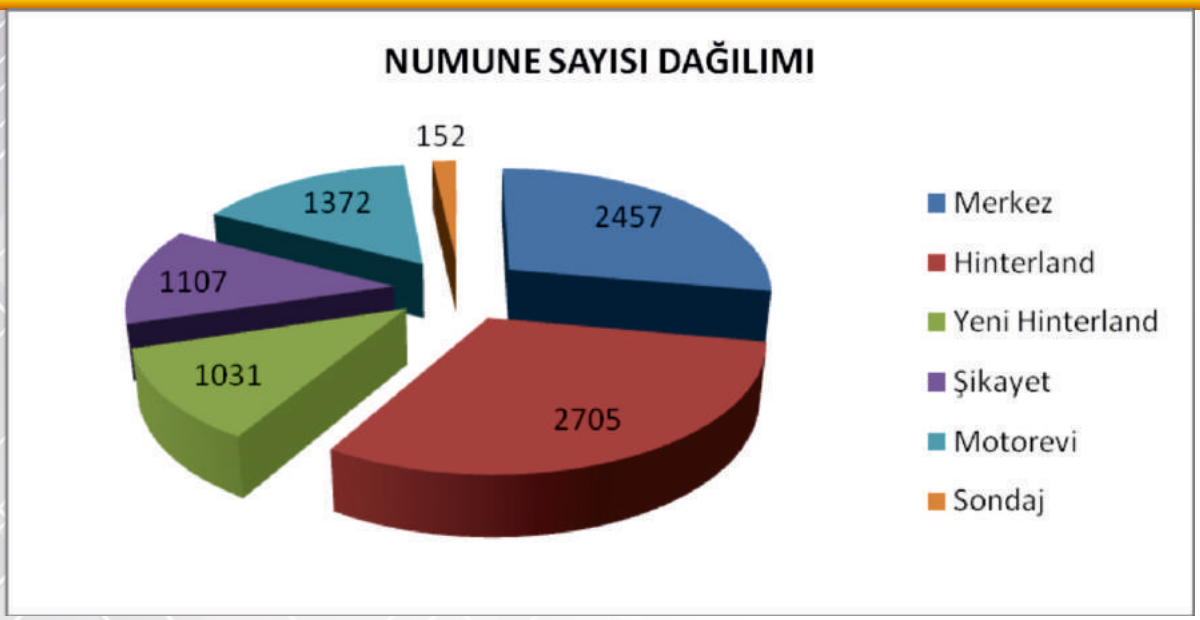

LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük olarak, 1 şube müdürü (kimyager), 1 kimya mühendisi, 3 kimyager, 3 biyolog, 2 kimya teknikeri, 1 sağlık teknikeri, 1 numune kabul personeli olmak üzere toplam 12 personel görev yapmaktadır.

Müdürlüğümüz, Numune Kabul Birimi, Atıksu Laboratuvarı, İçmesuyu Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından oluşmakta olup içmesuyu, atıksu, arıtma çamuru ve toprak numunelerinin kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirmektedir.

Laboratuvarlarımız 2008 yılından itibaren TS EN ISO IEC/17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardına" göre TÜRKAK' tan (Türk Akreditasyon Kurumu) akredite edilmiştir. Laboratuvarımızın sahip olduğu Akreditasyon Sertifikası Laboratuvarımız tarafından yapılan analizlerin doğru ve güvenilir olduğunun bir kanıtı olurken, Laboratuvarımızın ürettiği analiz sonuçları bu belgeden dolayı tüm dünyada tereddütsüz kabul görmekte olup ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip bulunmaktadır.

Ayrıca Laboratuvarlarımız 2007 yılından itibaren de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen "Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi" ne sahiptir. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği kapsamında ölçüm ve analiz yapma ve bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığının logosunu kullanarak rapor sunma yetkisine de sahiptir. Şu an itibarıyla Laboratuvarlarımız 55 parametrede akredite analiz ve ölçüm hizmeti vermektedir. Ayrıca akredite olduğu atıksu parametrelerinde "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"ndan yetkili olup belge kapsamında numune alma yetkisi de bulunmaktadır. Laboratuvarımız 22.02.2017 Tarihinde EN ISO IEC/17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardına" göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından başarılı bir denetleme geçirmiştir.

Çevre Analizleri Laboratuvarımız "Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği" kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenmiştir. Laboratuvarlarımız 05.11.2018 tarihine kadar "Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği" kapsamında ölçüm ve analiz yapma ve bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın logosunu kullanarak rapor hazırlama yetkisine sahiptir.

Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen ölçüm ve analiz parametrelerinden akredite parametrelerin 4 (dört) yılda bir akreditasyon gereklilikleri kapsamında ulusal ve uluslararası yeterlik deneylerine katılımlarının sağlanması zorunludur. Bu kapsamda laboratuarlarımızda ölçüm ve analizleri gerçekleştirilen Baryum (Ba), Bor (B), Arsenik (As), Selenyum (Se), Antimon (Sb), Kobalt (Co), Vanadyum (V), Molipten (Mo), Berilyum (Be), Benzo (b) floranthere, Benzo (k) floranthere, Benzo (g,h,i), floranthere, Benzo (a) pyrene, İndeno (1,2,3-cd) pyrene, Toplam klor, Serbest klor, Toplam siyanür, Toplam Koliform, E.coli, Toplam Koloni Sayımı (22°C), Toplam Koloni Sayımı (36°C) ve C.Perfinges parametrelerinden, LGC (Standards Proficiency Testing) Aquacheck ve FAPAS (Central Science Laboratuary) tarafından organize edilen uluslar arası karşılaştırma deneylerine katılım ve başarı sağlanmıştır.

NUMUNE KABUL BİRİMİ

Laboratuvarlarımızda numune kabul faaliyetlerinden raporlama aşamasına kadar geçen zaman içerisinde gerçekleştirilen ölçüm ve analiz faaliyetleri ile bu faaliyetlere ait kayıt işlemleri izlenebilirlik şartlarının

sağlanması, muhtemel karışıklıkların önüne geçilebilmesi, laboratuvar kayıtlarının geriye dönük olarak muhafaza edilebilmesi ve bu kayıtlardan istatistiksel veriler elde edilebilmesi amacıyla otomasyon yazılım programı kullanılmaktadır. Laboratuvarımızın bu biriminde;

Laboratuvarımıza getirilen numuneler ile ilgili gerekli kayıtlar tutularak gözden geçirme, kayıt ve kabul işlemleri gerçekleştirilir. Laboratuvar tarafından kabul edilen numunelere numune kabul personeli tarafından müşterilere ait gizli hakların korunması ve analizlerin laboratuvar personelleri tarafından tarafsız olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla numune kodu verilir ve numune raporlama aşamasına kadar laboratuvarda bu kodla takip edilir. Kod sayesinde analizi yapan laboratuvar personeli numunenin nereye veya hangi firmaya ait olduğunu bilmez. Kabulü yapılan numunelerden bir kısmı şahit numune olarak saklanırken, diğer bir kısmı analiz yapılması için laboratuvar personeline teslim edilir. Daire Başkanının onayından sonra deney raporu müşteriye iletilir ve raporlardan birer nüsha laboratuvarda saklanır. Laboratuvarda analiz edilmiş olan özel numunelere ait analiz ücretlerinin ödenip ödenmediğinin kontrolü yapılarak laboratuvara numune getiren müşterilerle iletişim kurulur.



Numune Kabul Birimi

İÇMESUYU KİMYA VE MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Su Kalitesi İzleme ve Havza Yönetimi Şube Müdürlüğünün ve özel şahısların getirdiği su numunelerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır. Elde edilen analiz sonuçları Su Kalitesi İzleme ve Havza Yönetimi Şube Müdürlüğüne ve özel şahıslara iletilmektedir. Laboratuvarlarımızda "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte" istenen tüm parametrelerin analizleri eksiksiz yapılmaktadır.



İçmesuyu Kimyasal Laboratuvarı Genel Görünüm



İçmesuyu Kimyasal Laboratuvarı / LC-MS/MS VE GC-MS Cihazları Odası



İçmesuyu Kimyasal Laboratuvarı / ICS 500 Plus İyon Kromatografi Cihazı



İçmesuyu Kimyasal Laboratuvarı / ICP – MS Cihazı



Mikrobiyoloji Laboratuvarı Genel Görünümü

ATIKSU LABORATUVARI

İlimizdeki atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj eden firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizleri "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğindeki" parametreler baz alınarak yapılmakta ve atıksu numunesinin alındığı firmalara denetleyici birime rapor edilmektedir.

Alıcı ortama direk deşarj eden firmalar tarafından getirilen atıksu numunelerinin analizleri Çevre Bakanlığı tarafından 04.09.1988 yayınlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde" belirtilen parametreler dikkate alınarak gerçekleştirilmekte ve numuneyi getiren firmalara veya denetleyici kuruluşlara rapor edilmektedir.

Alıcı ortama (Karasuya) deşarj eden ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından denetlenen Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz çıkışından düzenli aralıklarla getirilen atıksu numunelerinin analizleri yapılmaktadır. Ayrıca Büyükşehir yasası ile hizmet alanımıza dahilolan Yahyalı, Gürpınar, Ebiç, Başakpınar, Süksün, Sarıoğlan, Sarıoğlan Çiftlik, Yeşilhisar, Buğdaylı, Tomarza ve Pınarbaşı ilçelerinin Küçük Ölçekli Atıksu Arıtma Tesislerinden gelen atıksu numunelerinin analizleri de laboratuarımızda gerçekleştirilerek Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığına rapor edilmektedir.

Su ve Atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde metal analizleri "Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" kriterlerine göre yapılmaktadır



Atıksu Laboratuvarı /Genel Görünümü





Atıksu Laboratuvarı / ICP-OES Cihazı


2017 Yılı Laboratuvar Şube Müdürlüğünün Analiz Yaptığı Numune Ve Parametre Sayısı Tablosu


LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI FAALİYETLERİ		
İÇMESUYU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	KABULÜ YAPILAN NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
SU KALİTE İZLEME VE HAVZA YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN	8.825	106.772
ÖZEL NUMUNE	170	644
BİNA DEPOSU	1.515	2.991
PROJE ÇALIŞMASI	50	900
TOPLAM	**10.560**	**111.307**
ATIKSU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	KABULÜ YAPILAN NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (YENİ ARITMALAR)	100	426
ATIKSU DENETİM VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	474	3.304
KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	130	598
ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ	19	23
ÖZEL NUMUNE	106	456
DIŞ KALİTE KONTROL	10	34
BETON SUYU	2	4
TOPLAM NUMUNE VE PARAMETRE SAYISI	**841**	**4.845**
GENEL TOPLAM	**11.400**	**116.152**

2017 YILI İÇMESUYU NUMUNE SAYISI	
Kimyasal	4.598
Bakteriyolojik	5.962
TOPLAM	10.560

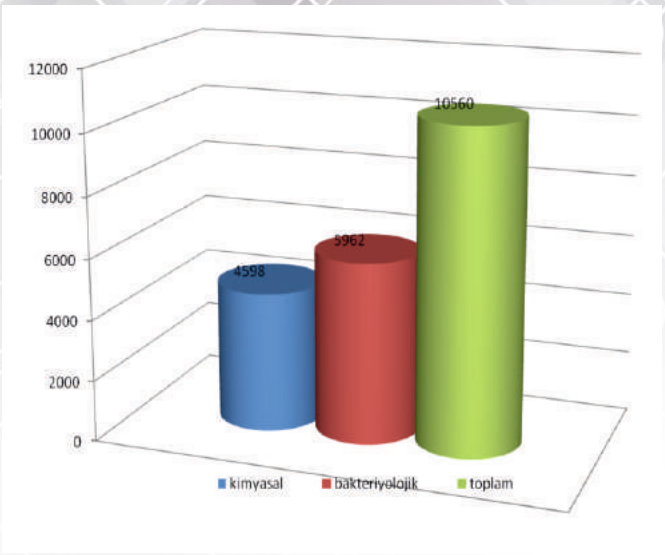

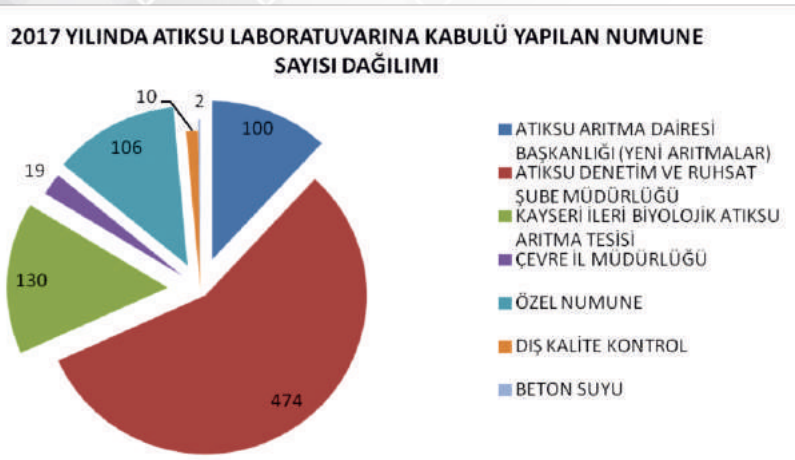

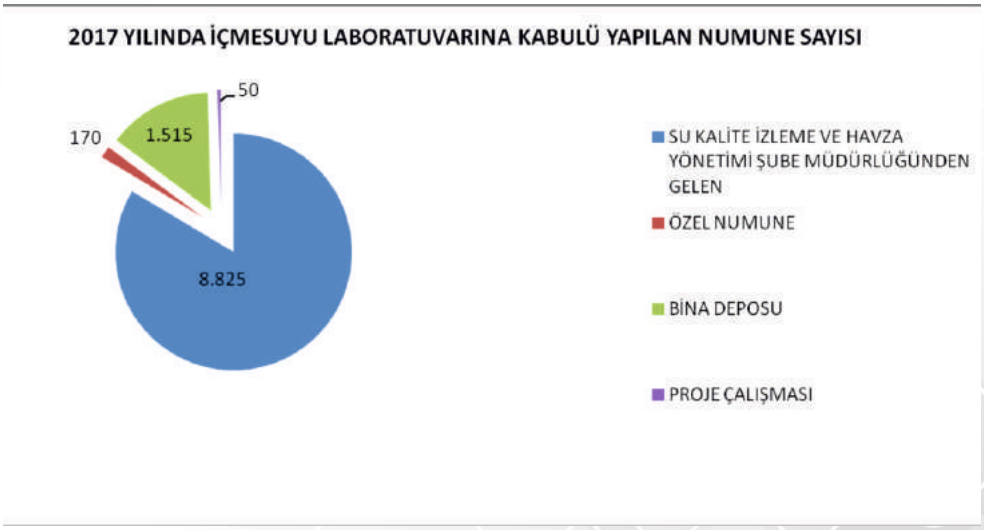

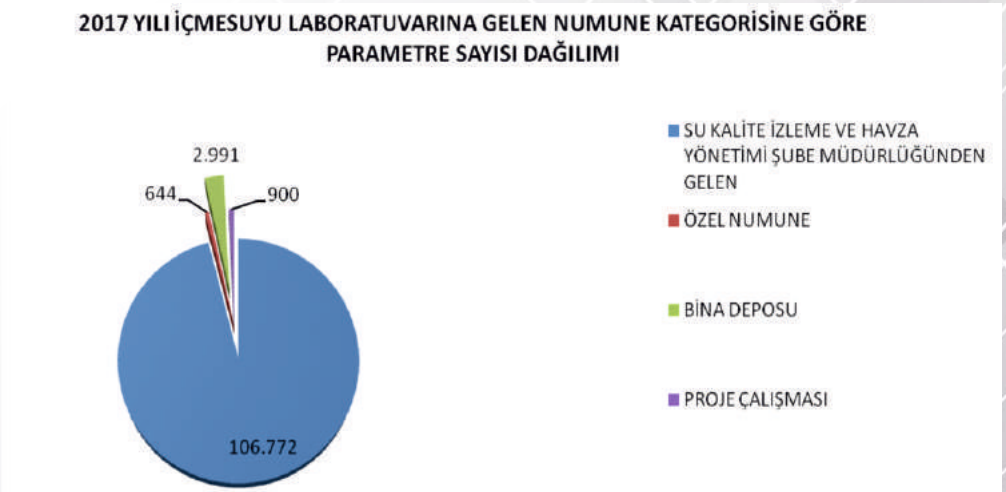

LABORATUVAR CİHAZ ALTYAPISI

- LC/MS/MS (Likit Kromatografi Sıralı Kütle Spektrometri)
- GC/MS (Gaz Kromatografi Kütle Spektrometri)
- GC/MS-Purge And Trap Üniteli (Purge And Trap Üniteli Gaz Kromatografi Kütle Spektrometri)
- ICP-OES (İndüktif Eşleşmiş Plazma – Optik Emisyon Spektrofotometresi)
- ICP-MS (Kütle Spektrometresi – İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma)
- Iyon Kromotografi Cihazı –IC 1100 C
- Iyon Kromotografi Cihazı – IC 5000
- Toplam Organik Karbon Cihazı
- Spektrofometreler
- Alev Fotometresi
- UV/VIS Spektrofotometre,
- Mikrodalga
- Kjeldahl Azotu Tayin Cihazı
- KOİ Parçalama Ünitesi
- Siyanür Parçalama Ünitesi
- Toprak ve Bitki Öğütme Cihazları
- Termoreaktörler
- Klor Fotometreleri
- Hava Sterilizatörleri
- Etüvler
- Santrifüjler
- Soğutucular
- Vakumlu Buharlı Sterilizatörler
- İnkübatörler
- Otoklavlar
- pH metreler
- İletkenlik Ölçerler
- Türbidimetreler
- İyonmetreler
- Oksijenmetreler
- Işık Mikroskobu, Stereo Mikroskoplar
- Su Banyoları
- Saf Su ve Ultra Saf Su Cihazları
- Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcılar
- Hassas ve Kaba Teraziler
- Çeker Ocaklar
- Mikrobiyolojik Güvenlik Kabinleri
- Dispenserler
- Membran Filtre Dispenserleri
- Dijital Büretler
- Otomatik Titratörler
- Otomatik Pipetler
- Pipetörler
- Sıcaklık ve Nem Ölçüm Cihazları
- Manifold Sistemler ve Vakum Pompaları
- Buzdolapları
- Bulaşık Makineleri
- Bunzen Bekler,
- Işık Kaynakları,

LABORATUVARIMIZDA ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER, YÖNTEM/ METOTLAR

Parametreler	Yöntem/Metot
pH (pH)	SM 4500 -HB.
İletkenlik (EC)	SM 2510 B
Sıcaklık	Elektrometrik Metot
Renk	Organoleptik Metot
Koku	Organoleptik Metot
Tat	Organoleptik Metot
Askıda Katı Madde (AKM)	SM 2540 D.
Toplam Katı Madde (TKM)	SM 2540 B.
Toplam Çözünmüs Katı (TDS)	SM 2540 C.
Çökebilen Katı Madde (60.dk)	SM 2540 F.
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI5)	SM 5210 B.
Çözünmüs Oksijen (O2)	SM 4500 OC.
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI)	SM 5220 B.
Vanadyum (V)	TS EN ISO 11885
Molibden (Mo)	TS EN ISO 11885
Baryum (Ba)	TS EN ISO 11885
Mangan (Mn)	TS EN ISO 11885
Kükürt (S)	TS EN ISO 11885
Kalay (Sn)	TS EN ISO 11885
Kadmiyum (Cd)	TS EN ISO 11885
Bakır (Cu)	TS EN ISO 11885
Nikel (Ni)	TS EN ISO 11885
Kobalt (Co)	TS EN ISO 11885
Silisyum (Si)	TS EN ISO 11885
Kalsiyum (Ca)	SM 3500 Ca.B
Demir (Fe)	TS EN ISO 11885
Lityum (Li)	TS EN ISO 11885
Fosfor (P)	TS EN ISO 11885
Çinko (Zn)	TS EN ISO 11885
Bor (B)	TS EN ISO 11885
Toplam Krom (Cr)	TS EN ISO 11885
Kurşun (Pb)	TS EN ISO 11885
Gümüş (Ag)	TS EN ISO 11885
Alüminyum (Al)	TS EN ISO 11885
Magnezyum (Mg)	SM 3500 Mg B.
Potasyum (K)	SM 3500 K. B
Arsenik (As)	TSEN ISO 11885

Parametreler	Yöntem/Metot
Antimon (Sb)	TS EN ISO 11885
Selenyum (Se)	TS EN ISO 11885
YağGress	SM 5520 B.
Amonyum (NH4)	Kalitatif Metot
Amonyum Azotu (NH4-N)	SM 4500 - NH3 B.C.
Amonyak Azotu (NH3-N)	SM 4500 - NH3 B.C.
Toplam Azot (TN)	Fotometrik Metot
Kjeldahl Azotu (TKN)	SM 4500 Norg B.
Anyonik Yüzey Aktif Maddeler	SM 5540 C.
Krom (+6) (Cr+6)	SM 3500 Cr B.
Serbest Klor (Cl2)	SM 4500 Cl B.
Toplam Fosfor (TP)	SM 4500 P-PE
Toplam Siyanür (CN)	Fotometrik Metot
Fosfat (PO4)	SM 4500 PE
Fosfat Fosforu (PO4-P)	SM 4500 PE
Fenol	Fotometrik Metot
Sülfür (S)	SM 4500 S-2 F
Sülfit (SO3)	SM 4500 SO3-2 B
Sülfat (SO4)	SM 4110 B
Florür (F)	SM 4110 B.
Nitrit (NO2)	Fotometrik Metot
Nitrit Azotu (NO2-N)	Fotometrik Metot
Nitrat (NO3)	SM 4110 B.
Nitrat Azotu (NO3-N)	Fotometrik Metot
Fosfat (PO4)	SM 4110 B.
Klorat (ClO3)	SM 4110 B.
Klorit (ClO2)	SM 4110 B.
Klorür (Cl)	SM 4500 Cl- B
Bromür (Br)	SM 4110 B.
Bromat (BrO3-)	SM 4110 B.
Bulanıklık	SM 2130 B.
Oksitlenebilirlik	TS 6288 EN ISO 8467
Toplam Sertlik	SM 2340 C.
Kalsiyum Sertliği	SM 3500 Ca B.
Magnezyum Sertliği	SM 3500 Mg B.
Karbonat (CO3-2)	SM 2320 B
Toplam Organik Karbon (TOC)	TS 8195 EN 1484

Parametreler	Yöntem/Metot
Escherischia coli	TS EN ISO 9308-1
Sodyum (Na)	SM 3500 Na B.
Fekal Koliform	MPN Metodu
Enterokok	TS EN ISO 7899-2
Zehirlilik Seyreltme Faktörü (ZSF)	Çevre mevzuati S.K.K.Yönetmeliği
Kadmiyum (Cd)	TS EN ISO 17294(1-2)
Arsenik (As)	TS EN ISO 17294(1-2)
Toplam Krom (Cr)	TS EN ISO 17294(1-2)
Kurşun (Pb)	TS EN ISO 17294(1-2)
Demir (Fe)	TS EN ISO 17294(1-2)
Nikel (Ni)	TS EN ISO 17294(1-2)
Bakır (Cu)	TS EN ISO 17294(1-2)
Çinko (Zn)	TS EN ISO 17294(1-2)
Bor (B)	TS EN ISO 17294(1-2)
Serbest Siyanür (CN)	SM 4500 CN E
Toplam Siyanür (TopCN)	SM 4500 CN C,E
Selenyum (Se)	TS EN ISO 17294(1-2)
Alüminyum (Al)	TS EN ISO 17294(1-2)
Antimon (Sb)	TS EN ISO 17294(1-2)
Civa (Hg)	EPA 200.8
Amonyum (NH4)	ASTM Standards D1426-08
Nitrit (NO2)	Kalitatif Metot
Nitrit (NO2)	S.M 4110 B
Klorür (Cl)	S.M 4110 B
Renk	S.M 2120 B
Toplam Çözünmüs Katı (TDS)	Elektrometrik Metot
Vanadyum (V)	TS EN ISO 17294(1-2)
Molibden (Mo)	TS EN ISO 17294(1-2)
Baryum (Ba)	TS EN ISO 17294(1-2)
Mangan (Mn)	TS EN ISO 17294(1-2)
Kükürt (S)	TS EN ISO 17294(1-2)
Kalay (Sn)	TS EN ISO 17294(1-2)
Kobalt (Co)	TS EN ISO 17294(1-2)
Silisyum (Si)	TS EN ISO 17294(1-2)
Kalsiyum (Ca)	TS EN ISO 17294(1-2)
Kalsiyum (Ca)	TS EN ISO 11885
Lityum (Li)	TS EN ISO 17294(1-2)
Fosfor (P)	TS EN ISO 17294(1-2)
Gümüş (Ag)	TS EN ISO 17294(1-2)
Magnezyum (Mg)	TS EN ISO 11885

Parametreler	Yöntem/Metot
Magnezyum (Mg)	TS EN ISO 17294(1-2)
Potasyum (K)	TS EN ISO 11885
Potasyum (K)	TS EN ISO 17294(1-2)
Civa (Hg)	TS EN ISO 11885
Amonyum (NH4)	Fotometrik Metot
Amonyum Azotu (NH4-N)	Fotometrik Metot
Amonyak Azotu (NH3-N)	ASTM Standarts D1426-08
Sülfat (SO4)	SM 4500 SO4-2 E
Florür (F)	SM 4500F- C
Florür (F)	Fotometrik Metot
Nitrat (NO3)	Fotometrik Metot
Amonyum (NH4)	SM 4500 - NH3 B.C.
Amonyak (NH3)	SM 4500 - NH3 B.C.
Serbest Klor (Cl2)	Fotometrik Metot
Nitrit. (NO2)	Fotometrik Metot.
Nitrit Azotu. (NO2-N)	Fotometrik Metot.
Benzen	Cihaz Uygulama Metodu
Bromodiklorometan	Cihaz Uygulama Metodu
Bromoform	Cihaz Uygulama Metodu
Dibromoklorometan	Cihaz Uygulama Metodu
Kloroform	Cihaz Uygulama Metodu
Trikloreten	Cihaz Uygulama Metodu
Toplam Trihalometanlar	Cihaz Uygulama Metodu
1,2 - Dikloretan	Cihaz Uygulama Metodu
Epikloridin	Cihaz Uygulama Metodu
Vinil Klorür	Cihaz Uygulama Metodu
Aldrin	Cihaz Uygulama Metodu
Alfa-HCH	Cihaz Uygulama Metodu
Alfa Endosülfan	Cihaz Uygulama Metodu
Beta Endosülfan	Cihaz Uygulama Metodu
Dieldrin	Cihaz Uygulama Metodu
Gamma- HCH	Cihaz Uygulama Metodu
Hekza Chlorobenzen	Cihaz Uygulama Metodu
Hepta Chlor	Cihaz Uygulama Metodu
Hepta Chloroepoksit	Cihaz Uygulama Metodu
2,4 DDE	Cihaz Uygulama Metodu
4,4 DDE	Cihaz Uygulama Metodu
2,4 DDD	Cihaz Uygulama Metodu
4,4 DDD	Cihaz Uygulama Metodu
2,4 DDT	Cihaz Uygulama Metodu

Parametreler	Yöntem/Metot
4,4 DDT	Cihaz Uygulama Metodu
Toplam DDT	Cihaz Uygulama Metodu
Carbofuran -3-hydroxy	Cihaz Uygulama Metodu
Methiocarb	Cihaz Uygulama Metodu
Methomyl	Cihaz Uygulama Metodu
Oxamyl	Cihaz Uygulama Metodu
Propoxur	Cihaz Uygulama Metodu
Aldicarb	Cihaz Uygulama Metodu
Aldicarb sülfane	Cihaz Uygulama Metodu
Aldicarb sülfoxide	Cihaz Uygulama Metodu
Carbaryl	Cihaz Uygulama Metodu
Carbofuran	Cihaz Uygulama Metodu
Metalaxyl	Cihaz Uygulama Metodu
Tebuconazole	Cihaz Uygulama Metodu
Atrazin	Cihaz Uygulama Metodu
Simazin	Cihaz Uygulama Metodu
Akrilamid	Cihaz Uygulama Metodu
Azinphos -ethyl	Cihaz Uygulama Metodu
Azinphos -methyl	Cihaz Uygulama Metodu
Chlorpyriphos -ethyl	Cihaz Uygulama Metodu
Chlorpyriphos -methyl	Cihaz Uygulama Metodu
Demethon(O+S)	Cihaz Uygulama Metodu
Diazinon	Cihaz Uygulama Metodu
Disülfoton	Cihaz Uygulama Metodu
Ethion	Cihaz Uygulama Metodu
Malathion	Cihaz Uygulama Metodu
Mathamidophos	Cihaz Uygulama Metodu
Parathion -ethyl	Cihaz Uygulama Metodu
Parathion -methyl	Cihaz Uygulama Metodu
Benzo(a)pyrene	Cihaz Uygulama Metodu
Benzo(b)fluoranthene	Cihaz Uygulama Metodu
Benzo(ghi)prylene	Cihaz Uygulama Metodu
Benzo(k)fluoranthene	Cihaz Uygulama Metodu
İndeno(1,2,3 cd)pyrene	Cihaz Uygulama Metodu
Toplam PAH	Cihaz Uygulama Metodu
Berilyum (Be)	TS EN ISO 17294(1-2)
Tetrakloreten	Cihaz Uygulama Metodu
Sodyum Absorbsiyon Oranı (SAR(tad))	Hesaplama Metodu
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (% Na)	Hesaplama Metodu
Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC)	Hesaplama Metodu
Toplam Tuz Konsantrasyonu (TDS)	Elektrometrik Metod
Bağlı Klor	Fotometrik Metot
Siyanürik Asit	İşletme İçi Metot (Fotometrik Metod)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKİ) Çevre Analizleri Laboratuvarı

Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0201-T

Akreditasyon Tarihi : 14 Kasım 2008

Revizyon Tarihi / No : 4 Temmuz 2017 / 07

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına, İlgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde , 3 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerlidir.

Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Akreditasyon Sertifikası Ekİ (Sayfa 1/5)

Akreditasyon Kapsamı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKİ) Çevre Analizleri Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-0201-T
Revizyon No: 07 Tarih: 4 Temmuz 2017

Deney Laboratuvarı

Adres : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ/TÜRKİYE
Tel : 0 352 337 09 46
Faks : 0 352 337 09 32
E-Posta : kaski@kaski.gov.tr
Website : www.kaski.gov.tr

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, İşletme içi metodlar)
SU	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500-H+ B
	Bulanıklık Tayini Laboratuvar Metodu	SM 2130 B
	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 D
	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	SM 5220 B
	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Analizi	SM 5210 B
	Yağ ve Gres Tayini Gravimetrik Metot	SM 5520 B
	Toplam Fosfor (P) Tayini Ön işlem : Digestion Metodu Ölçüm: Askorbik Asit Metodu	SM 4500-P B SM 4500-P E
	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Askorbik Asit Metodu	SM 4500-P E
	Krom VI Tayini Kolorimetrik Metot	SM 3500-Cr B
	Sülfür Tayini İyodometrik Metot	SM 4500-S^{-2} F
	Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot	SM 4500 SO_4^{-2} E
	Toplam Çözünmüş Azot Tayini Makro Çözünmüş Metodu	SM 4500 - Norg B
	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH_3 B SM 4500-NH_4 C

Akreditasyon Sertifikası Ekİ (Sayfa 2/5)

Akreditasyon Kapsamı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKİ) Çevre Analizleri Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-0201-T
Revizyon No: 07 Tarih: 4 Temmuz 2017

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, İşletme içi metodlar)
(SU Devamı)	Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini	TS 5676
	Nikel (Ni), Krom (Cr), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Bor (B), Arsenik (As) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 11885
	Civa (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 EPA 200.8
	Bakır (Cu),Alüminyum (Al), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Arsenik (As), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Krom (Cr), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Bor (B), Demir (Fe) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 17294-2
	Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu	TS 8195 EN 1484
	Amonyum/Amonyak Azotu Tayini Nesslerizasyon Metodu	ASTM D1426
	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot	SM 2130 B
	Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Kolorimetrik Metot	SM 4500-CN C SM 4500-CN E
	Serbest Siyanür Tayini Kolorimetrik Metot	SM 4500-CN E
	Florür Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu	SM 4500-F- C
	Florür (F^-), Klorür (Cl^-), Bromür (Br^-), Nitrit (NO_2^-), Nitrat (NO_3^-), Fosfat (PO_4^{-3}), Sülfat (SO_4^{-2}) Tayini İyon Kromatografi Metodu	SM 4110 B

Akreditasyon Sertifikası Ekİ (Sayfa 3/5)

Akreditasyon Kapsamı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKİ) Çevre Analizleri Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-0201-T
Revizyon No: 07 Tarih: 4 Temmuz 2017

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, İşletme içi metodlar)
(SU Devamı)	Escherichia coli (E. coli) ve Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
	Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 7899-2
ATIKSU	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500-H+ B
	Bulanıklık Tayini Laboratuvar Metodu	SM 2130 B
	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 D
	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks -Titrimetrik Metot	SM 5220 B
	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Analizi	SM 5210 B
	Yağ ve Gres Tayini Gravimetrik Metot	SM 5520 B
	Toplam Fosfor (P) Tayini Ön İşlem: Digestion Metodu Ölçüm: Askorbik Asit Metodu	SM 4500-P B SM 4500-P E
	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Askorbik Asit Metodu	SM 4500-P E
	Krom VI Tayini Kolorimetrik Metot	SM 3500-Cr B
	Sülfür Tayini İyodometrik Metot	SM 4500-S^{-2} F
	Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot	SM 4500 SO_4^{-2} E
	Toplam Çözünmüş Azot Tayini Makro Çözünmüş Metodu	SM 4500-Norg B
	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH_3 B SM 4500-NH_4 C

Akreditasyon Sertifikası Ek (Sayfa 4/5)

Akreditasyon Kapsamı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKİ) Çevre Analizleri Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-0201-T
Revizyon No: 07 Tarihi: 4 Temmuz 2017

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
(ATIKSU Devam)	Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini	TS 5678
	Nikel (Ni), Krom (Cr), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Bor (B), Arsenik (As) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 11885
	Civa (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 EPA 200.8
	Bakır (Cu), Alüminyum (Al), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Arsenik (As), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Krom (Cr), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Bor (B), Demir (Fe) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 17294-2
	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot	SM 2130 B
	Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Kolorimetrik Metot	SM 4500-CN C SM 4500-CN E
	Serbest Siyanür Tayini Kolorimetrik Metot	SM 4500-CN E
	Florür Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu	SM 4500 F- C
	Florür (F^-), Klorür (Cl^-), Bromür (Br^-), Nitrit (NO_2^-), Nitrat (NO_3^-), Fosfat (PO_4^{3-}) ve Sülfat (SO_4^{2-}) Tayini İyon Kromatografi Metodu	SM 4110 B
ARITMA ÇAMURU	Nikel (Ni), Krom (Cr), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Bor (B), Arsenik (As) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu	EPA 3051-A TS EN ISO 11885

Akreditasyon Sertifikası Ek (Sayfa 5/5)

Akreditasyon Kapsamı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKİ) Çevre Analizleri Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-0201-T
Revizyon No: 07 Tarihi: 4 Temmuz 2017

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
(ARITMA ÇAMURU Devam)	Bakır (Cu), Alüminyum (Al), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Arsenik (As), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Krom (Cr), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Bor (B), Demir (Fe) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 17294-2
	Civa (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 EPA 200.8
TOPRAK	Nikel (Ni), Krom (Cr), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Bor (B), Arsenik (As) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu	EPA 3051A TS EN ISO 11885
	Bakır (Cu), Alüminyum (Al), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Arsenik (As), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Krom (Cr), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Bor (B), Demir (Fe) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 17294-2
	Civa (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 EPA 200.8

KAPSAM SONU

Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ

Belge No : Y-38/062/2013

Kapsam : Atık Su, Arıtma Çamuru, Numune Alma, Toprak

Düzenleme Tarihi : 6.7.2017

Laboratuvar Adı : KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI

Adres : Yakut Mah. M.K.P. Bulvarı No:186 P. K. 38090 Kocasinan/KAYSERİ

Yukarıda açık adı ve adresi belirtilen kurum/kuruluş Ek Liste'de belirtilen kapsamda 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı R.G.de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği'ne göre ölçüm ve/veya analiz yapmaya ve bu çerçevede rapor hazırlamaya yetkilidir.

BELGENİN

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 5.11.2013

BİTİŞ TARİHİ : 5.11.2018

EK: PARAMETRE LİSTESİ (3 sayfa)

M. Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Yenileme Tarihi/No: -

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 1 / 3

Belge No : Y-38/062/2013
Düzenleme tarihi : 6.7.2017
Ek Liste
Başlangıç tarihi : 5.11.2013
Bitiş tarihi : 5.11.2018
Revizyon Tarihi/No :
Laboratuvar Adı : KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ			
Kapsam	Parametre	Metot Adı	Metot Numarası
ARITMA ÇAMURU	Metaller (Bakır, Çinko , Kadmiyum , Krom , Kurşun)	ICP-OES Metodu	TS EN ISO 11885
ATIK SU	Amonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu	Titrimetrik Metot	SM 4500 NH_3 C
	Amonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu - Ön İşlem	Distilasyon Metodu	SM 4500 NH_3 B
	Metaller (Arsenik , Bakır , Çinko , Demir , Kadmiyum , Krom , Kurşun , Nikel)	ICP-OES Metodu	TS EN ISO 11885
	Askıda Katı Madde (AKM)	Gravimetrik Metot	SM 2540 D
	Balık Biyodeneyi (ZSF)	Zehirlilik Deneyleri Zehirlilik Seyreltme Faktörü (ZSF) Tayini	TS 5676 SKKY Numune Alma Ve Analiz Metotları Tebliği
	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)	5 Günlük BOİ Metodu	SM 5210 B
	Metaller (Bor)	ICP-OES Metodu	EPA 200.7

M. Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 2 / 3

Belge No : Y-38/062/2013
Düzenleme tarihi : 6.7.2017
Ek Liste
Başlangıç tarihi : 5.11.2013
Bitiş tarihi : 5.11.2018
Revizyon Tarihi/No :
Laboratuvar Adı : KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ			
Kapsam	Parametre	Metot Adı	Metot Numarası
ATIK SU	Fosfat Fosforu	Spektrofotometrik Metot	SM 4500 P E
	İletkenlik	Elektrot Metodu	SM 2510 B
	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)	Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	SM 5220 B
	Krom^{+6}	Spektrofotometrik Metot	SM 3500 Cr B
	pH	Elektrometrik Metot	SM 4500 H+ B
	Sülfat	Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO_4^{2-} E
	Toplam Fosfor	Spektrofotometrik Metot	SM 4500 P E
	Toplam Fosfor Ön İşlem	Asitle Özütleme Metodu	SM 4500 P B
	Toplam Kjeldahl Azotu	Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500 Norg B
	Yağ ve Gres	Gravimetrik Metot	SM 5520 B
NUMUNE ALMA	Atık Sulardan Numune Alma	Atık Sulardan Numune Alma Kuralları	TS ISO 5667-10
	Dip Sedimentlerinden Numune Alma	Dip Sedimentlerinden Numune Alma Kuralları	TS 9547 ISO 5667-12

M. Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 3 / 3

Belge No : Y-38/062/2013
Düzenleme tarihi : 6.7.2017
Ek Liste
Başlangıç tarihi : 5.11.2013
Bitiş tarihi : 5.11.2018
Revizyon Tarihi/No :
Laboratuvar Adı : KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ:			
Kapsam	Parametre	Metot Adı	Metot Numarası
NUMUNE ALMA	Katı Atıklardan Numune Alma	Katı Atıklardan Numune Alma Kuralları	TS 12090
	Topraktan Numune Alma	Yüzey Topraktan Numune Alma Kuralları	TS 9923
TOPRAK	Metaller (Arsenik , Bakır , Çinko , Kadmiyum , Krom , Kurşun , Nikel)	ICP-OES Metodu	TS EN ISO 11885
	Metaller (Bor)	ICP-OES Metodu	EPA 200.7
	Metal Ön İşlem	Mikrodalga ile Özütleme Metodu	EPA 3051 A

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği : Atık Su.
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği : Atık Su.
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik : Arıtma Çamuru, Toprak
Numune Alma : Numune Alma.
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik : Toprak.

M. Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür

ATIKSU DENETİM VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük olarak; 1 atıksu denetim ve ruhsat mühendisi (maden mühendisi), 1 numune alma personeli olmak üzere 2 personel görev yapmaktadır. Atıksu Ruhsat Ve Denetim Şube Müdürlüğü; evsel nitelikte atıksuları arıtmak amacı ile dizaynedilmiş olan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve küçük ölçekli arıtma tesislerinin verimli bir şekilde çalışması için endüstriyel atıksuların niteliğinin kanalizasyon şebekesi deşarj limitlerine indirildikten sonra kanalizasyon sistemine verilmelerini sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir.

Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atıksu oluşumu hakkında veri toplanması, bu verilerin ve tesisin incelenmesiyle ve kirliliğin kontrolü yoluyla endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak.

Tespiti yapılan endüstriyel atıksu kaynaklarından atıksu analizi yapılmak üzere atıksu numunelerinin alınarak Laboratuvarlar Şube Müdürlüğüne ölçüm ve analizlerinin yapılması için teslim etmek.

Yapılan ölçüm ve analizlerin neticesinde atıksu karakterizasyonu çıkarılan endüstriyel atıksu kaynaklarının KASKİ Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Limit Değerlerini sağlayıp sağlamamasına göre yürürlükte olan "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" ve bu yönetmelik kapsamında çıkartılan "Atıksu Deşarj Yönergesi" hükümlerini uygulamak.

Atıksularını kanalizasyon şebekesi limitlerinin altına indirmek amacıyla ön arıtma tesisi kurması gereken atıksu kaynaklarının (fabrika, küçük ve büyük ölçekli sanayi bölgesi vs.) arıtma tesisi projelerini onaylamak.

Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarını "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" kapsamında inceleyip kanalizasyon şebekesine deşarj izni (Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi) vermek.

Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB) alan endüstriyel kuruluşların proseslerini takip etmek, atıksularından belirli periyotlarda numune alıp analiz etmek suretiyle düzenli takibini sağlamak.

Standartlara uymayan endüstriyel kuruluşlara tahakkuk ettirilecek Atıksu Arıtma Bedeli (AAB) verilerinin hazırlanması ve düzenlenmesini gerçekleştirmek. Yapılan rutin kontroller esnasında ruhsatta belirtilen limit değerlerini aşan endüstriyel atıksu kaynaklarına yükümlülüklerini yerine getirene kadar AAB uygulamak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden I. Sınıf ve/veya ilgili İlçe Belediyelerinden II. ve III. sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre gerekli işlemleri yapıldıktan sonra KASKİ görüşü vermektir.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2017 YILI FALİYETLERİ

Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi kapsamında 2017 yılı içerisinde toplam 93 firmanın endüstriyel atıksularından periyodik olarak numuneler alınıp analizleri yapılmış ve Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu firmalardan Atıksu Arıtma tesisine ve Ön Arıtma Tesisine sahip olan firmaların tesisleri denetlenmiş ve kanalizasyon deşarj limitlerine uygun atıksu vermeleri sağlanmıştır. Bu firmalardan 33'üne Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi verilmiştir.


Atıksuyu konvansiyonel parametreler içeren ve nitelik bakımından Atıksu Arıtma Tesisine zarar vermeyen Firmaların atıksuları için arıtma bedelleri hesaplanarak tahsil edilmesi için Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir.

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı kapsamında 2017 yılı içerisinde atıksuyu açısından toplam 122 firma incelenmiş ve Genel Müdürlüğümüzün görüşü verilmiştir.

ABKKİB ve GSM kapsamında incelenen firmalardan 353 adet numune alınarak bu endüstriyel atıksu kaynaklarının periyodik olarak kontrolü sağlanmıştır.

KASKİ Kanalizasyon şebekesine bağlı olmayan ve evsel nitelikli atıksularının vidanjörle getirilip kanalizasyon şebekesine deşarj edilebilmesi için toplam 36 adet işletme ile protokol imzalanmış olup bu atıksuların KASKİ personeli gözetiminde kabulünün yapılması sağlanmıştır.

2017 Yılı Faaliyeti	
Firmalara Yapılan Denetim Sayısı	449
Alınan Endüstriyel Atıksu Numunesi	353
Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi Verilen Firma Sayısı	33
Yapılan Protokol Sayısı	36
GSM Uygun Görüşü	122
Firmalara Uygulanan Atıksu Arıtma Bedeli Sayısı	57

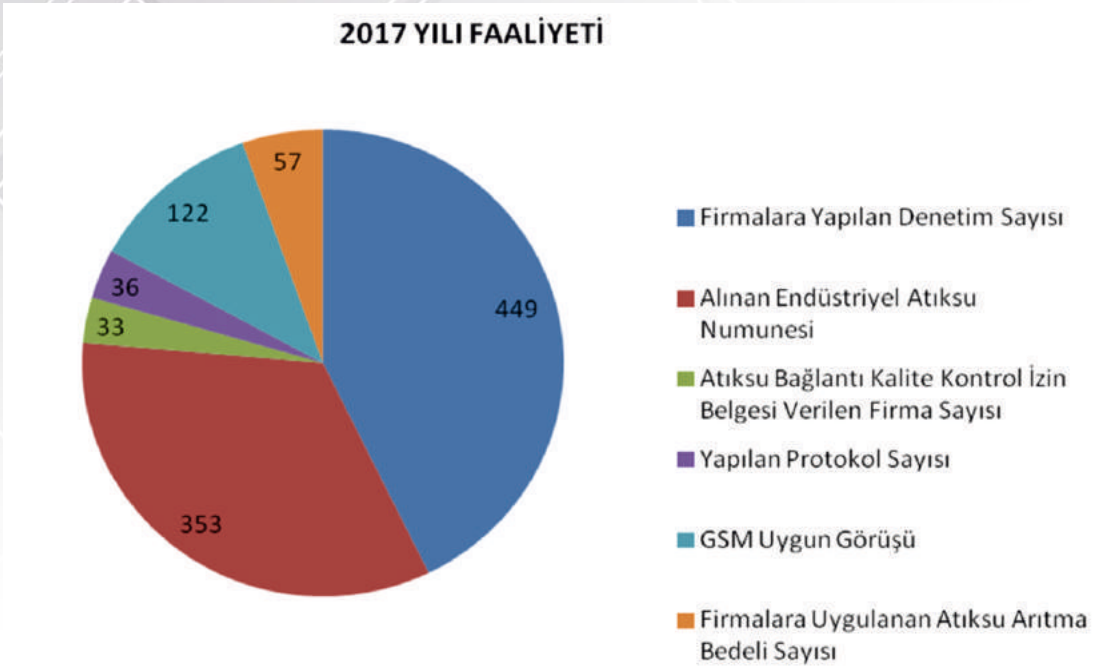



2-PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

Hedef 1: Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.

Faaliyet 1: Yeterli miktarda su üretmek.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Üretilen su miktarı.(m³)	110.000.000	97.305.995	% 88	% 12	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Mevsimsel şartlara göre ihtiyaç duyulan miktarda su üretilmiştir. Rahabilitasyon çalışmalarıyla tasarruf sağlanmıştır.					
Kullanılan enerji miktarı. (kw)	55.000.000	50.863.412	% 92	% 8	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Üretilen su miktarına göre enerji tüketilmiştir.					

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

Hedef 1: Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.

Faaliyet 2: Üretilen suyun sağlıklı olmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kurulan klor sistemi. (adet)	450	217	% 48	% 52	DÜŞÜK
AÇIKLAMA:Hava şartları ve arazi koşulları nedeniyle hedef miktarının altında montaj yapılmıştır.					
Gaz klor alım miktarı. (lt)	50.000	26.800	% 54	% 46	DÜŞÜK
AÇIKLAMA: İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliğine uygun miktarda gaz klor kullanıldı.					
Sıvı klor alım miktarı. (ton)	200	130	% 65	% 35	ORTA
AÇIKLAMA:İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliğine uygun miktarda sıvı klor kullanıldı.					
Temizlenip hijyenik hale getirilen su deposu. (adet)	150	100	% 67	% 33	ORTA

AÇIKLAMA:Yeni yapılan projelerde depo tadilat işinin yaptırılması sonucu ekiplerimiz hedefe ulaşamamıştır.

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

Hedef 1: Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.

Faaliyet 3: Suyun dağıtımını sağlamak.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Döşenen hat miktarı. (m.)	100.000	193.067	% 193	% 93	YÜKSEK
AÇIKLAMA:Belediyelerin yol çalışması yaptığı bölgeler ve yeni yerleşim alanlarıyla doğru orantılı olarak döşenen hat miktarı artmıştır.					
Ekonomik ömrünü doldurduğu için değiştirilen hat miktarı (m.)	50.000	94.000	% 188	% 88	YÜKSEK
AÇIKLAMA:Belediyelerin yol çalışması yaptığı bölgelerle doğru orantılı olarak hedef aşılmıştır.					
Coğrafi bilgi sistemine aktarılan hat miktarı (m.)	125.000	479.145	% 383	% 283	YÜKSEK
AÇIKLAMA: İşletme planı, gelen projeler ve döşenen hat metrajının fazla olması nedeniyle hedef aşılmıştır.					

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

Hedef 2: Su kaynaklarını etkin yönetmek.

Faaliyet 1: Suyun birim maliyetini düşürmek.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yüzdesel enerji tüketim (kw)/su üretim (m³) oranı. (%)	0,52	0,52	% 100	% 0	YÜKSEK
AÇIKLAMA: İhtiyaç duyulan su miktarındaki artışa rağmen su rehabilitasyon projelerinin yapılması nedeniyle yüzdesel enerji tüketimi değişmemiştir.					
Ekonomik ömrünü doldurmuş motor-pompa değişimi. (adet)	100	239	% 239	% 139	YÜKSEK
AÇIKLAMA:6360 Sayılı yasa gereği bağlanan kuyularda arızalanan motopompların değiştirme işlemi sebebiyle miktar artmıştır.					

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

Hedef 2: Su kaynaklarını etkin yönetmek.

Faaliyet 2: Su kayıp ve kaçaklarını engellemek.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kayıp ve kaçak oranı. (%)	28	28	% 100	% 0	YÜKSEK
AÇIKLAMA: İhtiyaç duyulan su miktarındaki artışa rağmen su rehabilitasyon projelerinin yapılması nedeniyle şehir genelinde kayıp kaçak oranı tutturulmuştur.					
Yapılan debi ve basınç ölçümü. (adet)	2.000	734	% 37	% 63	DÜŞÜK
AÇIKLAMA: Bölgenin büyüklüğü ve ekip iş yükü göz önüne alınarak hedefe ulaşılmasa dahi yeterli çalışma yapılmıştır.					
Yapılan kayıp ve kaçak tespiti. (adet)	1.500	1.074	% 72	% 28	ORTA
AÇIKLAMA: Kayıp kaçak olan bölgelerde içmesuyu hatlarının yenilenmesi nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır.					
Oluşturulan alt bölge sayısı. (adet)	20	10	% 50	% 50	DÜŞÜK
AÇIKLAMA: Alt bölge oluşturulacak yerler yeni projeler yapılarak çözümlenmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.					

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

Hedef 3: Hizmette sürekliliği sağlamak.

Faaliyet 1: Arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu hatlarında oluşan arıza sayısı. (adet)	6.250	23.600	% 378	% 278	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Kurumumuzda yeni arıza kayıt sistemine geçilmesi ile birlikte ve oluşan arıza çeşitliliğine bağlı olarak hedefin üzerinde kalınmıştır.					
Elektrik arıza sayısı. (adet)	3.750	3.572	% 95	% 5	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Periyodik bakımların artırılması nedeniyle 2017 yılında daha az elektrik arızası gerçekleşmiştir.					
Scada sistemi arıza sayısı. (adet)	2.250	2.070	% 92	% 8	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Periyodik bakımların artırılması nedeniyle 2017 yılında daha az scada sistemi arızası gerçekleşmiştir.					
Link sistemi arıza sayısı. (adet)	100	21	% 21	% 79	DÜŞÜK
AÇIKLAMA: Scada sisteminin yaygınlaşması nedeniyle 2017 yılında daha az link sistemi kurulmuştur.					
Değişen kolon borusu sayısı. (adet)	325	723	% 223	% 123	YÜKSEK
AÇIKLAMA: 6360 Sayılı Yasa gereği bağlanan kuyularda yıpranmış boruların değiştirme işlemi sebebiyle miktar artmıştır.					

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

Hedef 3: Hizmette sürekliliği sağlamak.

Faaliyet 2: Elektrifikasyonda ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Elektrik ve scada panolarının periyodik bakım sayısı. (adet)	2.200	2.693	% 122	% 22	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Elektrik ve scada panolarındaki arızaların azaltılması için periyodik bakımlar artırılmıştır.					
Elektrik şirketiyle ortak olarak trafoların değişimi revizyou. (adet)	250	286	% 114	% 14	YÜKSEK
AÇIKLAMA: 2017 yılında tüm trafo merkezlerinde ve enerji nakil hatlarında bakım yapılmıştır.					
Aydınlatma sistemleri bakım onarımı.(adet)	150	151	% 101	% 1	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Periyodik bakımların artırılması nedeniyle 2017 yılında aydınlatma elektrik arızasında belirlenen hedefe ulaşılmıştır.					
Jeneratör bakımı.(adet)	156	153	% 98	% 2	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Periyodik bakımların artırılması nedeniyle 2017 yılında jeneratör bakım adedinde belirlenen hedefe ulaşılmıştır.					
Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımı.(adet)	80	84	% 105	% 5	YÜKSEK
AÇIKLAMA: İhtiyaç duyulan su miktarındaki artış nedeniyle yeni yapılan sondaj kuyularına enerji nakil hatları çekilmiştir.					

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

Hedef 3: Hizmette sürekliliği sağlamak.

Faaliyet 3: Otomasyonun yaygınlaştırılması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Scada sistemine dahil edilen sondaj kuyusu sayısı. (adet)	250	304	% 122	% 22	YÜKSEK

AÇIKLAMA: SCADA Otomasyon sistemi yaygınlaştırılarak daha fazla sayıda sondaj kuyuları otomasyon sistemine dahil edilmiştir.

Scada sistemine dahil edilen terfi merkezi sayısı. (adet)	200	232	% 116	% 16	YÜKSEK

AÇIKLAMA: SCADA Otomasyon sistemi yaygınlaştırılarak daha fazla sayıda terfi merkezi otomasyon sistemine dahil edilmiştir.

Scada sistemine dahil edilen içmesuyu deposu sayısı. (adet)	190	266	% 140	% 40	YÜKSEK

AÇIKLAMA: SCADA Otomasyon sistemi yaygınlaştırılarak daha fazla sayıda su deposu otomasyon sistemine dahil edilmiştir.

Scada sistemine dahil edilen analizör sayısı. (adet)	30	26	% 87	% 13	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılında ihtiyaç duyulan yerlere klor analizörü montajı yapılarak scada sistemine dahil edilmiştir.

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

Hedef 4: Gelecek yılların planlamasını yapmak.

Faaliyet 1: Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Muhtelif bölgeler için yapılan içmesuyu projesi. (adet)	50	16	% 32	% 68	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Yapılan projelerin büyük ölçekli olması ve birçok mahalleye hitap etmesi nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır.

İçmesuyu temini için yapılan jeofizik etüdü. (adet)	30	35	% 117	% 17	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Su ihtiyacının artması nedeniyle açılacak kuyu sayısının artmasına bağlı olarak daha fazla etüd yaplmıştır.

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 3: Şehir kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı, yapım ve işletmesinin sağlanması.

Faaliyet 1: Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan personel hizmet alımı.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Çalıştırılacak personel sayısı. (adet)	170	170	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Personel hizmet alımı ihalesi 2017 - 2018 yıllarına sari (22 Aylık) olduğundan dolayı personel alımında herhangi bir artış veya eksilme olmamıştır. Hedeflenen personel sayısında devam etmiştir.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 4: Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan taşıt ve iş makinası kiralanması.

Faaliyet 1: Taşıt kiralanması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kiralanacak taşıt sayısı. (adet)	14	14	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Taşıt kiralama hizmet alımı ihalesi 2017 - 2018 yıllarına sari (24 Aylık) olduğundan dolayı kiralanan taşıtlarda herhangi bir artış veya eksilme olmamıştır. Hedeflenen araç sayısında devam etmiştir.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 4: Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan taşıt ve iş makinası kiralanması.

Faaliyet 2: İş makinası ve kepçe kiralanması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kiralanacak iş makinası ve kepçe sayısı. (adet)	47	47	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: İş makinası kiralama hizmet alımı ihalesi 2017 - 2018 yıllarına sari (24 Aylık) olduğundan dolayı kiralanan iş makinalarında herhangi bir artış veya eksilme olmamıştır. Hedeflenen sayıda devam etmiştir.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 5: Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.

Faaliyet 1: Korger ve pvc boru alımı.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Alınacak korger boru ve pvc miktarı. (mt.)	180.000	135.250	% 75	% 25	ORTA

AÇIKLAMA: 2017 yılı malzeme alımımız hedeflenen rakamlarda gerçekleşmiştir.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 5: Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.

Faaliyet 2: Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Alınacak kanal kapağı ve yağmur ızgarası miktarı. (adet)	0	4.000			

AÇIKLAMA: 2017 yılı için ambar stoklarımız yıl içerisindeki talepleri karşılamayacağından kanal kapağı ve yağmur ızgara alımı gerçekleşmiştir.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 5: Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.

Faaliyet 3: Beton baca elemanları ve yükseltme elemanları alımı.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Alınacak beton baca elemanları ve yükseltme elemanları miktarı. (adet)	15.000	19.720	% 131	% 31	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı içerisi ndeki beton baca ve yükseltme elemanları alımları hedeflenen rakamların üzerinde olmuştur.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 5: Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.

Faaliyet 4: İş elbisesi ve hırdavat malzemesi alımı.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Alınacak iş elbisesi ve hırdavat malzemesi miktarı. (kalem)	60	55	% 92	% 8	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı içerisindeki iş elbisesi ve hırdavat malzeme alımları hedeflenen rakamlarda olmuştur.

Amaç 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

Hedef 5: Şehir kanalizasyon sisteminin daha verimli çalışmasını sağlamak.

Faaliyet 1: Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarının yenilenmesi

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yenilenecek problemli kanalizasyon hattı uzunluğu. (m)	37.753	30.042	% 80	% 20	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı içerisindeki çalışmalarımız hedeflenen rakamlarda gerçekleşmiştir.

Amaç 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

Hedef 6: Yeni meskenlerin kanalizasyon sistemine dahil edilmesi.

Faaliyet 1: Şehir kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yeni yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğu. (m.)	64.682	66.552	% 103	% 3	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı içerisi ndeki çalışmalarımız hedeflenen rakamlarda gerçekleşmiştir.

Amaç 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

Hedef 6: Yeni meskenlerin kanalizasyon sistemine dahil edilmesi.

Faaliyet 2: Yeni yapılan meskenlerin kanalizasyon bağlantılarının yapılması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yeni yapılacak abone bağlantı adedi. (adet)	700	763	% 109	% 9	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı içerisi ndeki çalışmalarımız hedeflenen rakamlarda gerçekleşmiştir.

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 6: Atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.

Faaliyet 1: Atıksu arıtma tesislerinde elektrik kullanımı.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kullanılan elektrik miktarı. (kwh)	17.000	20.000	% 118	% 18	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Yeni katılan tesis ve nüfus artışı ile artmıştır.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 7: Çamur susuzlaştırma ünitelerinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.

Faaliyet 1: Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal madde alımı.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Alınacak polielektrolit miktarı. (kg)	80.000	80.000	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 8: Atıksu arıtma tesisleri proses kontrolünün yapılması çalışmaları.

Faaliyet 1: Tesislerin sağlıklı çalışabilmesi ve işletme koşullarının kontrol altında tutulabilmesi için hizmet alımı.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Çalıştırılacak personel sayısı. (adet)	75	83	% 111	% 11	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Yeni katılan tesisler ve iş hacmi artışı nedeniyle artmıştır.

Kiralanacak taşıt sayısı. (adet)	10	10	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Arıtılan su miktarı. (m^3)	70.000.000	72.000.000	% 103	% 3	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Yeni katılan tesis ve nüfus artışı ile artmıştır.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 9: Atıksu arıtma tesislerinin sürekli çalışmasının sağlanması.

Faaliyet 1: Tesislerde çalışan mekanik ve elektrik ekipmanların bakımlarının yapılması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Bakımı yapılacak susuzlaştırma ünitesi. (adet)	14	14	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Bakımı yapılacak araç ve iş makinası sayısı. (adet)	5	6	% 120	% 20	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Yeni gelen bir adet sıyırıcı greyder nedeniyle arttı.					
Bakımı yapılacak pompa sayısı. (adet)	142	160	% 113	% 13	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Yeni katılan tesisler nedeniyle artmıştır.					
Bakımı yapılacak gaz jeneratörü sayısı. (adet)	2	2	% 100	% 0	YÜKSEK
AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.					
Bakımı yapılacak dizel jeneratör sayısı. (adet)	10	9	% 90	% 10	YÜKSEK
AÇIKLAMA: 1 adet jeneratör yeterli saat çalışmadığı için bakım yapılmadı.					

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.
Hedef 10: Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi 2.kademe inşaatının yapılması.
Faaliyet 1: İkinci kademe projesinin hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılacak proje adedi. (adet)	1	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Uygun kredi arayışı ve araştırmalar devam ediyor. Taslak proje yapıldı.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.
Hedef 11: Arıtma çamurunun bertarafının yapılması.
Faaliyet 1: Çamur kurutma ve yakma projelerinin hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Arıtma çamuru bertaraf edilecek tesis adedi. (adet)	1	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: En uygun projeye karar verilmesi amacıyla yapılmadı. Araştırmalar devam ediyor.

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.
Hedef 8: Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.
Faaliyet 1: İçmesuyu, terfi, isale ve şebeke hattı yapılması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Döşenecek içmesuyu hattı uzunluğu. (m.)	138.655	200.582	% 145	% 45	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Gerçekleştirmiş olduğumuz içmesuyu altyapı işlerinin zemin etüdü ve yeni açılacak yolların, işin gerçekleşme sürecinde değişkenlik arz ettiğinden öngörülmeyen yapılaşma, ilçe belediyelerin planlı yollar haricinde yeni imar yollarını açması, işlerin devamında gelen ekstra talepler doğrultusunda, birim fiyatlı olarak ihale edilen altyapı işlerinde ön görülen metrajlardan daha fazla uygulama yapılmıştır.

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.
Hedef 9: İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.
Faaliyet 1: Abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılacak abone bağlantı sayısı. (adet)	3.472	3.228	% 93	% 7	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Yıllara sari projeler olmasından ve abone bağlantılarının şebeke imalatlarından sonra gerçekleştirilmesinden dolayı hedeflenen bağlantı adedi yılı içerisinde gerçekleştirilememiştir.

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.
Hedef 9: İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.
Faaliyet 2: Yangın hidrantı yapılması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılacak yangın hidrantı sayısı. (adet)	30	12	% 40	% 60	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Yıllara sari projelerde, yılında gerçekleştirilen içmesuyu şebekeleri kısmında uygulama projelerindeki düğüm noktalarında daha az sayıda yangın hidrantı bulunduğundan, ayrıca işin gerçekleşme sürecinde gelen bağlantı noktaları proje değişikliğinden dolayı hedeflenen bağlantı adedi yılı içerisinde gerçekleştirilememiştir.

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

Hedef 10: İçmesuyu ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirleri almak.

Faaliyet 1: Sondaj kuyusu açtırılması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Açılacak sondaj kuyusu sayısı. (adet)	50	27	% 54	% 46	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Yıllara sari projelerde gerçekleştirmiş olduğumuz sondaj kuyusu işlerinde işin gerçekleşme sürecinde açılacak hedeflerimizden daha az sondaj uygulaması yapılmıştır.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 12: Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.

Faaliyet 1: Kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Döşenecek kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu. (m)	127.846	374.454	% 293	% 193	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Gerçekleştirmiş olduğumuz kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı işlerinin zemin etüdü ve yeni açılacak yolların, işin gerçekleşme sürecinde değişkenlik arz ettiğinden öngörülmeyen yapılaşma ilçe belediyelerin planlı yollar haricinde yeni imar yollarını açması, işlerin devamında gelen ekstra talepler doğrultusunda birim fiyatlı olarak ihale edilen altyapı işlerinde öngörülen metrajlardan daha fazla uygulama yapılmıştır.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 12: Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.

Faaliyet 2: Yağmur ızgarası ve bağlantılarının yapılması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılacak yağmur ızgara bağlantı sayısı. (adet)	300	0	% 0	% 300	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Yıllara sari projeler olmasından ve abone bağlantılarının şebeke imalatlarından sonra gerçekleştirilmesinden dolayı hedeflenen bağlantı adedi yılı içerisinde gerçekleştirilememiştir.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 13: Aboneler için gerekli işlemlerin yapılması.

Faaliyet 1: Kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılacak kanal abone bağlantı sayısı. (adet)	2.000	3.923	% 196	% 96	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Gerçekleştirmiş olduğumuz kanalizasyon abone bağlantı işlerimizin yapımı sürecinde, öngörülemeyen yapılaşmalar ve işin devamı sürecinde gelen ekstra talepler doğrultusunda 2017 yılı hedeflerimiz içerisindeki öngörülen abone bağlantısından daha fazla uygulama yapılmıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

Hedef 7: Abonelere su faturalarını ödeme kolaylık sağlamak.

Faaliyet 1: Su faturalarının tahsilatı için PTT ile anlaşılması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan tahsilat sayısı. (adet)	227.490	246.512	% 108	% 8	YÜKSEK
AÇIKLAMA: PTT Şubelerinin sayısının artmasından dolayı beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.					
Toplam tahsilat içindeki payı. (%)	4,18	4,39	% 105	% 5	YÜKSEK
AÇIKLAMA: PTT Şubelerinin sayısının artmasından dolayı beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.					

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

Hedef 1: Abonelerin talep ve şikayetlerini kısa sürede sonuçlandırmak.

Faaliyet 1: Abonelerin her ay okunması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Hizmet alımı yolu ile personel çalıştırılması. (kişi)	140	150	% 107	% 7	YÜKSEK
AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.					
Sayaç okuma sayısı. (adet)	4.730.000	5.088.721	% 108	% 8	YÜKSEK
AÇIKLAMA: 2017 yılında abone sayısındaki artış ile hedeflenen rakama ulaşılarak aşılmıştır.					
Günlük sayaç okuma sayısı. (adet)	19.000	16.310	% 86	% 14	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Abonelik iptali ve geçici kapama işlemlerinin artışı ve ayrıca abonesiz su kullanımının artmasından dolayı hedeften sapma olmuştur.					
Kaçaksu tutanak sayısı. (adet)	82.200	94.136	% 115	% 15	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Sahada çalışan ekip sayısındaki artıştan dolayı hedeften sapma olmuştur.					
Borcundan dolayı kapatılan abone sayısı. (adet)	12.750	18.835	% 148	% 48	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Borçlu abone sayısındaki artıştan dolayı hedeften sapma olmuştur.					
İcra takibindeki dosya sayısı. (adet)	1.350	1.765	% 131	% 31	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Su borçlarını yapılandırıp ödemeyen abonelerin sayısındaki artıştan ve bu abonelerin icraya verilmelerinden dolayı hedeften sapma olmuştur.					

Amaç 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

Hedef 2: Abonelere su sayacı takılması ve bozulan sayaçların değiştirilmesi.

Faaliyet 1: Sayaç alımı için ihale yapılması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sayaç alımı. (adet)	28.000	40.000	% 143	% 43	YÜKSEK
AÇIKLAMA: 2017 yılı sayaç alım adedi rakamlarına ulaşılarak aşılmıştır.					
Sayaç değiştirme sayısı. (adet)	35.000	37.071	% 106	% 6	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Hedefe ulaşılmıştır.					
Bozuk sayaç ihbar sayısı. (adet)	18.500	10.421	% 56	% 44	ORTA
AÇIKLAMA: Mevsim şartlarının bekleneden normal geçmesi ve buna paralel olarak arızaların beklenenden az olmasından dolayı hedeften sapma olmuştur.					
Yeni abone sayısı. (adet)	18.500	21.098	% 114	% 14	YÜKSEK
AÇIKLAMA: 6360 sayılı kanun ile sınırların genişlemesinden dolayı yeni yapılan abone sayısındaki artıştan dolayı hedeften sapma olmuştur.					

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

Hedef 5: Kurum hizmetindeki iş makinaları ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve madeni yağ alınması.

Faaliyet 1: Akaryakıt ve yağ alınması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Akaryakıt ve yağ alım miktarı. (lt)	1.120.000	877.312,71	% 78	% 22	ORTA
AÇIKLAMA: Kuruma ait araçlardan hurda kapsamında satılanların olması, akaryakıt ve madeni yağ tüketimlerinin sarfını etkilemiştir.					
Motorin alım miktarı. (lt)	1.000.000	863.342,71	% 86	% 14	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Kuruma ait araçlardan hurda kapsamında satılanların olması, akaryakıt ve madeni yağ tüketimlerinin sarfını etkilemiştir.					
Kurşunsuz benzin alım miktarı. (lt)	100.000	10.570	% 11	% 89	DÜŞÜK
AÇIKLAMA: Kuruma ait araçlardan hurda kapsamında satılanların olması, akaryakıt ve madeni yağ tüketimlerinin sarfını etkilemiştir.					
Madeni yağ alım miktarı. (lt)	20.000	3.400	% 17	% 83	DÜŞÜK
AÇIKLAMA: Kuruma ait araçlardan hurda kapsamında satılanların olması, akaryakıt ve madeni yağ tüketimlerinin sarfını etkilemiştir.					

Amaç 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

Hedef 6: Kuruma ait taşıt ve iş makinası alımı.

Faaliyet 1: Kurum hizmetinde kullanılmak üzere taşıt ve iş makinası alımı.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Alınacak taşıt sayısı. (adet)	1	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: 2017 yılı için ihtiyaten araç alımı öngörülmüş ancak ihtiyaç olmadığından alınmamıştır.

Amaç 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

Hedef 7: Kurum hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmeti alınması.

Faaliyet 1: Taşıt kiralama hizmeti alımı.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kiralanacak taşıt sayısı. (adet)	40	39	% 98	% 2	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

Hedef 7: Kurum hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmeti alınması.

Faaliyet 2: İş makinası kiralama hizmeti alımı.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kiralanacak iş makinası sayısı. (adet)	1	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Kiralık iş makinesinde artış öngörülmüş ama ihtiyaç olmadığı için kiralama işi yapılmamıştır.

Amaç 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

Hedef 8: Kuruma ait araç ve iş makinaları için muhtelif cins ve miktar yedek parça alınması ve araç ve iş makinalarının gerekli bakım onarımlarının yapılması.

Faaliyet 1: İş makinası ve araçların bakım onarımlarının yapılması ve yedek parça alımı.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Bakım onarımı yapılacak iş makinası sayısı. (adet)	74	128	% 173	% 73	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Kuruma ait iş makinelerinde beklenenden fazla arıza oluştuğu için beklenin üzerinde çıkmıştır.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 3: Kurum tanıtımının daha etkin yapılması.

Hedef 1: Kurum web sayfasının güncelliğinin sağlanması.

Faaliyet 1: Kurum web sayfasının ihtiyaçlara göre yeniden dizaynedilmesi.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Web sayfasının yeniden düzenlenmesi. (gün)	30	30	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

Hedef 1: Kullanılan uygulamaların entegrasyonunun sağlanması.

Faaliyet 1: Kullanılan uygulamaların lisanslarının güncellenmesi ve raporlamalarının yapılması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sürekli güncellenecek uygulama sayısı. (adet)	3	3	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

Hedef 2: Donanım altyapısının güncellenmesi.

Faaliyet 1: Sunucu storage, bilgisayar, yazıcı, switch, plotter, el terminali, firewall ve güç kaynağı alınması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Bilgisayar alımı. (adet)	15	15	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Yazıcı alımı. (adet)	20	20	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

El terminali alımı. (adet)	100	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA:Sahada tablet kullanımı yaygınlaştı.

Tablet alımı. (adet)	5	25	% 500	% 400	YÜKSEK

AÇIKLAMA:Sahada tablet kullanımı yaygınlaştı.

Amaç 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

Hedef 3: EBYS yazılımının alınması ve entegrasyonu.

Faaliyet 1: Yazılım alınması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Alımı yapılacak ve entegrasyonu sağlanacak EBYS yazılımı. (adet)	1	1	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

Hedef 4: CBS yazılım güncelleme ve abonelerin coğrafi olarak koordinatlandırılması.

Faaliyet 1: Yazılımların güncellenmesi.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Abone adres bilgilerinin cogeocode olarak haritalandırılması.(adet)	1	1	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

Hedef 10: Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi.

Faaliyet 1: Hizmet içi eğitim programı düzenlemek.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Verilecek hizmet içi eğitim süresi. (saat)	2.000	2000	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

Hedef 11: Kurum temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alınması.

Faaliyet 1: Kuruma bağlı ilçeler, ekip evleri, vezneler, hizmet binası ve hizmet tesislerinin temizlik işlerinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Temizlik işlerinde çalıştırılacak kişi sayısı. (adet)	49	49	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

Hedef 9: Dava ve icra takibi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.

Faaliyet 1: Dava ve icra takibi başlatmak ve yürütmek.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yargılaması yapılacak dosya sayısı. (adet)	110	97	% 88	% 12	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Hedefe ulaşılmıştır.

Harç yatırılacak dosya sayısı. (adet)	110	97	% 88	% 12	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Hedefe ulaşılmıştır.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

Hedef 5: Genel Müdürlüğümüzün su üretip abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını ve analizlerini yaparak sürekli iyileştirmek.

Faaliyet 1: Numune alma birimi ve laboratuvar için gerekli araç ve gereçleri temin ederek yıllık laboratuvarda analizi yapılan içmesuyu numune sayısını 20.000'in altına ve parametre sayısını 150.000'in altına düşürmemek, parametre metod sayısını 160'a çıkarmak ve yıllık laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 1.000'in altına düşürmemek.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Numune almak ve klor kontrolü için kullanılan araç sayısı. (adet)	2	2	% 100	% 0	YÜKSEK
AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.					
Yıllık analizi yapılan numune sayısı. (adet)	14.000	11.400	% 81	% 19	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Yeni numune alma noktalarının merkez binaya çok uzak olması numune sayısını etkilemiştir.					
Yıllık analiz edilen parametre sayısı. (adet)	100.000	116.152	% 116	% 16	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Laboratuvardaki cihaz ve teçhizatın geliştirilmesi yapılan parametre sayısını artırmıştır.					
Yıllık klor kontrol sayısı. (adet)	6.000	3.746	% 62	% 38	ORTA
AÇIKLAMA: Mevcut araç ve personel sayısı aynı iken numune alma noktalarının uzaklaşması klor kontrol sayısını olumsuz etkilemiştir.					
İçmesuyu ve atıksu analizinde parametre ve analiz yöntemlerinin arttırılması. (adet)	122	125	% 102	% 2	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Belirlenen hedefin üzerinde parametre eklenmiştir.					
Laboratuvara gelen atıksu numunesi. (adet)	1.250	841	% 67	% 33	ORTA

AÇIKLAMA: Hizmet alanımız içerisinde merkeze daha uzak olan yerleşim yerlerinden tahmin edilenden daha çok numune alınması ve bu numune alma noktalarının merkez binaya uzak olması daha az numune toplanmasına neden olmuştur. Dairemizin mevcut araç ve personeli ile uzak yerleşim yerlerinden numune almak numune sayısını azalttığı için hedef tutturulamamıştır. Buna rağmen laboratuvardaki cihaz ve teçhizatın geliştirilmesi ile numunelerde çalışılan parametre sayıları hedefin üzerinde gerçekleşmiştir.

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

Hedef 6: Mesleki eğitimler ile ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlere katılımın sağlanması.

Faaliyet 1: Numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde ve laboratuvar personellerinin laboratuvarda yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 30 saatin altına düşürmemek.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Alınacak hizmet içi eğitim süresi. (saat/personel)	20	20	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı içeriisinde kişi başı 20 saat eğitim alınmıştır.

Amaç 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

Hedef 7: "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" gereği Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından il genelindeki şebekenin muhtelif yerlerinden alınarak analizi yaptırılan numunelerin sonuçlarını ve analiz bedellerini takip etmek.

Faaliyet 1: Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanı içindeki Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nün yaptığı tüm analiz raporlarının temini, değerlendirilmesi ve ödemelerin takibini yapmak.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İl Sağlık Müdürlüğü'nün sunduğu su analiz raporlarının ve ödemelerin takip edilmesi ve değerlendirilmesi. (%)	100	100	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Gerçekleştirilen bütün analizlerin raporları değerlendirilmiş ve ücreti ödenmştir.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 1: Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine" göre denetlemek.

Faaliyet 1: Denetlenen endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin sayısını 170'in altına düşürmemek.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Denetim yapılan işletme sayısı. (adet)	170	127	% 75	% 25	ORTA
AÇIKLAMA: Protokol taleplerinin artışı nedeniyle istenilen hedefin %25 lik kısmı sağlanamamıştır					
Yıllık ortalama denetim sayısı. (adet)	700	449	% 64	% 36	ORTA
AÇIKLAMA: Açılan firma sayısının beklenenden az olması ve faaliyette olan firmaların bir kısmının OSB 'lere taşınması.					
ABKKİB ruhsat verilen firma sayısı. (adet)	40	33	% 83	% 17	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Faaliyetlerine ara veren firmalardan dolayı belge verilmesine gerek görülmemiş olması.					

GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı. (adet)	230	122	% 53	% 47	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Ruhsat yenileme ve yeni açılan işletme sayılarının 2017 yılı için düşüş göstermesi.

Denetleme yapmak ve numune almak için kullanılan araç sayısı. (adet)	1	1	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün alıcı ortama deşarj yapan firmaları, KASKİ ile protokol yaparak atıksularını vidanjörle Kayseri Atıksu Arıtma Tesisine vermeleri konusunda uyarmaları, kurumumuza gelen protokol taleplerini artırmıştır. Bu firmaların protokol taleplerini karşılamak için yerinde incelemeler yapılmış ve buda planlanan denetimlerin zamanında yapılmasını aksatmış olup hedef yakalanamamıştır.

Amaç 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Hedef 2: Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre tehlikeli atıkların uzaklaştırılması.

Faaliyet 1: Genel Müdürlüğümüzün tüm birimleri tarafından oluşan tehlikeli atıkların mevcut yönetmeliğe göre bertaraf edilmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Tehlike atıkların bertaraf edilmesi için gerekli takiplerin yapılması. (%)	100	100	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Bütün tehlikeli atıklar gerekli sınıflandırmalar yapıldıktan sonra bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Amaç 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

Hedef 3: Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek

Faaliyet 1: Akredite parametre ve metod sayısını 80'e çıkarmak.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu ve atıksu analizinde akredite parametre ve metod sayısı. (adet)	56	56	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2017 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Yeterlilik deneylerine katılınan parametrelerde başarı oranı. (%)	90	92	% 102	% 2	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Akreditasyon ve Çevre Bakanlığından alınan yetki belgeleri için ilgili parametrelerde yeterlilik testlerinde hedefler yakalanmıştır.

Amaç 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

Hedef 3: Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek

Faaliyet 2: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısını 45'in altına düşürmemek.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısı. (adet)	45	45	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: İstenilen hedef gerçekleştirilmiştir.

Amaç 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

Hedef 4: Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işleminin geliştirilmesi.

Faaliyet 1: Numuneye uygulanacak sürecin bilgisayar ortamında takip edilebilmesi, otomatik raporlamanın devam ettirilebilmesi ve bilgisayar ortamında istatistiki veri olarak arşivlenebilmesi için mevcut yazılımın geliştirilmesi ve ayrıca internet üzerinden deney raporunun yayınlanması ile e-rapor sisteminin vatandaşa daha hızlı, şeffaf, kolay ve kullanışlı bilgi sağlayacak yönde geliştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2017 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Mevcut yazılımın işlevselliğinin artırılması. (%)	5	5	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Programda daha geniş kapsamlı aylık ve yıllık faaliyet raporlarının yanısıra daha içerikli istatiksel veriler alınabilir hale getirilmiştir.

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-ÜSTÜNLÜKLER

- Altyapı yatırımlarına gereken önemin verilmesi ve hem içmesuyu hem atıksu alt yapısının %97'sinin bitirilmiş olması.
- Scada sisteminin kurulu olması ve içmesuyu şebeke arızalarına anında müdahale edilebilmesi.
- Kuruma ait Türkak (Türkiye Akreditasyon Kurumu)'a bağlı Çevre Analizleri Laboratuvarının olması.
- İçmesuyu ve kullanma suyu kalitesi bakımından Türkiye'de sayılı illerden biri oluşu.
- Su faturaları tahsilatı konusunda, tahsilat noktalarının ve Kioks (Akıllı Vezne)' larla tahsilat yüzdesinin %99'larda olması.
- Coğrafi Bilgi Sistemleri oluşturulmuş olup, altyapı ve üstü tesislerinin tamamına yakınının CBS'ne kaydedilmiş olması.
- Kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmesinde mevcut araç ve iş makinası parkının yeterli olması.
- Kurum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gereken elektronik makine ve teçhizata sahip olunması.
- Mevcut su kaynakları ile şehrimizin su ihtiyacının 2070 yılına kadar yetecek olması.
- E- İmza Sisteminin uygulanması.

B-ZAYIFLIKLAR

- Artan yazılım ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılayabilme yetkinliğine sahip olmaması.
- Modern yönetim süreçlerinin (iş akışı yönetim sistemi, performans izleme ve değerlendirme sistemi, süreç yönetim sistemi, vs. gibi) yeterince takip edilmemesi.
- Arşivleme sisteminin klasik oluşu, yeni yönetim tarzına göre arşiv yönetim sisteminin olmayışı.
- AR-GE faaliyetlerinin yetersizliği.
- İSKİ Kuruluş Kanunu ile kurumumuza verilen görev ve sorumlulukla; Yağmursularının kanalizasyon hatlarına verilmesinden dolayı hatlarda fazladan oluşan doluluk.
- Nitelikli personel sayısının yeterince olmaması.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Kayseri, Nisan 2018

Ender BATUKAN
Genel Müdür

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Strateji Geliştirme birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2017 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Kayseri, Nisan 2018

Cemil KOÇ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.


Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Kayseri, Nisan 2018

Yavuz ÇAĞAN	Mustafa KAYAR	Buket ERGİN	H.İbrahim KILIÇASLAN	Mustafa ÖNK	Recep ÇULHAOĞLU	İ.Hakkı TUNA	Emir NAMALDI	Mücahid SOYAK	Fazilet MALİK	Necmettin KOCAKAPLAN	Cüneyt URFALIER	Hikmet ULUSOY	Adil ÇAKMAK
İçmesuyu Dai. Bşk.	Kanal. Dai. Bşk.	Atıksu Arıtma Dai. Bşk. V.	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.	Elektrik Mak. Ve Malz. İk. Dai. Bşk.	Bilgi İşlem Dai. Bşk.	İnsan Kay. Ve Des. Hiz. Dai. Bşk.	Tesisler Dai. Bşk.	Abone İşleri Dai. Bşk.	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	Muhasebe Şube Müdür V.	İ.Hukuk Müşaviri	Basın Yayın Şb. Müd.	Yön. Kur. Sek.







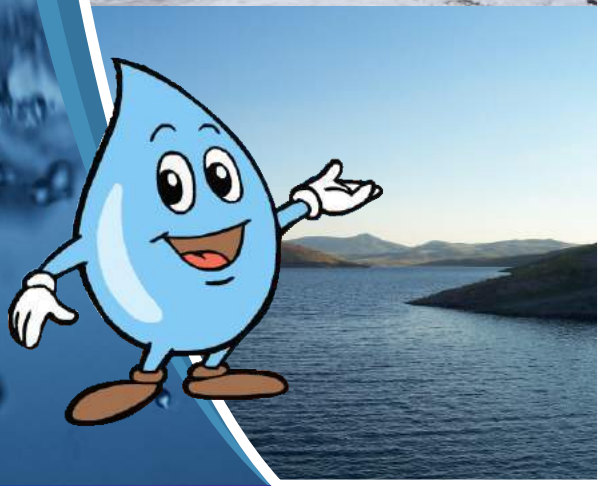

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulv.
No:186 P.K:38090 Kocasinan/KAYSERİ
Tel : +90 352 432 0 432 Fax : +90 352 337 09 32
www.kaski.gov.tr / e-mail:kaski@kaski.gov.tr
